



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - март 2015 года	9	1	8
январь - март 2016 года	1	1	0



Строительство ж/д по ул.Давурская–А.Кутуя, Казань



Средства
подмащивания
установлены на
случайные предметы

Вынесены постановления
о назначении
административного
наказания на юридическое
и должностное лица

Заказчик : ООО «СК «УнистройДом». Подрядчик: ООО «УСК «Гермес»



Строительство ж/д на Комсомольской набережной, г. Набережные Челны



Технические отверстия
в плите и другие выемки
не закрыты крышками,
щитами или ограждениями

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик: ООО «АНГ-Холдинг». Подрядчик: ООО «СК КамАвтоСтрой»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	218	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	48	2 246,0
Взыскано всего	3	195,0
Не истек срок оплаты	36	1 976,0
Обжалуются в суде	1	75,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	143
- с выездом на объекты строительства	27
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	55
- выдано предписаний	19
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	34
- выдано предупреждений	2

Республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ» по итогам 2015 года



№	Номинация
I	Строительные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
II	Специализированные монтажные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
III	Предприятия стройиндустрии с численностью работников: - до 100 человек; - свыше 100 человек.



Заявки на конкурс

7

«Лучшая организация по охране труда в строительной отрасли»

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
1	г. Казань	2
2	г.Наб.Челны	2
3	Агрызский	
4	Азнакаевский	2
5	Аксубаевский	
6	Актанышский	1
7	Алексеевский	1
8	Алькеевский	1
9	Альметьевский	1
10	Апастовский	
11	Арский	1
12	Атнинский	1

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
13	Бавлинский	
14	Балтасинский	1
15	Бугульминский	
16	Буинский	1
17	Верхнеуслонский	
18	Высокогорский	
19	Дрожжановский	1
20	Елабужский	
21	Заинский	
22	Зеленодольский	
23	Кайбицкий	
24	Камско-Устьинский	



Заявки на конкурс

8

«Лучшая организация по охране труда в строительной отрасли»

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
25	Кукморский	
26	Лаишевский	1
27	Лениногорский	
28	Мамадышский	
29	Менделеевский	2
30	Мензелинский	
31	Муслюмовский	
32	Нижнекамский	5
33	Новошешменский	1
34	Нурлатский	
35	Пестречинский	

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
36	Рыбно-Слободский	
37	Сабинский	
38	Сармановский	
39	Спасский	1
40	Тетюшский	
41	Тукаевский	
42	Тюлячинский	
43	Черемшанский	1
44	Чистопольский	1
45	Ютазинский	1
	Итого:	28



28 апреля

**Всемирный
день
охраны труда**





Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 марта 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	512 546	21,3	1 888 454
1	Чистопольский	45 000	1 592	3,5	43 408
2	Лениногорский	30 000	1 593	5,3	28 407
3	Буинский	19 000	1 014	5,3	17 986
4	Черемшанский	8 000	571	7,1	7 429
5	Бавлинский	17 000	1 221	7,2	15 779
6	Нижнекамский	150 000	13 806	9,2	136 194
7	Новошешминский	5 000	502	10,0	4 498
8	Бугульминский	40 000	4 516	11,3	35 484
9	Арский	27 000	3 082	11,4	23 918
10	В-Услонский <i>в т.ч. Иннополис</i>	40 000 26 000	4 759 0	11,9 0	35 241
11	Агрызский	20 000	2 630	13,2	17 370
12	г.Наб.Челны	300 000	44 161	14,7	255 839
13	Мамадышский	15 000	2 293	15,3	12 707
14	Азнакаевский	25 000	3 833	15,3	21 167
15	г.Казань	800 000	124 457	15,6	675 543



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 марта 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	512 546	21,3	1 888 454
16	К-Устьинский	10 000	1 583	15,8	8 417
17	Тетюшский	10 000	1 617	16,2	8 383
18	Менделеевский	10 000	1 621	16,2	8 379
19	Тукаевский	70 000	12 638	18,1	57 362
20	Нурлатский	26 000	4 749	18,3	21 251
21	Заинский	20 000	3 772	18,9	16 228
22	Кукморский	27 000	5 137	19,0	21 863
23	Муслюмовский	8 000	1 525	19,1	6 475
24	Спасский	8 000	1 606	20,1	6 394
25	Аксубаевский	11 000	2 225	20,2	8 775
26	Сабинский	18 000	3 718	20,7	14 282
27	Атнинский	4 000	831	20,8	3 169
28	Елабужский	50 000	10 406	20,8	39 594
29	Мензелинский	16 000	3 448	21,6	12 552
30	Актанышский	17 000	3 705	21,8	13 295



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 марта 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	512 546	21,3	1 888 454
31	Альметьевский	155 000	34 963	22,6	120 037
32	Ютазинский	10 000	2 437	24,4	7 563
33	Высокогорский	64 000	16 071	25,1	47 929
34	Балтасинский	14 000	3 520	25,1	10 480
35	Дрожжановский	7 000	1 760	25,1	5 240
36	Сармановский	10 000	2 643	26,4	7 357
37	Алексеевский	14 000	3 752	26,8	10 248
38	Кайбицкий	4 800	1 372	28,6	3 428
39	Зеленодольский	170 000	60 451	35,6	109 549
40	Р-Слободский	13 000	4 829	37,1	8 171
41	Алькеевский	6 500	2 623	40,4	3 877
42	Тюлячинский	7 500	3 056	40,7	4 444
43	Апастовский	12 000	5 571	46,4	6 429
44	Лаишевский	80 000	37 414	46,8	42 586
45	Пестречинский	70 000	63 473	90,7	6 527



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 18.03.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	170	42	128	92	36
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,2	44,7	460,5	282,9	177,6
Количество квартир	8 912	832	8 080	4 868	3 212



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасом- строй»	100	2 кв.2016
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	99	2 кв. 2016
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 6 шт. 85 кв. ж/д – 6 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	94	2 кв.2016



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	96	3 кв. 2016
Елабужский район, г.Елабуга, Танаевское шоссе, комплекс арендного жилья 162 кв.	ООО «ГИПС»	ООО «ПСК Народный дом»	75	2 кв. 2016
Мамадышский район, 30 кв.ж/д ул.Школьная пос.совхоза «Мамадышский»	ООО «ГИПС»	ЗАО «Стройсервис»	67	3 кв.2016



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

16

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		18	120	10	7	1
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	-	1
3	Бугульминский	1	20	-	1	-
4	Высокогорский	1	22	1	-	-
5	Зеленодольский	1	1	1	-	-
6	г.Казань	10	46	6	4	-
7	г. Наб. Челны	3	24	1	2	-

Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Детей-сирот	№	МО РТ	Детей-сирот	
ИТОГО по РТ						311
1	Агрызский	9	13	Буинский	4	
2	Азнакаевский	3	14	Верхнеуслонский	4	
3	Аксубаевский	7	15	Высокогорский	11	
4	Актанышский	2	16	Дрожжановский	3	
5	Алексеевский	1	17	Елабужский	7	
6	Алькеевский	10	18	Заинский	6	
7	Альметьевский	14	19	Зеленодольский	18	
8	Арский	2	20	Кайбицкий	9	
9	Атнинский	3	21	Кукморский	4	
10	Бавлинский	11	22	Камско-Устьинский	8	
11	Балтасинский	1	23	Лаишевский	5	
12	Бугульминский	25	24	Лениногорский	13	





Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Детей-сирот	№	МО РТ	Детей-сирот
ИТОГО по РТ		311			
25	Мамадышский	3	35	Сармановский	1
26	Менделеевский	3	36	Спасский	2
27	Мензелинский	3	37	Тетюшский	4
28	Муслюмовский	2	38	Тукаевский	3
29	Нижнекамский	7	39	Тюлячинский	1
30	Новошешминский	1	40	Черемшанский	3
31	Нурлатский	11	41	Чистопольский	6
32	Пестречинский	5	42	Ютазинский	2
33	Рыбно-Слободский	5	43	г.Наб.Челны	19
34	Сабинский	3	44	г. Казань	47



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Сертификаты		Динамика за 2 недели
		План	Выдано	
1	Аксубаевский	1	1	
2	Алексеевский	4	4	+3
3	Алькеевский	5	0	
4	Альметьевский	3	3	+1
5	Арский	1	1	
6	Бавлинский	1	0	
7	Буинский	1	1	
8	Елабужский	2	2	+2
9	Зеленодольский	1	1	
10	г.Казань	2	2	
ИТОГО		38	26	+12

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей



№	МО РТ	Сертификаты		Динамика за 2 недели
		План	Выдано	
11	К-Устьинский	1	1	+1
12	Лаишевский	1	0	
13	Лениногорский	1	1	+1
14	Мамадышский	1	0	
15	Менделеевский	2	2	
16	Мензелинский	1	1	
17	Н.Челны	2	2	+1
18	Пестречинский	4	1	
19	Тетюшский	1	1	+1
20	Чистопольский	2	2	+2
ИТОГО		38	26	+12



Молодые семьи

№	МО РТ	План
1	Альметьевский	2
2	Арский	1
3	Бугульминский	1
4	Лаишевский	1
5	Лениногорский	1
6	Нижнекамский	8
7	Сабинский	2
8	Чистопольский	1
9	Ютазинский	1
10	г.Н.Челны	20
11	г.Казань	39
ИТОГО		77



Чернобыльцы

№	МО РТ	План	Внесено в АИС
1	Алькеевский	1	1
2	Альметьевский	1	1
3	Верхнеуслонский	1	1
4	Елабужский	1	1
5	Зеленодольский	3	3
6	г.Казань	5	5
7	Кукморский	1	1
8	Мамадышский	1	1
9	Менделеевский	1	1
10	Н.Челны	3	3
11	Нижнекамский	2	2
12	Рыбно-Слободский	1	1
13	Сармановский	2	2
14	Чистопольский	2	2
15	Ютазинский	1	1
ИТОГО по РТ		26	26



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	План	Внесено в АИС
1	Альметьевский	1	1
2	Азнакаевский	3	3
3	Алькеевский	1	1
4	Апастовский	2	2
5	Арский	2	2
6	Бугульминский	3	3
7	Высокогорский	1	1
8	Елабужский	1	1
9	Заинский	1	1
10	Зеленодольский	6	6
11	Лениногорский	1	1
12	Сабинский	1	1
13	Сармановский	1	1
14	г.Казань	11	11
15	Н.Челны	2	2
ИТОГО		37	37



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	План	Внесено в АИС
1	Нижнекамский	1	1
2	Верхнеуслонский	1	1
3	Бугульминский	1	1
ИТОГО		3	3



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

25



г.Казань, 14-кв. жилой дом по ул.Бехтерева
Застройщик – ООО «Аврора»



Многоквартирное инвестиционное жилье

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		80	32	30	18
1	Агрызский	1	-	-	1
2	Альметьевский	3	2	-	1
3	Арский	2	1	-	1
4	Бугульминский	3	1	2	-
5	Высокогорский	1	-	-	1
6	Елабужский	3	1	1	1
7	Зеленодольский	2	2	-	-
8	Лаишевский	2	1	-	1
9	Лениногорский	2	2	-	-
10	Муслюмовский	1	-	1	-
11	Нижнекамский	3	-	2	1
12	Пестречинский	2	1	1	-
13	г.Набережные Челны	28	12	11	5
14	г.Казань	27	9	12	6



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	2 005	6 995



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

28

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		16,9	1,6
г.Казань	Советский район – ОП № 13 Азино-2, п.Вознесенье	0	0
	Советский район – ОП № 12 Гвардейский, п.Константиновка	0	0
	Приволжский район - ОП № 9 Сафиуллина, п.Вишневка	0	0
Зеленодольский, с.Свияжск		0	0
Заинский, с.Тюгеевка		3,0	3,0
Мамадышский, п.Северный		15,0	0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		20,0	4,0
Нижнекамский, с.Верхние Челны		38,5	5,5
Дрожжановский, с.Шланга		42,5	3,0
Высокогорский, с.Куркачи		50,0	0



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

29

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		3,5	3,0
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	0	0
	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	0	0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	0	0
Дрожжановский, с.Большая Акса		1,0	0
Заинский, г.Заинск-2		3,0	3,0
Высокогорский, с.Чернышевка		5,0	4,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		15,0	13,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



Нижнекамский район, с.Верхние Челны
Подрядчик – ООО «НФ-Строй»

**Жилой дом по ул.Бехтерева/3.Космодемьянская
г.Казань (ООО «Фирма «Свей»)
(введен в эксплуатацию)**





**Жилой дом № 2 по ул.Павлюхина
ЖК «Симфония» г.Казань (ГК «Фон»)
(введен в эксплуатацию)**





Перечень долевых объектов жилья на стадии высокой степени готовности


Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Общ. площ.	Стадия строительства (%)
1	146 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	ООО «Свей»	13 771	<i>Введен в эксплуатацию</i>
2	276 кв. ж.д. по ул.Краснококшайская/ул.Баруди	ООО «ИТЦ»	17 216	<i>ЗОС получен</i>
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	97 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	87 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	78 %
5	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	80 %
ИТОГО по г.Казани			68 001	
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО ЖСК «Доступное жилье»	22 369	99 %
ИТОГО по РТ			90 370	



«Сельские клубы»

34

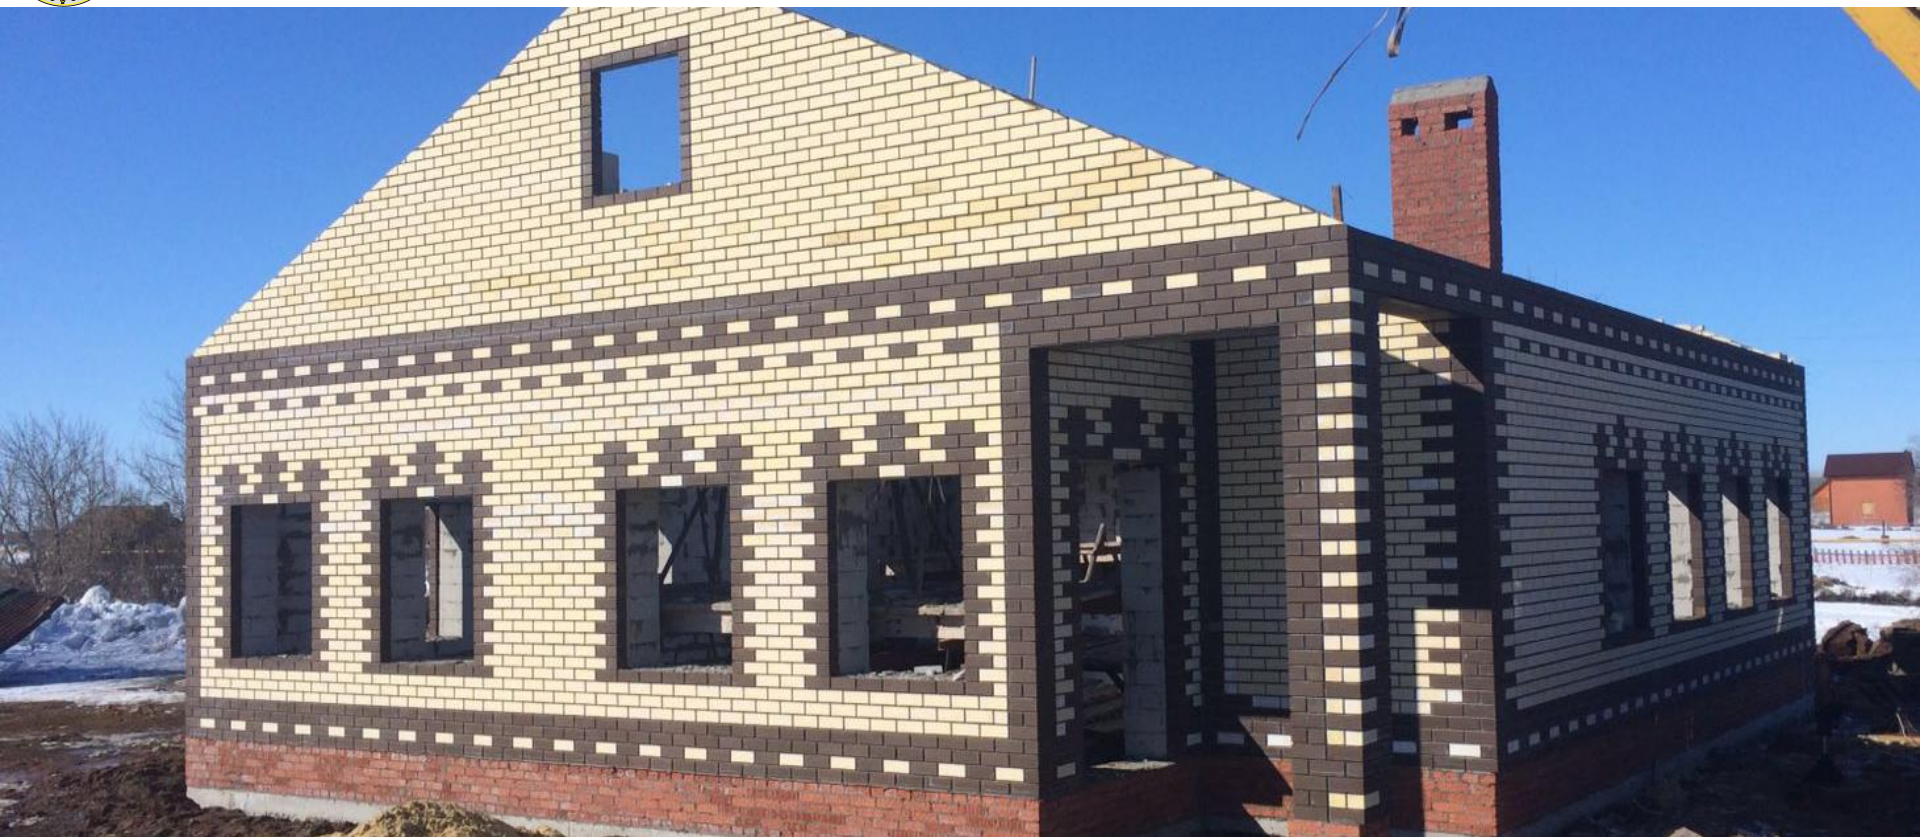

Лаишевский, д.Курманаково
Подрядчик: ООО "СтройКорпорация"



«Сельские клубы»

35



Альметьевский, с.Ильтень-Бута
Подрядчик: ООО «Основа С»



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 18.03.16	дина- мика
1	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	3	1
2	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	4	2
3	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	4	4
4	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	4	2
5	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	4	2
6	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	5	2
7	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	6	0
8	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	8	0
9	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	9	4



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 18.03.16	дина- мика
10	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	9	3
11	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	15	6
12	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	15	3
13	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	16	5
14	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	16	1
15	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	17	2
16	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	5 350,17	19	6
17	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	19	3
18	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	19	4



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 18.03.16	дина- мика
19	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	22	5
20	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	22	2
21	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	24	1
22	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	25	9
23	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	25	9
24	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	25	7
25	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	27	10
26	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	27	6
27	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	27	11



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 18.03.16	дина- мика
28	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	27	17
29	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	29	10
30	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	32	12
31	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	35	6
32	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	35	3
33	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	38	10
34	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	38	10
35	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	43	3
36	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	46	11
37	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	47	5



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 18.03.16	дина- мика
38	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	49	5
39	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	49	16
40	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	50	2
41	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	51	12
42	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	55	2
43	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	57	15
44	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	58	2
45	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	72	8



Участковые ветеринарные пункты

41

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, Чалпы				
3	Аксубаевский, Старые Савруши				
4	Актанышский, Такталачук				
5	Актанышский, Поисеево				
6	Алексеевский, Лебедино				
7	Алькеевский, Старое Алпарово				
8	Альметьевский, Бишмунча				
9	Апастовский, Шигаево				
10	Арский, Утар-Аты				
11	Арский, Шушмабаш				
12	Атнинский, Нижняя Береске				
13	Бавлинский, Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, Васькино Турайлы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

42

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский, Янгулово				
16	Буинский, Каменный Брод				
17	Высокогорский, Айбаш				
18	Дрожжановский, Б. Матаки				
19	Дрожжановский, Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский, г.Заинск				
22	Зеленодольский, Мизинова				
23	Кайбицкий, Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, Теньки				
25	Кукморский, Березняк				
26	Кукморский, Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, Малые Елги				
28	Лениногорский, Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, Атрякле				
31	Муслимовский, Елгабаш				
32	Нижнекамский, Кам.Поляны				
33	Новошешминский, совхоз «Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, Шали				
35	Сармановский, Лешев Тамак				
36	Тетюшский, Жуково				
37	Тукаевский, Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, Большая Меша				
39	Черемшанский, Аккиреево				
40	Ютазинский, Старый Каразирек				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

45

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верхнеуслонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Камско-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, с.Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Менделеевский, с.Абачевский				
39	Мензелинский, с.Калтаковский				
40	Мензелинский, с.Кзыл-Тюбякский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюронясевское				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыбно-Слободский, с.Полянский				
48	Рыбно-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуртинский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуркеевский				
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодайский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты



Дрожжановский, с. Чувашское Дрожжаное
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Патологоанатомические отделения

49

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский				
7	Балтасинский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский, Елабужская ЦРБ				
4	Нурлатский, с.Старые Челны				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 11.03.16 по 17.03.16	
437,6	353,24	32,12	
		Остаток	
		84,36	
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ		% выполнения	
11.03.2016г. – 17.03.2016г.		5,38	5,43
СМР		5,38	100,93
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ		100,64	
01.03.2016 г. – 17.03.2016 г.		15,54	15,64
СМР		15,54	100,64
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 17.03.2016 г.		367,90	370,87
		100,81	

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.03.2016г. – 17.03.2016г.	15,19	15,22	100,20
СМР	15,19	15,22	100,20
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 17.03.2016 г.	27,13	27,22	100,33
СМР	27,13	27,22	100,33
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 17.03.2016 г.	94,03	94,13	100,11

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.03.2016г. – 17.03.2016г.	7,13	7,19	100,84
СМР	7,13	7,19	100,84
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 17.03.2016 г.	14,55	14,68	100,89
СМР	14,55	14,68	100,89
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 17.03.2016 г.	63,95	65,05	102,04

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.03.2016г. – 17.03.2016г.	7,71	7,75	100,52
СМР	7,71	7,75	100,52
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 17.03.2016 г.	17,43	17,63	101,15
СМР	17,43	17,63	101,15
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 17.03.2016 г.	61,25	63,13	103,53



С днём работников ЖКХ!



ЖИТЬ
Комфортно-
Хорошо

ЭТО НАШ ДОМ - НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

