






Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июнь 2015 года	21	7	14
январь - июнь 2016 года	16	5	11
	 24%	 29%	 21%



Травматизм в строительной отрасли (смертельные случаи в разрезе МО)

№	МО	Количество за январь-июнь	
		2015г.	2016г.
1	г. Казань	3	1
2	Верхнеуслонский	2	-
3	Нижнекамский	1	1
	за пределами РТ	1	3
	ИТОГО:	7	5




Травматизм в строительной отрасли

(тяжелые случаи в разрезе МО)

№	МО	Количество за январь-июнь	
		2015г.	2016г.
1	г. Казань	2	2
2	г.Наб.Челны	1	3
3	Арский	1	-
4	Атнинский	-	1
5	Бугульминский	1	-
6	Нижнекамский	3	1
	за пределами РТ	6	5
	ИТОГО:	14	11




Виды несчастных случаев

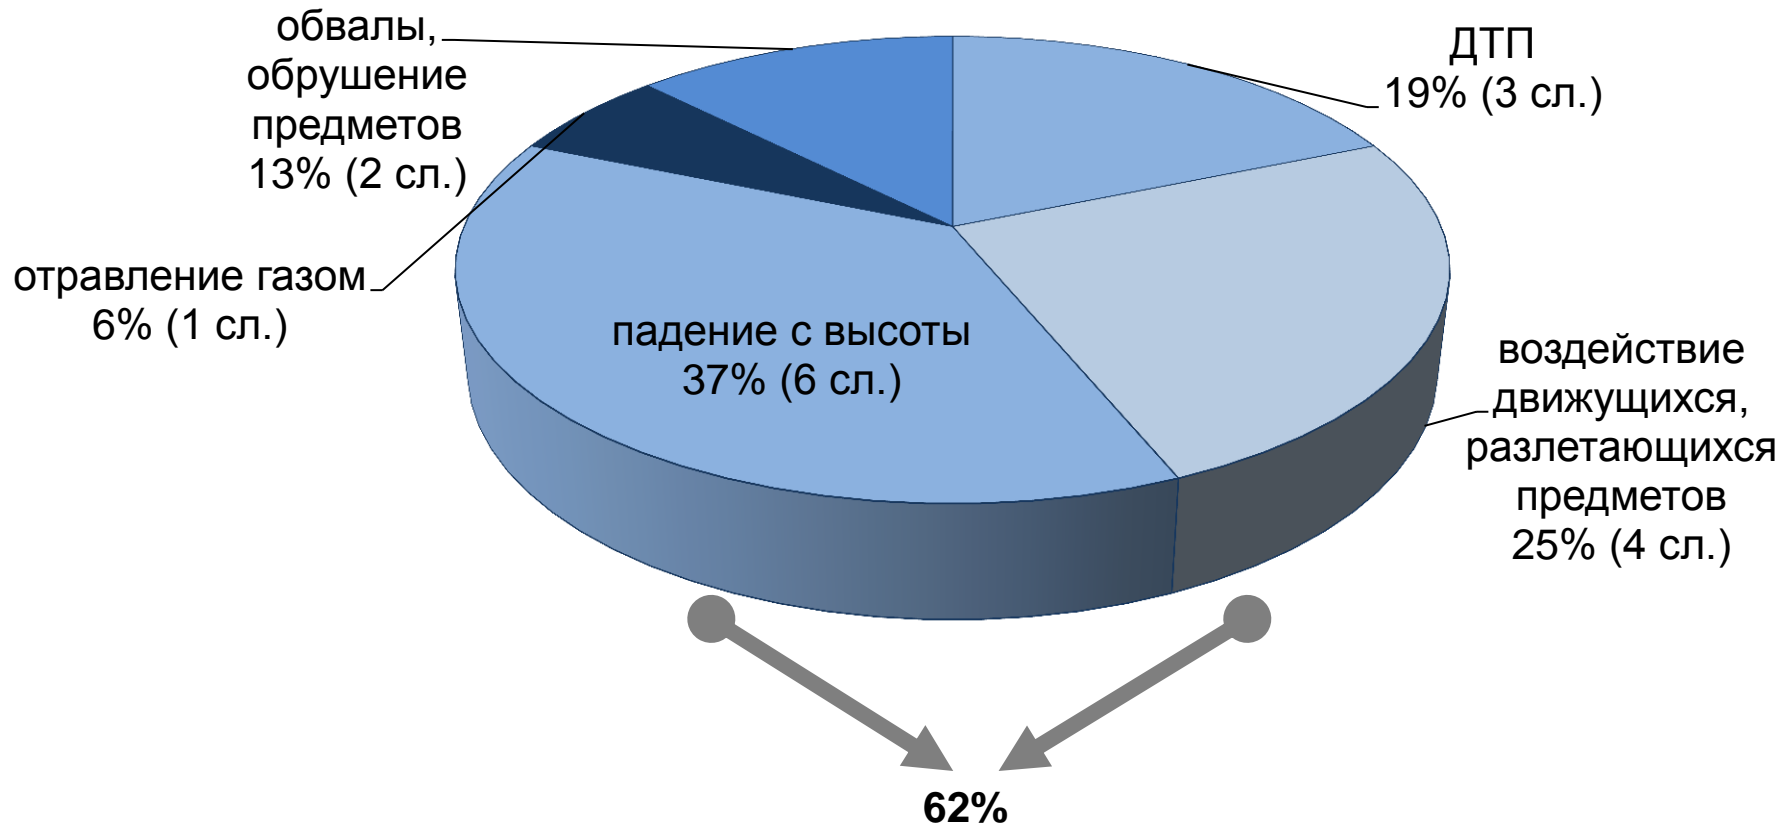

Падение с высоты и воздействие движущихся, разлетающихся предметов



Виды объектов, на которых произошли несчастные случаи

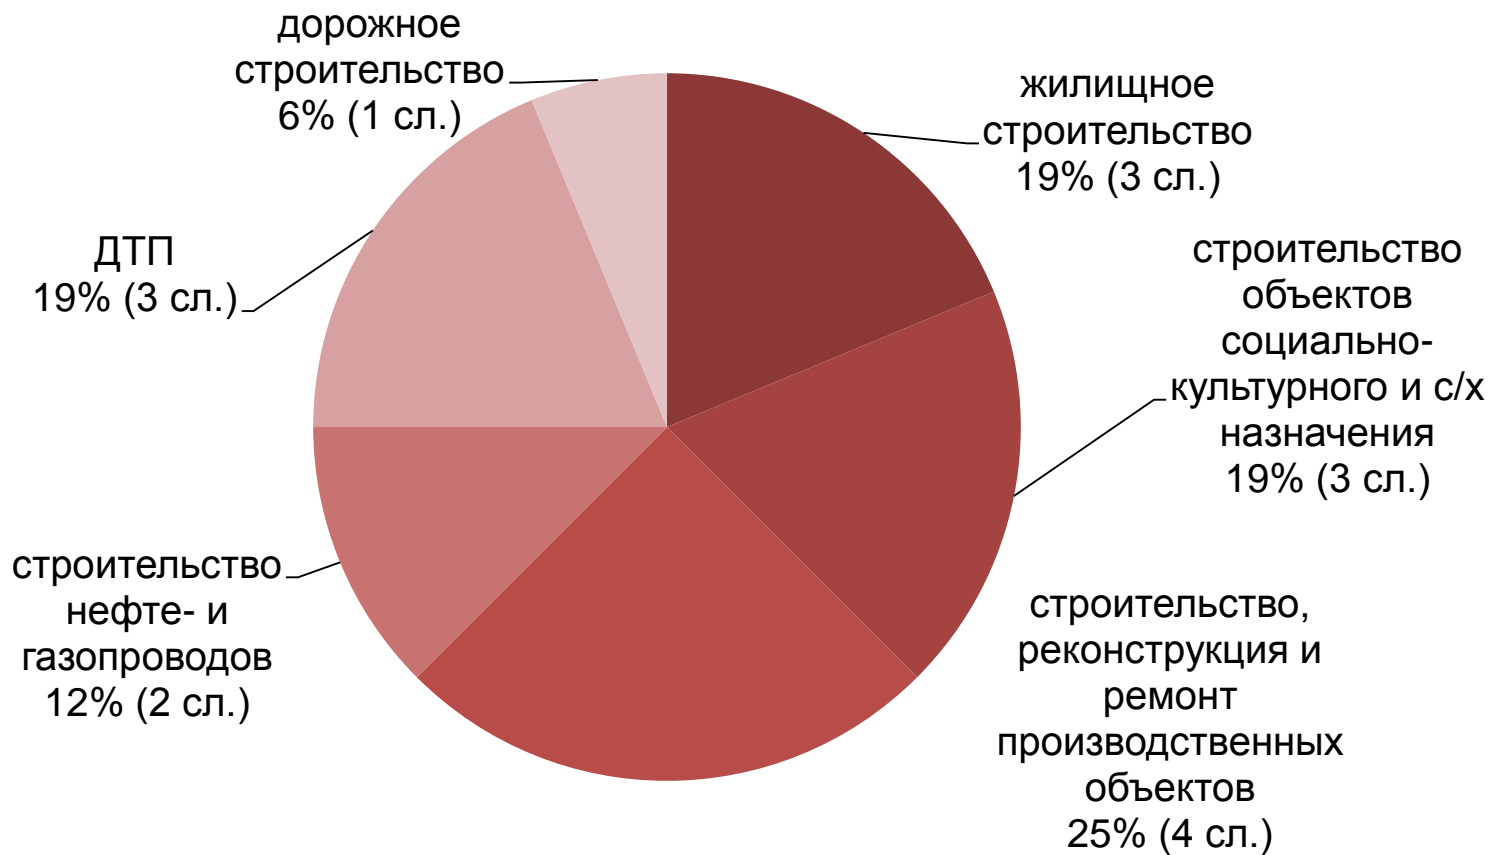



Реконструкция котельной и тепловых сетей НПС-3 Альметьевского РНУ, г.Альметьевск



Не установлены трапы
или маршевые лестницы
для прохода
на рабочие места

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : АО «Транснефть-Прикамье»
Подрядчик: ООО «ЮниФрэт»



Строительство гаража-стоянки в 21 мкрн. XI жилого района, г.Набережные Челны



Отсутствуют
сигнальные ограждения
на границе
работы крана

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «Современное строительство»
Подрядчик: ООО «ГИК»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	587	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	318	9 669,0
Взыскано всего	74	2 510,0
Не истек срок оплаты	178	5 804,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	555,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	426
- с выездом на объекты строительства	109
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	191
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	90
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	12

Разработка и утверждение генеральных планов поселений в Республике Татарстан



Наименование района	Количество поселений, не имеющих утвержденные генеральные планы	Стадия			
		Разработка не начата	В разработке	Согласование с КМ РТ	На утверждении
Апастовский	15	8	1	6	
Зеленодольский	9			2	7
Лениногорский	2		1	1	
Пестречинский	1				1



Разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселений в Республике Татарстан

Наименование района	Количество поселений, не имеющих утвержденные ПЗЗ	Стадия		
		Разработка не начата	Разработаны	На утверждении
Апастовский	1		1	
Мамадышский	4	4		
Пестречинский	6		5	1
Рыбно - Слободской	26	<i>Заключение договоров</i>		



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 июля 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 139 242	47,4	1 261 758
1	Чистопольский	30 000	4 386	14,6	25 614
2	Лениногорский	30 000	6 486	21,6	23 514
3	Нижнекамский	150 000	34 074	22,7	115 926
4	Черемшанский	8 000	2 003	25,0	5 997
5	Буинский	17 000	4 737	27,9	12 263
6	Арский	27 000	8 483	31,4	18 517
7	Бавлинский	17 000	5 400	31,8	11 600
8	Новошешминский	5 000	1 602	32,0	3 398
9	Елабужский	50 000	16 147	32,3	33 853
10	Бугульминский	40 000	13 077	32,7	26 923
11	Спасский	8 000	2 627	32,8	5 373
12	Нурлатский	26 000	8 716	33,5	17 284
13	г.Наб.Челны	300 000	101 806	33,9	198 194
14	г.Казань	800 000	291 952	36,5	508 048
15	Аксубаевский	11 000	4 069	37,0	6 931



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 июля 2016 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 139 242	47,4	1 261 758
16	Дрожжановский	7 000	2 660	38,0	4 340
17	Кайбицкий	4 800	2 034	42,4	2 766
18	Кукморский	27 000	12 211	45,2	14 789
19	Альметьевский	155 000	71 769	46,3	83 231
20	Муслюмовский	8 000	3 891	48,6	4 109
21	Сабинский	18 000	9 072	50,4	8 928
22	В-Услонский	40 000	20 323	50,8	19 677
23	Зеленодольский	170 000	87 094	51,2	82 906
24	Тетюшский	10 000	5 171	51,7	4 829
25	Балтасинский	14 000	7 256	51,8	6 744
26	Мензелинский	16 000	8 381	52,4	7 619
27	Агрызский	20 000	10 501	52,5	9 499
28	Ютазинский	10 000	5 306	53,1	4 694
29	Менделеевский	10 000	5 377	53,8	4 623
30	Р-Слободский	13 000	7 058	54,3	5 942



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 июля 2016 года

14

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 139 242	47,4	1 261 758
31	К-Устьинский	10 000	5 443	54,4	4 557
32	Алексеевский	14 000	7 871	56,2	6 129
33	Азнакаевский	25 000	14 307	57,2	10 693
34	Актанышский	17 000	9 767	57,5	7 233
35	Алькеевский	6 500	3 896	59,9	2 604
36	Атнинский	4 000	2 490	62,3	1 510
37	Сармановский	10 000	6 410	64,1	3 590
38	Мамадышский	15 000	9 747	65,0	5 253
39	Заинский	20 000	13 003	65,0	6 997
40	Тюлячинский	7 500	5 253	70,0	2 247
41	Высокогорский	64 000	56 700	88,6	7 300
42	Пестречинский	85 000	76 802	90,4	8 198
43	Тукаевский	70 000	68 056	97,2	1 944
44	Апастовский	12 000	12 008	100,1	-
45	Лаишевский	80 000	83 820	104,8	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск 120-кв. ж.д. № 20 в мкр. 47
подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

16

на 08.07.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	62	131	92	29	10
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	110,1	395,3	247,5	131,7	16,1
Количество квартир	9 554	1 967	7 587	4 661	2 527	399



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасдом- строй»	100	-
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	100	-
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100	-
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100	июль 2016



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (введен в эксплуатацию)



**Актанышский район, д.Барсуково, ул.Куйбышева, д.27 «А»
Подрядчик – ООО «РемстройДом»**



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

19

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		42	182	22	17	3
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Актанышский	4	4	3	1	-
3	Арский	1	5	1	-	-
4	Бавлинский	1	15	-	-	1
5	Балтасинский	4	4	2	2	-
6	Бугульминский	1	20	-	1	-
7	Высокогорский	3	8	1	1	1
8	Зеленодольский	2	14	2	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

20

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		42	182	22	17	3
9	Сабинский	2	4	1	1	-
10	Кукморский	1	1	1	-	-
11	Мензелинский	1	1	-	1	-
12	Муслюмовский	1	11	-	-	1
13	Лайшевский	2	6	2	-	-
14	Пестречинский	1	3	1	-	-
15	Черемшанский	3	3	-	3	-
16	г. Казань	11	56	5	6	-
17	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-

Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Регистрация права ГЖФ			план	Регистрация права ГЖФ
ИТОГО по РТ						311	51
1	Агрызский	7	4	12	Бугульминский	18	
2	Азнакаевский	3		13	Буинский	3	
3	Аксубаевский	7		14	Верхнеуслонский	4	
4	Актанышский	1		15	Высокогорский	7	
5	Алексеевский	3		16	Дрожжановский	3	
6	Алькеевский	9		17	Елабужский	3	
7	Альметьевский	11		18	Заинский	9	
8	Арский	2		19	Зеленодольский	20	2
9	Атнинский	3		20	Кайбицкий	7	
10	Бавлинский	13		21	Кукморский	6	
11	Балтасинский	4		22	Камско-Устьинский	5	



Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Регистрация права ГЖФ			план	Регистрация права ГЖФ
ИТОГО по РТ						311	51
23	Лаишевский	1		33	Рыбно-Слободский	7	
24	Лениногорский	14		34	Сабинский	2	
25	Мамадышский	10	4	35	Сармановский	1	
26	Менделеевский	5		36	Спасский	3	
27	Мензелинский	5		37	Тетюшский	6	
28	Муслюмовский	1		38	Тукаевский	2	
29	Нижнекамский	38	4	39	Тюлячинский	1	
30	Новошешминский	1		40	Чистопольский	17	
31	Нурлатский	19		41	Ютазинский	2	
32	Пестречинский	5		42	г. Казань	23	37



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	0	0	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	0	0
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	1	0	0	0
5	Арский	1	1	0	1	0	0	0
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	1	+1	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	1	+1	0	0
11	г.Казань	2	2	0	1	0	1	0
ИТОГО		41	41	0	19	4	1	0



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации						
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено		
			08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1	0	1	0	0	0	0
16	Менделеевский	2	2	0	2	0	0	0	0
17	Мензелинский	2	2	0	1	0	0	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	1	+1	0	0	0
19	Пестречинский	3	3	0	2	+1	0	0	0
20	Рыбно-Слободский	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0	0
22	Чистопольский	3	3	0	3	0	0	0	0
ИТОГО		41	41	0	19	4	1	1	1



Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Перечислено по заявке МО	
			08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Арский	1	1	0	1	0	1	0
3	Бугульминский	1	1	0	1	0	1	0
4	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	0
5	Нижнекамский	10	10	0	10	0	10	0
6	Сабинский	2	2	0	2	0	2	0
7	Чистопольский	1	1	0	1	0	1	0
8	Ютазинский	1	1	0	1	0	1	0
9	г.Н.Челны	20	20	0	20	0	20	0
10	г.Казань	42	42	+3	40	+4	33	+20
ИТОГО		81	81	3	79	4	72	20



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Н.Челны	1	1	0	0	0	0	0
3	Нижнекамский	2	2	0	2	+2	2	+2
4	Сармановский	1	1	0	1	+1	1	+1
5	Тюлячинский	1	1	0	0	0	0	0
6	Чистопольский	1	1	0	0	0	0	0
7	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		9	9	0	5	+3	5	+3



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	0	0	0	0
2	Елабужский	1	1	0	1	+1	1	+1
3	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
4	Сармановский	1	1	0	1	+1	1	+1
5	г.Казань	4	4	0	2	+2	2	+2
ИТОГО		8	8	0	4	+4	4	+4



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка	08.07.16	Дин-ка
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	3	+1
2		Жилое помещение	3	2	0	0	0	0	0
ИТОГО			6	2	0	0	0	3	+1



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

29



г.Казань, 450-кв. жилой дом № 100 ул.Р.Гареева
Застройщик – ООО СК «Грань»



Многоквартирное инвестиционное жильё (введен в эксплуатацию)

30



г.Казань, 416-кв. жилой дом (1 этап) ЖК «Победа»
Застройщик – ООО «ЖК «Победа»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		63	37	26
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Арский	2	1	1
4	Бугульминский	3	-	3
5	Елабужский	3	1	2
6	Зеленодольский	2	2	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	2	-	2
9	Муслюмовский	1	-	1
10	Нижнекамский	3	2	1
11	Пестречинский	1	1	-
12	г.Набережные Челны	22	17	5
13	г.Казань	19	9	10



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	4 965	4 035

Служебное жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



Альметьевский район, с. Дальний Ямаши
Подрядчик – ООО «Основа С»



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

Адрес объекта		СМР, %	Дин-ка за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
Итого по РТ		66,0	5,1	37 000,0	17 615,0	9 386,4
г.Казань	Приволжский район – ОП № 9 «Сафиуллина», п.Вишневка	8,0	3,0	3 700,0	1 104,5	0,0
	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	15,0	10,0	3 700,0	1 104,5	0,0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		45,5	3,0	3 700,0	2 399,4	1 849,9
Зеленодольский, с.Свияжск		55,3	11,3	3 700,0	1 104,5	0,0
г.Казань, Советский район – ОП № 12 «Гвардейский», п.Константиновка		77,8	2,8	3 700,0	1 104,5	0,0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		84,2	3,3	3 700,0	2 189,8	1 631,0
Заинский, с.Тюгеевка		87,8	16,3	3 700,0	1 104,5	0,0
Дрожжановский, с.Шланга		92,5	7,0	3 700,0	2 299,8	1 707,6
Высокогорский, с.Куркачи		94,0	2,5	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	-	3 700,0	2 781,0	2 395,0

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



г.Казань, пос.Петровский, ул.Центральная, ОП №10
Подрядчик – ООО «Ашил»



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

36

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		45,4	4,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		33,0	3,0
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	40,0	0,0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	40,0	0,0
	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	42,0	0,0
Заинский, г. Заинск-2		47,0	12,0
Высокогорский, с.Чернышевка		65,0	5,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		87,0	7,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-



Долевое строительство

37

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	95 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	97 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	87 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	78 %
ИТОГО по РТ			76 599	



Сельские клубы



Буинский, д.Новые Мертли
Подрядчик: ООО "Стройгаранты"



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 08.07.16	дина- мика
1	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	44	4
2	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	45	8
3	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	50	3
4	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	59	10
5	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	59	11
6	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	61	12
7	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	65	18
8	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	71	2
9	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	71	11



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 08.07.16	дина- мика
10	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	72	8
11	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	73	8
12	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	75	25
13	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	78	23
14	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	79	2
15	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	80	25
16	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	80	12
17	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	83	7
18	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	84	19



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 08.07.16	дина- мика
19	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагросстрой»	5 350,17	89	4
20	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	90	15
21	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	92	19
22	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	93	6
23	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	93	8
24	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	94	2
25	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	96	11
26	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	96	12
27	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	96	33



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 08.07.16	дина- мика
28	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	97	12
29	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	97	23
30	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	98	6
31	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	99	4
32	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99	8
33	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	99	9
34	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	99	1
35	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	100	7
36	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	100	4



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 08.07.16	дина- мика
37	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	100	4
38	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	100	4
39	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	100	3
40	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	100	0
41	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	100	0
42	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	100	0
43	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	100	0
44	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	100	0
45	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	100	0



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с. Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, с. Чалпы				
3	Аксубаевский, с. Старые Савруши				
4	Актанышский, с. Такталачук				
5	Актанышский, с. Поисеево				
6	Алексеевский, с. Лебедино				
7	Алькеевский, с. Старое Алпарово				
8	Альметьевский, с. Бишмунча				
9	Апастовский, с. Шигаево				
10	Арский, с. Нижние-Аты				
11	Арский, с. Шушмабаш				
12	Атнинский, с. Нижняя Береске				
13	Бавлинский, с. Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, с. Васькино Туйралы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский , с.Янгулово				
16	Буинский, с.Каменный Брод				
17	Высокогорский, с.Айбаш				
18	Дрожжановский, с.Б.Матаки				
19	Дрожжановский, с.Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский , г.Заинск				
22	Зеленодольский, с.Мизинова				
23	Кайбицкий, с.Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, с.Теньки				
25	Кукморский, с.Березняк				
26	Кукморский, с.Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, с.Малые Елги				
28	Лениногорский, с.Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

46

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, с.Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, с.Атрякле				
31	Муслюмовский, с.Елгабаш				
32	Нижнекамский, Камские Поляны				
33	Новошешминский, с.«Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, с.Шали				
35	Сармановский, с.Лешев Тамак				
36	Тетюшский, сЖуково				
37	Тукаевский, с.Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, с.Большая Меша				
39	Черемшанский, с.Аккиреево				
40	Ютазинский, с.Старый Каразирек				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	21,3	65	35
2	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	0	74	2
3	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	70,97	90	5
4	г.Казань	5 000	35,61	91	4
5	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	100	-
7	Арский, г.Арск	500	100	100	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	100	-
9	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	100	-
10	Буинский, г.Буинск	1 750	100	100	-
11	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
12	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	100	-
13	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	100	-
14	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100	-
15	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	70,28	100	-
16	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100	-
17	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	100	-
18	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	100	-
19	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	87,36	100	-
20	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100	-
21	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100	-
22	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	64,36	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

49

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Азнакаевский, г.Азнакаево	200	0	55	15
2	Алексеевский, пгт.Алексеевское	500	0	60	5
3	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	60	10
4	Спасский, г.Болгар	1 448	0	80	55
5	Актанышский, с.Актаныш	300	0	100	40
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	388	0	100	-
7	Апастовский, пгт.Апастово	600	100	100	-
8	Балтасинский, с.Балтаси	202	100	100	-
9	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100	-
10	Буинский, г.Буинск	1 500	99,5	100	-
11	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	600	100	100	-
12	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	1 000	100	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

50

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Заинский, г.Заинск	200	100	100	-
14	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	300	100	100	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	0	100	-
16	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	100	-
17	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	100	-
18	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	100	-
19	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	83,74	100	-
20	Сармановский, с.Сарманово	2 000	89,98	100	-
21	Тетюшский, г.Тетюши	500	99,9	100	-
22	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	100	-
23	Черемшанский, с.Черемшан	1 500	100	100	-
24	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	99,79	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верх.-Услонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

53

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Кам.-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Мензелинский, с.Калтаковский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
39	Мензелинский, с. Кзыл-Тюбякский				
40	Менделеевский, с.Абалевский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюросовхозский				
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыб.-Слободский, с.Полянский				
48	Рыб.-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуркеевский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуртинский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомическое отделение

56

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский, с.Ново-Кырлайский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский, с.Киятский				
7	Балтасинский, с.Куюкский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомическое отделение

57

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

58

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
1	Азнакаевский	100	2	100	-	-	-	-
2	Аксубаевский	99	4	97	-	-	-	100
3	Актанышский	90	23	86	-	-	93	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	97	1	94	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

59

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100
15	Высокогорский	90	15	90	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Кам.- Устьинский	92	4	92	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	93	46	93	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

60

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
27	Нурлатский	68	34	68	-	-	-	-
28	Пестречинский	53	3	5	100	-	-	-
29	Рыб.Слободский	97	7	93	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	100	1	100	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	99	5	99	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Наб. Челны	94	7	-	-	-	-	94
39	г.Казань	42	4	-	-	-	-	42



Универсальные спортивные площадки

61



Заинский, ул. Ленина
Подрядчик: ЗАО «СУ-32»



Универсальные спортивные площадки

62



Нижнекамский, пгт.Камские Поляны, Школа №25

Подрядчик: ООО «Технология»



Универсальные спортивные площадки

63



Кукморский район, с.Ядыгерь
Подрядчик: ООО «Строй-Гарант »



Универсальные спортивные площадки

64

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динамика за неделю
1	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	30	5
2	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	0	74	6
3	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	11	83	12
4	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	16	88	12
5	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	13	89	22
6	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	91	15
7	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Стр-о и консалтинг"	27	19	96	2



Универсальные спортивные площадки

65

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динамика за неделю
8	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	10	98	4
9	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	87	100	0
10	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100	0
11	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	78	100	0
12	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100	0
13	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	76	100	0
14	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	65	100	0



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динамика за неделю
15	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО"СМ-СтройИнвест"	2	37	100	0
16	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100	0
17	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	95	100	0
18	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100	0
19	Буинский	ООО "Стр-е технологии"	2	0	100	0
20	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	36	100	0
21	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	71	100	0
22	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	82	100	0



Универсальные спортивные площадки

67

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динамика за неделю
23	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	100	10
24	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	99	100	0
25	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	53	100	0
26	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	6	100	0
27	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	13	100	0
28	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	29	100	7
29	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100	0
30	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100	0



Универсальные спортивные площадки

68

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динами- ка за неделю
31	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО"Менз.ПМК"Мелиорации	3	0	100	1
32	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	60	100	0
33	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	0	100	0
34	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	46	100	0
35	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	33	100	0
36	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	0	100	0
37	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	18	100	0



Универсальные спортивные площадки

69

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %	
					на 08.07.16.	Динамика за неделю
38	Сармановский	ООО "Илвар"	3	0	100	0
39	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	37	100	5
40	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	0	100	50
41	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100	0
42	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	86	100	0
43	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	0	100	0
44	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	43	100	0
45	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	86	100	0

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 01.07.16 по 07.07.16		Остаток
936,83	600,75	0,00		336,08
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (01.07.2016г. – 07.07.2016г.)		10,38	10,41	100,29
СМР		10,38	10,41	100,29
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 07.07.2016г.)		10,38	10,41	100,29
СМР		10,38	10,41	100,29
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.07.2016г.)		659,19	661,78	100,39

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (01.07.2016г. – 07.07.2016г.)	10,06	10,11	100,50
СМР	10,06	10,11	100,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 07.07.2016г.)	10,06	10,11	100,50
СМР	10,06	10,11	100,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.07.2016г.)	138,52	141,73	102,46

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (01.07.2016г. – 07.07.2016г.)	7,16	7,22	100,84
СМР	2,07	2,10	101,45
Оборудование	5,09	5,12	100,59
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 07.07.2016г.)	7,16	7,22	100,84
СМР	2,07	2,10	101,45
Оборудование	5,09	5,12	100,59
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.07.2016г.)	220,25	223,99	101,70
СМР	186,87	190,76	102,08
Оборудование	33,38	33,39	100,03

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ		
Объем финансирования, млн. руб.		175,72		
		ПИР 4,09	СМР 124,06	Обор-е 47,56
Начало строительства		2015		
Срок завершения строительства		Август 2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (01.07.2016г. – 07.07.2016г.)	8,58	8,60	100,23	
СМР	1,51	1,52	100,66	
Оборудование	7,07	7,08	100,14	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 07.07.2016г.)	8,58	8,60	100,23	
СМР	1,51	1,52	100,66	
Оборудование	7,07	7,08	100,14	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.07.2016г.)	149,80	151,73	101,28	
СМР	109,96	111,84	101,71	
Оборудование	39,84	39,89	100,13	

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51
		Обор-е 65,93	
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (01.07.2016г. – 07.07.2016г.)	6,50	6,58	101,23
СМР	2,33	2,37	101,72
Оборудование	4,17	4,21	100,96
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 07.07.2016г.)	6,50	6,58	101,23
СМР	2,33	2,37	101,72
Оборудование	4,17	4,21	100,96
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.07.2016г.)	143,50	145,61	101,47
СМР	101,82	103,83	101,97
Оборудование	41,68	41,78	100,24
