



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2014 года	37	15	22
январь - август 2015 года	33	10	23
январь - август 2016 года	20	5	15



Благоустройство каскада прудов на р.Камышла, г.Лениногорск



Работники не обеспечены
спецодеждой и спецобувью

Прокуратурой г.Лениногорска вынесено
постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении
в отношении ООО «Региональная
Строительная Компания»

**Заказчик : АО «Транснефть-Прикамье». Подрядчик: ООО «ЮниФрэйт»
Субподрядчик: ООО «Региональная Строительная Компания**



Строительство многоуровневого паркинга по ул. Ак.Лаврентьева, г.Казань



На границах опасных зон
не установлены
защитные ограждения

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «Строительная фирма «Фарус».
Генподрядчик: ООО «СТА-строй»



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 2 кв. 2016 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	3 018,2	3 018,2	100%
2	г.Наб.Челны	9 440,0	7 008,4	74%
3	Агрызский	106,2	126,2	119%
4	Азнакаевский	3 273,0	3 141,0	96%
5	Аксубаевский	21,9	21,9	100%
6	Актанышский	81,0	81,0	100%
7	Алексеевский	7 760,8	6 858,0	88%
8	Алькеевский	75,0	75,0	100%
9	Альметьевский	10 524,5	15 885,1	151%
10	Апастовский	22,5	22,5	100%
11	Арский	833,6	1 195,5	143%
12	Атнинский	81,0	81,7	101%
13	Бавлинский	52,0	52,0	100%
14	Балтасинский	39,5	39,5	100%
15	Бугульминский	2 758,8	2 779,4	101%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 2 кв. 2016 года (по данным МО)

5

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	150,0	155,0	103%
17	Верхнеуслонский	222,5	79,6	36%
18	Высокогорский	227,1	229,9	101%
19	Дрожжановский	-	-	
20	Елабужский	2 026,4	1 730,4	85%
21	Заинский	140,0	140,0	100%
22	Зеленодольский	-	-	
23	Кайбицкий	8,0	8,0	100%
24	Камско-Устьинский	10,0	10,0	100%
25	Кукморский	119,0	119,0	100%
26	Лаишевский	91,7	91,7	100%
27	Лениногорский	6 367,8	6 383,8	100%
28	Мамадышский	55,0	56,5	103%
29	Менделеевский	150,0	151,0	101%
30	Мензелинский	165,0	165,0	100%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 2 кв. 2016 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	88,0	88,0	100%
32	Нижнекамский	6 671,1	6 671,1	100%
33	Новошешменский	77,0	86,1	112%
34	Нурлатский	156,3	138,8	89%
35	Пестречинский	111,5	116,8	105%
36	Рыбно-Слободский	45,0	45,1	100%
37	Сабинский	1 309,3	1 495,4	114%
38	Сармановский	17,5	17,6	101%
39	Спасский	90,8	92,2	102%
40	Тетюшский	140,0	137,0	99%
41	Тукаевский	36,5	36,5	100%
42	Тюлячинский	20,0	20,0	100%
43	Черемшанский	150,0	150,0	100%
44	Чистопольский	355,4	305,5	86%
45	Ютазинский	2 461,7	2 755,8	112%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	679	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	360	11 417,0
Взыскано всего	102	3 928,0
Не истек срок оплаты	187	6 134,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	555,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	493
- с выездом на объекты строительства	128
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	254
- выдано предписаний	58
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	137
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	14



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 августа 2016 года

9

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 271 022	52,9	3,7	1 129 978
1	Чистопольский	30 000	6 070	20,2	4,6	23 930
2	Черемшанский	8 000	2 196	27,5	0	5 804
3	Лениногорский	30 000	8 499	28,3	3,7	21 501
4	Нижнекамский	150 000	44 670	29,8	4,1	105 330
5	Новошешминский	5 000	1 602	32,0	0	3 398
6	г.Наб.Челны	300 000	104 183	34,7	0	195 817
7	Буинский	17 000	6 336	37,3	9,4	10 664
8	Аксубаевский	11 000	4 172	37,9	0,9	6 828
9	Бавлинский	17 000	6 479	38,1	6,3	10 521
10	г.Казань	800 000	324 256	40,5	4,0	475 744
11	Бугульминский	40 000	16 381	41,0	4,9	23 619
12	Спасский	8 000	3 341	41,8	6,1	4 659
13	Нурлатский	26 000	11 652	44,8	1,9	14 348
14	Арский	27 000	12 683	47,0	10,8	14 317
15	Елабужский	50 000	25 179	50,4	10,0	24 821



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 августа 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
16	Кукморский	27 000	13 742	50,9	3,6	13 258
17	Кайбицкий	4 800	2 475	51,6	7,6	2 325
18	Альметьевский	155 000	81 183	52,4	0	73 817
	Всего по РТ	2 401 000	1 271 022	52,9	3,7	1 129 978
19	Дрожжановский	7 000	3 714	53,1	2,8	3 286
20	Зеленодольский	170 000	93 489	55,0	3,8	76 511
21	Тетюшский	10 000	5 613	56,1	4,4	4 387
22	Агрызский	20 000	11 370	56,9	4,3	8 630
23	Менделеевский	10 000	5 787	57,9	0	4 213
24	В-Услонский	40 000	23 478	58,7	7,5	16 522
25	Сабинский	18 000	10 572	58,7	8,3	7 428
26	К-Устьинский	10 000	5 985	59,9	1,8	4 015
27	Ютазинский	10 000	6 055	60,6	7,5	3 945
28	Мензелинский	16 000	9 701	60,6	4,1	6 299
29	Актанышский	17 000	10 477	61,6	3,0	6 523
30	Азнакаевский	25 000	15 761	63,0	4,6	9 239




Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 августа 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 271 022	52,9	3,7	1 129 978
31	Р-Слободский	13 000	8 278	63,7	1,0	4 722
32	Алексеевский	14 000	9 185	65,6	4,8	4 815
33	Мамадышский	15 000	10 208	68,1	1,4	4 792
34	Балтасинский	14 000	9 564	68,3	11,4	4 436
35	Муслюмовский	8 000	5 509	68,9	16,2	2 491
36	Алькеевский	6 500	4 498	69,2	9,3	2 002
37	Атнинский	4 000	2 987	74,7	5,1	1 013
38	Сармановский	10 000	7 474	74,7	4,8	2 526
39	Заинский	20 000	15 018	75,1	4,6	4 982
40	Тюлячинский	7 500	5 842	77,9	4,9	1 658
41	Высокогорский	64 000	56 700	88,6	0	7 300
42	Апастовский	12 000	12 008	100,1	0	-
43	Пестречинский	85 000	85 618	100,7	4,1	-
44	Лаишевский	80 000	84 842	106,1	0,8	-
45	Тукаевский	70 000	76 190	108,8	11,6	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

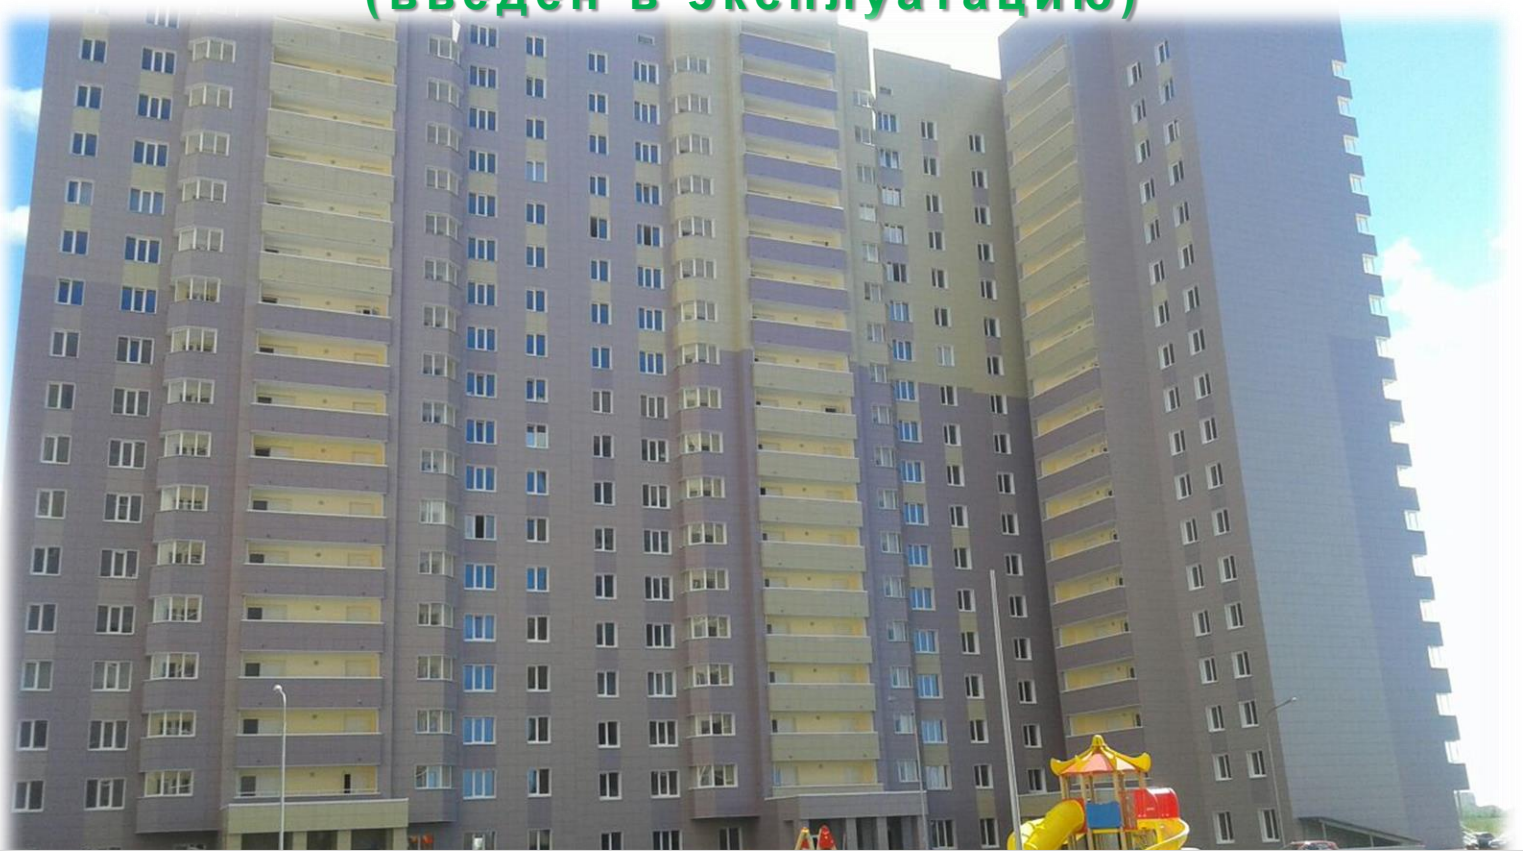

**г.Казань 255-кв. ж.д. № 13-3 в жилом районе «Салават Купере»
подрядчик – ООО «Ак Таш»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 05.08.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	68	125	94	24	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	132,5	372,9	274,1	94,1	4,7
Количество квартир	9 554	2 368	7 168	5 242	1 805	139



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасдом- строй»	100
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	100
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		25	138	15	9	1
1	Арский	1	5	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	1	-
3	Бугульминский	1	20	-	1	-
4	Высокогорский	2	8	1	1	-
5	Зеленодольский	2	14	2	-	-
6	Кукморский	1	1	1	-	-
7	Лаишевский	2	6	2	-	-
8	Пестречинский	1	3	1	-	-
9	Сабинский	1	3	-	-	1
10	г. Казань	11	51	4	6	-
11	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		15	39	13	1	1
1	Актанышский	4	4	4	-	-
2	Бавлинский	1	15	-	1	-
3	Балтасинский	4	4	4	-	-
4	Мензелинский	1	1	1	-	-
5	Муслюмовский	1	11	-	-	1
6	Сабинский	1	1	1	-	-
7	Черемшанский	3	3	3	-	-

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		Выставлено для выбора	Регистрация права РТ			Выставлено для выбора	Регистрация права РТ
ИТОГО по РТ						311	51
1	Агрызский	7	4	10	Балтасинский	1	
2	Азнакаевский	4		11	Бугульминский	20	
3	Аксубаевский	7		12	Буинский	3	
4	Актанышский	1		13	Верхнеуслонский	5	
5	Алексеевский	2		14	Елабужский	19	
6	Алькеевский	8		15	Заинский	4	
7	Альметьевский	6		16	Зеленодольский	25	2
8	Арский	3		17	Кайбицкий	7	
9	Бавлинский	8		18	Камско-Устьинский	5	

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		Выставлено для выбора	Регистрация права РТ			Выставлено для выбора	Регистрация права РТ
ИТОГО по РТ						311	51
19	Кукморский	8		28	Пестречинский	5	
20	Лаишевский	5		29	Сабинский	2	
21	Лениногорский	11		30	Сармановский	1	
22	Мамадышский	6	4	31	Тетюшский	2	
23	Менделеевский	2		32	Тюлячинский	1	
24	Мензелинский	4		33	Черемшанский	3	
25	Нижнекамский	45	4	34	Чистопольский	17	
26	Новошешминский	1		35	Ютазинский	2	
27	Нурлатский	11		36	г. Казань	50	37



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	1	0	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	3	+2
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	2	0	1	+1
5	Арский	1	1	0	1	0	0	0
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	1	0	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	1	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	2	+1	1	0
ИТОГО		42	42	0	22	2	8	5



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	+1
16	Менделеевский	2	2	0	2	0	1	+1
17	Мензелинский	2	2	0	2	+1	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	1	0	0	0
19	Нижнекамский	1	1	0	0	0	0	0
20	Пестречинский	3	3	0	2	0	0	0
21	Рыбно-Слободский	1	1	0	0	0	0	0
22	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
23	Чистопольский	3	3	0	3	0	1	+1
ИТОГО		42	42	0	22	2	8	5



Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Перечислено по заявке МО	
			05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Арский	1	1	0	1	0	1	0
3	Бугульминский	1	1	0	1	0	1	0
4	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	0
5	Нижнекамский	10	10	0	10	0	10	0
6	Сабинский	2	2	0	2	0	2	0
7	Чистопольский	1	1	0	1	0	1	0
8	Ютазинский	1	1	0	1	0	1	0
9	г.Н.Челны	20	20	0	20	0	20	0
10	г.Казань	42	42	0	42	0	42	0
ИТОГО		81	81	0	81	0	81	0



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Зеленодольский	1	0	0	0	0	0	0
3	Менделеевский	1	0	0	0	0	0	0
4	Нижнекамский	2	2	0	2	0	2	0
5	Сармановский	2	1	0	1	0	1	0
6	Тюлячинский	1	1	0	1	+1	1	+1
7	Чистопольский	2	1	0	1	+1	1	+1
8	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
9	г.Н.Челны	2	1	0	0	0	0	0
10	г.Казань	1	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		15	9	0	7	2	7	2



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	1	+1	1	+1
2	Елабужский	1	1	0	1	0	1	0
3	Зеленодольский	1	1	0	1	0	1	0
4	Сармановский	1	1	0	1	0	1	0
5	г.Казань	4	4	0	2	0	2	0
ИТОГО		8	8	0	6	1	6	1



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка	05.08.16	Дин-ка
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	3	0
2		Жилое помещение	3	2	0	0	0	0	0
ИТОГО			6	2	0	0	0	3	0



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

26



г.Казань, 80-кв. жилой дом мкр. М-16А ул.Дубравная
Застройщик – ООО «Тандем Д»



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

27



г.Арск, 18-кв. жилой дом ул.Интернациональная д.19
Застройщик – ООО «Комбинат стройматериалов»



Многоквартирное инвестиционное жилье

28

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		59	37	22
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Арский	1	1	-
4	Бугульминский	3	-	3
5	Елабужский	3	1	2
6	Зеленодольский	2	2	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	2	-	2
9	Муслюмовский	1	-	1
10	Нижнекамский	3	2	1
11	Пестречинский	1	1	-
12	г.Набережные Челны	21	16	5
13	г.Казань	17	10	7



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	5 650	3 350

Служебное жильё для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



Заинский район, с. Тюгеевка
Подрядчик – ООО «Старк»



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

31

Адрес объекта		СМР, %	Дин-ка за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
Итого по РТ		79,4	6,4	37 000,0	21 180,1	14 190,3
г.Казань	Приволжский район – ОП №9 «Сафиуллина», п.Вишневка	20,0	5,0	3 700,0	1 104,5	0,0
	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	45,0	8,5	3 700,0	1 104,5	0,0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		70,0	24,5	3 700,0	2 399,4	1 849,9
Зеленодольский, с.Свияжск		78,5	6,0	3 700,0	1 104,5	0,0
г.Казань, Советский район – ОП №12 «Гвардейский», п.Константиновка		93,2	6,4	3 700,0	1 840,8	0,0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		90,0	4,0	3 700,0	2 246,1	1 631,0
Высокогорский, с.Куркачи		98,8	0,0	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Дрожжановский, с.Шланга		99,0	4,0	3 700,0	2 985,7	2 687,5
Заинский, с.Тюгеевка		100	3,0	3 700,0	3 071,8	2 810,5
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	-	3 700,0	2 956,6	3 408,6

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



г.Казань, пос.Петровский, ул.Центральная, ОП №10
Подрядчик – ООО «Ашил»



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		75,0	12,0
г.Казань, Авиастроительный район, п.Кадышево		65,0	15,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		70,0	10,0
Высокогорский, с.Чернышевка		70,0	2,0
г.Казань	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Старое Победилово	75,0	15,0
	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Петровский	85,0	15,0
Заинский, г. Заинск-2		85,0	15,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		100	-
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-



Долевое строительство

34

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	95 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			76 599	



Сельские клубы



Мензелинский, с. Тулубаево
Подрядчик: ООО «Лига»



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
1	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	0,00	56	2
2	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	66,40	58	2
3	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	59,82	75	5
4	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	94,69	77	14
5	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	71,66	80	5
6	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	38,90	81	31
7	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	75,33	81	0
8	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	30,65	85	10



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
9	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	61,40	86	11
10	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	55,65	86	11
11	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	19,44	87	7
12	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	60,59	91	16
13	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	70,78	92	5
14	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	89,48	93	3
15	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	89,97	94	15
16	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагросстрой»	5 350,17	81,11	96	2



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
17	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	68,22	97	7
18	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	0,00	97	7
19	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	76,46	97	0
20	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	85,45	98	2
21	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	99,50	98	1
22	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	99,43	98	1
23	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	84,03	98	3
24	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	99,50	99	2



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
25	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	95,75	99	0
26	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	94,43	100	-
27	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	67,58	100	-
28	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	99,50	100	-
29	Алькеевский, д.Бибаево- Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	99,50	100	-
30	Альметьевский, с.Ильтень- Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	86,75	100	-
31	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	92,72	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
32	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	99,50	100	-
33	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	99,24	100	-
34	Высокогорский, д.Ташлы- Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	72,28	100	-
35	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	99,50	100	-
36	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	94,70	100	-
37	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	99,24	100	-
38	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	93,61	100	-
39	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99,50	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 05.08.16	дина- мика
40	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	99,50	100	-
41	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	80,93	100	-
42	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	87,43	100	-
43	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	92,61	100	-
44	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	98,73	100	-
45	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	95,42	100	-



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с. Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, с. Чалпы				
3	Аксубаевский, с. Старые Савруши				
4	Актанышский, с. Такталачук				
5	Актанышский, с. Поисеево				
6	Алексеевский, с. Лебедино				
7	Алькеевский, с. Старое Алпарово				
8	Альметьевский, с. Бишмунча				
9	Апастовский, с. Шигаево				
10	Арский, с. Нижние-Аты				
11	Арский, с. Шушмабаш				
12	Атнинский, с. Нижняя Береске				
13	Бавлинский, с. Покровский Урустамак				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Балтасинский , с.Янгулово				
15	Буинский, с.Каменный Брод				
16	Высокогорский, с.Айбаш				
17	Дрожжановский, с.Б.Матаки				
18	Дрожжановский, с.Старые Какерли				
19	Елабужский, г.Елабуга				
20	Заинский , г.Заинск				
21	Зеленодольский, с.Мизинова				
22	Кайбицкий, с.Большое Подберезье				
23	Камско-Устьинский, с.Теньки				
24	Кукморский, с.Березняк				
25	Кукморский, с.Нижний Искубаш				
26	Лаишевский, с.Малые Елги				
27	Лениногорский, с.Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
28	Мамадышский, с.Куюк Ерыкса				
29	Мензелинский, с.Атрякле				
30	Нижнекамский, Камские Поляны				
31	Новошешминский, с.«Красный Октябрь»				
32	Пестречинский, с.Шали				
33	Сармановский, с.Лешев Тамак				
34	Тетюшский, сЖуково				
35	Тукаевский, с.Нижний Суык-Су				
36	Тюлячинский, с.Большая Меша				
37	Черемшанский, с.Аккиреево				
38	Ютазинский, с.Старый Каразирек				
39	Бавлинский, с. Васькино Турайлы				
40	Муслюмовский, с. Елгабаш				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	68,43	96	4
2	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	96	4
3	г.Казань	5 000	78,23	99	7
4	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	21,3	99	4
5	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	100	-
7	Арский, г.Арск	500	100	100	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	100	-
9	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	100	-
10	Буинский, г.Буинск	1 750	100	100	-
11	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
12	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	100	-
13	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	100	-
14	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100	-
15	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100	-
16	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100	-
17	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	100	-
18	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	100	-
19	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	87,36	100	-
20	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100	-
21	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100	-
22	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	64,36	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский, пгт.Алексеевское	500	0	85	2
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	200	0	80	2
3	Спасский, г.Болгар	1 448	56,08	99	10
4	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	99	6
5	Актанышский, с.Актаныш	300	0	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	388	0	100	-
7	Апастовский, пгт.Апастово	600	100	100	-
8	Балтасинский, с.Балтаси	202	100	100	-
9	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100	-
10	Буинский, г.Буинск	1 500	99,5	100	-
11	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	600	100	100	-
12	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	1 000	100	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Заинский, г.Заинск	200	100	100	-
14	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	300	100	100	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	0	100	-
16	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	100	-
17	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	100	-
18	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	100	-
19	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	83,74	100	-
20	Сармановский, с.Сарманово	2 000	100	100	-
21	Тетюшский, г.Тетюши	500	99,9	100	-
22	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	100	-
23	Черемшанский, с.Черемшан	1 500	100	100	-
24	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	99,79	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верх.-Услонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Кам.-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Мензелинский, с.Калтаковский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
39	Мензелинский, с. Кзыл-Тюбякский				
40	Менделеевский, с.Абалевский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюросовхозский				
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыб.-Слободский, с.Полянский				
48	Рыб.-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуркеевский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуртинский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомическое отделение

54

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский, с.Ново-Кырлайский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский, с.Киятский				
7	Балтасинский, с.Куюкский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

55

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

56

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
1	Азнакаевский	100	-	100	-	-	-	-
2	Аксубаевский	100	-	100	-	-	-	100
3	Актанышский	100	-	100	-	-	100	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	94	1	94	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

57

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100
15	Высокогорский	99,1	2,6	99,1	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Кам.- Устьинский	97	2	95	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	100	-	100	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

58

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
27	Нурлатский	75,9	6,6	75,9	-	-	-	-
28	Пестречинский	80	15	60	100	-	-	-
29	Рыб.Слободский	100	2,5	100	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	100	-	100	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	100	-	100	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Наб. Челны	97	1	-	-	-	-	97
39	г.Казань	49	2	-	-	-	-	49



Универсальные спортивные площадки

59



Верхнеуслонский район, с.В.Услон, ул.Чехова, д.34

Подрядчик: ООО "Сыйфат"



Универсальные спортивные площадки

60



Кайбицкий район, с. Кушманы, ул.Школьная д.31

Подрядчик: ООО «Волгадорстрой»



Универсальные спортивные площадки

61



Актанышский р-он, с. Старые Бугады, ул. Центральная, 56
Подрядчик: ООО "Актаныш юллары"



Универсальные спортивные площадки

62

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	динамика за неделю
1	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	0	100	0
2	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	100	9
3	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100	0
4	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100	0
5	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100	0
6	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100	0
7	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	100	0
8	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100	0



Универсальные спортивные площадки

63

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	динамика за неделю
9	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100	0
10	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	100	30
11	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	0	100	0
12	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100	0
13	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская ПМК"Мелиорации"	3	20	100	0
14	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	21	100	0



Универсальные спортивные площадки

64

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	динамика за неделю
15	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	23	100	0
16	Сармановский	ООО "Илвар"	3	31	100	0
17	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	32	100	0
18	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	45	100	0
19	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	46	100	0
20	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	53	100	0
21	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	55	100	0
22	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	57	100	0



Универсальные спортивные площадки

65

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	динамика за неделю
23	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	63	100	0
24	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	66	100	0
25	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	66	100	0
26	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	66	100	0
27	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	71	100	0
28	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	75	100	0
29	Буинский	ООО "Строительные технологии"	2	76	100	0
30	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	78	100	0



Универсальные спортивные площадки

66

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	динами- ка за неделю
31	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	82	100	0
32	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	85	100	0
33	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	86	100	0
34	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	86	100	0
35	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	86	100	0
36	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	87	100	0
37	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	88	100	0



Универсальные спортивные площадки

67

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %	
					на 05.08.16.	Динамика за неделю
38	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ-СтройИнвест"	2	88	100	0
39	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	91	100	0
40	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	92	100	12
41	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	95	100	0
42	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	97	100	0
43	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	98	100	0
44	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	98	100	0
45	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	99	100	0

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 29.07.16 по 04.08.16	Остаток
936,83	667,32	40,10	269,51
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)		10,14	10,17
СМР		10,14	10,17
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)		5,79	5,81
СМР		5,79	5,81
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)		714,81	720,51
СМР		714,81	720,51
Оборудование		0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)	10,19	10,21	100,20
СМР	10,19	10,21	100,20
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)	5,82	5,83	100,25
СМР	5,82	5,83	100,25
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)	179,43	182,87	101,92
СМР	179,43	172,66	101,92
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)	7,51	7,45	99,20
СМР	1,25	1,23	98,40
Оборудование	6,26	6,22	99,36
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)	4,29	4,26	99,30
СМР	0,71	0,70	98,59
Оборудование	3,58	3,56	99,44
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)	242,67	246,33	101,51
СМР	193,32	196,97	101,88
Оборудование	49,35	49,36	100,02

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)	6,07	6,12	100,82
СМР	2,42	2,45	101,24
Оборудование	3,65	3,67	100,55
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)	3,47	3,50	100,86
СМР	1,38	1,40	101,45
Оборудование	2,09	2,10	100,49
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)	160,61	163,02	101,50
СМР	115,39	116,72	101,15
Оборудование	45,22	46,30	102,39

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ		
Объем финансирования, млн. руб.		209,01		
		ПИР 4,57	СМР 138,51	Обор-е 65,93
Начало строительства		2015		
Срок завершения строительства		Август 2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)	6,36	6,43	101,10	
СМР	2,57	2,59	100,77	
Оборудование	3,79	3,84	101,32	
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)	3,64	3,67	100,82	
СМР	1,47	1,48	100,68	
Оборудование	2,17	2,19	100,92	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)	166,66	169,26	101,56	
СМР	112,26	114,55	102,04	
Оборудование	54,40	54,71	100,57	

«Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		508,9	
		ПИР 11,63	Обор-е 110,58
Начало строительства		Октябрь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (29.07.2016г. – 04.08.2016г.)	11,66	11,71	100,43
СМР	1,54	1,57	101,95
Оборудование	10,12	10,14	100,19
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 04.08.2016г.)	6,66	6,69	100,45
СМР	0,88	0,90	102,27
Оборудование	5,78	5,79	100,17
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.08.2016г.)	391,10	402,11	102,82
СМР	363,24	374,08	102,98
Оборудование	27,86	28,03	100,61
