



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	566,94	1 358,92	3 892,00	5 817,86



МО, по которым **не представлены** акты ввода законченного капитальным ремонтом МКД

2

	МО	К-во МКД в программе	Количество МКД, по которым не предоставлены в Фонд акты ввода
1	Арский	8	1
2	Балтасинский	4	4
3	Бугульминский	57	1
4	Буинский	8	1
5	Высокогорский	15	8
6	г. Казань	280	98
7	г. Набережные Челны	112	112
8	Елабужский	21	1
9	Зеленодольский	28	24
10	К.-Устьинский	6	6
11	Лаишевский	7	5
12	Нижнекамский	123	1
13	Новошешминский	2	2
14	Пестречинский	6	4
	ИТОГО по РТ	974	268



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение (по данным МЖФ), %	принятые КС-2 ГЖИ РТ		
					сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %
1	г. Наб.Челны	112	1 389 204,60	97,90	572 667,12	41,22	12,40
2	Балтасинский	4	6 184,88	88,97	2 646,55	42,79	11,67
3	Пестречинский	6	13 400,75	76,98	6 227,61	46,47	6,43
4	Высокогорский	15	30 731,76	99,69	15 255,53	49,64	10,97
5	Атнинский	1	621,63	99,04	364,82	58,69	0,00
6	Зеленодольский	28	243 591,73	95,13	152 206,68	62,48	9,46
7	г. Казань	280	1 836 704,96	84,08	1 204 258,34	65,57	14,55
8	К.-Устьинский	6	9 155,00	98,61	6 093,66	66,56	8,39
	Итого по РТ:	974	5 817 856,78	93,6	3 997 425,27	68,7	10,94
9	Лаишевский	7	22 830,35	97,15	16 287,45	71,34	2,72
10	Кайбицкий	1	592,76	79,31	450,35	75,98	0,00
11	Сабинский	1	11 201,88	100,00	8 584,95	76,64	1,61
12	Тетюшский	6	9 479,67	97,92	7 739,57	81,64	0,86
13	Нижнекамский	123	683 928,89	99,38	560 149,72	81,90	9,83
14	Елабужский	21	140 870,01	97,53	115 627,56	82,08	0,73



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение (по данным МЖФ), %	принятые КС-2 ГЖИ РТ		
					сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %
15	Верхнеуслонский	2	5 074,42	97,50	4 377,85	86,27	2,92
16	Буинский	8	26 652,49	93,06	23 073,29	86,57	18,64
17	Альметьевский	61	342 608,72	97,11	299 212,74	87,33	12,65
18	Р.-Слободский	4	9 245,28	95,16	8 093,95	87,55	0,00
19	Нурлатский	16	54 928,22	95,97	48 455,13	88,22	0,00
20	Черемшанский	3	1 820,15	99,04	1 610,93	88,50	50,76
21	Азнакаевский	25	89 831,24	94,18	79 783,95	88,82	0,00
22	Алексеевский	5	9 488,55	100,00	8 741,72	92,13	0,00
23	Менделеевский	24	46 067,84	99,26	42 465,10	92,18	14,11
24	Новошешминский	2	4 328,62	94,47	4 000,41	92,42	31,49
25	Агрызский	11	28 184,41	98,56	26 167,64	92,84	0,00
26	Ютазинский	16	24 042,87	100,00	22 576,94	93,90	0,00
27	Мамадышский	14	21 896,31	97,72	20 654,81	94,33	0,00
28	Муслюмовский	6	9 822,34	94,54	9 269,63	94,37	0,00
29	Сармановский	12	40 197,14	99,99	38 212,53	95,06	0,00
	Итого по РТ:	974	5 817 856,78	93,6	3 997 425,27	68,7	10,94



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

5

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение (по данным МЖФ), %	принятые КС-2 ГЖИ РТ		
					сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %
30	Арский	8	19 461,05	98,43	18 738,21	96,29	5,55
31	Мензелинский	6	22 157,17	100,00	21 434,18	96,74	48,80
32	Бугульминский	57	212 540,36	99,67	206 144,38	96,99	1,04
33	Кукморский	7	21 011,68	95,70	20 418,36	97,18	20,36
34	Тюлячинский	1	1 169,44	100,00	1 140,92	97,56	6,00
35	Тукаевский	11	26 831,46	100,00	26 368,27	98,27	4,95
36	Заинский	17	72 588,60	100,00	71 388,60	98,35	1,70
37	Апастовский	2	4 025,26	100,00	3 960,90	98,40	0,00
38	Лениногорский	17	156 644,81	99,94	154 301,52	98,50	0,00
39	Аксубаевский	4	7 339,16	100,00	7 254,23	98,84	3,21
40	Актанышский	3	10 246,45	98,22	10 162,42	99,18	0,00
41	Чистопольский	12	104 151,28	100,00	103 916,10	99,77	16,17
42	Бавлинский	6	40 320,70	99,84	40 258,79	99,85	1,78
43	Спасский	3	6 681,87	95,69	6 681,87	100,00	4,31
	Итого по РТ:	974	5 817 856,78	93,6	3 997 425,27	68,7	10,94



МО, по которым не предоставлены технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 13.12.2018

	МО	К-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не предоставлены документы
1	г.Казань	234	2
2	Верхнеуслонский	2	1
	Итого по РТ:	907	3



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: работы завершены	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г.Казань	26 549,6	84,0	1,0
2	МАДОУ «Детский сад № 313 комбинированного вида», г.Казань	41 849,6	94,0	2,0
3	МАДОУ «Детский сад № 324 присмотра и оздоровления», г.Казань	29 708,0	97,0	2,0
4	МАДОУ «Детский сад № 407 комбинированного вида», г.Казань	23 446,7	97,0	2,0
5	МАДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», г.Казань	43 979,5	98,0	3,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	99,5	0,2
6	МАДОУ «Детский сад № 353 комбинированного вида», г.Казань	42 436,7	99,9	0,2



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017
(с изм. от 28.12.2017 № 3660-р)



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	99,2	0,7
	Итого по РТ	336 116,4	99,9	0,1



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	ПИР (ПСД), млн. рублей	Оборудование, доп. средства
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828	294,093

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р),
РКМ РТ № 2400-р от 11.09.2018



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
1	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», женская консультация, Кукморский	6 008,1	30,0	5,0
2	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», детская поликлиника, Кукморский	7 515,0	43,0	6,0
3	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника, г.Елабуга	117 545,6	48,0	5,0
4	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,9	60,0	7,0
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,6	60,0	10,0
6	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Набережные Челны	76 025,3	65,0	5,0
7	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Набережные Челны	100 929,5	75,0	6,0
8	ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,3	75,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
9	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», поликлиника, Кукморский	45 161,9	77,0	4,0
10	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 2», г.Набережные Челны	28 221,0	79,0	4,0
11	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Набережные Челны	66 048,0	80,0	10,0
12	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр., г.Елабуга	3 921,6	80,0	6,0
13	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,5	80,0	18,0
14	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,4	83,0	13,0
15	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань, Сеченова, д.6	18 217,0	84,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,1	87,0	2,0
17	ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,9	87,0	15,0
18	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,1	88,0	16,0
19	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,1	89,0	2,0
20	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 3, г.Зеленодольск	13 160,0	90,0	5,0
21	ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», детская поликлиника, г.Лениногорск	25 034,9	90,0	17,0
22	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,3	90,0	7,0
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
23	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск	84 481,4	92,0	4,0
24	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер», г.Набережные Челны	28 080,7	92,0	12,0
25	ГАУЗ «Арская ЦРБ», поликлиника, г.Арск	46 516,3	92,0	2,0
26	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казань	26 010,5	93,0	16,0
27	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника, г.Чистополь	58 258,4	93,0	6,0
28	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», филиал поликлиники, г.Чистополь	19 170,4	94,0	6,0
29	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижекамск	71 352,4	94,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
30	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	94,0	6,0
31	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,0	95,0	20,0
32	ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», поликлиника, г.Нурлат	51 445,2	95,0	10,0
33	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,0	95,0	23,0
34	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Набережные Челны	13 998,0	95,0	22,0
35	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер», г.Чистополь	27 565,4	95,0	3,0
36	ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», детское отделение поликлиники, пгт.Аксубаево	11 672,1	95,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
37	ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», женская консультация, г.Нурлат	2 487,1	96,0	0,0
38	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», женская консультация, г.Елабуга	24 000,0	96,0	0,0
39	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	48 177,3	96,0	3,0
40	ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,6	96,3	0,3
41	ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.Казань	18 607,3	97,0	12,0
42	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 11», г.Казань	8 421,1	97,0	1,0
43	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	44 587,3	98,0	3,0
44	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», г.Набережные Челны	10 654,3	98,0	3,0
45	ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ», поликлиника, г.Наб. Челны	99 730,6	98,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
46	ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,7	98,0	0,0
47	ГАУЗ «Буинская ЦРБ», поликлиника, г.Буинск	51 017,5	98,0	1,0
48	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 4, г.Зеленодольск	21 848,5	98,0	11,0
49	ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,8	99,0	0,0
50	ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора	20 314,2	99,0	0,0
51	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» филиал поликлиника, г.Чистополь	8 000,0	99,0	0,0
52	ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», поликлиника, с.Пестрецы, ул.Молодежная, д.13	73 480,9	99,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	90,7	4,0
53	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника при Городской больнице № 2	22 256,1	99,0	0,0
54	ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», поликлиника, Сабинский	38 035,3	99,0	8,0
55	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,2	99,0	0,0
56	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, Черемшанский	66 402,5	99,0	5,0
57	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,3	99,0	4,0

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 832 235,01	24 682 386,58	80,05	1,66	6 149 848,43
1	Верхнеуслонский	1 252 498,27	489 477,10	39,08	0,00	763 021,17
2	Менделеевский	129 462,09	73 247,10	56,58	0,00	56 214,98
3	Казань	12 465 019,67	9 139 565,11	73,32	1,17	3 325 454,56
4	Кукморский	231 117,57	173 350,61	75,01	0,46	57 766,96
5	Наб.Челны	2 175 346,86	1 639 967,23	75,39	4,50	535 379,63
6	Елабужский	651 226,88	496 114,64	76,18	0,79	155 112,24
7	Высокогорский	579 330,44	442 841,73	76,44	0,85	136 488,71
8	Тукаевский	214 522,03	164 972,86	76,90	0,49	49 549,17
9	Нурлатский	187 963,08	151 211,86	80,45	0,03	36 751,22
10	Пестречинский	229 095,84	188 648,56	82,34	2,87	40 447,28
11	Алексеевский	163 451,81	135 943,05	83,17	6,20	27 508,76
12	Муслюмовский	98 316,25	82 631,26	84,05	0,95	15 684,99
13	Аксубаевский	121 600,40	103 166,25	84,84	0,00	18 434,15
14	Актанышский	218 611,35	186 027,71	85,10	1,52	32 583,63
15	Сабинский	315 167,74	268 756,19	85,27	0,00	46 411,55

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 832 235,01	24 682 386,58	80,05	1,66	6 149 848,43
16	Р.-Слободский	74 672,04	64 954,20	86,99	6,08	9 717,84
17	Арский	344 386,17	301 326,22	87,50	1,50	43 059,94
18	Чистопольский	976 165,59	862 556,11	88,36	0,00	113 609,48
19	Спасский	159 923,30	142 198,88	88,92	0,00	17 724,42
20	Нижнекамский	3 053 095,34	2 716 852,23	88,99	0,00	336 243,10
21	Мамадышский	329 566,32	295 448,66	89,65	0,00	34 117,66
22	Балтасинский	226 915,26	207 907,88	91,62	1,40	19 007,38
23	Азнакаевский	634 063,66	585 517,15	92,34	0,00	48 546,51
24	Агрызский	69 778,18	64 482,03	92,41	0,00	5 296,16
25	Зеленодольский	1 327 978,93	1 227 518,40	92,44	0,00	100 460,53
26	Буинский	206 855,36	193 432,95	93,51	0,24	13 422,42
27	Апастовский	116 365,27	111 428,36	95,76	0,12	4 936,91
28	Алькеевский	101 893,40	98 098,70	96,28	0,00	3 794,70
29	Лаишевский	405 830,03	391 520,90	96,47	2,84	14 309,13
30	Кайбицкий	73 868,54	71 537,95	96,84	1,76	2 330,59

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 832 235,01	24 682 386,58	80,05	1,66	6 149 848,43
31	Атнинский	75 927,54	73 570,65	96,90	3,42	2 356,90
32	Мензелинский	175 574,84	170 289,77	96,99	2,23	5 285,07
33	Сармановский	237 171,60	230 129,24	97,03	0,25	7 042,36
34	Ютазинский	194 125,68	188 664,47	97,19	0,48	5 461,21
35	Лениногорский	474 987,86	462 054,46	97,28	12,18	12 933,39
36	Альметьевский	950 544,55	927 271,37	97,55	0,00	23 273,18
37	Тетюшский	187 351,46	182 880,58	97,61	4,23	4 470,88
38	Тюлячинский	78 366,75	76 523,23	97,65	13,39	1 843,53
39	Новошешминский	84 970,94	83 123,94	97,83	3,50	1 847,00
40	Дрожжановский	106 302,37	104 043,47	97,88	0,00	2 258,90
41	Бугульминский	452 145,36	442 998,22	97,98	3,38	9 147,14
42	Черемшанский	232 820,01	228 114,19	97,98	2,12	4 705,82
43	Камско-Устьинский	111 218,15	109 337,18	98,31	0,00	1 880,98
44	Бавлинский	135 446,17	133 368,70	98,47	0,00	2 077,47
45	Заинский	201 194,08	199 315,24	99,07	2,87	1 878,84



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 13.12.2018

23

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	8 367 598,36	76,31	4,55	2 597 033,95
1	Менделеевский	112 971,74	57 012,20	50,47	0,00	55 959,54
2	Казань	2 389 668,84	1 356 103,21	56,75	6,71	1 033 565,63
3	Елабужский	332 711,12	208 013,25	62,52	2,21	124 697,87
4	Наб.Челны	1 394 937,01	913 076,10	65,46	7,02	481 860,91
5	Кукморский	174 699,80	117 988,64	67,54	0,49	56 711,16
6	Сабинский	143 107,81	99 227,68	69,34	1,77	43 880,13
7	Чистопольский	354 664,35	247 227,55	69,71	7,22	107 436,79
8	Нижнекамский	546 662,49	402 053,44	73,55	7,15	144 609,05
9	Тукаевский	192 599,40	143 072,32	74,28	0,54	49 527,08
10	Высокогорский	217 559,14	161 682,09	74,32	2,83	55 877,05
11	Пестречинский	156 893,13	116 972,51	74,56	4,35	39 920,62
12	Арский	179 507,19	138 671,64	77,25	3,30	40 835,55
13	Зеленодольский	343 772,36	266 936,98	77,65	8,70	76 835,38
14	Нурлатский	166 779,73	130 378,08	78,17	0,03	36 401,64
15	Мамадышский	104 660,52	83 270,88	79,56	3,07	21 389,64



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 13.12.2018

24

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	8 367 598,36	76,31	4,55	2 597 033,95
16	Аксубаевский	92 322,02	74 904,49	81,13	10,16	17 417,53
17	Актанышский	186 021,79	153 443,49	82,49	1,79	32 578,31
18	Алексеевский	95 994,34	80 722,36	84,09	8,35	15 271,98
19	Муслюмовский	71 370,43	61 273,23	85,85	0,46	10 097,20
20	Рыбно- Слободский	58 549,31	50 435,27	86,14	3,58	8 114,05
21	Спасский	95 183,47	83 278,94	87,49	3,14	11 904,53
22	Верхнеуслонский	79 702,26	70 465,93	88,41	2,83	9 236,34
23	Агрызский	54 600,40	49 335,01	90,36	0,00	5 265,39
24	Буинский	142 357,57	128 949,59	90,58	0,35	13 407,99
25	Апастовский	58 308,62	53 385,23	91,56	0,23	4 923,38
26	Альметьевский	354 083,01	330 950,40	93,47	1,30	23 132,61
27	Балтасинский	173 341,32	164 922,19	95,14	0,21	8 419,13
28	Мензелинский	110 801,40	105 564,61	95,27	3,53	5 236,78
29	Алькеевский	49 759,80	47 576,65	95,61	0,00	2 183,15
30	Дрожжановский	44 730,50	42 861,68	95,82	14,49	1 868,82

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 13.12.2018

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	8 367 598,36	76,31	4,55	2 597 033,95
31	Кайбицкий	60 501,70	58 174,03	96,15	2,15	2 327,67
32	Азнакаевский	279 082,12	268 979,40	96,38	1,71	10 102,72
33	Атнинский	54 437,02	52 804,79	97,00	4,77	1 632,23
34	Бавлинский	69 515,23	67 486,32	97,08	0,58	2 028,91
35	Лениногорский	445 889,24	433 011,47	97,11	0,18	12 877,77
36	Лаишевский	218 216,56	211 922,38	97,12	5,61	6 294,18
37	Ютазинский	74 688,22	72 546,34	97,13	1,24	2 141,88
38	Тюлячинский	65 298,57	63 645,99	97,47	16,10	1 652,58
39	Сармановский	207 206,03	202 816,37	97,88	0,29	4 389,66
40	Новошешминский	71 029,71	69 532,13	97,89	1,80	1 497,58
41	Бугульминский	377 551,70	371 316,98	98,35	4,05	6 234,72
42	Тетюшский	147 094,33	144 832,40	98,46	5,39	2 261,93
43	Черемшанский	186 362,70	183 589,91	98,51	1,65	2 772,78
44	Камско-Устьинский	44 198,66	43 650,72	98,76	0,03	547,94
45	Заинский	185 239,66	183 533,47	99,08	3,11	1 706,19



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 13.12.2018

26

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 274 596,25	95,29	0,48	63 006,75
1	Муслюмовский	26 945,82	21 358,03	79,26	1,20	5 587,79
2	Балтасинский	53 573,94	42 985,69	80,24	1,99	10 588,25
3	Казань	62 812,00	55 941,39	89,06	0,00	6 870,61
4	Сабинский	24 762,29	22 230,87	89,78	0,81	2 531,42
5	Рыбно-Слободский	16 122,73	14 518,93	90,05	11,84	1 603,79
6	Бугульминский	30 849,06	27 942,35	90,58	0,00	2 906,71
7	Высокогорский	33 698,72	30 686,02	91,06	0,05	3 012,70
8	Сармановский	29 965,57	27 312,87	91,15	0,01	2 652,70
9	Верхнеуслонский	34 085,79	31 138,54	91,35	0,05	2 947,25
10	Елабужский	36 306,75	33 254,38	91,59	0,00	3 052,38
11	Алексеевский	17 739,28	16 359,00	92,22	0,03	1 380,28
12	Лаишевский	39 303,18	36 502,54	92,87	0,00	2 800,64
13	Набережные Челны	36 955,00	34 368,39	93,00	0,00	2 586,61
14	Алькеевский	21 039,00	19 612,24	93,22	0,01	1 426,76
15	Камско-Устьинский	19 759,36	18 426,32	93,25	0,03	1 333,04



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 13.12.2018

27

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 274 596,25	95,29	0,48	63 006,75
16	Арский	33 377,84	31 513,23	94,41	0,00	1 864,62
17	Тетюшский	40 257,12	38 048,18	94,51	0,01	2 208,94
18	Атнинский	16 963,71	16 239,04	95,73	0,00	724,67
19	Кукморский	21 316,42	20 576,12	96,53	0,06	740,30
20	Аксубаевский	29 278,37	28 261,76	96,53	0,00	1 016,62
21	Новошешминский	11 786,23	11 436,80	97,04	0,03	349,42
22	Пестречинский	20 011,57	19 484,91	97,37	0,00	526,66
23	Зеленодольский	35 065,24	34 191,95	97,51	0,04	873,30
24	Азнакаевский	17 588,42	17 250,14	98,08	0,00	338,28
25	Нурлатский	21 183,35	20 833,78	98,35	0,00	349,57
26	Тюлячинский	11 990,69	11 799,74	98,41	0,00	190,94
27	Менделеевский	16 490,34	16 234,90	98,45	0,01	255,44
28	Чистопольский	22 985,99	22 665,61	98,61	0,00	320,39
29	Мамадышский	97 576,61	96 469,74	98,87	0,00	1 106,87
30	Заинский	15 954,41	15 781,77	98,92	0,00	172,65



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 13.12.2018

28

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 274 596,25	95,29	0,48	63 006,75
31	Альметьевский	19 741,26	19 600,69	99,29	0,00	140,57
32	Дрожжановский	58 019,01	57 784,20	99,60	0,00	234,81
33	Бавлинский	12 343,73	12 295,18	99,61	0,00	48,55
34	Мензелинский	20 609,32	20 561,03	99,77	0,00	48,29
35	Агрызский	15 177,78	15 147,02	99,80	0,00	30,77
36	Лениногорский	29 098,62	29 042,99	99,81	0,00	55,63
37	Тукаевский	21 922,63	21 900,54	99,90	0,00	22,09
38	Черемшанский	35 970,84	35 946,61	99,93	0,00	24,23
39	Нижнекамский	23 340,00	23 324,68	99,93	0,00	15,32
40	Апастовский	23 184,10	23 170,57	99,94	0,00	13,53
41	Ютазинский	56 865,75	56 842,04	99,96	0,00	23,72
42	Актанышский	16 649,80	16 644,48	99,97	0,00	5,33
43	Спасский	31 070,71	31 063,73	99,98	0,00	6,98
44	Буинский	64 497,79	64 483,36	99,98	0,00	14,43
45	Кайбицкий	13 366,84	13 363,92	99,98	0,00	2,92



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 13.12.2018

29

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 529 999,69	15 040 191,96	81,17	0,60	3 489 807,73
1	Верхнеуслонский	1 138 710,22	387 872,64	34,06	0,00	750 837,58
2	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	0,00	77 598,96
3	Казань	10 012 538,83	7 727 520,51	77,18	0,00	2 285 018,32
4	Алексеевский	49 718,19	38 861,69	78,16	3,52	10 856,50
5	Черемшанский	10 486,48	8 577,67	81,80	7,12	1 908,81
6	Спасский	33 669,12	27 856,21	82,74	0,00	5 812,91
7	Азнакаевский	337 393,12	299 287,60	88,71	0,00	38 105,52
8	Елабужский	282 209,01	254 847,01	90,30	0,00	27 362,00
9	Мамадышский	127 329,19	115 708,04	90,87	0,00	11 621,15
10	Нижнекамский	2 483 092,85	2 291 474,11	92,28	0,00	191 618,74
11	Наб.Челны	743 454,85	692 522,74	93,15	0,00	50 932,11
12	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	0,00	3 295,61



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 13.12.2018

30

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 529 999,69	15 040 191,96	81,17	0,60	3 489 807,73
13	Дрожжановский	3 552,86	3 397,58	95,63	0,00	155,28
14	Лаишевский	148 310,30	143 095,99	96,48	0,00	5 214,31
15	Зеленодольский	949 141,32	926 389,47	97,60	0,00	22 751,85
16	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	0,00	5 852,30
17	Кукморский	35 101,35	34 785,85	99,10	0,54	315,50
18	Алькеевский	31 094,60	30 909,81	99,41	0,00	184,79
19	Арский	131 501,13	131 141,36	99,73	0,00	359,77
20	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	0,00	5,71
21	Бавлинский	53 587,21	53 587,21	100,00	0,00	0,00
22	Актанышский	15 939,75	15 939,75	100,00	0,00	0,00
23	Альметьевский	576 720,28	576 720,28	100,00	0,00	0,00
24	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 13.12.2018

31

тыс.рублей


№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 529 999,69	15 040 191,96	81,17	0,60	3 489 807,73
25	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00	0,00
26	Камско-Устьинский	47 260,13	47 260,13	100,00	0,00	0,00
27	Мензелинский	44 164,12	44 164,12	100,00	0,00	0,00
28	Новошешминский	2 155,00	2 155,00	100,00	26,92	0,00
29	Пестречинский	52 191,14	52 191,14	100,00	0,00	0,00
30	Сабинский	147 297,64	147 297,64	100,00	0,00	0,00
31	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00	0,00

В остальных 14 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Динамика просроченной задолженности ЖКК за потребленный газ в РТ

млн. руб.

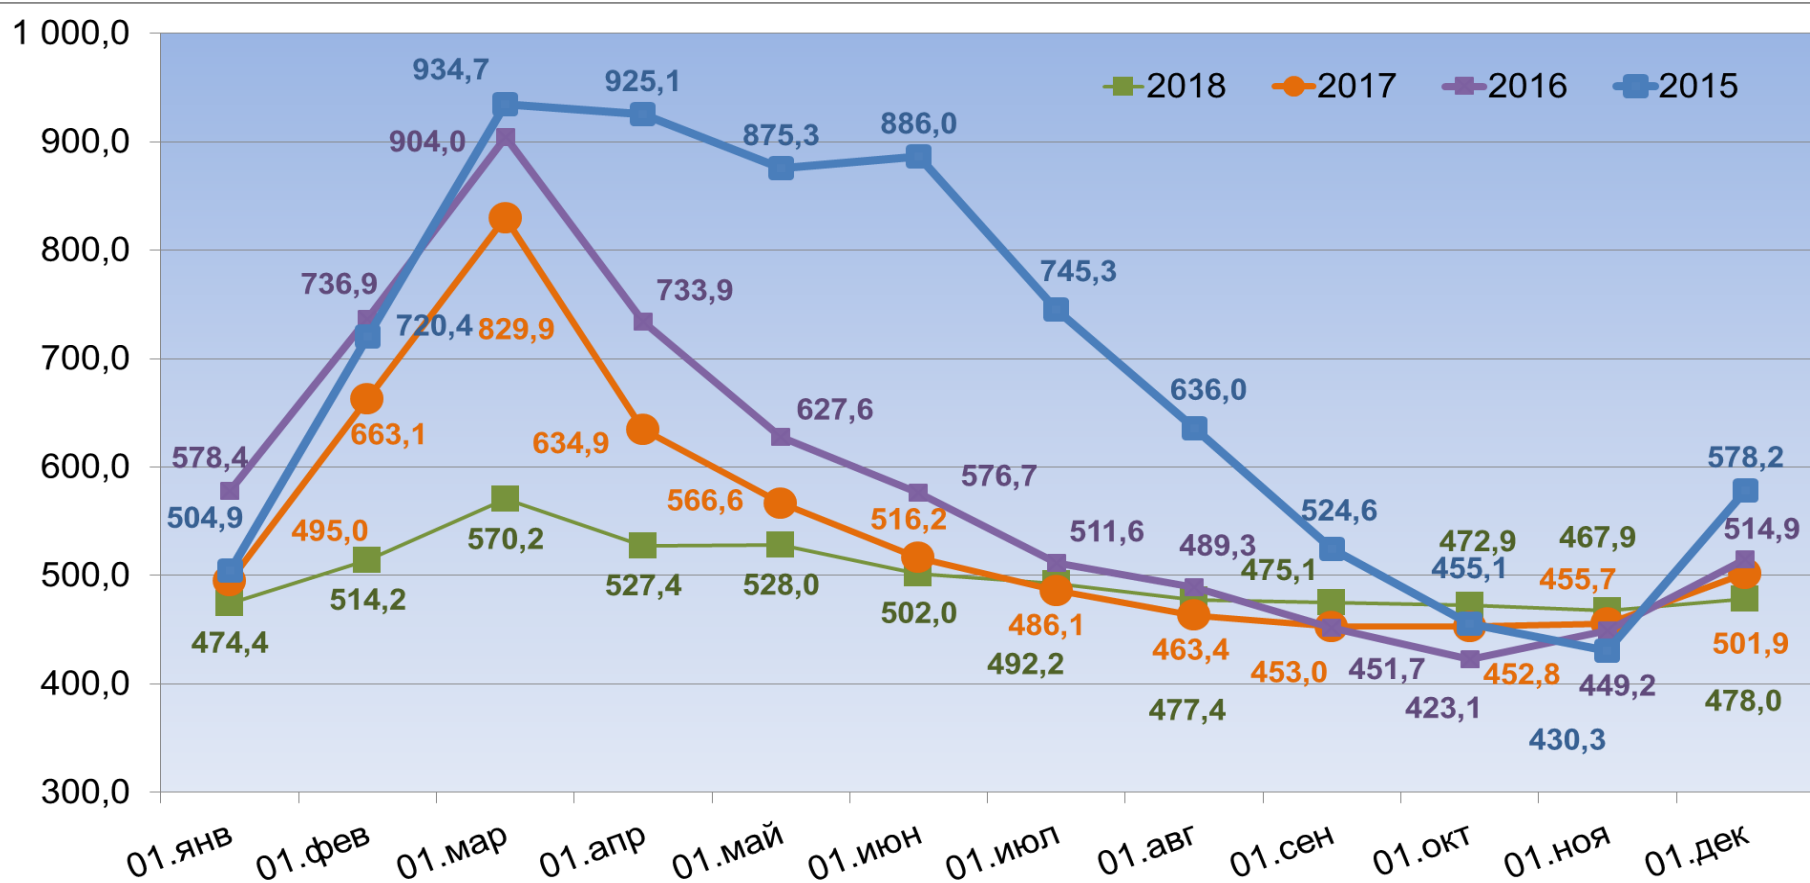



Задолженность организаций ЖКК за потребленный газ

33

тыс. руб.

№	МО	на 01.12.2017	на 01.12.2018	Динамика за год	Динамика за месяц
	ВСЕГО по РТ	501 915	478 032	-23 883	10 094
1	Зеленодольский	164 636	178 910	14 274	2 232
2	Елабужский	90 886	83 287	-7 599	8 081
3	Агрызский	83 887	79 155	-4 732	4 426
4	Бугульминский	78 809	62 786	-16 023	-12 847
5	г.Казань	49 019	50 183	1 164	3 700
6	Верхнеуслонский	10 200	7 337	-2 863	0
7	Лениногорский	0	6 000	6 000	5 980
8	Чистопольский	2 600	2 000	-600	2 000
9	Нижнекамский	1 860	1 720	-140	-154
10	Азнакаевский	7 488	1 436	-6 052	-6 527
11	Альметьевский	1 445	1 309	-136	1 043
12	Тетюшский	1 392	1 258	-134	1 045
13	Тюлячинский	0	897	897	724
14	Высокогорский	350	655	305	552
15	Камско-Устьинский	499	497	-2	497
16	Черемшанский	506	400	-106	400
17	Атнинский	0	125	125	125
18	Лаишевский	0	53	53	53
19	Муслюмовский	197	24	-173	24



Проблемные теплоснабжающие организации Республики Татарстан

34

тыс. руб.

№	МО	Наименование организации	на 11.12.2018	Период образования
1	Азнакаевский	МУП "Сельхозжилсервис"	3 665	октябрь-ноябрь 2018
2	Альметьевский	ООО "Альтехносервис"	3 022	октябрь-ноябрь 2018
3	Бугульминский	ОАО "Бугульминское ПТС"	110 885	май-июнь, август-ноябрь 2018
4	Высокогорский	ООО "Теплокоминвест"	1 019	сентябрь-ноябрь 2018
5	Елабужский	АО "Елабужское ПТС"	109 289	март-ноябрь 2018
6	Зеленодольский	ОАО "Зеленодольское ПТС"	232 124	март-ноябрь 2018
7	г.Казань	АО "ГУ ЖКХ"	25 913	декабрь 2016 - март 2017
8	г.Казань	ОАО "РЭУ"	20 570	февраль-октябрь 2015
9	К.-Устьинский	ОАО "К.-Устьинские коммунальные сети"	1 092	октябрь-ноябрь 2018
10	Лаишевский	ООО "Нармонский КомСервис"	312	октябрь-ноябрь 2018
11	Лениногорский	ООО "ЛТС"	36 489	октябрь-ноябрь 2018
12	Тетюшский	ОАО "Тетюшское ПТС"	3 216	октябрь-ноябрь 2018
13	Тюлячинский	МУП "Тюлячинские тепловые сети"	2 127	сентябрь-ноябрь 2018
14	Чистопольский	ООО ПКФ "Восток-Энерго"	8 308	октябрь-ноябрь 2018
