



**2016**  
январь - июнь

**2017**  
январь - июнь


**2018**  
январь - июнь

**2019**  
январь - июнь

**Со смертельным  
исходом**

**С тяжелым  
исходом**

**ВСЕГО  
по РТ**

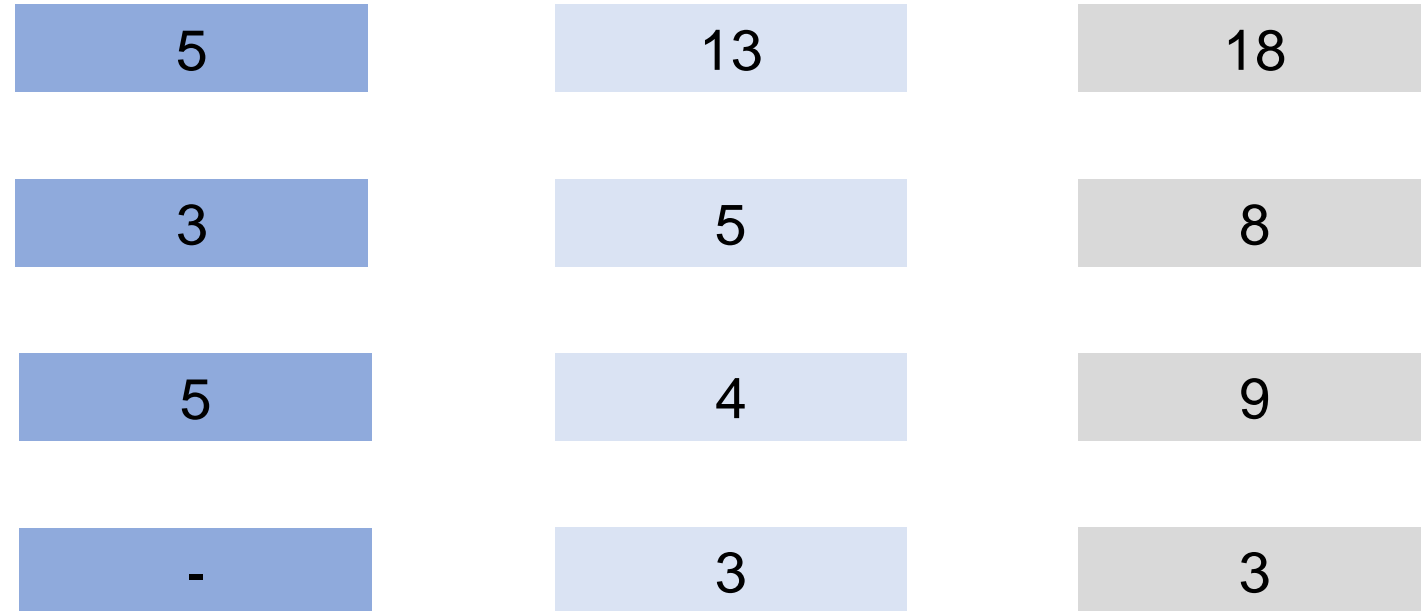



# Строительство жилого дома по ул.Аделя Кутуя, 83а, г.Казань



Не оборудован  
безопасный вход  
в строящееся здание

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Инвест-Строй Торг»**  
**Генподрядчик: ООО «ИСК «Новые горизонты»**



Установка башенного крана  
и пусконаладочные работы  
выполняются без проекта  
производства работ,  
допущены грубые  
нарушения требований СНиП

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО ПСК «КАЖ»**  
**Подрядчик: ООО «СК ДИЗАЙН-КУБ»**



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	702	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	154 55	5 955,0 -
Взыскано всего	56	3 540,0
Не истек срок оплаты	41	2 295,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019


Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	597
- с выездом на объекты строительства	107
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	451
- выдано предписаний	237
- приостановлено право осуществлять строительство	69
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	10
- выдано предупреждений	135



# Ввод жилья

2 425 000 кв.м.

100%



1 408 418 кв.м.

58,1%

Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 408 418</b>	<b>58,1</b>	<b>1 016 582</b>
1	Нижнекамский	100 000	10 025	10,0	89 975
2	Менделеевский	14 000	2 512	17,9	11 488
3	Апастовский	10 000	2 347	23,5	7 653
4	Атнинский	4 500	1 260	28,0	3 240
5	г.Наб.Челны	310 000	90 778	29,3	219 222
6	Новошешминский	5 000	1 485	29,7	3 515
7	Зеленодольский	110 000	36 706	33,4	73 294
8	Лениногорский	26 000	9 075	34,9	16 925
9	Сабинский	20 000	7 419	37,1	12 581
10	Бугульминский	35 000	13 056	37,3	21 944
11	Чистопольский	28 000	10 585	37,8	17 415
12	В-Услонский	40 000	16 091	40,2	23 909
13	Дрожжановский	6 000	2 452	40,9	3 548
14	Елабужский	50 000	20 446	40,9	29 554
15	Сармановский	10 000	4 145	41,5	5 855

Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 408 418</b>	<b>58,1</b>	<b>1 016 582</b>
16	Альметьевский	130 000	54 851	42,2	75 149
17	Буинский	15 000	6 337	42,2	8 663
18	Мамадышский	17 000	7 517	44,2	9 483
19	Муслюмовский	9 000	4 180	46,4	4 820
20	Заинский	17 000	8 105	47,7	8 895
21	Арский	25 000	12 179	48,7	12 821
22	К-Устьинский	8 000	4 002	50,0	3 998
23	Спасский	6 500	3 261	50,2	3 239
24	Высокогорский	80 000	40 163	50,2	39 837
25	Азнакаевский	20 000	10 152	50,8	9 848
26	Актанышский	14 000	7 139	51,0	6 861
27	Тетюшский	10 000	5 366	53,7	4 634
28	Черемшанский	5 000	2 725	54,5	2 275
29	Алексеевский	14 000	7 668	54,8	6 332
30	Мензелинский	14 000	7 855	56,1	6 145



Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 408 418</b>	<b>58,1</b>	<b>1 016 582</b>
31	Бавлинский	12 000	6 868	57,2	5 132
32	Аксубаевский	7 000	4 198	60,0	2 802
33	Кайбицкий	5 000	3 049	61,0	1 951
34	Ютазинский	11 000	6 725	61,1	4 275
35	Нурлатский	16 000	9 965	62,3	6 035
36	Р-Слободский	13 500	8 631	63,9	4 869
37	Тукаевский	90 000	58 602	65,1	31 398
38	Алькеевский	7 000	4 675	66,8	2 325
39	Балтасинский	14 000	9 476	67,7	4 524
40	г.Казань	850 000	629 247	74,0	220 753
41	Тюлячинский	8 000	6 226	77,8	1 774
42	Агрызский	15 000	12 028	80,2	2 972
43	Кукморский	20 000	17 495	87,5	2 505
44	Пестречинский	140 000	122 806	87,7	17 194
45	Лаишевский	100 000	98 545	98,5	1 455



438 302 кв.м.

100%

144 649 кв.м.

33%





**г. Казань, ж.р. «Салават Купере», 425-кв. жилой дом № 8-8**  
генподрядчик – ООО «Ак таш»



на 28.06.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	<b>165</b>	46	1	119	59	23	37
Количество квартир	<b>7 838</b>	2 494	425	5 344	2 259	1 043	2 042
Общая площадь (тыс.кв.м.)	<b>438,3</b>	144,6	25,18	293,7	120,8	61,5	111,4



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>15 589 060</b>	<b>10 631 279</b>	<b>351 321</b>	<b>7 943 457</b>	<b>351 523</b>	<b>10 954 098</b>	<b>465 627</b>
введены в эксплуатацию	5 064 357	5 064 357	34 162	4 569 014	27 395	4 943 348	24 778
высокая 70-100%	4 626 009	4 002 261	199 888	2 574 118	128 346	3 705 122	58 742
средняя 30-70%	2 073 847	833 289	74 764	567 258	140 723	1 039 160	184 276
низкая 0-30%	3 824 847	731 372	42 508	233 068	55 058	1 266 469	197 831



## Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Арский
4. Бавлинский
5. Буинский
6. Высокогорский
7. Елабужский
8. Зеленодольский
9. Лаишевский
10. Пестречинский
11. г.Наб.Челны
12. г.Казань

Количество объектов	Степень готовности		
	Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
59	30	26	3
1	-	1	-
1	1	-	-
2	2	-	-
1	1	-	-
2	-	2	-
3	-	2	1
3	2	1	-
3	1	2	-
1	1	-	-
12	6	6	-
21	8	11	2
9	8	1	-



# Малоэтажное строительство (в том числе ИЖС)

7 325 домов

100%



4 723 дома

64,5%



<b>№</b>	<b>Наименование банка</b>	<b>№</b>	<b>Наименование банка</b>
1.	АО «АБ «РОССИЯ»	10.	ПАО «РОСБАНК»
2.	АО «Газпромбанк»	11.	АО «Банк ДОМ.РФ»
3.	ООО Банк «Аверс»	12.	АО «Райфайзенбанк»
4.	ПАО «Запсибкомбанк»	13.	ПАО «АК БАРС» БАНК
5.	ПАО «Банк ВТБ»	14.	ПАО «Промсвязьбанк»
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»	15.	ПАО «Банк ЗЕНИТ»
7.	ПАО АКБ «Связь-Банк»	16.	АО «»Россельхозбанк»
8.	ПАО «Сбербанк»	17.	ПАО АКБ «Абсолют Банк»
9.	ПАО Банк «ФК Открытие»	18.	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»





№	Наименование банка	Подано заявок всего	Из них (этапы рассмотрения):					
			Анализ документов	Банком даны замечания	Завершение анализа документов	Отказ банка	Одобрение банка	Заключен договор
1	ПАО «Сбербанк»	<b>38</b>	19	3	2	0	2	12
2	ПАО «Банк ВТБ»	<b>18</b>	9	2	2	0	5	0
3	АО «Газпромбанк»	<b>13</b>	1	12	0	0	0	0
4	АО «Банк ДОМ.РФ»	<b>11</b>	5	4	1	0	1	0
5	ПАО Банк «ФК Открытие»	<b>10</b>	1	0	0	0	9	0
6	ПАО «Промсвязьбанк»	<b>7</b>	6	0	0	0	1	0
7	ПАО «АК БАРС» БАНК	<b>7</b>	3	0	1	3	0	0
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	<b>3</b>	1	0	2	0	0	0
9	АО «Россельхозбанк»	<b>1</b>	1	0	0	0	0	0
10	ООО Банк «Аверс»	<b>1</b>	1	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	<b>109</b>	47	21	8	3	18	12



1. Альметьевский

Количество  
объектов

1

Количество  
квартир

3

Степень готовности  
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	42	14
многодетные семьи	33	155,9	33	100
молодые семьи	54	57,9	0	0

**Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»**

<b>Итого семей, в т.ч. по категориям:</b>	<b>45</b>	<b>101,4</b>	<b>40</b>	<b>89</b>
Чернобыльцы	21	44,7	21	100
Вынужденные переселенцы	23	53,5	18	78
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации						
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено		
			28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка	
1	Агрызский	2	1	0	0	0	0	0	0
2	Аксубаевский	1	1		1		1		
3	Альметьевский	5	5	0	4	0	3	0	
4	Бугульминский	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Буинский	3	3	0	1	0	0	0	0
6	Высокогорский	2	2	0	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Кукморский	3	3	0	0	0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Мамадышский	2	2	0	2	0	0	0	0
11	Муслюмовский	1	1	0	0	0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6		6		6		
13	Сабинский	1	1		1		1		
14	г.Казань	4	4		4	+1	4		+1
<b>ИТОГО</b>		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>+1</b>	<b>15</b>		<b>+1</b>



№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Нижнекамский	10
4	Сабинский	1
5	г.Н.Челны	13
6	г.Казань	28
<b>ИТОГО</b>		<b>54</b>



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации						
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен		
			28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка	
1	Азнакаевский	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Елабужский	2	2	0	1	+1	1	+1	
4	Н.Челны	4	2	0	1	0	0	0	0
5	Нижнекамский	3	2	+1	0	0	0	0	0
6	Сабинский	1	1	0	1	+1	0	0	0
7	Тукаевский	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Тюлячинский	2	0	0	0	0	0	0	0
9	Чистопольский	2	2	0	1	+1	0	0	0
10	г.Казань	4	3	0	1	0	1	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>21</b>	<b>14</b>	<b>+1</b>	<b>5</b>	<b>+3</b>	<b>2</b>	<b>+1</b>	



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка	28.06.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	0	0	0	0
2	Зеленодольский	3	3	0	2	0	2	+2
3	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
4	Муслюмовский	1	0	0	0	0	0	0
5	Сармановский	1	0	0	0	0	0	0
6	г.Казань	11	9	0	6	+3	4	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>18</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>+3</b>	<b>6</b>	<b>+3</b>



# Программы строительства социально-культурных объектов

	Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	Строительство детских оздоровительных лагерей	343,07	7	Аукцион состоится в III квартале 2019 года





№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 850</b>	<b>216 987,59</b>	<b>46,3</b>	<b>3,7</b>
1	Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево	50	7 453,34	97,0	4,0
2	Заинский район, с.Бура-Кирта	50	7 453,3	92,0	2,0
3	Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское	200	14 872,9	72,5	17,5
4	Высокогорский район, с. Улля	100	12 911,7	68,0	2,0
5	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,3	63,9	28,9
6	Апастовский район, с. Сатламышево	50	7 453,34	62,3	4,4
7	Бугульминский район, с. Новое Сумароково	100	12 911,7	60,1	10,4
8	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,9	56,5	6,7
9	Высокогорский район, с. Шигали	200	14 872,9	56,3	5,2
10	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	55,3	1,2
11	Аксубаевский район, п. Мюд	100	12 911,7	51,9	7,8



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 850</b>	<b>216 987,59</b>	<b>46,3</b>	<b>3,7</b>
12	Буинский район, с. Чувашские Кищаки	100	12 911,7	49,8	6,7
13	Агрызский район, с. Шаршада	200	14 872,9	44,8	4,7
14	Ютазинский район, с. Байряки-Тамак	50	7 453,3	32,0	16,0
15	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,3	19,0	3,0
16	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	18,8	2,7
17	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	18,6	0,6
18	Нурлатский район, с. Бурметьево	100	12 911,71	18,0	2,0
19	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,3	14,0	2,0
20	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	9,0	1,0
21	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	4,8	4,7



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
<b>ИТОГО</b>		<b>49 220,38</b>	<b>63,5</b>	<b>8,8</b>
1	Бугульминский, Зеленогородское СП	4 474,58	15,4	2,4
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	22	4,8
3	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	39,5	3
4	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	50	10,2
5	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	71	27
6	Буинский, Нижнеаратбашское СП	4 474,58	72	3,3
7	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	75	14,5
8	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	76,8	5
9	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	78	18
10	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	98,3	2
11	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	100	6,5



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Нурлатский, Аксумлинский				
2	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
3	Заинский, Перцовский				
4	Черемшанский, Туйметкинский				
5	Дрожжановский, Малоаксинский				
6	Тетюшский, Бакрчинский				
7	Буинский, Тингашский				
8	Менделеевский, Ново-Кокшанский				
9	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
10	Альметьевский, Новотроицкий				
11	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
12	Мамадышский, Албайский				
13	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
14	Сармановский, Альметьевский				
15	Сармановский, Шарлиареминский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Аксубаевский, Старочувадамский				
17	Алексеевский, Бутлеровский				
18	Алексеевский, Левашевский				
19	Азнакаевский, Сарлинский				
20	Актанышский, Казкеевский				
21	Апастовский, Черемшанский				
22	Апастовский, Шемяковский				
23	Арский, Средне-Пшалымский				
24	Бавлинский, Алексеевский				
25	Балтасинский, Сырьинский				
26	Зеленодольский, Кульбашинский				
27	Кайбицкий, Хозесановский				
28	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
29	Кукморский, Сардекбашский				
30	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Лениногорский, Старо-Иштерьякский				
32	Нижнекамский, Благодатновский				
33	Новошешминский, Екатерининский				
34	Пестречинский, Отар-Дубровский				
35	Сабинский, Шикшинский				
36	Тюлячинский, Максабашский				
37	Чистопольский, Четыре-Дворский				
38	Ютазинский, Подгорный				
39	Агрызский, Салакушкой				
40	Атнинский, Ключи-Сапский				
41	Высокогорский, Березкинский				
42	Мензелинский, Кадряковский				
43	Елабужский, Хлыстовский				
44	Спасский, Вожинский				
45	Бугульминский, Ключевский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский				
2	Аксубаевский				
3	Алькеевский				
4	Камско-Устьинский				
5	Альметьевский				
6	Лаишевский				
7	Зеленодольский				
8	Менделеевский				
9	Пестречинский				



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>100 из 105</b>	<b>82,8</b>	<b>50,8</b>	<b>20,9</b>
1	Бавлинский	2 из 2	100	100	11,5
2	Заинский	2 из 2	100	100	70,0
3	Лаишевский	1 из 1	100	100	47,0
4	Сармановский	2 из 2	100	100	48,9
5	Агрызский	2 из 2	100	28,4	26,4
6	Алексеевский	1 из 1	100	91,5	45,7
7	Атнинский	1 из 1	100	63,5	28,5
8	Балтасинский	2 из 2	100	99,8	69,5
9	Бугульминский	2 из 2	100	45,8	30,8
10	Буинский	3 из 3	100	63,8	20,1
11	Верхнеуслонский	1 из 1	100	99,0	15,0
12	Дрожжановский	2 из 2	100	52,8	15,4





№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
<b>ИТОГО</b>		<b>100 из 105</b>	<b>82,8</b>	<b>50,8</b>	<b>20,9</b>
13	К.Устьинский	1 из 1	100	<b>33,7</b>	21,7
14	Кайбицкий	1 из 1	100	<b>53,5</b>	35,5
15	Кукморский	2 из 2	100	<b>99,8</b>	54,8
16	Муслюмовский	2 из 2	100	<b>78,1</b>	59,1
17	Нижнекамский	4 из 4	100	<b>64,8</b>	20,8
18	Новошешминский	1 из 1	100	<b>45,0</b>	41,2
19	Р.Слободский	1 из 1	100	<b>39,0</b>	6,0
20	Тукаевский	2 из 2	100	<b>92,8</b>	1,0
21	Тюлячинский	2 из 2	100	<b>69,0</b>	35,4
22	Алькеевский	2 из 2	97,5	<b>56,3</b>	26,3
23	Чистопольский	3 из 3	96,7	<b>73,5</b>	7,7
24	Мамадышский	1 из 1	95,0	<b>28,5</b>	10,5



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>100 из 105</b>	<b>82,8</b>	<b>50,8</b>	<b>20,9</b>
25	Высокогорский	3 из 3	93,3	<b>80,1</b>	54,3
26	г.Наб. Челны	7 из 7	93,3	<b>74,7</b>	4,0
27	Азнакаевский	4 из 4	92,5	<b>49,2</b>	27,2
28	Арский	1 из 1	90,0	<b>30,5</b>	29,2
29	Елабужский	2 из 2	90,0	<b>36,5</b>	17,5
30	Альметьевский	3 из 3	86,7	<b>41,4</b>	11,2
31	Апастовский	1 из 1	85,0	<b>34,5</b>	19,5
32	Нурлатский	2 из 2	85,0	<b>52,3</b>	22,9
33	Тетюшский	3 из 3	80,0	<b>65,4</b>	17,0
34	Пестречинский	1 из 1	75,0	<b>32,0</b>	20,0
35	Сабинский	3 из 3	75,0	<b>22,0</b>	16,5
36	г.Казань	13 из 15	72,8	<b>51,6</b>	9,6



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>100 из 105</b>	<b>82,8</b>	<b>50,8</b>	<b>20,9</b>
37	Актанышский	1 из 1	70,0	<b>24,0</b>	24,0
38	Зеленодольский	2 из 3	66,7	<b>40,4</b>	24,8
39	Лениногорский	3 из 3	66,7	<b>23,1</b>	16,0
40	Ютазинский	3 из 3	56,7	<b>46,1</b>	33,6
41	Аксубаевский	1 из 1	30,0	<b>9,0</b>	9,0
42	Менделеевский	1 из 1	10,0	<b>3,0</b>	3,0
43	Черемшанский	1 из 1	10,0	<b>3,0</b>	3,0
44	Спасский	1 из 1	7,0	<b>2,1</b>	2,1
45	Мензелинский	1 из 3	2,3	<b>0,3</b>	0,3



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>13</b>	<b>400 000,00</b>	<b>43,77</b>	<b>33,20</b>
1	Высокогорский	2,00	78 000,00	<b>3,08</b>	3,08
2	Балтасинский	1,00	105 928,84	<b>5,00</b>	5,00
3	Лаишевский	1,00	17 766,00	<b>15,00</b>	15,00
4	Ютазинский	1,00	36 018,26	<b>60,00</b>	10,00
5	Тукаевский	1,00	18 326,20	<b>68,00</b>	8,00
6	Кукморский	1,00	60 982,50	<b>85,00</b>	85,00
7	Актанышский	6,00	82 978,20	<b>95,00</b>	78,96



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>105</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,23</b>	<b>37,32</b>
1	Азнакаевский	1	1 500,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Алькеевский	1	1 500,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Муслюмовский	3	4 500,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Новошешминский	1	1 500,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Нурлатский	1	1 500,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Черемшанский	4	6 000,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Тетюшский	2	3 000,00	<b>2,50</b>	2,50
8	Буинский	4	6 000,00	<b>3,00</b>	3,00
9	Мензелинский	2	4 500,00	<b>3,00</b>	3,00
10	Дрожжановский	4	6 000,00	<b>6,25</b>	6,25
11	Альметьевский	3	4 500,00	<b>6,67</b>	6,67
12	Арский	7	16 500,00	<b>7,27</b>	7,27
13	Лаишевский	3	6 000,00	<b>12,50</b>	12,50
14	Тюлячинский	3	4 500,00	<b>13,33</b>	13,33



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>105</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,23</b>	<b>37,32</b>
15	Высокогорский	1	1 500,00	15,00	15,00
16	Бавлинский	2	3 000,00	25,00	25,00
17	Менделеевский	2	3 000,00	35,00	27,50
18	Актанышский	4	6 000,00	36,25	32,13
19	Алексеевский	2	5 500,00	36,36	36,36
20	Балтасинский	8	15 000,00	38,30	36,80
21	Сабинский	5	10 000,00	40,50	31,65
22	Лениногорский	3	4 500,00	45,00	35,00
23	Елабужский	3	4 500,00	48,33	48,33
24	Ютазинский	2	3 000,00	50,00	50,00
25	Кукморский	12	19 500,00	54,62	53,12
26	Тукаевский	2	3 000,00	55,00	53,50
27	Атнинский	12	34 500,00	78,26	78,26
28	Мамадышский	8	19 500,00	91,92	91,92



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>69,2</b>	<b>3,2</b>
1	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	369 100,45	<b>62</b>	4
2	Елабужский, г.Елабуга	220	120	196 380,55	<b>64,1</b>	1,1
3	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	344 432,98	<b>69</b>	3
4	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	128 055,99	<b>70</b>	3
5	Казань, ул.Завойского	50	50	73 020,97	<b>74,4</b>	4,4
6	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	219 201,33	<b>76</b>	3
7	Лаишевский, с.Усады	260	120	196 561,16	<b>78</b>	2
8	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	196 380,55	<b>79</b>	5
9	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	72 896,04	<b>80</b>	2,3
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	196 380,55	<b>80</b>	8
11	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	219 201,33	<b>81</b>	4
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	196 380,55	<b>89</b>	2
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	196 380,55	<b>95</b>	6
14	Арский, г.Арск	140	70	127 011,36	<b>100</b>	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	118 426,49	<b>100</b>	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>69,2</b>	<b>3,2</b>
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	215 267,43	<b>9,5</b>	1
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	197 321,17	<b>37,5</b>	2,5
3	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Мира	220	120	197 321,17	<b>40,5</b>	1,5
4	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	197 321,17	<b>61,1</b>	6,2
5	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	<b>62</b>	5
6	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	197 321,17	<b>68</b>	4
7	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,98	<b>69</b>	1
8	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,31	<b>72</b>	2
9	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	200 599,62	<b>72</b>	4
10	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,31	<b>75</b>	3
11	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 618,19	<b>75</b>	3
12	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	197 321,17	<b>76</b>	3
13	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	200 953,17	<b>81</b>	2
14	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 642,56	<b>81</b>	2





№	Муниципальный район	Количество ДОО и готовность документации				Примечание
		2020	%	2021	%	
1	Арский	1	100	0	-	100%
2	Буинский	1	100	0	-	100%
3	Высокогорский	1	100	0	-	100%
4	Нижнекамск	1	100	1	100	100%
5	Нурлатский	0	-	1	100	100%
6	Елабужский	0	-	2	50	50% по 1 объекту не соответствует площадь ЗУ
7	Зеленодольский	1	100	1	0	50% 2021: по 1 объекту не соответствует ВРИ
8	Тукаевский	1	100	1	0	50% 2021: документы по 1 объекту не представлены
9	Альметьевский	1	100	2	0	33% 2021: по 2 объектам документы не представлены



№	Муниципальный район	Количество ДОО и готовность документации				Примечание
		2020	%	2021	%	
10	г.Наб.Челны	3	0%	4	50	28,6% 2020: по 3 объектам не соответствует площадь ЗУ 2021: по 2 объектам не соответствует площадь
11	Камско-Устьинский	0	-	1	0	0% документы не представлены
12	Лаишевский	1	0	1	0	0% документы не представлены
13	Пестречинский	1	0	2	0	0% 2020: не соответствует площадь ЗУ 2021: по 2 объектам документы не представлены



№	Муниципальный район	Количество ДОО и готовность документации				Примечание
		2020	%	2021	%	
14	г.Казань	10	0	10	0	0% 2020: по 5 объектам земля не соответствует, по 4 объектам отсутствуют кадастровые номера; на 1 объект расположен объект кап.строительства 2021: по 4 объектам земля не соответствует по площади, на 1 объекте расположен объект незавершённого строительства и не соответствует ВРИ, на 1 объект расположен объект кап.строительства, частная собственность, по 3 объектам не соответствует ВРИ, 1 объект – земля промышленной зоны
