

Программы капитального ремонта



Многоквартирные дома (МКД)



Образование

4 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

2 программы



Культура

2 программы




Сельское хозяйство и
продовольствие

7 программ

Иные социальные программы 6 программ

Финансирование программы капитального ремонта МКД

Финансирование программы на 2020 год

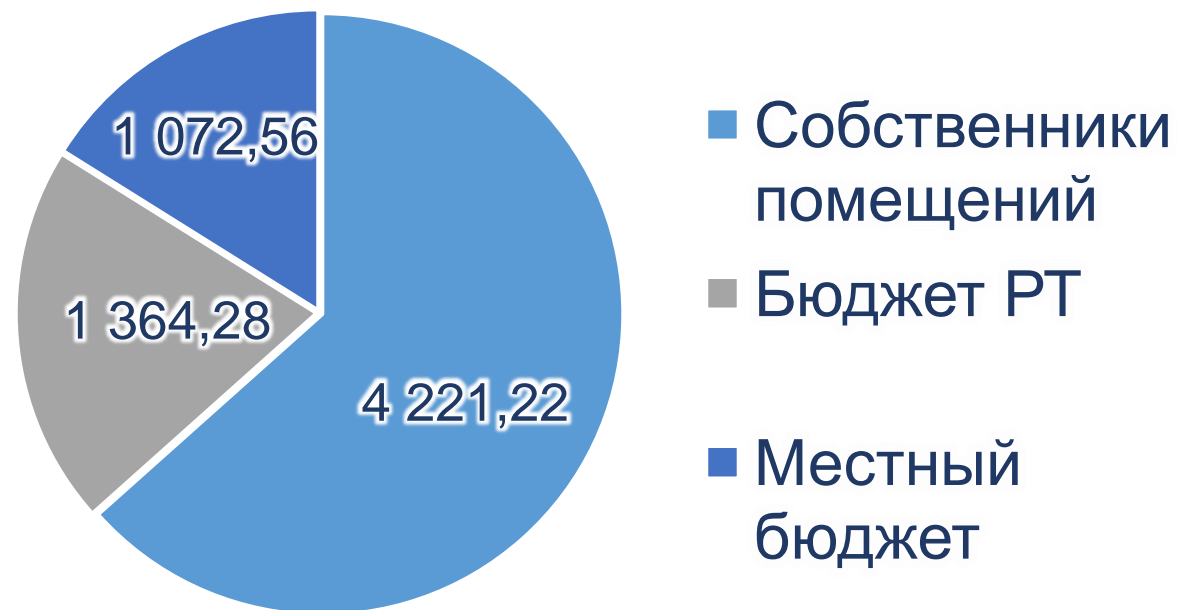

Всего: **1 064 МКД**
6 658,58 млн рублей

Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Кол-во домов	В том числе:		Представлено в Фонд для размещения извещения на электронный аукцион на выполнение СМР
	не требуется	подготовлено заключение	
1 064	8	1 056	1 052

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
1	Агрызский	12	12	12	-	-	-
2	Азнакаевский	31	31	31	-	-	-
3	Аксубаевский	3	3	3	-	-	-
4	Алексеевский	6	6	6	-	-	-
5	Апастовский	3	3	3	-	-	-
6	Арский	9	9	9	-	-	-
7	Бавлинский	10	10	10	-	-	-
8	Балтасинский	3	3	3	-	-	-
9	Буинский	6	6	6	-	-	-
10	Верхнеуслонский	3	3	3	-	-	-
11	Высокогорский	17	17	17	-	-	-
12	К.-Устьинский	4	4	4	-	-	-
13	Кукморский	5	5	5	-	-	-
14	Лаишевский	6	6	6	-	-	-
Итого по РТ		1064	1056	824	62	166	5

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
15	Мамадышский	3	3	3	-	-	-
16	Менделеевский	16	16	16	-	-	-
17	Мензелинский	5	5	5	-	-	-
18	Муслюмовский	2	2	2	-	-	-
19	Пестречинский	9	8	8	-	-	1
20	Р.-Слободский	3	3	3	-	-	-
21	Сабинский	6	6	6	-	-	-
22	Сармановский	15	15	15	-	-	-
23	Тетюшский	5	5	5	-	-	-
24	Тюлячинский	1	1	1	-	-	-
25	Черемшанский	5	5	5	-	-	-
26	Чистопольский	8	8	8	-	-	-
27	Ютазинский	10	10	10	-	-	-
28	Казань	278	278	212	62	-	4
	Итого по РТ	1064	1056	824	62	166	5

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
29	Альметьевский	52	52	50	-	2	-
30	Елабужский	18	18	17	-	1	-
31	г.Наб.Челны	213	213	194	-	19	-
32	Нижнекамский	103	96	83	-	13	-
33	Зеленодольский	42	42	30	-	12	-
34	Заинский	53	53	32	-	21	-
35	Бугульминский	46	46	1	-	45	-
36	Актанышский	3	3	-	-	3	-
37	Лениногорский	21	21	-	-	21	-
38	Новошешминский	5	5	-	-	5	-
39	Нурлатский	13	13	-	-	13	-
40	Спасский	4	4	-	-	4	-
41	Тукаевский	7	7	-	-	7	-
	Итого по РТ	1064	1056	824	62	166	5



Образование

Капитальный ремонт объектов образования
(172 объекта)

Капремонт ресурсных центров
(17 объектов)

Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий
(3 объекта)

Капитальный ремонт теплых туалетов
(286 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

3 051 833,9

658 018,7

190 049,8

110 518,2

Выполнение СМР, %

36,85

27,56

32,7

Ориентировочная дата торгов
15.06.2020

Динамика за
2 недели, %

4,73

6,24

7,3

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Атнинский	16 643,17	1	1,0
2	г.Казань	50 000,00	4	3,0
3	Муслюмовский	16 643,17	7	2,3
4	Нижнекамский	83 473,50	16,7	8,0
5	Мамадышский	19 961,76	21	3,0
6	Чистопольский	75 359,28	29	6,7
7	Камско-Устьинский	16 643,17	30	10,0
8	Менделеевский	6 000,00	30	5,0
9	Арский	10 600,00	33	0,0
10	Кукморский	1 388,00	33	3,0
11	Агрызский	4 543,03	35	5
12	г.Набережные Челны	189 166,70	41	2,0
	ИТОГО	826 747,92	43,3	5,1

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	ИТОГО	826 747,92	43,3	5,1
13	Дрожжановский	16 643,17	45	15,0
14	Зеленодольский	115 669,10	49	4,0
15	Бугульминский	23 211,09	56	4,0
16	Сабинский	20 010,41	62	14,0
17	Высокогорский	27 491,61	66,7	6,3
18	Лаишевский	20 578,71	70	0,0
19	Кайбицкий	16 824,77	80	15,0
20	Аксубаевский	8 158,68	84	5,0
21	Рыбно-Слободский	8 321,59	90	5,0
22	Верхнеуслонский	16 643,17	95	6,0
23	Азнакаевский	16 200,00	97	7,0
24	Апастовский	42 959,00	100	15,0
25	Буинский	3 614,84	100	0,0

Капитальный ремонт объектов образования (коррекционные школы)

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ «Набережночелнинская школа № 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	80 000,00	18	2,0
2	ГБОУ «Кадетская школа № 82 им.Героя Советского Союза Ильдара Маннанова»	132 424,28	25	2,0
ИТОГО		274 424,28	25,2	3,6
3	ГБОУ «Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	62 000,00	35	9,0

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Новошешминский	16 643,17	2	2,0
2	Пестречинский	16 643,10	3	3,0
3	Заинский	28 829,01	9	9,0
4	Тюлячинский	16 643,17	10	5,0
5	Алькеевский	16 643,17	20	4,0
6	г.Казань	440 444,70	21,7	7,1
7	Нижнекамский	160 143,90	26	5,4
8	Чистопольский	43 301,03	28	6,5
9	Актанышский	16 643,17	29	4,0
10	Рыбно-Слободский	8 321,58	29	5,0
11	Черемшанский	16 643,17	30	3,0
12	Тукаевский	16 643,17	31	5,0
	ИТОГО	1 771 706,46	43,2	5,0

Капитальный ремонт ДОО

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	Сармановский	17 431,25	35	5,0
14	Альметьевский	130 959,21	37	6,2
15	Лениногорский	47 745,11	39	4,8
16	Менделеевский	12 309,61	42	5,0
	ИТОГО	1 771 706,46	43,2	5,0
17	Спасский	16 643,17	44	8,5
18	Бугульминский	39 382,47	45	5,0
19	Ютазинский	16 643,17	45	4,0
20	Бавлинский	18 686,05	48	4,0
21	Сабинский	4 500,00	48	14,0
22	г.Набережные Челны	296 495,26	55	2,0
23	Елабужский	60 554,00	58	4,0
24	Нурлатский	27 364,62	58	3,5

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	Агрызский	14 080,28	65	15,0
26	Кукморский	23 373,37	68	10,0
27	Азнакаевский	26 139,00	69	2,0
28	Зеленодольский	88 567,91	71	5,5
29	Аксубаевский	8 484,49	75	5,0
30	Арский	25 064,61	84	9,0
31	Мензелинский	16 643,17	89	4,0
32	Тетюшский	16 643,18	94	2,5
33	Алексеевский	16 643,17	96	7,0
34	Буинский	16 524,68	97	6,5
35	Балтасинский	16 643,17	99	0,0
36	Апастовский	16 643,17	100	0,0
	ИТОГО	1 771 706,46	43,2	5,0

МБДОУ «Малоболгоярский детский сад «Карлыгач», Апастовского МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «СФ СтройГрадИнжиниринг»
Объём финансирования (бюджет РТ): 8,84 млн рублей

МБДОУ «Танай-Тураевский детский сад «Гульбакча», Апастовского МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «СФ СтройГрадИнжиниринг»
Объём финансирования (бюджет РТ): 7,80 млн рублей

Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский	1 200,00	0,0	0,0
2	Аксубаевский	1 200,00	0,0	0,0
3	Алексеевский	1 200,00	0,0	0,0
4	Атнинский	1 200,00	0,0	0,0
5	Бугульминский	1 200,00	0,0	0,0
6	Лениногорский	1 200,00	0,0	0,0
7	Мамадышский	1 200,00	0,0	0,0
8	Мензелинский	1 200,00	0,0	0,0
9	Новошешминский	1 200,00	0,0	0,0
10	Пестречинский	1 200,00	0,0	0,0
11	Р.-Слободский	1 200,00	0,0	0,0
12	Сабинский	1 200,00	0,0	0,0
13	Спасский	1 200,00	0,0	0,0
14	Тюлячинский	1 200,00	0,0	0,0
	Итого	50 400,00	35,7	5,2

Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Чистопольский	1 200,00	0	0,0
16	Буинский	1 200,00	3	3,0
17	Дрожжановский	1 200,00	3	3,0
18	Елабужский	1 200,00	5	5,0
19	Нурлатский	1 200,00	5	5,0
20	Балтасинский	1 200,00	15	15,0
21	Заинский	1 200,00	15	15,0
22	Менделеевский	1 200,00	20	5,0
23	Черемшанский	1 200,00	20	0,0
24	Арский	1 200,00	30	30,0
25	Нижнекамский	1 200,00	32	2,0
26	Ютазинский	1 200,00	35	15,0
	ИТОГО	50 400,00	35,7	5,2
27	Муслюмовский	1 200,00	39	2,0
28	Агрызский	1 200,00	40	5

Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
29	Бавлинский	1 200,00	40	33,0
30	Верхнеуслонский	1 200,00	55	11,0
31	Лаишевский	1 200,00	60	10,0
32	Алькеевский	1 200,00	90	42,0
33	Камско-Устьинский	1 200,00	95	25,0
34	Высокогорский	1 200,00	98	6,0
35	Актанышский	1 200,00	100	0,0
36	Альметьевский	1 200,00	100	0,0
37	Апастовский	1 200,00	100	5,0
38	Зеленодольский	1 200,00	100	0,0
39	Кайбицкий	1 200,00	100	0,0
40	Кукморский	1 200,00	100	2,0
41	Тетюшский	1 200,00	100	0,0
42	Тукаевский	1 200,00	100	0,0
ИТОГО		50 400,00	35,7	5,2

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	17 500,00	0,0	0,0
2	ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж»	15 000,00	0,0	0,0
3	ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова»	50 000,00	1,0	1,0
4	ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	6 000,00	2,0	2,0
5	ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»	15 000,00	5,0	5,0
6	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»	115 000,00	8,0	5,5
7	ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж»	10 000,00	15,0	5,0
8	ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»	50 000,00	20,0	4,0
9	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	95 000,00	23,0	3,0
ИТОГО		658 018,70	27,56	6,24

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум»	80 000,00	24,0	13,0
	ИТОГО	658 018,70	27,56	6,24
11	ГАПОУ «Лубянский лесотехнический колледж»	29 000,00	28,0	8,0
12	ГАПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий»	30 000,00	43,0	13,0
13	ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева»	45 000,00	49,0	6,0
14	Филиал ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж им.В.В.Дементьева»	7 500,00	70,0	56,0
15	Филиал ГАПОУ «Нижекамский агропромышленный колледж»	32 018,70	70,0	6,0
16	ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»	54 500,00	77,0	5,0
17	ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»	6 500,00	88,0	1,0

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум»	83 123,33	28	5,0
2	ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»	79 854,64	34	7,0
3	ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», Кукморский	27 071,81	43	15,0
ИТОГО		190 049,8	32,7	7,3



Спорт

Капитальный ремонт
спортивных объектов
(23 объекта)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР, %

Динамика за
2 недели, %

489 305,94

28,2

12,2

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Здание крытого плавательного бассейна МБУ «Спортивная школа», Новошешминский	3 943,72	0	0
2	МБУ «Спортивная школа «Зай», Заинский	40 011,60	3	3
3	МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Касатка», г.Казань	29 723,03	8	2
4	МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма», г.Казань	37 782,08	12	2
5	МБУ «Спортивная школа», Алексеевский	41 866,04	13	1
6	МБУ «Спортивная школа», Балтасинский	18 548,97	17	4
7	ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», г.Казань,	19 625,34	18	11
8	МБУ «Спортивная школа № 5 «Дельфин», Зеленодольский	26 549,44	18	13
9	ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе», Верхнеуслонский	14 626,60	24	14
10	МБУ «Спортивная школа по настольному теннису», Альметьевский	9 052,47	27	7
ИТОГО		489 305,94	28,2	12,2

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	МБУ «Спортивная школа «Юность» имени Е.А.Тимерзянова», Бугульминский	7 613,69	30	5
12	МБУ «Спортивная школа «Татнефть Олимп», Чистопольский	18 328,26	31	6
13	МБУ «Спортивная школа «Мотор» г.Казань	29 755,47	35	7
14	ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк», г.Зеленодольск	20 364,21	40	0
15	МБУ «Спортивная школа № 1», Лениногорский	44 244,68	47	5
16	Здание лыжной базы МБУ «Спортивная школа «Старт», Сармановский	7 429,12	50	5
17	МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский	8 610,56	58	19
18	ЖК МБУ «Спортивная школа», Аксубаевский	6 505,28	60	10
19	МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский	26 404,65	61	10
20	МБУ «Спортивная школа «Мотор», г.Казани	8 334,93	68	8
21	ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк», г.Зеленодольск	15 091,67	80	32
22	МБУ «Спортивная школа «Юность», Буинский	29 072,95	90	10
ИТОГО		489 305,94	28,2	12,2



Молодежная политика

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР, %

Динамика за
2 недели, %

Капитальный ремонт
детских лагерей
(6 объектов)

258 447,35

67,74

12,34

Капитальный ремонт
подростковых клубов
(17 объектов)

39 812,10

65,18

7,33

Капитальный ремонт
молодежных центров
(5 объектов)

284 603,6

24,4

8,35

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	54 352,32	33,00	2,00
2	Оздоровительный лагерь «Юнитур», г.Казань	37 080,00	49,00	5,00
ИТОГО		258 447,35	67,74	12,34
3	ДОЛ «Свияга+» (Корпус №1), Апастовский	85 405,75	70,00	10,00
4	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	55 869,28	97,00	3,00
5	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	22 240,00	100,00	6,74
6	ДОЛ «Кама», Мамадышский	3 500,00	100,00	27,50

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Цудзуки», г.Казань	300,00	0,00	0,00
2	Подростковый клуб «Юниор», г.Казань	2 400,00	5,00	0,00
3	Молодежный клуб здорового образа жизни «Спарта», Заинский	9 844,10	11,00	4,50
4	Подростковый клуб «Ровесник», Агрызский	6 005,20	17,00	3,00
5	Подростковый клуб «Свои», г.Казань	1 000,00	25,00	6,00
6	Подростково-молодежный клуб «Ровесник», г.Наб.Челны	2 793,30	32,00	4,00
7	Подростковый клуб «Алгарыш», Нижнекамский	4 976,40	40,00	7,00
8	Подростковый клуб «Искра», Альметьевский	3 452,80	45,00	4,00
9	Подростковый клуб «Луч», Нижнекамский	3 135,40	48,00	6,00
ИТОГО		39 812,10	65,18	7,33

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	Подростковый клуб спортивно-патриотической направленности «Пегас», Бавлинский	7 003,60	49,00	7,00
11	Подростковый клуб «Алые паруса», Нижнекамский	3 672,20	49,00	6,00
12	Подростковый клуб «Ротор», Альметьевский	3 819,60	52,00	4,00
13	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	3 719,20	55,00	22,00
14	Подростковый клуб «Дорожник», Альметьевский	4 887,40	60,00	15,00
15	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	3 721,60	60,00	10,00
	ИТОГО	39 812,10	65,18	7,33
16	Подростковый клуб «Ступени», г.Казань	2 065,70	73,00	13,00
17	Подростковый клуб «Мастерица», г.Казань	2 184,20	73,00	11,00

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	45 000,0	7,0	3,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	96 000,0	17,0	3,0
3	Филиал ГБУ «Молодежный центр», Зеленодольский	106 013,0	24,0	15,0
ИТОГО		284 603,6	24,4	8,35
4	МБУ "Молодежный центр "Хыял", Балтасинский	25 035,5	73,0	11,0
5	МБУ "Молодежный центр "Алан", Нижнекамский	6 720,6	93,0	6,0



Здравоохранение

Капитальный ремонт
объектов здравоохранения
(8 объектов)

Капитальный ремонт
стационаров
(15 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

69 169,55

1 588 903,09

Выполнение СМР, %

Сбор документации

41,55

Динамика за
2 недели, %

2,97

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Набережные Челны	стационар, г.Наб.Челны, ул.Набережная им.Габдуллы Тукая, д.39	24 257,16	0,00	0,00
2	ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани	здание лечебного корпуса №2, г.Казань, ул.Исаева, д.5	90 000,00	0,00	0,00
3	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»	стационар, г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	137 563,82	0,00	0,00
4	ГАУЗ «Нижекамская центральная районная многопрофильная больница»	инфекционный корпус, г.Нижекамск, ул.Ахтубинская, д.11Д	37 283,58	0,00	0,00
5	ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района»	инфекционный корпус, Алькеевский, с.Базарные Матаки, ул.Базарная, д.2	62 016,87	3,00	3,00
6	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»	лечебный корпус №3, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.14	81 088,11	3,50	2,27
ИТОГО			1 588 903,09	41,55	2,97

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница»	лечебный корпус, г.Азнакаево, ул. Хасаншиной, д.21	73 348,25	6,00	3,00
8	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница»	палатный корпус, г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	110 086,63	15,00	3,00
9	ГАУЗ "Нижекамская центральная районная многопрофильная больница"	лечебный корпус №3, г.Нижекамск, ул.Ахтубинская, д.13	191 024,83	28,00	5,00
10	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница»	инфекционное отделение, г.Бугульма, ул.Ленина, д.90	153 000,00	35,00	13,00
ИТОГО			1 588 903,09	41,55	2,97
11	ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница»	лечебный корпус, г.Тетюши, ул.Ленина, д.11, стр.1	45 000,00	60,00	5,00
12	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»	корпус А, В г.Буинск, ул.Ефремова, д.137	104 945,17	80,00	10,00

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница»	блоки "В1" и "В2", г.Наб.Челны, пр.Московский, д.85	436 854,94	100,00	0,00
14	ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»	здание дневного стационара поликлиники (стоматологическое и диагностическое отделения), пгт.Апастово, ул.Красноармейская, д.93	18 000,00	100,00	2,00
15	ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»	здание дневного стационара поликлиники, Апастовский, с.Среднее Балтаево, ул.Новая, д.233	24 433,73	100,00	0,00
ИТОГО			1 588 903,09	41,55	2,97



Культура

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
(37 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

410 094,60

Выполнение СМР, %

65,74

Динамика за
2 недели, %

6,0

Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры
(8 объектов)

138 042,0

46,02

5,73

Капитальный ремонт объектов культурного назначения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МБУК города Казани «Культурный центр Залесный»	24 000,00	0,00	0,0
2	СДК с.Аксарино, Заинский	11 000,00	19,00	13,0
3	СДК с.Тавели, Мамадышский	11 083,23	26,00	3,0
4	СДК с.Крынды, Агрызский	10 900,00	40,00	11,0
5	СДК с.Нижняя Уратьма, Нижнекамский	15 000,00	42,00	12,0
6	СДК с.Антоновка, Спасский	11 935,17	43,00	5,0
7	СДК с.Березняк, Кукморский	1 996,51	47,00	4,0
8	СДК с.Татарские Челны, Менделеевский	14 629,82	47,00	3,0
9	СДК с.Старые Бугады, Актанышский	14 549,96	48,00	4,0
10	СДК с.Старые Кутуши, Черемшанский	13 650,08	52,00	5,0
11	СДК д.Смаиль, Балтасинский	19 256,97	53,00	8,0
12	СДК с.Большой Шинар, Сабинский	12 000,00	53,00	8,0
	ИТОГО	410 094,60	65,74	6,0

Капитальный ремонт объектов культурного назначения

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	СДК с.Большие Полянки, Алексеевский	10 988,04	54,00	9,0
14	СДК с.Крым-Сарай, Бавлинский	10 372,47	54,00	14,0
15	СДК с.Ивановка, Лениногорский	13 658,85	63,00	5,0
16	СДК с.Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский	11 923,58	65,00	15,0
17	СДК д.Балчиклы, К.-Устьинский	5 831,70	65,00	10,0
	ИТОГО	410 094,60	65,74	6,0
18	СДК д.Татарское Танаево, Зеленодольский	14 609,88	69,00	4,0
19	СДК д.Зеленая Роща, Бугульминский	12 719,55	70,00	15,0
20	СДК с.Киртели, Тетюшский	11 070,03	76,00	1,0
21	СДК с.Азалаково, Сармановский	10 964,19	86,00	7,0
22	СДК с.Молвино, Зеленодольский	7 616,23	87,00	4,0
23	СДК с.Баландыш, Тюлячинский	9 170,85	87,00	12,0
24	СДК с.Тяжбердино, Алькеевский	11 341,09	88,00	3,0

Капитальный ремонт объектов культурного назначения

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	СДК с.Печищи, Верхнеуслонский	7 434,20	88,00	8,0
26	СДК с.Новые Усы, Муслюмовский	9 258,82	93,00	8,0
27	СДК с.Большой Менгер, Атнинский	12 500,02	96,00	1,0
28	СДК с.Бехтерево, Елабужский	8 196,18	97,00	7,0
29	СДК д.Малая Шильна, Тукаевский	20 363,13	97,00	6,0
30	СДК с.Байларово, Ютазинский	6 095,39	99,00	2,0
31	СДК с.Среднее Балтаево, Апастовский	19 485,00	100,00	0,0
32	СК с.Сердебаш, Арский	2 917,66	100,00	5,0
33	СДК д.Тингаш, Буинский	11 551,71	100,00	0,0
34	СДК с.Багаево, Кайбицкий	10 000,00	100,00	0,0
35	СК с.Урясьбаш, Кукморский	2 997,57	100,00	0,0
36	СДК с.Туембаш, Кукморский	2 011,00	100,00	0,0
37	СДК с.Кобяково, Пестречинский	7 015,72	100,00	3,0
ИТОГО		410 094,60	65,74	6,0

СДК с.Среднее Балтаево, Апастовского МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «СФ СтройГрадИнжиниринг»
Объём финансирования (бюджет РТ): 19,49 млн рублей

Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З.Яруллина», Альметьевский	41 519,92	13,0	4,0
2	МБОУДО «Детская школа искусств», Агрызский	10 845,65	35,0	5,0
3	МБОУДО «Актюбинская детская школа искусств», Азнакаевский	10 843,39	37,0	2,0
4	МБОУДО «Детская школа искусств г.Зеленодольска Республики Татарстан», Зеленодольский	17 926,48	42,0	4,0
	ИТОГО	138 042,0	46,02	5,73
5	МБОДО «Лениногорская детская художественная школа им.М.Х.Хаертдинова», Лениногорский	11 490,06	57,0	2,0
6	МБОУДО «Детская школа искусств», Пестречинский	15 076,13	60,0	0,0
7	МБОДО «Детская художественная школа», Чистопольский	7 264,03	63,0	4,0
8	МБОУДО «Апастовская детская школа искусств», Апастовский	23 076,34	98,0	18,0



Сельское хозяйство

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (127 объектов)	329,41	16,05	16,05
Капитальный ремонт конеферм (11 объектов)	32,85	16,57	16,57
Капитальный ремонт коровников (158 объектов)	601,15	11,68	11,68
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (66 объектов)	164,35	12,02	12,02
Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ (12 объектов)	66,67	0,23	0,23
Капитальный ремонт птицеферм (12 объектов)	66,31	4,83	4,83
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (41 объект)	59,59	82,73	6,15

Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	УСХП в Сармановском МР	398,00	0,00	0,00
2	УСХП в Высокогорском МР	497,50	17,00	17,00
3	УСХП в Лениногорском МР	1 978,06	23,00	3,00
4	ВО в Агрызском МР	486,55	27,00	3,00
5	ВО в Алькеевском МР	1 183,05	30,00	30,00
6	ВО в Мамадышском МР	635,80	33,00	2,00
7	ВО в Мамадышском МР	1 332,30	33,00	2,00
8	УСХП в Агрызском МР	497,50	34,00	4,00
9	УСХП в Бавлинском МР	995,00	53,00	9,00
10	ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»	4 901,24	54,00	2,00
11	ВО в Азнакаевском МР	785,05	60,00	25,00
12	УСХП в Бугульминском МР	2 475,56	69,00	5,00
	Итого	59 592,00	82,73	6,15

Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства


№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	ВО в Буинском МР	1 979,05	80,00	10,00
14	ВО в Буинском МР	1 481,55	80,00	10,00
15	ВО в Муслюмовском МР	1 183,05	80,00	10,00
16	УСХП в Дрожжановском МР	1 480,56	90,00	20,00
17	УСХП в Лаишевском МР	796,00	95,00	0,00
18	ВО в Нижнекамском МР	1 481,55	97,00	4,00
19	ВО в Пестречинском МР	1 979,05	98,00	0,00
20	УСХП в Буинском МР	1 492,50	98,00	0,00
21	ВО в Бавлинском МР	984,05	99,00	0,00
22	ВО в Новошешминском МР	984,05	99,00	0,00
23	ВО в Ютазинском МР	486,55	99,00	0,00
24	ВО в Актанышском МО	2 960,12	100,00	0,00
Итого		59 592,00	82,73	6,15

Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	ВО в Алексеевском МР	486,55	100,00	0,00
26	ВО в Альметьевском МР	2 476,55	100,00	0,00
27	ВО в Арском МР	984,05	100,00	0,00
28	ВО в Балтасинском МР	2 376,00	100,00	0,00
29	ВО в Заинском МР	2 476,55	100,00	0,00
30	ВО в Камско-Устьинском МР	486,55	100,00	0,00
31	ВО в Лениногорском МР	1 481,55	100,00	0,00
32	ВО в Мензелинском МР	1 481,55	100,00	0,00
33	ВО в Сабинском МР	2 377,05	100,00	0,00
34	ВО в Сармановском МР	984,05	100,00	0,00
35	ВО в Тюлячинском МР	984,05	100,00	0,00
36	УСХП в Актанышском МР	3 152,16	100,00	20,00
	Итого	59 592,00	82,73	6,15

Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
37	УСХП в Алексеевском МР	497,50	100,00	9,00
38	УСХП в Апастовском МР	1 492,50	100,00	0,00
39	УСХП в Кукморском МР	2 475,56	100,00	0,00
40	УСХП в Нижнекамском МР	995,00	100,00	2,00
41	УСХП в Тетюшском МР	497,50	100,00	0,00
	Итого	59 592,00	82,73	6,15

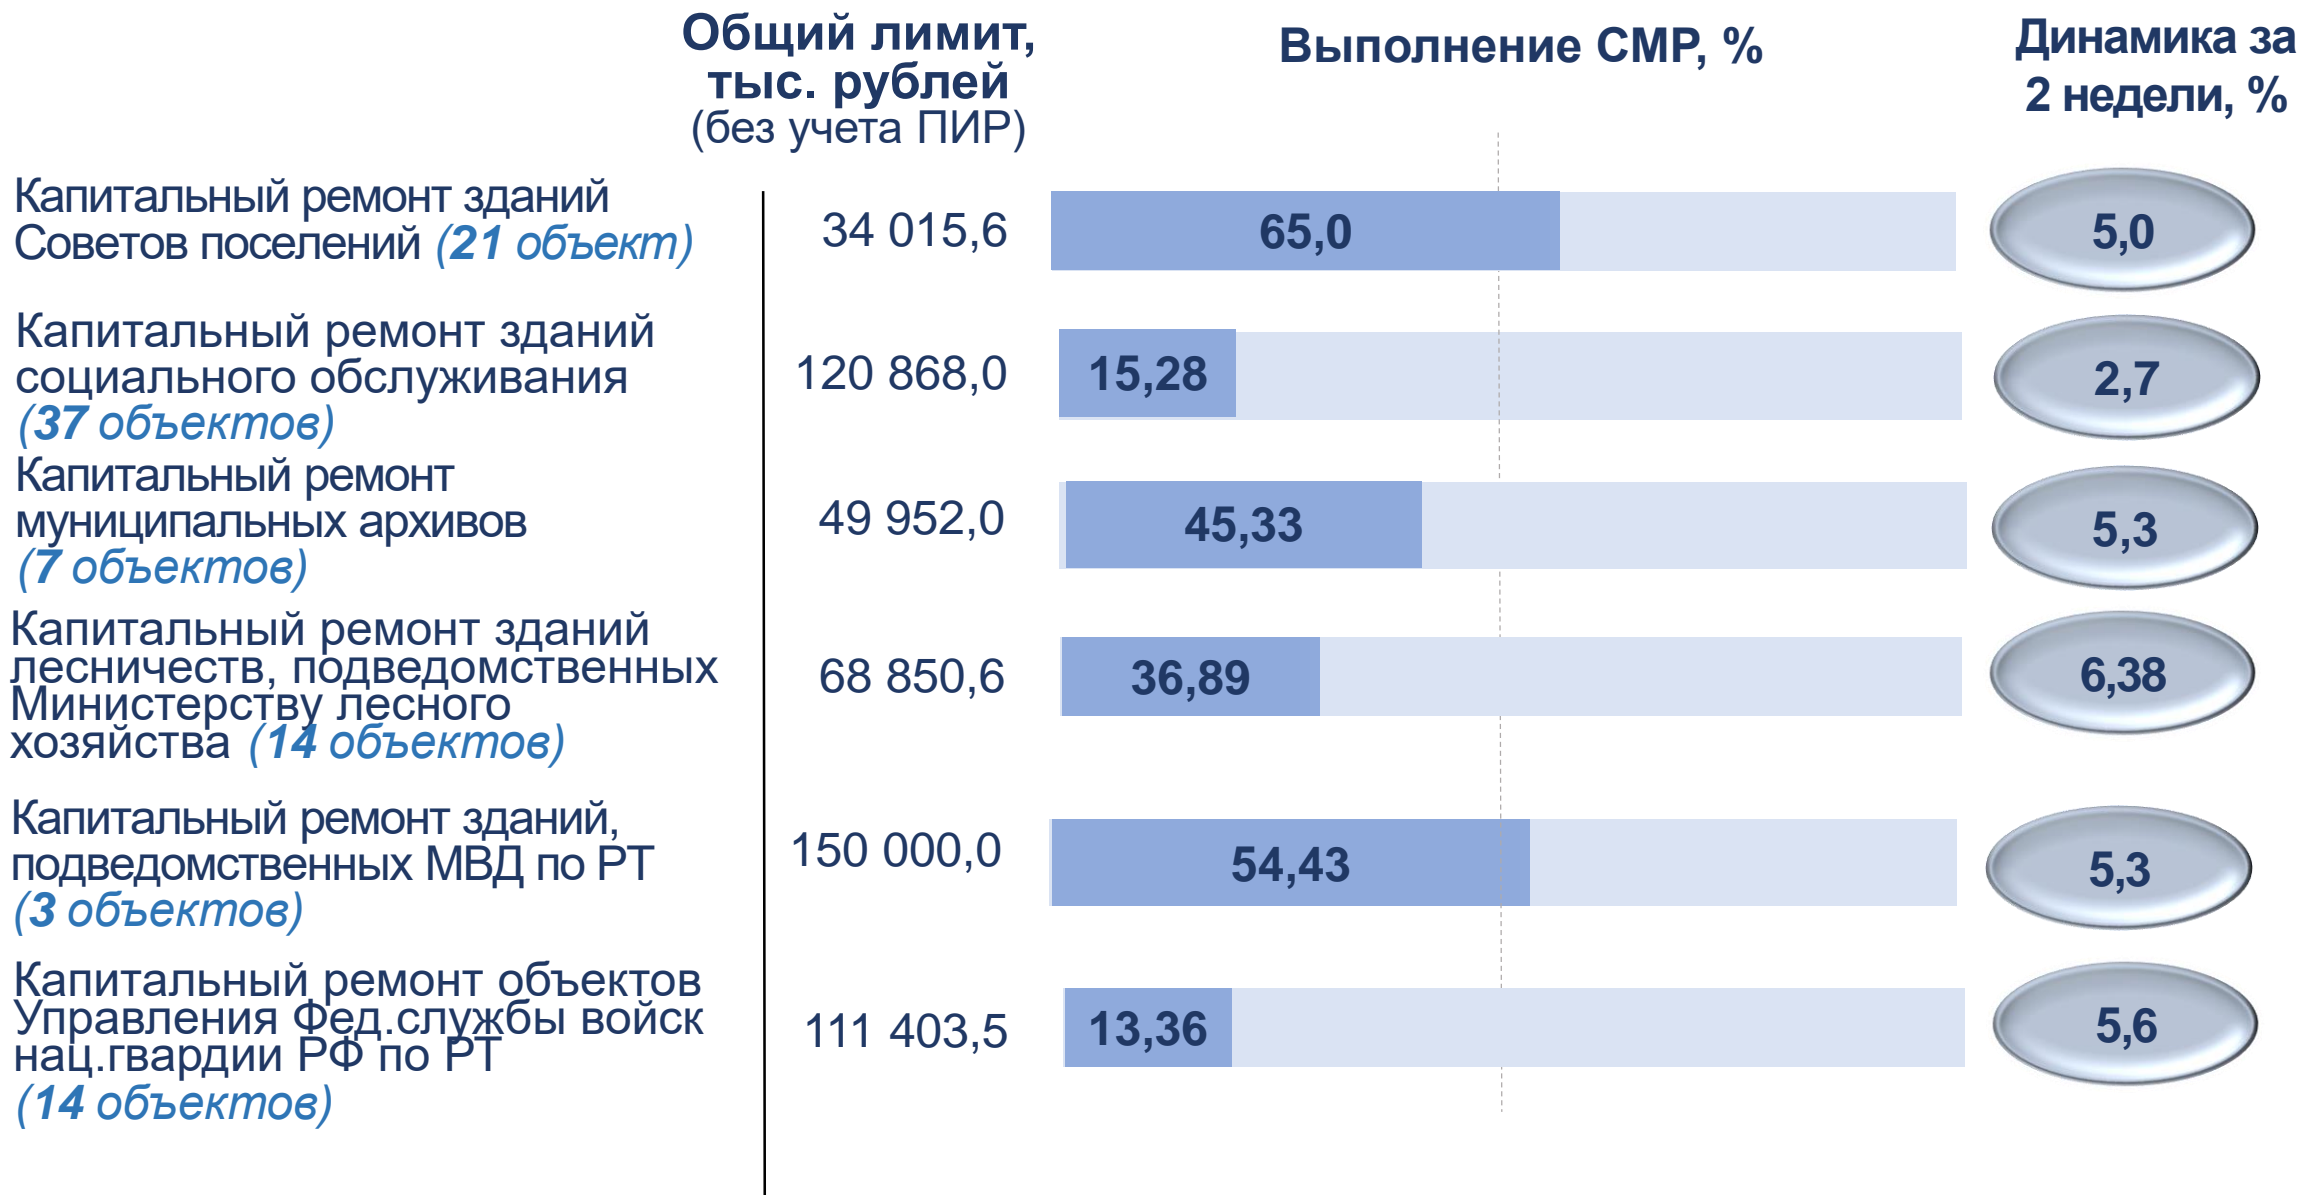

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Вязовское сельское поселение, Бугульминский	2 001,93	0,0	0,0
2	Измерское сельское поселение, Спасский	2 100,00	0,0	0,0
3	Ромодановское сельское поселение, Алексеевский	1 138,71	2,0	0,0
4	Татарско-Баганинское сельское поселение, Чистопольский	1 837,80	8,0	8,0
5	Нижнесуньское сельское поселение, Мамадышский	1 902,64	25,0	2,0
6	Маломеминское сельское поселение, Кайбицкий	1 231,08	30,0	30,0
7	Кошкинское сельское поселение, Алькеевский	2 100,00	40,0	20,0
8	Урманаевское сельское поселение, Азнакаевский	2 100,00	50,0	10,0
	Итого	34 015,60	65,0	5,0
9	Майскогорское сельское поселение, Нижнекамский	705,02	85,0	10,0
10	Новоаксубаевское сельское поселение, Аксубаевский	2 100,00	91,0	2,0
11	Звездинское сельское поселение, Дрожжановский	1 762,45	98,0	0,0

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Акбуринское сельское поселение, Новошешминский	1 855,44	98,0	0,0
13	Петровско-Заводское сельское поселение, Сармановский	940,82	98,0	0,0
14	Казкеевское сельское поселение, Актанышский	1 200,00	100,0	0,0
15	Аппаковское сельское поселение, Альметьевский	1 302,00	100,0	0,0
16	Шишинерское сельское поселение, Балтасинский	2 100,00	100,0	0,0
17	Старостуденецкое сельское поселение, Буинский	2 100,00	100,0	0,0
18	Бегишевское сельское поселение, Заинский	2 038,98	100,0	11,0
19	Селенгушское сельское поселение, Нурлатский	906,62	100,0	0,0
20	Кильдюшевское Сельское поселение, Тетюшский	739,50	100,0	25,0
21	Аланское сельское поселение, Тюлячинский	1 852,61	100,0	0,0
ИТОГО		34 015,60	65,0	5,0

Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Аксубаевский	5 500,00	0,0	0,0
2	ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,00	0,0	0,0
3	ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 750,00	0,0	0,0
4	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», Арский	3 000,00	0,0	0,0
5	ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия», Арский	3 500,00	0,0	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,00	0,0	0,0
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 000,00	0,0	0,0
8	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Теплый дом», Дрожжановский	4 900,00	0,0	0,0
9	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	3 500,00	0,0	0,0
	Итого	119 750,0	15,28	2,7

Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Зеленодольский	3 000,00	0,0	0,0
11	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель», Зеленодольский	3 000,00	0,0	0,0
12	ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 500,00	0,0	0,0
13	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	6 000,00	0,0	0,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный», г.Казань	5 000,00	0,0	0,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка», г.Казань	2 000,00	0,0	0,0
16	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	2 500,00	0,0	0,0
17	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» (компенсационных выплат), г.Казань	4 600,00	0,0	0,0
18	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 000,00	0,0	0,0
ИТОГО		119 750,0	15,28	2,7

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
19	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ», г.Набережные Челны	2 000,00	0,0	0,0
20	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,00	0,0	0,0
21	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч», Рыбно-Слободский	2 000,00	0,0	0,0
22	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток», Набережные Челны	4 000,00	1,0	1,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», г.Набережные Челны	3 000,00	1,0	1,0
24	ГАУСО «КЦСОН «Радуга», Бугульминский	2 500,00	2,0	2,0
25	ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном районе»	2 500,00	2,0	2,0
26	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,00	7,0	0,0
27	ГАУСО «КЦСОН «Шафкатъ», Сармановский	3 500,00	9,0	3,0
	ИТОГО	119 750,0	15,28	2,7

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,00	10,0	8,0
	ИТОГО	119 750,0	15,28	2,7
29	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	25,0	0,0
30	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие», Кукморский	4 500,00	50,0	5,0
31	ГАУСО «КЦСОН «Тетюшское сияние», Тетюшский	4 000,00	60,0	8,0
32	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 000,00	70,0	60,0
33	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран», Альметьевский	2 500,00	75,0	47,0
34	ГАУСО «КЦСОН «Нежность», Аксубаевский	3 000,00	81,0	5,0
35	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш», Нижнекамский	2 000,00	92,0	2,0
36	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Забота», Алексеевский	2 000,00	95,0	1,0
37	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч», Лениногорский	2 000,00	100,0	0,0

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Аксубаевский	87,97	0,0	0,0
2	Высокогорский	1 421,33	5,0	5,0
3	Спасский	1 040,82	15,0	0,0
4	Лаишевский	537,82	30,0	20,0
5	Тукаевский	36 430,38	38,0	6,0
	ИТОГО	49 952,00	45,33	5,3
6	Кукморский	10 075,23	80,0	5,0
7	Ютазинский	358,45	99,0	0,0

Капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Административное здание Сабинского участкового лесничества	4 904,50	0,00	0,00
2	Административное здание Мешешашского участкового лесничества, Сабинский	260,96	0,00	0,00
3	Административное здание Высокогорского участкового лесничества	1 302,10	5,00	5,00
4	Административное здание Матюшинского участкового лесничества, г.Казань	3 102,56	10,00	10,00
5	Административное здание ГКУ «Бугульминское лесничество»	4 402,99	14,00	7,00
6	Административное здание Сабабашского участкового лесничества, Сабинский	435,70	16,00	0,00
7	Здание факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета	29 725,88	29,00	4,00
8	Ремонт гаража для пожарно-химической станции - II типа, Нурлатский	2 125,54	32,00	21,00
ИТОГО		68 850,66	36,89	6,38

Капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	ИТОГО	68 850,66	36,89	6,38
9	Ремонт гаража для пожарно-химической станции - II типа, Нижнекамский	6 381,87	42,00	7,00
10	Административное здание ГКУ «Аксубаевское лесничество»	4 570,00	45,00	10,00
11	Административное здание Шеморданского участкового лесничества, Сабинский	1 077,95	63,00	0,00
12	Административное здание Ленинского участкового лесничества, Тюлячинский	833,31	80,00	4,00
13	Административное здание ГКУ «Заинское лесничество»	4 726,90	89,00	24,00
14	Административное здание ГКУ «Тетюшское лесничество»	5 000,40	95,00	0,00

Капитальный ремонт зданий подведомственных МВД по РТ

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Административное здание отдела МВД России по Тукаевскому району	82 306,65	46,00	0,00
	ИТОГО	150 000,00	54,43	5,30
2	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	62 543,89	66,00	6,00
3	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	5 149,46	100,00	10,00

Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ОВО по Алексеевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Алексеевский	830,71	0,00	0,00
2	ОВО по Арскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Арский	1018,88	0,00	0,00
3	ОВО по Бугульминскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Бугульминский	3014,28	0,00	0,00
4	ОВО по Агрызскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Агрызский	4293,62	0,00	0,00
5	ОВО по Заинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Заинский	9462,1	0,00	0,00
6	ОВО по Мензелинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Мензелинский	5238,66	0,00	0,00
7	ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Альметьевский	10678,6	4,00	4,00
	ИТОГО	111 403,45	13,36	5,60

Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	УВО по г.Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», г. Казань, ул. Р.Зорге, д.31а	8687,31	10,00	8,00
9	ОВО по Нижнекамскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Нижнекамск	2578,16	12,00	2,00
10	УВО по г.Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», г. Казань, ул. Центральная, д.64	8275,91	13,00	3,00
ИТОГО		111 403,45	13,36	5,60
11	УВО по г.Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», г. Казань, ул. Отрадная, д.36	14842,5	16,00	4,00
12	ОВО по Лениногорскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Лениногорский	22656,94	20,00	15,00
13	ОВО по Зеленодольскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Зеленодольский	17698,71	25,00	8,00
14	ОВО по Балтасинскому район - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Балтасинский	2127,07	55,00	25,00

План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

№	Наименование программы	План	Ход выполнения СМР	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	- 220 км водопровода; - 30 скважин; - 35 водонапорных башен	- 34,3 км водопровода; - 4 скважины; - 5 водонапорных башен	14 %	8 %
2	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	замена 113 котлов на 65 объектах	- демонтаж 48 котлов на 27 объектах; - монтаж 15 котлов на 9 объектах	12 %	9 %

План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

№	Наименование программы	План	Ход выполнения СМР	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
3	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ	- перевод на инд. системы отопления 1 353 квартиры; - установка 29 котлов на объектах СКБ; - строительство 14 км газопроводов	монтаж: - фасадных газопроводов – 925 квартир; - системы отопления – 284 квартиры	21 %	9 %
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	- 12 177 светильников; - 252 км СИП	- 1359 светильников; - 32,4 км СИП	11 %	7 %
5	Модернизация систем водоотведения	17 МО, 27 объектов	Торги проведены	Дата заключения ГК -15 июня 2020	

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Кукморский	16	Мензелинский	31	Тюлячинский
2	Лениногорский	17	Менделеевский	32	Тукаевский
3	Пестречинский	18	Атнинский	33	Аксубаевский
4	Высокогорский	19	Балтасинский	34	Заинский
5	Рыбно-Слободский	20	Апастовский	35	Лаишевский
6	Ютазинский	21	Алькеевский	36	г. Набережные Челны
7	Сармановский	22	Камско-Устьинский	37	Дрожжановский
8	Тетюшский	23	Агрызский	38	Алексеевский
9	Зеленодольский	24	Верхнеуслонский	39	Арский
10	Чистопольский	25	Сабинский	40	г. Казань
11	Актанышский	26	Бугульминский	41	Новошешминский
12	Елабужский	27	Нурлатский	42	Кайбицкий
13	Альметьевский	28	Буинский	43	Нижнекамский
14	Спасский	29	Муслюмовский	44	Черемшанский
15	Мамадышский	30	Азнакаевский	45	Бавлинский

MP РТ предоставившие от 10 до 31% документов от общего необходимого количества

Строительство, реконструкция объекта:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- в случае реконструкции – правоустанавливающие документы на здание;
- градостроительный план земельного участка;
- утвержденное техническое задание на проектирование;
- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Капитальный ремонт объекта:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект;
- технический паспорт БТИ на объект;
- утвержденное техническое задание на проектирование (при необходимости разработки проектно-сметной документации).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
