



# Программы капитального ремонта



Многоквартирные дома (МКД)



Образование

4 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

2 программы



Культура

2 программы




Сельское хозяйство и  
продовольствие

7 программ

Иные социальные программы 6 программ

# Финансирование программы капитального ремонта МКД

## Финансирование программы на 2020 год

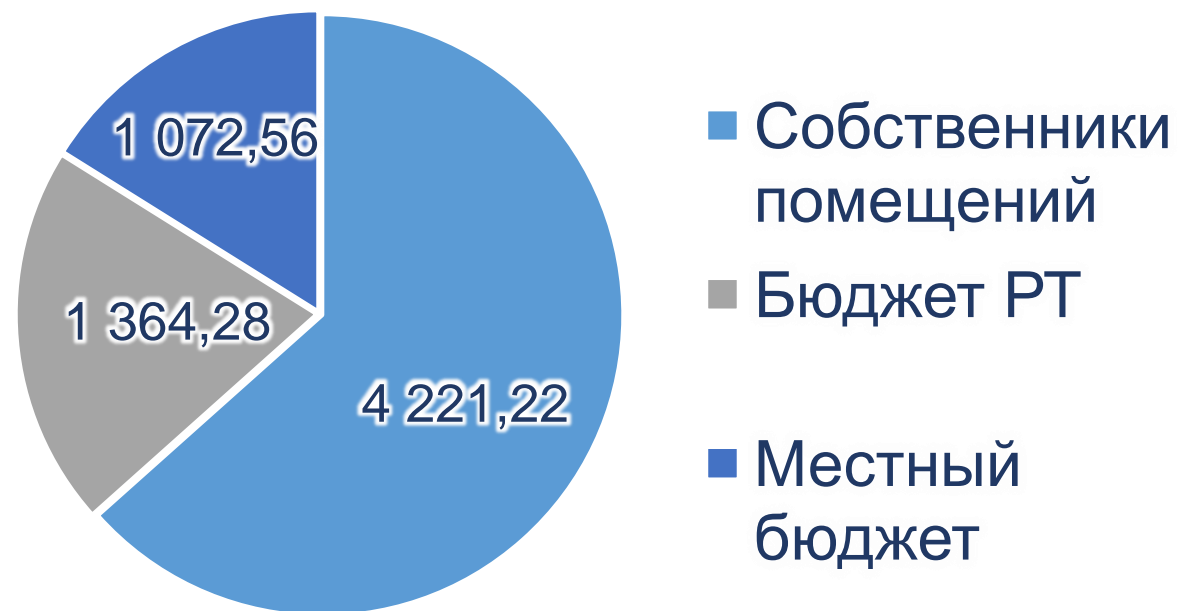

Всего: **1 064 МКД**  
**6 658,58 млн рублей**



# Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Кол-во ДОМОВ	В том числе:		Представлено в Фонд для размещения извещения на электронный аукцион на выполнение СМР
	не требуется	подготовлено заключение	
1 064	8	1 056	1 053



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
1	Агрызский	12	12	12	-	-	-
2	Азнакаевский	31	31	31	-	-	-
3	Аксубаевский	3	3	3	-	-	-
4	Алексеевский	6	6	-	6	-	-
5	Апастовский	3	3	3	-	-	-
6	Арский	9	9	-	9	-	-
7	Бавлинский	10	10	10	-	-	-
8	Балтасинский	3	3	3	-	-	-
9	Буинский	6	6	6	-	-	-
10	Верхнеуслонский	3	3	3	-	-	-
11	Высокогорский	17	17	-	17	-	-
12	К.-Устьинский	4	4	4	-	-	-
13	Кукморский	5	5	-	5	-	-
14	Лаишевский	6	6	-	6	-	-
<b>Итого</b>		<b>1064</b>	<b>1056</b>	<b>499</b>	<b>325</b>	<b>228</b>	<b>4</b>



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заклучен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
15	Мамадышский	3	3	3	-	-	-
16	Менделеевский	16	16	16	-	-	-
17	Мензелинский	5	5	5	-	-	-
18	Муслюмовский	2	2	2	-	-	-
19	Пестречинский	9	8	7	-	-	1
20	Р.-Слободский	3	3	3	-	-	-
21	Сабинский	6	6	-	6	-	-
22	Сармановский	15	15	15	-	-	-
23	Тетюшский	5	5	5	-	-	-
24	Тюлячинский	1	1	-	1	-	-
25	Черемшанский	5	5	5	-	-	-
26	Чистопольский	8	8	-	8	-	-
27	Ютазинский	10	10	10	-	-	-
28	Альметьевский	52	52	50	-	2	-
	<b>Итого</b>	<b>1064</b>	<b>1056</b>	<b>499</b>	<b>325</b>	<b>228</b>	<b>4</b>



# Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор	НЕ представлено в Фонд на торги
29	Елабужский	18	18	17	-	1	-
30	г.Наб.Челны	213	213	78	116	19	-
31	Нижнекамский	103	96	83	-	13	-
32	Казань	278	278	89	121	62	3
33	Зеленодольский	42	42	-	30	12	-
34	Заинский	53	53	32	-	21	-
35	Бугульминский	46	46	1	-	45	-
36	Актанышский	3	3	-	-	3	-
37	Лениногорский	21	21	-	-	21	-
38	Новошешминский	5	5	-	-	5	-
39	Нурлатский	13	13	-	-	13	-
40	Спасский	4	4	-	-	4	-
41	Тукаевский	7	7	-	-	7	-
	<b>Итого</b>	<b>1064</b>	<b>1056</b>	<b>499</b>	<b>325</b>	<b>228</b>	<b>4</b>



# Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика за 2 недели, %
		План	Факт	
Капитальный ремонт объектов образования (172 объекта)	3 051 833,9	52,08	49,6	9,5
Капремонт ресурсных центров (17 объектов)	658 018,7	42,05	37,05	9,49
Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий (3 объекта)	190 049,8	46,12	37,9	5,2
Капитальный ремонт теплых туалетов (286 объектов)	110 518,2	0,0	Г/контракт заключен 26.06.2020г.	



# Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Нижнекамский, МБОУ «Верхнечелнинская средняя общеобразовательная школа»	3 000,00	7	7,0	0,0
2	г.Казань, МАОУ «Гимназия-интернат №4»	50 000,00	7	3,0	0,0
3	Муслюмовский, МБОУ «Баланнинская основная общеобразовательная школа»	16 643,17	9	2,0	0,0
4	Атнинский, МБОУ «Кулле-Киминская основная общеобразовательная школа имени Сибгата Хакима»	16 643,17	15	14,0	0,0
5	Мамадышский, МБОУ «Нижнеякинская средняя общеобразовательная школа»	19 961,76	24	3,0	0,0
6	Арский, Филиал МБОУ «Нижнеатынская основная общеобразовательная школа» - Среднесердинская начальная общеобразовательная школа»	10 600,00	35	2,0	0,0
7	Чистопольский, МБОУ «Гимназия №3»	24 685,85	35	12,0	0,0
8	Чистопольский, МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа»	26 354,44	36	8,0	0,0
9	Камско-Устьинский, МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная школа имени Василия Петровича Муравьева»	16 643,17	40	10,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>826 747,92</b>	<b>54,5</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>





# Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
10	г.Набережные Челны, МБОУ «Гимназия №2 имени Мулланура Вахитова»	141 000,00	48	23,0	0,0
11	Высокогорский, Филиал МБОУ «Высокогорская СОШ №1» - «Учхозская СОШ»	4 997,21	50	23,0	0,0
12	Нижнекамский, МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов»	4 700,00	50	40,0	27,7
13	Нижнекамский, МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов»	7 000,00	50	50,0	39,3
14	Чистопольский, МБОУ «Кубасская основная общеобразовательная школа»	24 318,99	50	14,0	0,0
15	Дрожжановский, МБОУ «Старочукалинская основная общеобразовательная школа»	16 643,17	53	8,0	0,0
16	Менделеевский, МБОУ «СОШ №7»	6 000,00	53	23,0	43,6
<b>ИТОГО</b>		<b>826 747,92</b>	<b>54,5</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>
17	Кукморский, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им.С.А.Ахтямова с.Манзарас»	1 388,00	55	22,0	0,0
18	Нижнекамский, МБОУ «Краснокадкинская основная общеобразовательная школа»	53 473,50	56	6,0	0,0



# Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
19	Зеленодольский, МБОУ «Лицей №9 имени А.С.Пушкина»	115 669,10	58	9,0	0,0
20	Нижнекамский, МБОУ «СОШ №20»	5 300,00	60	45,0	50,2
21	Нижнекамский, МБОУ «СОШ №7»	5 300,00	60	50,0	59,6
22	г.Набережные Челны, МБОУ «Средняя школа №46»	48 166,70	60	3,0	69,8
23	Бугульминский, МБОУ «Татарская Дымская основная общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Татарско-Дымской детский сад общеразвивающего вида «Умырзая»	23 211,09	62	6,0	0,0
24	Сабинский, МБОУ «Юлбатская основная общеобразовательная школа»	20 010,41	74	12,0	0,0
25	Агрызский, МБОУ «Исенбаевская средняя общеобразовательная школа»	4 543,03	75	40,0	0,0
26	Лаишевский, МБОУ «Большекабанская средняя общеобразовательная школа»	20 578,71	75	5,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>826 747,92</b>	<b>54,5</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>



# Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
27	Нижнекамский, МБОУ «СОШ №26 с углубленным изучением отдельных предметов»	4 700,00	80	65,0	80,1
28	Кайбицкий, МБОУ "Кушманская основная общеобразовательная школа им.Абрара Сагиди	16 824,77	85	5,0	0,0
29	Аксубаевский, МБОУ «Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад»	8 158,68	88	4,0	0,0
30	Высокогорский, МБОУ «Мемдельская средняя общеобразовательная школа имени Хай Вахита»	15 997,20	90	4,0	0,0
31	Высокогорский, МБОУ «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа»	6 497,20	93	6,0	0,0
32	Р.-Слободский, МБОУ «Кугарчинская СОШ»	8 321,59	93	3,0	0,0
33	Верхнеуслонский, МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»	16 643,17	98	3,0	0,0
34	Азнакаевский, МБОУ «СОШ №7 города Азнакаево»	16 200,00	99	2,0	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>826 747,92</b>	<b>Факт 54,5 План 54,8</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>



# Капитальный ремонт объектов образования (коррекционные школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГБОУ «Набережночелнинская школа №87 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	80 000,00	25	7,0	11,3
	<b>Итого</b>	<b>274 424,28</b>	<b>Факт 45,8</b> <b>План 40,2</b>	<b>20,6</b>	<b>11,4</b>
2	ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	62 000,00	51	16,0	0,0
3	ГБОУ «Кадетская школа №82 им.Героя Советского Союза Ильдара Маннанова»	132 424,28	56	31,0	16,8



# Капитальный ремонт ДОО

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Пестречинский	16 643,10	7	4	0
2	Новошешминский	16 643,17	8	6	0
3	Тюлячинский	16 643,17	15	5	0
4	Заинский	28 829,01	24	45	0
5	г.Казань	440 444,70	31,1	9,4	0
6	Актанышский	16 643,17	35	6	0
7	Рыбно-Слободский	8 321,58	36	7	0
8	Черемшанский	16 643,17	38	8	0
9	Чистопольский	43 301,03	38	10	0
10	Альметьевский	130 959,21	40	7,4	9,8
11	Алькеевский	16 643,17	42	21,5	0
12	Тукаевский	16 643,17	43	12	0
<b>ИТОГО</b>		<b>1 771 706,46</b>	<b>50,9</b>	<b>7,7</b>	<b>11,6</b>



# Капитальный ремонт ДОО

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Пестречинский	16 643,10	7	4	0
2	Новошешминский	16 643,17	8	6	0
3	Тюлячинский	16 643,17	15	5	0
4	Заинский	28 829,01	24	45	0
5	г.Казань	440 444,70	31,1	9,4	0
6	Актанышский	16 643,17	35	6	0
7	Рыбно-Слободский	8 321,58	36	7	0
8	Черемшанский	16 643,17	38	8	0
9	Чистопольский	43 301,03	38	10	0
10	Альметьевский	130 959,21	40	7,4	9,8
11	Алькеевский	16 643,17	42	21,5	0
12	Тукаевский	16 643,17	43	12	0
<b>ИТОГО</b>		<b>1 771 706,46</b>	<b>50,9</b>	<b>7,7</b>	<b>11,6</b>



# Капитальный ремонт ДОО

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
25	Кукморский	23 373,37	73	5	0
26	Агрызский	14 080,28	80	15	0
27	Аксубаевский	8 484,49	80	5	0
28	Азнакаевский	26 139,00	82	9	0
29	Сабинский	4 500,00	85	37	0
30	Мензелинский	16 643,17	91	2	38,6
31	Арский	25 064,61	92	8	12,6
32	Тетюшский	16 643,18	96	2	0
33	Буинский	16 524,68	98	1,5	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 771 706,46</b>	<b>Факт 50,9</b> <b>План 54,54</b>	<b>7,7</b>	<b>11,6</b>



# Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2,%
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Атнинский	1 200,00	0	0,0	0,0
2	Бугульминский	1 200,00	0	0,0	0,0
3	Мамадышский	1 200,00	0	0,0	0,0
4	Новошешминский	1 200,00	0	0,0	0,0
5	Спасский	1 200,00	0	0,0	0,0
6	Рыбно-Слободский	1 200,00	3	3,0	0,0
7	Азнакаевский	1 200,00	5	5,0	0,0
8	Лениногорский	1 200,00	5	5,0	0,0
9	Пестречинский	1 200,00	5	5,0	0,0
10	Дрожжановский	1 200,00	7	7,0	0,0
11	Елабужский	1 200,00	7	7,0	0,0
12	Мензелинский	1 200,00	12	12,0	0,0
13	Алексеевский	1 200,00	15	15,0	0,0
14	Буинский	1 200,00	15	15,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50,3</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>





# Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
15	Аксубаевский	1 200,00	20	20,0	0,0
16	Чистопольский	1 200,00	22	22,0	0,0
17	Тюлячинский	1 200,00	25	25,0	0,0
18	Арский	1 200,00	30	30,0	0,0
19	Нижнекамский	1 200,00	38	8,0	0,0
20	Заинский	1 200,00	40	40,0	0,0
21	Муслюмовский	1 200,00	41	4,0	0,0
22	Нурлатский	1 200,00	45	45,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50,3</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>
23	Бавлинский	1 200,00	54	47,0	0,0
24	Верхнеуслонский	1 200,00	63	19,0	0,0
25	Сабинский	1 200,00	65	65,0	0,0
26	Балтасинский	1 200,00	70	70,0	0,0
27	Лаишевский	1 200,00	80	30,0	0,0
28	Черемшанский	1 200,00	80	70,0	0,0



# Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа»

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
29	Менделеевский	1 200,00	85	70,0	0,0
30	Ютазинский	1 200,00	85	65,0	0,0
31	Агрызский	1 200,00	95	60,0	0,0
Итого		50 400,00	Факт 50,3	19,8	0,0
			План 47,99		



# Капитальный ремонт функциональных зон в рамках федерального проекта «Современная школа» (коррекционные школы)

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2,%
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	1 250,00	5	5,0	0,0
2	ГБОУ «Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	1 250,00	5	5,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>2 500,00</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>



# Капитальный ремонт ресурсных центров

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2,%
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	17 500,00	2	2,0	0,0
2	ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова»	50 000,00	3	2,0	0,0
3	ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж»	15 000,00	3,0	3,0	0,0
4	ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	6 000,00	7	5,0	0,0
5	ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»	15 000,00	12	7,0	0,0
6	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»	115 000,00	18,2	10,2	0,0
7	ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж»	10 000,00	22	7,0	0,0
8	ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»	50 000,00	27	7,0	0,0
9	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	95 000,00	29	6,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>658 018,70</b>	<b>37,05</b>	<b>9,49</b>	<b>0,00</b>



# Капитальный ремонт ресурсных центров

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
10	ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж»	29 000,00	33	5,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>658 018,70</b>	<b>Факт 37,05</b> <b>План 42,05</b>	<b>9,49</b>	<b>0,00</b>
11	ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум»	80 000,00	46	22,0	0,0
12	ГАПОУ «Нижекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева»	45 000,00	56	7,0	0,0
13	ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий»	30 000,00	73	30,0	0,0
14	Филиал ГАПОУ«Нижекамский агропромышленный колледж»	32 018,70	79	9,0	0,0
15	ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»	54 500,00	80	3,0	0,0
16	ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»	6 500,00	90	2,0	0,0
17	Филиал ГАПОУ«Казанский авиационно-технический колледж им.В.В.Дементьева»	7 500,00	95	25,0	0,0



# Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум»	83 123,33	31	3,0	0,0
2	ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»	79 854,64	42	8,0	0,0
3	ГАПОУ ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж»	27 071,81	47	4,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>190 049,8</b>	<b>Факт 37,9</b> <b>План 46,12</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>



# Капитальный ремонт спортивных объектов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Здание крытого плавательного бассейна МБУ "Спортивная школа", Новошешминский	3 943,72	0,0	0,0	0,0
2	МБУ «Спортивная школа «Зай», Заинский	40 011,60	9,0	6,0	0,0
3	МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Касатка», г.Казань	29 723,03	15,00	7,00	0,00
4	МБУ «Спортивная школа», Алексеевский	41 866,04	16,00	3,00	0,00
5	МБУ «Спортивная школа», Балтасинский	18 548,97	20,00	3,00	0,00
6	МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма», г. Казань	37 782,08	22,00	10,00	0,00
7	ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», г.Казань	19 625,34	26,0	8,0	0,0
8	МБУ «Спортивная школа №5 «Дельфин», Зеленодольский	26 549,44	31,00	13,00	0,00
9	ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе», Верхнеуслонский	14 626,60	35,0	11,0	0,0
10	МУП «Спортивная школа по настольному теннису», Альметьевский	9 052,47	36,00	9,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>489 305,94</b>	<b>34,93</b>	<b>6,77</b>	<b>8,15</b>



# Капитальный ремонт спортивных объектов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
11	МБУ «Спортивная школа «Юность» имени Е.А.Тимерзянова», Бугульминский	7 613,69	40,00	10,00	0,00
12	МБУ «Спортивная школа «Мотор», г.Казань	29 755,47	40,00	5,00	0,00
13	МБУ «Спортивная школа «Татнефть Олимп», Чистопольский	18 328,26	40,00	9,00	0,00
14	МБУ «Спортивная школа №1», Лениногорский	44 244,68	55,00	8,00	0,00
15	Здание лыжной базы МБУ «Спортивная школа «Старт», Сармановский	7 429,12	65,0	15,0	33,9
16	ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк», Зеленодольский	35 455,88	65,00	10,00	0,00
17	ЖК МБУ «Спортивная школа», Аксубаевский	6 505,28	66,0	6,0	0,0
18	МБУ «Спортивная школа №8», Нижнекамский	26 404,65	70,00	9,00	0,00
19	МБУ «Спортивная школа «Мотор» г.Казани	8 334,93	72,0	4,0	57,5
20	МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский	8 610,56	80,0	22,0	79,8
21	МБУ «Спортивная школа «Юность», Буинский	29 072,95	95,00	5,00	91,23
<b>ИТОГО</b>		<b>489 305,94</b>	<b>Факт 34,93 План 40,13</b>	<b>6,77</b>	<b>8,15</b>





# Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика за 2 недели, %
		План	Факт	
Капитальный ремонт молодежных центров (5 объектов)	278 769,10	38,5	29,24	4,33
Капитальный ремонт детских лагерей (6 объектов)	258 447,35	65,64	71,07	3,33
Капитальный ремонт подростковых клубов (17 объектов)	64 980,70	50,3	53,33	13,4



# Капитальный ремонт молодежных центров

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	45 000,0	10,0	3,0	0,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	96 000,0	20,0	3,0	0,0
3	Филиал ГБУ «Молодежный центр», Зеленодольский	106 013,0	28,0	4,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>278 769,1</b>	<b>Факт 29,24</b> <b>План 38,5</b>	<b>4,33</b>	<b>0,0</b>
4	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	25 035,5	86,0	13,0	0,0
5	МБУ «Молодежный центр «Алан», Нижнекамский	6 720,6	98,0	5,0	0,0



# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	54 352,32	36	3,0	0,0
2	Оздоровительный лагерь «Юнитур», г. Казань	37 080	55	6,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>258 447,35</b>	<b>Факт 71,07</b> <b>План 65,64</b>	<b>3,33</b>	<b>0,0</b>
3	ДОЛ «Свияга+» (Корпус №1), Апастовский	85 405,75	75	5,0	0,0
4	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	55 869,28	98	1,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Подростковый клуб «Цудзуки» г.Казань	300,00	0	0	0,0
2	Подростковый клуб «Юниор» г.Казань	2 400,00	5	0	0,0
3	Молодежный клуб здорового образа жизни «Спарта» Заинский	9 844,10	14	3	0,0
4	«Подростковый клуб «Ровесник» Агрызский	6 005,20	25	8	0,0
5	Подростковый клуб «Свои» г.Казань	1 000,00	29	4	0,0
6	Подростковый клуб «Искра» Альметьевский	3 452,80	47	2	0,0
7	Подростковый клуб «Ротор» Альметьевский	3 819,60	56	4	0,0
8	Подростковый клуб «Алгарыш» Нижнекамский	4 976,40	60	20	0,0
9	Подростковый клуб «Дорожник» Альметьевский	4 887,40	64	4	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>64 980,70</b>	<b>53,33</b>	<b>13,40</b>	<b>0,0</b>



# Капитальный ремонт подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
10	Подростковый клуб «Синтез» г.Казань	3 719,20	67	12	0,0
11	Подростковый клуб спортивно-патриотической направленности «Пегас» Бавлинский	7 003,60	70	21	0,0
12	Подростковый клуб «Факел» г.Казань	3 721,60	70	10	0,0
13	Подростковый клуб «Луч» Нижнекамский	3 135,40	80	32	0,0
14	Подростковый клуб «Ступени» г.Казань	2 065,70	82	9	0,0
15	Подростковый клуб «Мастерица» г.Казань	2 184,20	82	9	0,0
16	Подростково-молодежный клуб «Ровесник» г.Набережные Челны	2 793,30	85	53	0,0
17	Подростковый клуб «Алые паруса» Нижнекамский	3 672,20	85	36	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>64 980,70</b>	<b>Факт 53,33</b> <b>План 50,85</b>	<b>13,40</b>	<b>0,0</b>



# Здравоохранение

Капитальный ремонт  
стационаров  
*(15 объектов)*

Капитальный ремонт  
объектов здравоохранения  
*(8 объектов)*

Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика за 2 недели, %
	План	Факт	
1 588 903,09	44,2	44,77	3,2
69 169,55	0,0	Дата проведения торгов 30.06.2020	



# Капитальный ремонт стационаров

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2,%
				Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани	здание лечебного корпуса №2, г.Казань, ул.Исаева, д.5	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»	стационар, г.Чистополь, ул.Вишневого, д.1	137 563,82	4,00	4,00	0,00
3	ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	инфекционный корпус, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.11Д	37 283,58	4,00	4,00	0,00
4	ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ"	лечебный корпус №3, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.14	81 088,11	6,00	2,50	0,00
5	ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ"	лечебный корпус, г.Азнакаево, ул. Хасаншиной, д.21	73 348,25	9,00	3,00	0,00
6	ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского МР»	инфекционный корпус, Алькеевский МР, с.Базарные Матаки, ул.Базарная, д.2	62 016,87	10,00	7,00	0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1 588 903,09</b>	<b>44,77</b>	<b>3,20</b>	<b>7,41</b>



# Капитальный ремонт стационаров

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
				Факт	Динамика за 2 недели	
7	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница»	палатный корпус, г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	110 086,63	23,00	8,00	19,33
8	ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	лечебный корпус №3, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.13	191 024,83	35,00	7,00	0,00
9	ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ"	инфекционное отделение, г.Бугульма, ул.Ленина	153 000,00	40,00	5,00	42,67
<b>ИТОГО</b>			<b>1 588 903,09</b>	<b>Факт 44,77</b> <b>План 44,20</b>	<b>3,20</b>	<b>7,41</b>
10	ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Набережные Челны	стационар, г.Наб.Челны, ул.Набережная им.Габдуллы Тукая, д.39	24 257,16	65,00	5,00	0,00
11	ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ"	лечебный корпус, г.Тетюши, ул.Ленина, д.11, стр.1	45 000,00	65,00	50,00	0,00
12	ГАУЗ "Буинская центральная районная больница"	корпус А, В г.Буинск, ул.Ефремова	104 945,17	88,00	8,00	0,00





# Культура

Капитальный ремонт объектов культурного назначения  
(37 объектов)

Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры  
(8 объектов)

Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика за 2 недели, %
	План	Факт	
410 094,60	71,97	72,39	6,64
138 042,0	55,83	55,76	9,74



# Капитальный ремонт объектов культурного назначения

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	МБУК г.Казани «Культурный центр Залесный»	24 000,00	10,00	10,00	0,0
2	СДК с.Тавели, Мамадышский	11 083,23	32,00	6,00	0,0
3	СДК с.Аксарино, Заинский	11 000,00	42,00	23,00	0,0
4	СДК с.Березняк, Кукморский	1 996,51	50,00	3,00	0,0
5	СДК с.Нижняя Уратьма, Нижнекамский	15 000,00	50,00	8,00	0,0
6	СДК с.Антоновка, Спасский	11 935,17	50,00	7,00	0,0
7	СДК с.Старые Бугады, Актанышский	14 549,96	53,00	5,00	0,0
8	СДК с.Татарские Челны, Менделеевский	14 629,82	56,00	9,00	0,0
9	СДК с.Старые Кутуши, Черемшанский	13 650,08	57,00	5,00	0,0
10	СДК с.Крынды, Агрызский	10 900,00	60,00	20,00	0,0
11	СДК д.Смаиль, Балтасинский	19 256,97	60,00	7,00	0,0
12	СДК с.Крым-Сарай, Бавлинский	10 372,47	62,00	8,00	0,0
13	СДК с.Большие Полянки, Алексеевский	10 988,04	68,00	14,00	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>410 094,60</b>	<b>72,39</b>	<b>6,64</b>	<b>5,39</b>



# Капитальный ремонт объектов культурного назначения

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
14	СДК д.Балчиклы, Камско-Устьинский	5 831,70	70,00	5,00	46,6
15	СДК с.Большой Шинар, Сабинский	12 000,00	70,00	17,00	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>410 094,60</b>	<b>Факт 72,39</b>	<b>6,64</b>	<b>5,39</b>
			<b>План 71,97</b>		
16	СДК с.Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский	11 923,58	73,00	8,00	0,0
17	СДК д.Татарское Танаево, Зеленодольский	14 609,88	73,00	4,00	0,0
18	СДК с.Ивановка, Лениногорский	13 658,85	73,00	10,00	0,0
19	СДК д.Зеленая Роца, Бугульминский	12 719,55	79,00	9,00	0,0
20	СДК с.Киртели, Тетюшский	11 070,03	82,00	6,00	0,0
21	СДК с.Тяжбердино, Алькеевский	11 341,09	90,00	2,00	0,0
22	СДК с.Азалаково, Сармановский	10 964,19	90,00	4,00	0,0
23	СДК с.Молвино, Зеленодольский	7 616,23	92,00	5,00	0,0
24	СДК с.Печищи, Верхнеуслонский	7 434,20	94,00	6,00	41,8
25	СДК с.Новые Усы, Муслюмовский	9 258,82	96,00	3,00	0,0
26	СДК с.Большой Менгер, Атнинский	12 500,02	98,00	2,00	0,0



# Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З.Яруллина», Альметьевский	41 519,92	18,0	5,00	0,0
2	МБОУДО «Актюбинская детская школа искусств», Азнакаевский	10 843,39	40,0	3,00	0,0
3	МБУДО «Детская школа искусств г.Зеленодольска Республики Татарстан», Зеленодольский	17 926,48	49,0	7,00	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>138 042,0</b>	<b>Факт 55,76</b> <b>План 55,83</b>	<b>9,74</b>	<b>1,0</b>
4	МБОУДО «Лениногорская детская художественная школа им.М.Х.Хаертдинова», Лениногорский	11 490,06	62,0	5,00	12,1
5	МБОУДО «Детская художественная школа» Чистопольский	7 264,03	66,0	3,00	0,0
6	МБУДО «Детская школа искусств», Агрызский	10 845,65	72,0	37,00	0,0
7	МБУДО «Детская школа искусств», Пестречинский	15 076,13	90,0	3,00	0,0



## Сельское хозяйство

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика 2 недели, %
		План	Факт	
Капитальный ремонт коровников (158 объектов)	601 148,0	27,7	38,75	27,07
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (127 объектов)	329 414,0	33,3	47,63	31,58
Капитальный ремонт машинно- тракторных парков (66 объектов)	164 347,0	28,0	41,05	29,03
Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ (12 объектов)	66 667,0	18,37	6,62	6,40
Капитальный ремонт птицеферм (12 объектов)	66 307,0	18,18	10,53	10,53
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (41 объект)	59 592,0	85,11	87,14	5,34
Капитальный ремонт конеферм (11 объектов)	32 854,0	18,2	38,90	38,90



# Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Мамадышский	2 200	0,00	0,00	-
2	Рыбно-Слободский	4 500	0,00	0,00	-
3	Новошешминский	12 000	2,00	2,00	-
4	Азнакаевский	16 500	5,00	2,27	-
5	Аксубаевский	15 000	6,70	6,70	-
6	Лаишевский	4 500	8,00	8,00	-
7	Арский	34 500	9,78	9,78	-
8	Чистопольский	3 000	10,00	10,00	-
9	Тетюшский	24 500	10,10	10,10	-
10	Высокогорский	33 000	11,82	11,82	-
11	Бугульминский	4 500	15,00	15,00	-
12	Альметьевский	7 000	16,43	6,79	-
	<b>Итого</b>	<b>601 148,0</b>	<b>38,75</b>	<b>27,07</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
13	Ютазинский	15 364	16,88	16,88	-
14	Дрожжановский	16 500	17,27	12,27	-
15	Пестречинский	3 000	20,00	20,00	-
16	Нурлатский	23 200	20,32	20,32	-
17	Верхнеуслонский	4 000	22,00	10,00	-
18	Елабужский	15 000	26,00	26,00	-
19	Черемшанский	18 000	26,67	19,17	-
20	Буинский	13 500	27,22	19,44	-
21	Лениногорский	3 000	30,00	30,00	-
22	Кайбицкий	15 000	33,00	9,00	-
23	Тюлячинский	24 697	35,87	15,63	-
24	Бавлинский	13 500	36,00	36,00	-
	<b>Итого</b>	<b>601 148,0</b>	<b>38,75</b>	<b>27,07</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт коровников

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
25	Нижнекамский	9 000	42,50	42,50	-
26	Тукаевский	39 837	46,44	25,25	-
27	Кукморский	57 350	59,97	59,97	-
28	Мензелинский	30 000	60,00	30,00	-
29	Сармановский	7 000	63,71	5,14	-
30	Актанышский	34 500	64,48	64,48	-
31	Балтасинский	19 500	65,00	65,00	-
32	Апастовский	10 500	70,00	70,00	-
33	Атнинский	18 000	72,50	72,50	-
34	Сабинский	36 500	75,48	12,40	-
35	Агрызский	4 000	100,00	20,00	-
36	Заинский	9 000	100,00	0,00	-
<b>Итого</b>		<b>601 148,0</b>	<b>Факт 38,75</b> <b>План 27,70</b>	<b>27,07</b>	<b>-</b>





# Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Мамадышский	6 000,00	0,00	0,00	-
2	Новошешминский	9 360,00	0,00	0,00	-
3	Заинский	3 000,00	3,33	0,00	-
4	Верхнеуслонский	3 000,00	7,00	2,00	-
5	Пестречинский	7 200,00	12,50	12,50	-
6	Высокогорский	18 000,00	14,17	14,17	-
7	Аксубаевский	7 370,00	20,62	4,34	-
8	Рыбно-Слободский	12 000,00	23,50	0,00	-
9	Арский	16 460,00	24,47	24,47	-
10	Азнакаевский	11 780,00	25,25	24,62	-
11	Тетюшский	18 490,00	28,50	28,50	-
12	Нижнекамский	5 000,00	30,00	30,00	-
	<b>Итого</b>	<b>329 414,0</b>	<b>47,63</b>	<b>31,58</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
13	Черемшанский	9 000,00	30,00	21,67	-
14	Бавлинский	7 500,00	30,40	30,40	-
15	Мензелинский	9 280,00	31,33	15,16	-
16	Ютазинский	4 500,00	35,33	35,33	-
17	Апастовский	7 500,00	36,67	36,67	-
18	Дрожжановский	8 700,00	37,36	26,44	-
19	Алькеевский	6 000,00	41,67	0,00	-
20	Альметьевский	8 500,00	43,53	8,24	-
<b>Итого</b>		<b>329 414,0</b>	<b>47,63</b>	<b>31,58</b>	<b>-</b>
21	Чистопольский	2 300,00	50,00	50,00	-
22	Кайбицкий	3 480,00	51,67	18,33	-
23	Буинский	13 000,00	61,15	36,92	-
24	Сабинский	10 150,00	62,41	10,91	-



# Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
25	Тукаевский	15 000,00	63,00	25,00	-
26	Кукморский	16 490,00	66,49	66,49	-
27	Тюлячинский	5 940,00	66,94	19,80	-
28	Лениногорский	8 300,00	71,81	71,81	-
29	Лаишевский	5 600,00	76,57	9,43	-
30	Елабужский	7 500,00	80,00	80,00	-
31	Актанышский	11 100,00	81,00	81,00	-
32	Сармановский	6 600,00	81,33	0,73	-
33	Балтасинский	21 000,00	81,43	81,43	-
34	Нурлатский	6 000,00	95,00	95,00	-
<b>Итого</b>		<b>329 414,0</b>	<b>Факт 47,63</b>	<b>31,58</b>	<b>-</b>
			<b>План 33,30</b>		



# Капитальный ремонт машинно-тракторных парков

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Высокогорский	6 197,00	0,00	0,00	-
2	Мензелинский	5 500,00	0,00	0,00	-
3	Новошешминский	1 700,00	0,00	0,00	-
4	Пестречинский	3 000,00	0,00	0,00	-
5	Ютазинский	3 000,00	0,00	0,00	-
6	Кайбицкий	2 000,00	3,00	3,00	-
7	Азнакаевский	5 000,00	7,50	7,50	-
8	Черемшанский	3 000,00	7,50	7,50	-
9	Бугульминский	1 800,00	15,00	15,00	-
10	Лениногорский	3 000,00	15,00	15,00	-
11	Лаишевский	6 000,00	18,00	8,00	-
12	Тетюшский	6 500,00	20,00	20,00	-
13	Арский	13 000,00	25,38	25,38	-
	<b>Итого</b>	<b>164 347,0</b>	<b>41,05</b>	<b>29,03</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт машинно-тракторных парков

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
14	Дрожжановский	5 500,00	30,00	18,18	-
15	Апастовский	9 000,00	31,67	31,67	-
16	Кукморский	14 000,00	33,75	33,75	-
<b>Итого</b>		<b>164 347,0</b>	<b>Факт 41,05</b> <b>План 28,00</b>	<b>29,03</b>	<b>-</b>
17	Сармановский	4 400,00	45,27	3,00	-
18	Сабинский	12 500,00	50,00	8,20	-
19	Мамадышский	5 500,00	50,18	50,18	-
20	Буинский	6 500,00	61,15	42,31	-
21	Тукаевский	17 000,00	64,12	37,12	-
22	Заинский	3 250,00	65,38	0,00	-
23	Балтасинский	8 000,00	67,81	67,81	-
24	Актанышский	9 000,00	88,89	88,89	-
25	Атнинский	8 000,00	96,88	96,88	-
26	Алькеевский	2 000,00	100,00	0,00	-



# Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	картофелехранилище в с.Красный Бор	4 500,00	0,00	0,00	-
2	овощехранилище в д.Муслюмово	5 000,00	0,00	0,00	-
3	овощехранилище в г.Азнакаево	14 000,00	0,00	0,00	-
4	овощехранилище в с.Кирби	5 000,00	0,00	0,00	-
5	овощехранилище в д.Алан	5 000,00	0,00	0,00	-
6	овощехранилище в с.Верхний Такермен	6 000,00	0,00	0,00	-
7	овощехранилище в с.Новошешминск	2 000,00	0,00	0,00	-
8	овощехранилище с.Бетьки (2-й этап)	4 000,00	0,00	0,00	-
9	овощехранилище в д.Муртаза	3 000,00	3,00	3,00	-
10	овощехранилище в д.Крестниково	3 000,00	5,00	0,00	-
11	овощехранилище в с.Мочалей	1 500,00	5,00	5,00	-
12	овощехранилище в с.Гари	13 667,00	30,00	30,00	-
<b>Итого</b>		<b>66 667,0</b>	<b>Факт 6,62</b> <b>План 18,37</b>	<b>6,40</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт птицеферм

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	птицеферма в д.Тарханка	3 000,00	0,00	0,00	-
2	птицеферма в с.Большие Ключи	7 240,00	0,00	0,00	-
3	птицеферма с.Большие Ключи	8 577,00	0,00	0,00	-
4	птицеферма в с.Большие Ключи	7 490,00	0,00	0,00	-
5	птицеферма в г.Лениногорске	5 000,00	7,00	7,00	-
6	птицеферма в г.Лениногорске	5 000,00	7,00	7,00	-
7	птицеферма в с.Байлянгар (1-й этап)	4 000,00	10,00	10,00	-
8	птицеферма в п.Подгорный	4 000,00	12,00	12,00	-
9	птицеферма в с.Байлянгар	10 000,00	20,00	20,00	-
10	птицеферма в д.Калинино	4 000,00	30,00	20,00	-
11	птицеферма в с.Шильнебаш	4 000,00	55,00	25,00	-
12	птицеферма в д.Новый Мусабай	4 000,00	80,00	30,00	-
<b>Итого</b>		<b>66 307,0</b>	<b>Факт 10,53</b> <b>План 18,18</b>	<b>10,53</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	УСХП в Сармановском МР	400,00	20,00	20,00	-
2	УСХП в Лениногорском МР	2 000,00	33,00	10,00	-
3	ВО в Мамадышском МР	1 339,00	36,00	3,00	-
4	ВО в Мамадышском МР	639,00	41,00	8,00	-
5	ВО в Алькеевском МР	1 189,00	55,00	25,00	-
6	УСХП в Бавлинском МР	1 000,00	62,00	9,00	-
7	УСХП в Бугульминском МР	2 500,00	73,00	4,00	-
8	ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ	4 989,00	75,00	21,00	-
9	ВО в Муслюмовском МР	1 189,00	80,00	0,00	-
<b>Итого</b>		<b>59 592,00</b>	<b>87,14</b>	<b>5,34</b>	<b>-</b>
10	ВО в Буинском МР	1 989,00	90,00	10,00	-
11	ВО в Буинском МР	1 489,00	90,00	10,00	-
12	УСХП в Высокогорском МР	500,00	90,00	73,00	-





# Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
13	УСХП в Агрызском МР	500,00	97,00	59,00	-
14	УСХП в Буинском МР	1 500,00	98,00	0,00	-
15	УСХП в Дрожжановском МР	1 500,00	98,00	8,00	-
16	ВО г.Нижнекамска	1 489,00	99,00	2,00	-
17	ВО Агрызском МР	489,00	100,00	69,00	-
<b>Итого</b>		<b>59 592,00</b>	<b>Факт 87,14</b> <b>План 85,11</b>	<b>5,34</b>	<b>-</b>



# Капитальный ремонт конеферм

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Конеферма ООО "Татарский конный завод № 57" в с.Слобода Петропавловская	4000,00	0,00	0	-
2	Конеферма ООО "Агрокомплекс "Ак Барс" в с.Смак-Корса	1500,00	15,00	15	-
3	Конеферма ООО "Цильна" в с. Малая Цильна	3400,00	15,00	10	-
4	Конеферма ИП главы КФХ Габдрахманова А.Г. в с. Тумутук	3000,00	20,00	20	-
5	Конеферма ООО "Агрофирма "Кырлай" в с.Новый Яваш	4000,00	20,00	20	-
6	Конеферма ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Северный" в с.Шека	500,00	30,00	30	-
7	Конеферма ИП главы КФХ Набиуллина С.Ф. в п.Верхний Каран	2000,00	40,00	40	-
8	Конеферма ООО "Гигант" в п.Новый	3000,00	40,00	30	-
9	Конеферма ООО "Агрофирма Актай" в с.Верхняя Баланда	4000,00	41,00	3	-
<b>Итого</b>		<b>32 854,0</b>	<b>Факт 38,90</b> <b>План 18,20</b>	<b>38,9</b>	<b>-</b>
10	Конеферма ООО "Алга" в д.Верхний Шубан	4000,00	85,00	85	-



# Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %		Динамика за 2 недели, %
		План	Факт	
Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ (3 объектов)	150 000,0	62,02	59,22	4,79
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (37 объектов)	120 868,0	29,4	18,53	3,3
Капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства (14 объектов)	68 850,6	54,01	45,09	1,3
Капитальный ремонт муниципальных архивов (7 объектов)	49 952,0	55,27	53,45	8,12
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (21 объект)	34 015,6	71,35	69,65	4,66



# Капитальный ремонт зданий подведомственных МВД по РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Административное здание отдела МВД России по Тукаевскому району	82 306,65	52,00	6,00	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>150 000,00</b>	<b>Факт 59,22</b> <b>План 62,02</b>	<b>4,79</b>	<b>0,0</b>
2	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	62 543,89	70,00	4,00	0,0
3	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	5 149,46	100,00	0,00	0,0



# Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Аксубаевский	5 500,00	0,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,00	0,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 750,00	0,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», Арский	3 000,00	0,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия» Арском МР»	3 500,00	0,0	0,0	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском МР»	2 000,00	0,0	0,0	0,0
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	2 000,00	0,0	0,0	0,0
8	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	3 500,00	0,0	0,0	0,0
9	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском МР»	3 000,00	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>119 750,0</b>	<b>18,53</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>



# Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
10	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель», Зеленодольский	3 000,00	0,0	0,0	0,0
11	ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 500,00	0,0	0,0	0,0
12	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	6 000,00	0,0	0,0	0,0
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный», г.Казань	5 000,00	0,0	0,0	0,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка», г.Казань	2 000,00	0,0	0,0	0,0
15	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	2 500,00	0,0	0,0	0,0
16	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» (компенсационных выплат), г.Казань	4 600,00	0,0	0,0	0,0
17	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 000,00	0,0	0,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Наб. Челны»	2 000,00	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>119 750,0</b>	<b>18,53</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>



# Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
19	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,00	0,0	0,0	0,0
20	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» в Р.-Слободском МР»	2 000,00	0,0	0,0	0,0
21	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Теплый дом» в Дрожжановском МР»	4 900,00	3,0	3,0	0,0
22	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	4 000,00	4,0	3,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» в городском округе «город Наб. Челны»	3 000,00	5,0	4,0	0,0
24	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,00	7,0	0,0	0,0
25	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» в Бугульминском МР»	2 500,00	10,0	8,0	0,0
26	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,00	14,0	4,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>119 750,0</b>	<b>18,53</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>
27	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	25,0	0,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
28	ГАУСО «КЦСОН «Шафкатъ» в Сармановском МР»	3 500,00	35,0	26,0	0,0
29	ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском МР»	2 500,00	40,0	38,0	0,0
30	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»	4 500,00	55,0	5,0	66,6
31	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 000,00	72,0	2,0	0,0
32	ГАУСО «КЦСОН «Тетюшское сияние» в Тетюшском МР»	4 000,00	72,0	12,0	0,0
33	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран», Альметьевский	2 500,00	80,0	5,0	0,0
34	ГАУСО «КЦСОН «Нежность» в Аксубаевском МР»	3 000,00	90,0	9,0	68,4
35	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе»	2 000,00	95,0	3,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>119 750,0</b>	<b>Факт 18,53</b> <b>План 29,40</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>





# Капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Административное здание Сабинского участкового лесничества	4 904,50	0,00	0,00	0,00
2	Административное здание Мешебашского участкового лесничества, Сабинский	260,96	0,00	0,00	0,00
3	Административное здание Матюшинского участкового лесничества, г.Казань	3 102,56	14,00	4,00	0,00
4	Административное здание Сабабашского участкового лесничества, Сабинский	435,70	16,50	0,50	0,00
5	Административное здание ГКУ «Бугульминское лесничество»	4 402,99	22,00	8,00	0,00
6	Здание факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета	29 725,88	35,00	6,00	0,00
7	Ремонт гаража для пожарно-химической станции - II типа, Нурлаский	2 125,54	40,00	8,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>68 850,66</b>	<b>45,09</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>



# Капитальный ремонт зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
8	Административное здание ГКУ «Аксубаевское лесничество»	4 570,00	55,00	10,00	0,00
9	Административное здание Высокогорского участкового лесничества	1 302,10	60,00	55,00	0,00
10	Ремонт гаража для пожарно-химической станции - II типа, Нижнекамский	6 381,87	60,00	18,00	0,00
11	Административное здание Шеморданского участкового лесничества, Сабинский	1 077,95	65,00	2,00	0,00
12	Административное здание Ленинского участкового лесничества, Тюлячинский	833,31	92,00	12,00	0,00
13	Административное здание ГКУ «Заинское лесничество»	4 726,90	100,00	11,00	0,00
14	Административное здание ГКУ «Тетюшское лесничество», Тетюшский	5 000,40	100,00	5,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>68 850,66</b>	<b>Факт 45,09 План 54,01</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>



# Капитальный ремонт муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Аксубаевский	87,97	0,00	0,00	0,00
2	Тукаевский	36 430,38	43,00	5,00	0,00
3	Спасский	1 040,82	50,00	35,00	0,00
ИТОГО		49 952,00	Факт 53,45	8,12	0,00
			План 55,27		
4	Лаишевский	537,82	60,00	30,00	0,00
5	Кукморский	10 075,23	85,00	5,00	0,00
6	Высокогорский	1 421,33	90,00	85,00	0,00
7	Ютазинский	358,45	100,00	1,00	0,00



# Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Измерское сельское поселение, Спасский	2 100,00	0,0	0,0	0,0
2	Вязовское сельское поселение, Бугульминский	2 001,93	4,0	4,0	0,0
3	Татарско-Баганинское сельское поселение, Чистопольский	1 837,80	16,0	8,0	0,0
4	Нижнесуньское сельское поселение, Мамадышский	1 902,64	28,0	3,0	0,0
5	Маломеминское сельское поселение, Кайбицкий	1 231,08	40,0	10,0	0,0
6	Ромодановское сельское поселение, Алексеевский	1 138,71	45,0	43,0	0,0
7	Кошкинское сельское поселение, Алькеевский	2 100,00	55,0	15,0	0,0
8	Урманаевское сельское поселение, Азнакаевский	2 100,00	60,0	10,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>34 015,60</b>	<b>69,65</b>	<b>4,66</b>	<b>21,53</b>
9	Новоаксубаевское сельское поселение, Аксубаевский	2 100,00	94,0	3,0	0,0
10	Майскогорское сельское поселение, Нижнекамский	705,02	95,0	10,0	0,0
11	Звездинское сельское поселение, Дрожжановский	1 762,45	98,0	0,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№	МО РТ	Лимит тыс рублей	СМР, %		Принято КС-2, %
			Факт	Динамика за 2 недели	
12	Акбуринское сельское поселение, Новошешминский	1 855,44	99,0	1,0	0,0
13	Петровско-Заводское сельское поселение, Сармановский	940,82	99,0	1,0	92,18
14	Казкеевское сельское поселение, Актанышский	1 200,00	100,0	0,0	0,0
15	Аппаковское сельское поселение, Альметьевский	1 302,00	100,0	0,0	0,0
16	Шишинерское сельское поселение, Балтасинский	2 100,00	100,0	0,0	98,46
17	Старостуденецкое сельское поселение, Буинский	2 100,00	100,0	0,0	92,82
18	Бегишевское сельское поселение, Заинский	2 038,98	100,0	0,0	0,0
19	Селенгушское сельское поселение, Нурлатский	906,62	100,0	0,0	0,0
20	Кильдюшевское Сельское поселение, Тетюшский	739,50	100,0	0,0	89,0
21	Аланское сельское поселение, Тюлячинский	1 852,61	100,0	0,0	95,89
	<b>Итого</b>	<b>34 015,60</b>	<b>Факт 69,65</b> <b>План 71,35</b>	<b>4,66</b>	<b>21,53</b>



# Программы Фонда газификации

**Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ**  
*(220 км. водопровода,  
30 скважин,  
35 водонапорных башен)*

**Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ**  
*(113 котлов на 65 объектах)*

**Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ**  
*(1 353 квартиры;  
29 котлов;  
14 км газопроводов)*

Общий лимит,  
млн. рублей  
(без учета ПИР)

Выполнение СМР, %

План

Факт

Динамика за  
2 недели, %

589,25

24

24

9

65,007

40

45

23

150,84

45

48

16



# Программы Фонда газификации

**Восстановление  
уличного освещения  
в населенных пунктах РТ**  
*(12 177 светильников;  
252 км СИП)*

**Модернизация систем  
водоотведения**  
*(17 МО,  
27 объектов)*

Общий лимит,  
тыс. рублей  
(без учета ПИР)

Выполнение СМР, %

План

Факт

Динамика за  
2 недели, %

224,9

30

32

20

293,734

7

7

2



# Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года в разрезе МО РТ

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Пестречинский	16	Лениногорский	31	Тюлячинский
2	Алькеевский	17	Менделеевский	32	Тукаевский
3	Мензелинский	18	Альметьевский	33	Аксубаевский
4	Бугульминский	19	Балтасинский	34	Заинский
5	Елабужский	20	Апастовский	35	Лаишевский
6	Атнинский	21	Спасский	36	г. Набережные Челны
7	Тетюшский	22	Камско-Устьинский	37	Дрожжановский
8	Зеленодольский	23	Агрызский	38	Алексеевский
9	Чистопольский	24	Верхнеуслонский	39	Арский
10	Кукморский	25	Сабинский	40	г. Казань
11	Ютазинский	26	Актанышский	41	Новошешминский
12	Высокогорский	27	Нурлатский	42	Кайбицкий
13	Сармановский	28	Буинский	43	Нижнекамский
14	Мамадышский	29	Муслюмовский	44	Черемшанский
15	Рыбно-Слободский	30	Азнакаевский	45	Бавлинский

МО РТ предоставившие от 10 до 50% документов от общего необходимого количества





# Перечень документов в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года

## Строительство, реконструкция объекта:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- в случае реконструкции – правоустанавливающие документы на здание;
- градостроительный план земельного участка;
- утвержденное техническое задание на проектирование;
- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

## Капитальный ремонт объекта:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект;
- технический паспорт БТИ на объект;
- утвержденное техническое задание на проектирование (при необходимости разработки проектно-сметной документации).



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**
