



# Спорт

■ Выполнение СМР, %    ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

**100,0%**

**97,3%**

завершено – 86

**СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО  
ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА С  
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ  
ПОКРЫТИЕМ**

**100,0%**

**86,4%**

завершено – 1

**СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-  
МОДУЛЬНЫХ ЛЫЖНЫХ БАЗ**

**100,0%**

**16,0%**

завершено – 6

0,00%    20,00%    40,00%    60,00%    80,00%    100,00%




# Образование

## Строительство дошкольных образовательных организаций

### Выполнение работ



### Принято КС-2

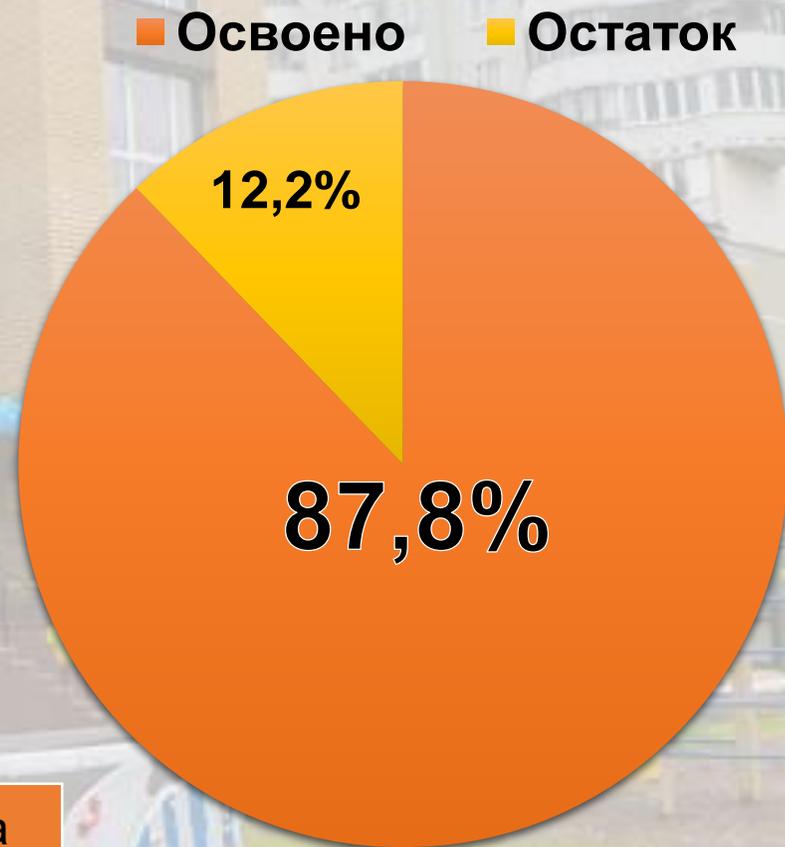

Всего 22 объекта

завершено – 21



# Строительство дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Детский сад на 340 мест в г.Казань, ЖР «Западное Заречье» (ул.Серова-Баруди)	355 521,73	95,0	2,0
<b>ИТОГО по 22 объектам</b>		<b>5 282 814,68</b>	<b>99,4</b>	<b>0,1</b>



## Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
1	Строительство ДОО на 340 мест, с.Высокая Гора	+	+	100	передан
2	Строительство ДОО на 340 мест, г.Казань, ЖК«Залесный Сити»	+	не требуются	100	передан
3	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, жилой район «Замелекесье», мкр.25	+	+	100	
4	Строительство ДОО на 140 мест, Тукаевский МО, д.Азьмушкино	+	+	100	
5	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, жилой район «Замелекесье», мкр.22	+	+	98,4	
6	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, п.ЗЯБ, мкр.19	+	+	98,1	



## Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %
7	Строительство ДОО на 120 мест, г.Казань, жилой комплекс «Весна 2»	+	не требуются	93,4
8	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.29	+	+	88,5
9	Строительство ДОО на 220 мест, г.Зеленодольск, жилой район «Красный металлист»	+	-	100
10	Строительство ДОО на 140 мест, г.Арск	+	нет на газоснабжение	100
11	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.35А	+	+	92,2
12	Строительство ДОО на 260 мест, г.Буинск	+	-	91,0
13	Строительство дошкольной образовательной организации на 50 мест в Сабинском районе, д.Илебер	-	-	73,4
14	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в Лаишевском районе, ЖК «Южный парк»	-	-	89,4



## Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %
15	Строительство ДОО на 260 мест 2 квартал жилого района "Салават купере"	-	не требуются	85,7
16	Строительство ДОО на 260 мест 3 квартал жилого района "Салават купере"	-	не требуются	81,2
17	Строительство ДОО на 220 мест жилой комплекс "Усадьба Царево"	-	-	85,0



# Здравоохранение

■ Выполнение СМР, %    ■ Принято КС-2, %

## СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ

99,4%

82,7%

Всего 43 объекта  
завершено – 37

## СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ

95,6%

70,3%

Всего 7 объектов  
завершено – 4

## СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

57,0%

41,5%

Всего 1 объект  
завершено – 0

0,0%    20,0%    40,0%    60,0%    80,0%    100,0%



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Елабужский, Колосовский	3 596,19	88,8	11,9
2	Балтасинский, Сардыганский	3 596,19	92,2	3,9
3	Бавлинский, Фоминовский	2 261,02	96,2	1,8
4	Агрызский, Кучуковский	3 596,19	98,8	10,8
5	Мамадышский, Омарский	3 596,19	99,0	8,0
6	Буинский, Раковский	3 596,19	99,8	1,2
	<b>ИТОГО по 43 объектам</b>	<b>147 392,3</b>	<b>99,4</b>	<b>1,0</b>



# Строительство модульно-врачебных амбулаторий

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Кукморский МР, с.Ядыгерь	8 134,86	88,8	2,0
2	Елабужский МР, с.Танайка	15 457,87	89,3	10,6
3	Тетюшский МР, с.Большое Шемякино	16 367,06	95,8	6,7
<b>Итого по 7 объектам</b>		<b>77 358,6</b>	<b>95,6</b>	<b>3,5</b>

## Строительство офиса врача общей практики

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Офис врача общей практики ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, пос.Бирюлинского зверосовхоза	27 985,23	57,0	17,0




# Молодежная политика

## Строительство ДОЛ


### Выполнение работ

Освоено Остаток

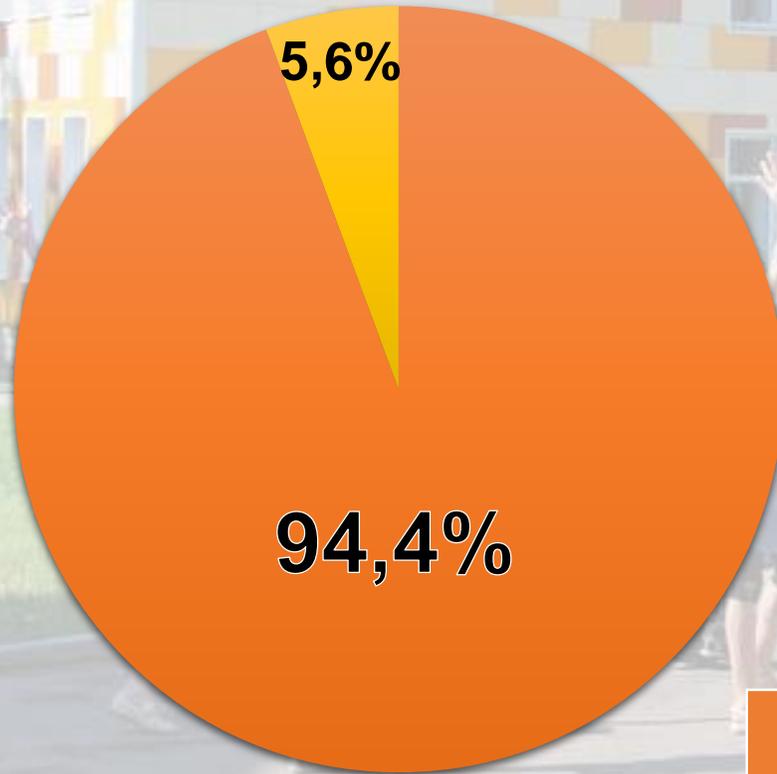

### Принято КС-2

Освоено Остаток

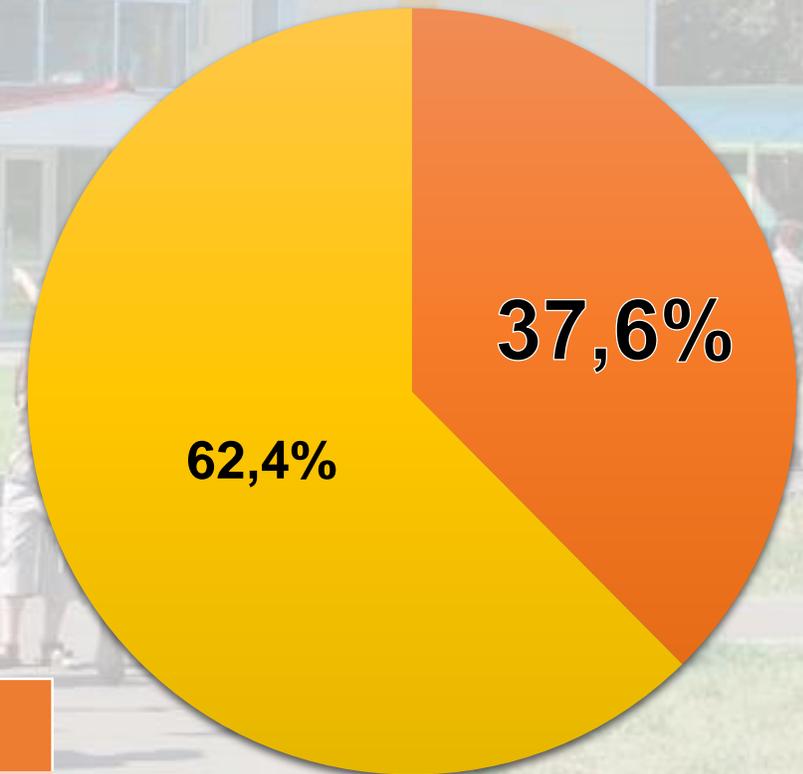

Всего 9 объектов

завершено – 7



# Строительство детских оздоровительных лагерей (в том числе реконструкция)

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %		Подрядчик
			Факт	Динамика за 2 недели	
1	Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» г.Казани	234 682,1	80,0	3,0	ООО «Грань»
2	г.Казань, ДОЛ «Восток»	319 230,3	98,0	1,0	ООО «СМК «Прогресс»
<b>Итого по 9 объектам</b>		<b>935 326,2</b>	<b>94,4</b>	<b>1,8</b>	



# Сельское хозяйство

■ Выполнение СМР, %    ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ  
И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ**

**81,0%**

3,7%

Всего 7 объектов  
завершено – 4

**СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛОСНО-  
СЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ**

**99,2%**

0,0%

Всего 79 объектов  
завершено – 74

0,0%    20,0%    40,0%    60,0%    80,0%    100,0%



## Сельское хозяйство

# Строительство коровников и овцеводческих ферм

№	МО РТ	Сметная стоимость, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Балтасинский район, с.Княбаш	108 053,00	64,0	7,0
2	Сабинский район, с.Тюбяк	52 339,00	65,0	4,0
3	Ютазинский район. д.Яссы-Тугай	24 226,00	75,0	10,0
<b>ИТОГО по 7 объектам</b>		<b>333 333,00</b>	<b>81,0</b>	<b>3,6</b>



Сельское  
хозяйство

## Строительство silosno- сенажных траншей

№	МО РТ	Кол-во объектов (всего/незавершенных)	Сметная стоимость, тыс рублей	СМР, %	
				Факт	Динамика за 2 недели
1	Лениногорский район	1 / 1	1 500,00	39,0	0,0
2	Азнакаевский район	2 / 1	4 200,00	99,4	5,4
3	Высокогорский район	2 / 1	4 300,00	96,7	2,9
4	Кукморский район	5 / 2	8 300,00	94,0	0,2
<b>ИТОГО по 79 объектам</b>		<b>79 / 5</b>	<b>198 500,00</b>	<b>99,2</b>	<b>0,5</b>



# Формирование комфортной городской среды

■ Выполнение СМР, %    ■ Принято КС-2, %

**62 ПРОГРАММНЫХ ОБЪЕКТА**

**96,3%**

**49,3%**

Всего 62 объекта

завершено – 36

**КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ**

**95,8%**

**79,3%**

Всего 4 объекта

завершен – 1

0,0%    20,0%    40,0%    60,0%    80,0%    100,0%



# Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Сармановский, Центральный сквер по ул. Ленина, 2 очередь, пгт.Джалиль	16 984,76	62	0
2	Арский, Площадь Советская и ул.Большая, 3 очередь, г.Арск	40 433,455	69	0
3	Буинский, Парк Сахарного завода, г.Буинск, ул.Строительная	33 029,652	75	10
4	г.Набережные Челны,Парк «Гренада», 2 очередь, пр.Московский	121 029,11	85	15
5	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, пгт.Балтаси,ул.Татарстан	25 972,206	88	16
6	Бугульминский, Активация городского центра, 2 очередь, г.Бугульма,ул.Владимира Ленина	81 453,534	90	5
7	Агрызский,ул.Карла Маркса, 2 очередь, г.Агрыз, ул. Карла Маркса, ул. Гагарина	15 630,751	92	7
8	Высокогорский, Сквер 100 лет ТАССР, с.Высокая гора ул.Центральная-Полковая,	39 414,663	93	1
9	Лениногорский, Сквер им.Ленина, г.Лениногорск	63 730,747	93	4
10	г.Набережные Челны,Парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	23 500,0	94	8
<b>ИТОГО по 62 объектам</b>		<b>2 776 038,3</b>	<b>96,3</b>	<b>1,6</b>



# Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
11	Нурлатский, Парк «Спортивный», 2 очередь, г.Нурлат, ул.Юности	43 760,915	94,6	7,1
12	Апастовский, Набережная р.Табарка, 4 очередь, Табар-Черкийское сельское поселение	15 327,924	95	4
13	Зеленодольский, Парк «Березовая роща», мкр.Мирный, г.Зеленодольск	129 245,55	95	2
14	Кайбицкий, Парк Победы, с.Большие Кайбицы, ул.Солнечный бульвар	10 664,566	95	1
15	Нижнекамский, Мемориальный комплекс, г.Нижнекамск	20 000,0	95	10
16	Пестречинский, Парк отдыха, с.Шали, ул.КамАЗ	15 336,081	96	1
17	Сабинский, Парк по ул.З.Юсупова, пгт.Богатые Сабы	24 214,671	96	1
18	г.Набережные Челны, Бульвар Юных Ленинцев	101 470,4	96	3
<b>ИТОГО по 62 объектам</b>		<b>2 776 038,3</b>	<b>96,3</b>	<b>1,6</b>



# Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
19	Казань, парк "Черное озеро", ул. Дзержинского	75 000,0	96	6
20	Атнинский, Парк «Яшьлек», 2 очередь, с.Новые Шаши	10 142,687	97	3
21	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, г.Лаишево	34 681,094	97	4
22	Бавлинский, Парк Победы и трудовой славы, г.Бавлы, пл.Победы, ул.Куйбышева	27 061,207	98	0
23	Мамадышский, 2 очередь Ул. Советская , 2 очередь, г.Мамадыш, Ул. Советская и Карла Маркса, ул.Чапаева	32 780,023	98	7
24	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки в с. Тюлячи	10 797,18	98	5
25	Ютазинский, Парк Ф.Каримова, 3 очередь, пгт.Уруссу,ул.Ф.Каримова	15 848,242	98	3
26	Черемшанский, Парк «Озерный», 3 очередь, с.Черемшан,ул.Советская	14 760,021	99	0
<b>ИТОГО по 62 объектам</b>		<b>2 776 038,3</b>	<b>96,3</b>	<b>1,6</b>



# Формирование комфортной городской среды

## Конкурс малых городов - 2020

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Лаишевский, «Экстрим-парк» г.Лаишево	45 000,00	95	6
2	Заинский, Центральная площадь у ДК «Энергетик»	70 000,00	94	2
3	Бавлинский, Парк Победы и трудовой славы, г.Бавлы, пл.Победы, ул.Куйбышева	70 000,00	98	2
<b>ИТОГО по 4 объектам</b>		<b>187 293,60</b>	<b>95,8</b>	<b>3,4</b>




# Культура

## Строительство сельских клубов


### Выполнение работ

■ Освоено ■ Остаток

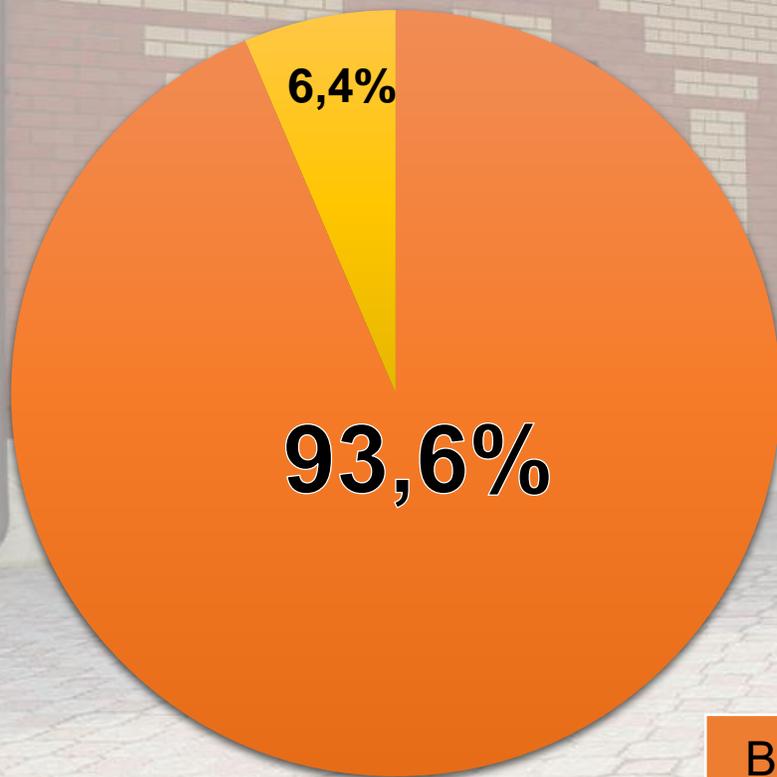

### Принято КС-2

■ Освоено ■ Остаток

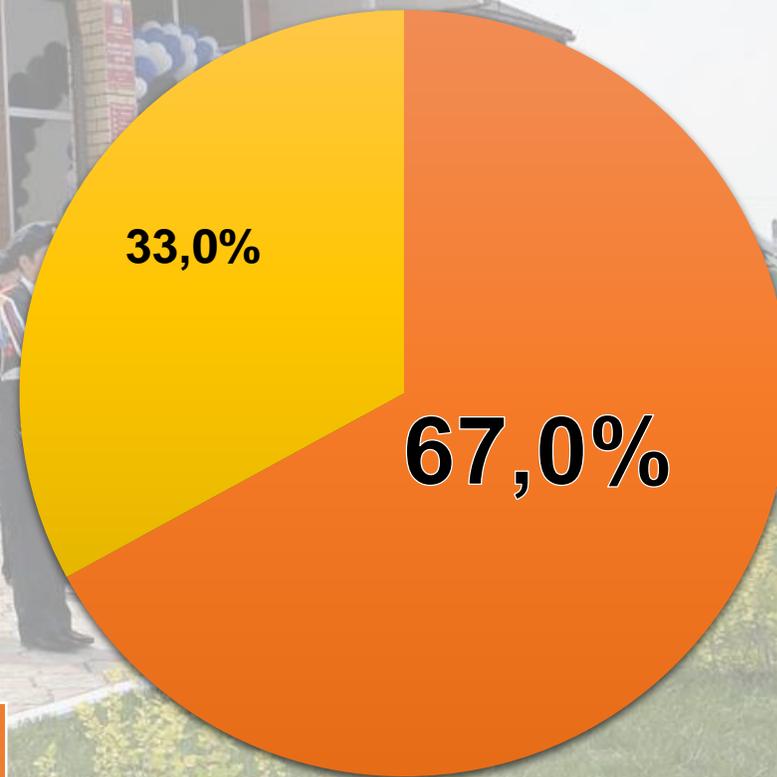

Всего 12 объектов

завершено – 8



№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
				Факт	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский район, г.Азнакаево	200	21 070,37	72,0	17,0
2	Рыбно-Слободской район, с.Биектау	200	21 070,37	77,0	8,0
3	Нурлатский район, г.Нурлат	300	25 328,37	96,0	1,0
4	Чистопольский район, с.Бахта	50	10 559,07	99,0	2,0
<b>ИТОГО по 12 объектам</b>		<b>1 300</b>	<b>185 699,17</b>	<b>93,6</b>	<b>3,5</b>



# Иные социальные программы

■ Выполнение СМР, %    ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ  
СОВЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ**

**95,7%**

Всего 11 объектов  
завершено – 4

**47,9%**

**СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-  
МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ  
КОМПЛЕКСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**83,7%**

Всего 21 объект

**0%**

0,00%    20,00%    40,00%    60,00%    80,00%    100,00%



# Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Кукморский, с.Туембаш	5 758,5	72,0	4,0
2	Лаишевский, с.Малые Кабаны	5 758,5	93,0	16,0
3	Черемшанский, с.Ивашкино	5 758,5	95,0	10,0
4	Ютазинский, с.Байряка	5 758,5	96,0	4,0
5	Агрызский, с.Азево	5 758,5	99,0	1,0
6	Зеленодольский, с.Айша	5 758,5	99,0	1,0
7	Атнинский, с.Коморгузя	5 758,5	99,0	1,0
<b>ИТОГО по 11 объектам</b>		<b>63 343,5</b>	<b>95,7</b>	<b>3,2</b>



## Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Кудашево, ул.Тукая	2 673,96	56,0	17,5
2	Новошешминский, с.Русская Чебоксарка, ул.Речная	2 673,96	56,7	1,2
3	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Дуслык	2 673,96	77,0	1,5
4	Сабинский, с.Старый Мичан, ул.Залесная	2 673,96	77,0	1,5
5	Елабужский, п.Малореченский, ул.Центральная	2 673,96	82,5	1,5
6	Чистопольский, с.Четырчи, ул.Зеленая	2 673,96	84,0	12,8
7	Заинский, с.Сарапала, ул.Центральная	2 673,96	84,0	1,2
8	Камско-Устьинский, с. Балтачево, ул.Школьная	2 673,96	84,8	2,1
9	Муслюмовский, с.Семяково, ул.Школьная	2 673,96	85,5	2,7
10	Кайбицкий, с.Ульянково, ул.Школьная	2 673,96	86,5	3,7
11	Кукморский, д.Старая Уча, ул.Первомайская	2 673,96	86,7	20,2
<b>ИТОГО по 21 объекту</b>		<b>56 153,16</b>	<b>83,7</b>	<b>6,9</b>

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах**

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
12	Мамадышский, с.Дигитли, ул.Центральная	2 673,96	88,5	4,7
13	Сармановский, с.Сарманово, ул.В.Терешковой	2 673,96	89,0	1,5
14	Буинский, д.Раково, ул.Центральная	2 673,96	89,5	6,5
15	Дрожжановский, с.Новые Чукалы, ул.Советская	2 673,96	89,5	10,0
16	Мамадышский, с.Соколка, ул.Лесная	2 673,96	89,5	3,2
17	Алексеевский, д.Березовая Грива, ул.Пушкина	2 673,96	89,7	5,9
18	Актанышский, с.Чишма, ул.Центральная	2 673,96	90,0	2,2
19	Алькеевский, с.Верхнее Алькеево, ул.Мира	2 673,96	90,0	8,1
20	Тукаевский, д.Кугашево, ул.Лесная	2 673,96	90,0	2,0
21	Черемшанский, д.Старое Серезжино, ул.Степная	2 673,96	90,0	1,5
<b>ИТОГО по 21 объекту</b>		<b>56 153,16</b>	<b>83,7</b>	<b>6,9</b>



# Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ</b>					
1	Формирование комфортной городской среды	1 452 790,33	1 380 575,18	72 215,15	РКМ №1891-р от 29.09.2020
2	Реконструкция, строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах Республики Татарстан	162 200,00	150 846,00	11 354,00	РКМ №2481-р от 18.11.2020
3	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений Республики Татарстан	69 900,00	65 007,00	4 893,00	РКМ №2499-р от 20.11.2020



# Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ</b>					
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан	225 000,00	224 900,00	100,00	РКМ №2500-р от 20.11.2020
<b>Министерство спорта РТ</b>					
5	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	300 000,00	292 289,10	7 710,90	РКМ №2445-р от 13.11.2020
6	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,00	484 175,08	15 824,92	РКМ №2494-р от 20.11.2020
<b>Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ</b>					
7	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов)	60 000,00	60 000,00	0,00	РКМ №2449-р от 13.11.2020
8	Капитальный ремонт овощехранилищ	15 000,00	15 000,00	0,00	РКМ №2450-р от 13.11.2020



## Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ, зашедшие в КМ РТ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ</b>					
1	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии	30 000,00	30 000,00	0,00	вх. КМ РТ от 07.11.2020 № 62093
2	Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений	20 000,00	20 000,00	0,00	
3	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах	150 000,00	150 000,00	0,00	вх. КМ РТ от 12.11.2020 № 63104
<b>Государственный комитет РТ по архивному делу</b>					
4	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	48 890,00	1 110,00	согл-9846597-1 от 09.10.2020
<b>Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ</b>					
5	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания	100 000,00	100 000,00	0,00	вх. КМ РТ от 26.10.2020 № 59602



## Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство по делам молодежи РТ</b>					
1	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	согл-9993502-2 от 16.11.2020
2	Капитальный ремонт молодежных центров	95 000,00	91 390,00	3 610,00	согл-9889917-5 от 20.10.2020
3	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	96 200,00	3 800,00	согл-9907278-2 от 23.10.2020
<b>Министерство здравоохранения РТ</b>					
4	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения	330 000,00	318 119,88	11 880,12	согл-9847551-6 от 09.10.2020
5	Строительство и капитальный ремонт стационаров	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	согл-9849301-6 от 09.10.2020



# Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство внутренних дел по РТ</b>					
6	Строительство и капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	150 000,00	148 860,00	1 140,00	согл-9846875-3 от 09.10.2020
<b>Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ</b>					
7	Строительство силосно-сенажных траншей	54 600,00	54 600,00	0,00	согл-9897246-4 от 21.10.2020
8	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	50 000,00	2 920,56	согл-9897240-6 от 21.10.2020
<b>Министерство лесного хозяйства РТ</b>					
9	Капитальный ремонт подведомственных зданий	70 500,00	70 500,00	0,00	согл-9844624-4 от 08.10.2020



## Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»</b>					
10	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов	100 000,00	97 501,13	2 498,87	согл-9901594-5 от 22.10.2020
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ</b>					
11	Обеспечение населения питьевой водой	650 000,00	589 250,00	60 750,00	согл-9742193-9 от 15.09.2020
12	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	167 100,00	167 100,00	0,00	согл-9849577-3 от 09.10.2020
<b>Управление Росгвардии по РТ</b>					
13	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии	111 403,45	111 403,45	0,00	согл-9907252-1 от 23.10.2020



## Формирование государственных программ на 2021 год. Проводится работа по формированию программ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство образования и науки РТ</b>					
1	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,8	179 654,72	10 395,08	МОиН РТ проводится работа по согласованию подхода по формированию мероприятий с руководством республики
2	Капремонт объектов образования	2 000 000,0	1 921 079,41	78 920,59	
3	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,0	481 000,00	19 000,00	
4	Строительство дошкольных образовательных организаций	2 859 627,23	2 820 615,39	39 011,84	Перечень определен, ожидается выход заключений экспертиз
5	Организация горячего питания в школах	1 000 000,00			Перечень определен, ожидается предоставление документации от районов, параллельно ведется работа по расчету стоимости объектов




## Формирование государственных программ на 2021 год. Проводится работа по формированию программ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
<b>Министерство культуры РТ</b>					
6	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	300 000,00	288 600,00	11 400,00	Перечень представлен, однако документация по части объектов отсутствует
7	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	150 000,00	144 300,00	5 700,00	Перечень представлен, однако документация по части объектов отсутствует



# Ввод жилья в Республике Татарстан

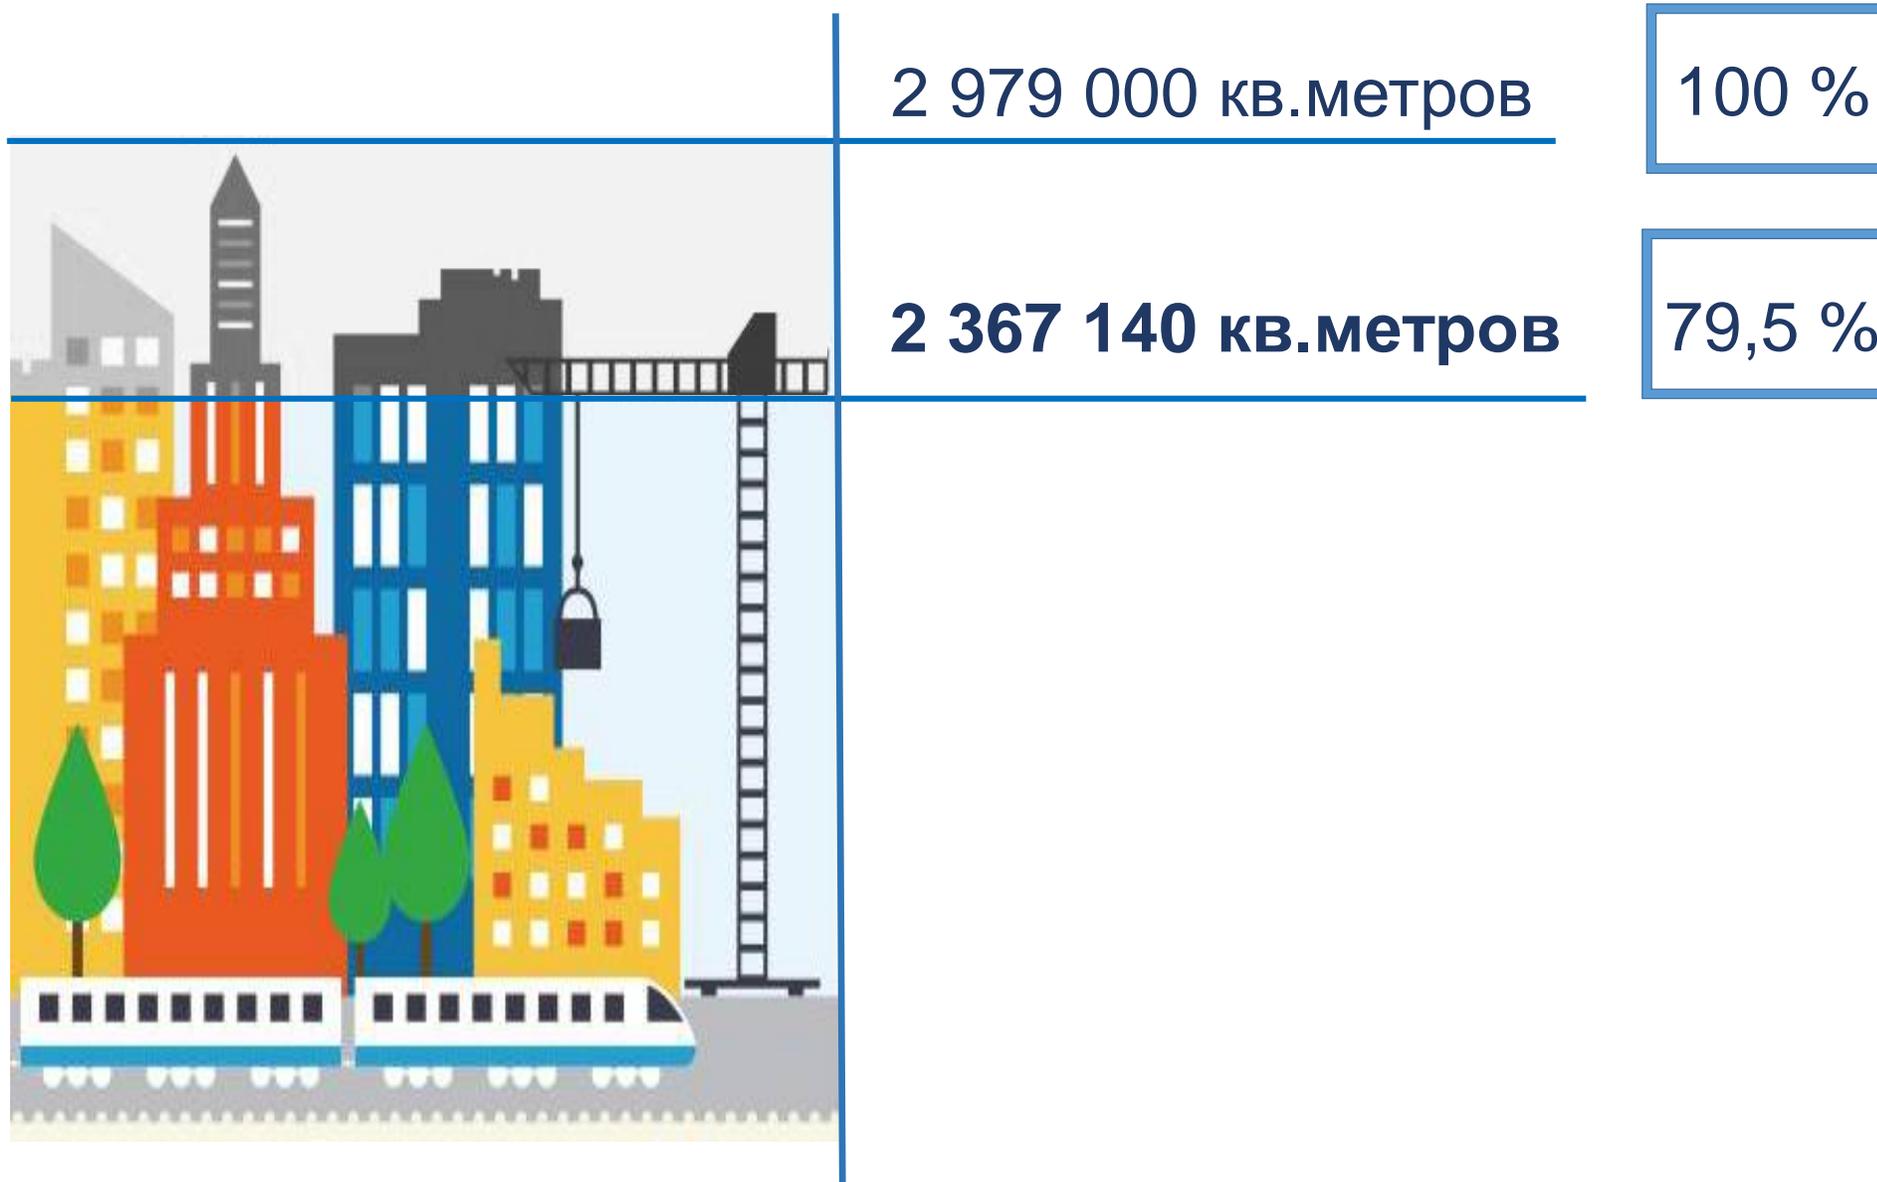



# Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	42 412	38,6	67 588
2	Лениногорский	32 000	15 365	48,0	16 635
3	Бугульминский	45 000	22 720	50,5	22 280
4	Чистопольский	35 000	19 335	55,2	15 665
5	Тетюшский	14 000	8 124	58,0	5 876
6	г.Наб.Челны	350 000	207 600	59,3	142 400
7	Новошешминский	6 000	3 718	62,0	2 282
8	К-Устьинский	12 000	7 700	64,2	4 300
9	Атнинский	6 000	3 958	66,0	2 042
10	Арский	30 000	20 874	69,6	9 126
11	Муслюмовский	12 000	8 585	71,5	3 415
12	Менделеевский	15 000	10 841	72,3	4 159
13	г.Казань	960 000	699 867	72,9	260 133
14	Аксубаевский	10 000	7 302	73,0	2 698
15	Азнакаевский	26 000	19 019	73,2	6 981
<b>ВСЕГО</b>		<b>2 979 000</b>	<b>2 367 140</b>	<b>79,5</b>	<b>611 860</b>



# Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Дрожжановский	9 000	6 996	77,7	2 004
17	Альметьевский	140 000	110 075	78,6	29 925
18	Зеленодольский	110 000	86 946	79,0	23 054
19	В-Услонский	50 000	40 618	81,2	9 382
20	Спасский	9 000	7 366	81,8	1 634
21	Елабужский	65 000	54 217	83,4	10 783
22	Бавлинский	18 000	15 226	84,6	2 774
23	Буинский	20 000	17 068	85,3	2 932
24	Актанышский	18 000	15 445	85,8	2 555
25	Алькеевский	10 000	8 731	87,3	1 269
26	Мамадышский	23 000	20 283	88,2	2 717
27	Мензелинский	18 000	15 928	88,5	2 072
28	Сабинский	26 000	23 068	88,7	2 932
29	Тюлячинский	12 000	10 708	89,2	1 292
30	Р-Слободский	18 000	16 366	90,9	1 634
<b>ВСЕГО</b>		<b>2 979 000</b>	<b>2 367 140</b>	<b>79,5</b>	<b>611 860</b>




# Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Сармановский	12 000	10 968	91,4	1 032
32	Алексеевский	19 000	17 422	91,7	1 578
33	Ютазинский	15 000	13 882	92,5	1 118
34	Агрызский	21 000	19 563	93,2	1 437
35	Кайбицкий	7 000	6 636	94,8	364
36	Заинский	21 000	20 133	95,9	867
37	Балтасинский	18 000	17 412	96,7	588
38	Кукморский	29 000	28 378	97,9	622
39	Нурлатский	20 000	19 596	98,0	404
40	Черемшанский	7 000	6 948	99,3	52
41	Пестречинский	200 000	203 568	101,8	-
42	Тукаевский	120 000	126 818	105,7	-
43	Апастовский	8 000	8 901	111,3	-
44	Высокогорский	110 000	127 567	116,0	-
45	Лаишевский	160 000	192 887	120,6	-
<b>ВСЕГО</b>		<b>2 979 000</b>	<b>2 367 140</b>	<b>79,5</b>	<b>611 860</b>



# Программа ГЖФ РТ

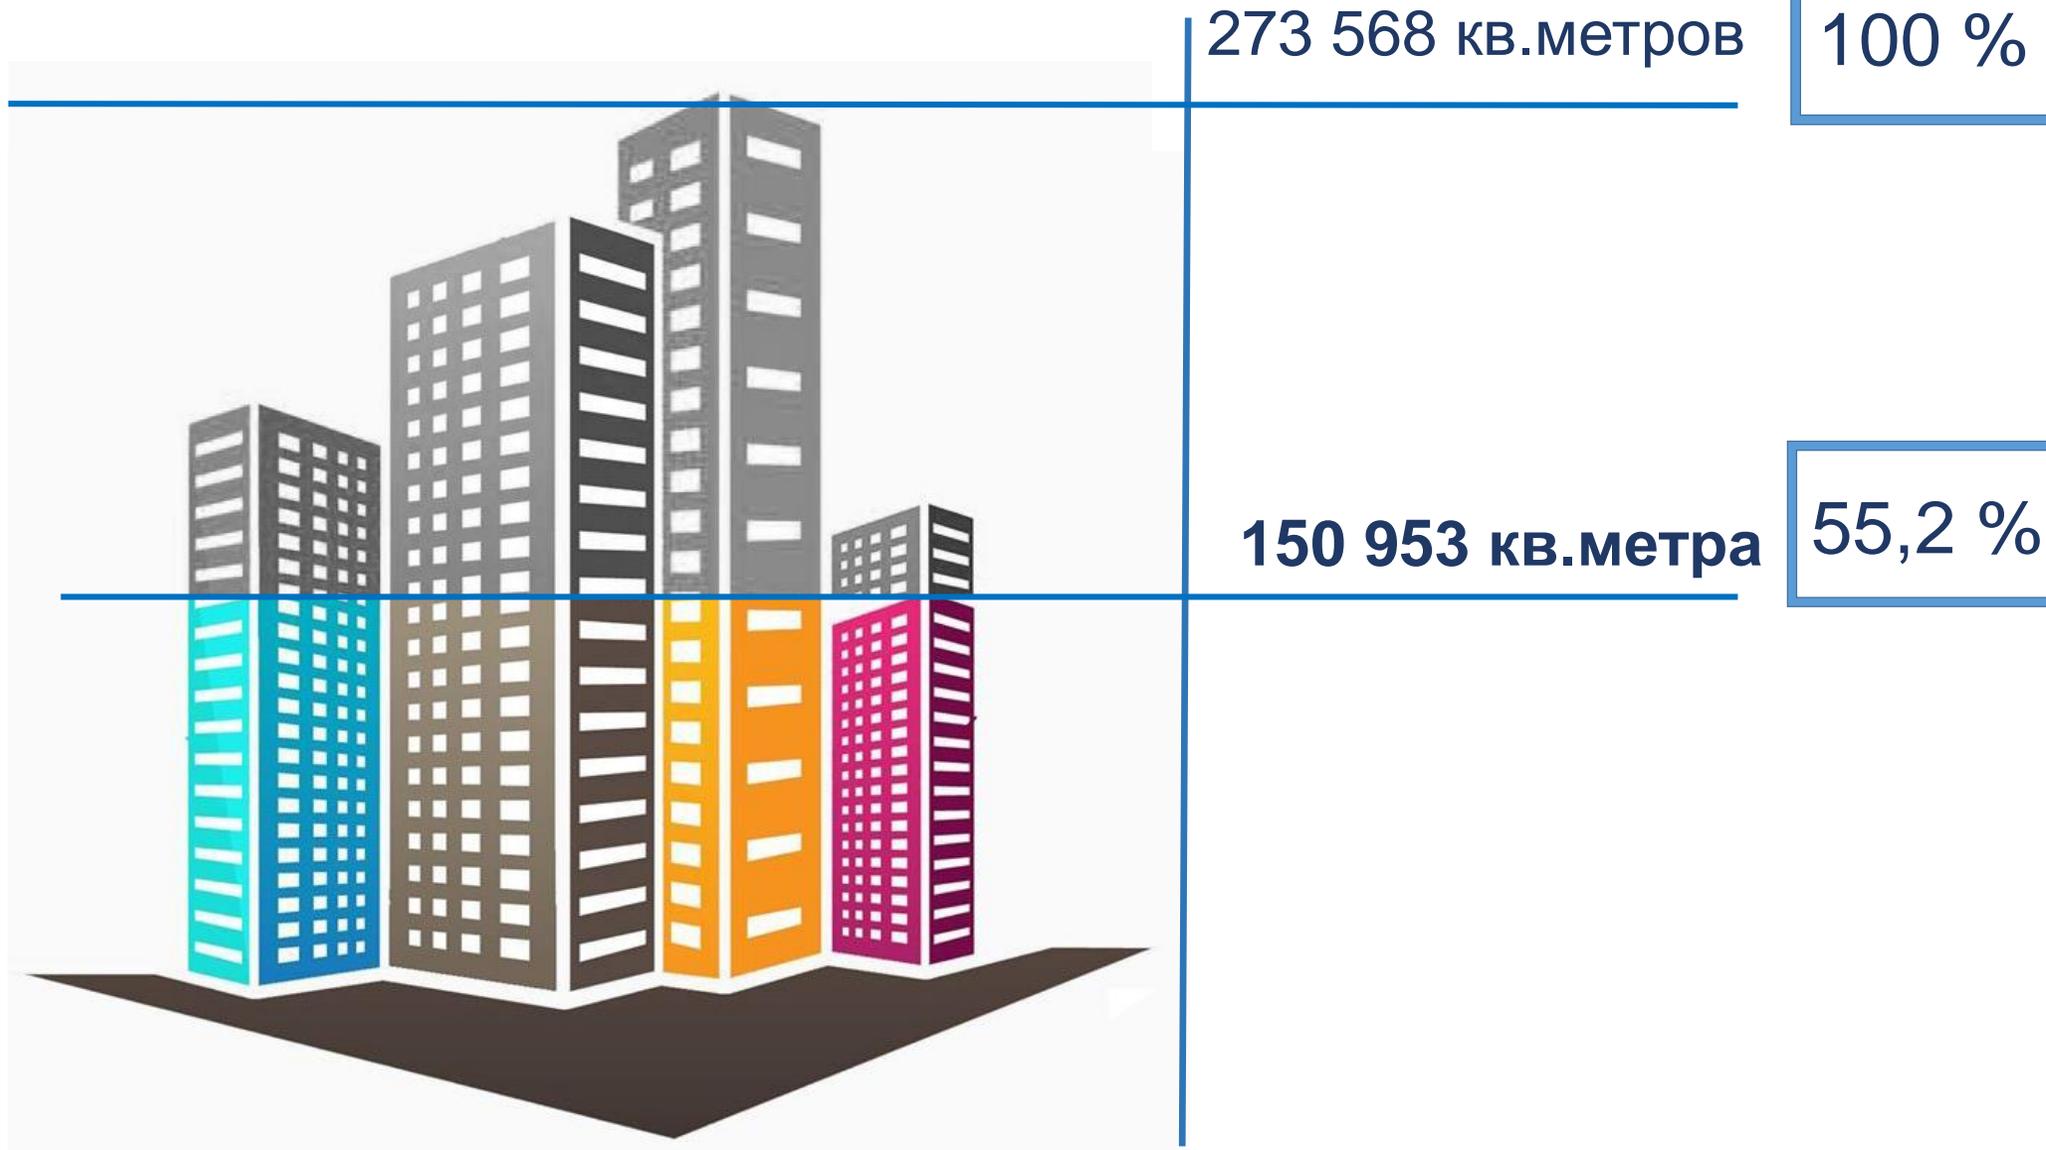



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	План	Введено		Остаток	Степень готовности	
		Всего	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)
Количество объектов	<b>130</b>	90	7	40	35	5
Количество квартир	<b>4 970</b>	2 631	372	2 339	2 322	17
Общая площадь (тыс кв.метров)	<b>273,6</b>	150,9	17,1	122,7	122,1	0,6




# Ход исполнения программы ГЖФ РТ

тыс руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2 / КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
введены в эксплуатацию	4 904 466	4 904 466	7 800	4 556 121	31 779	4 672 504	1 098
высокая 70-100%	5 411 325	4 952 794	68 812	3 907 199	85 028	4 653 709	131 255
средняя 30-70%	18 760	9 036	495	5 222	0	8 243	0
низкая 0-30%	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>10 334 551</b>	<b>9 866 295</b>	<b>77 107</b>	<b>8 468 542</b>	<b>116 807</b>	<b>9 334 456</b>	<b>132 353</b>



# Многоквартирное инвестиционное жильё

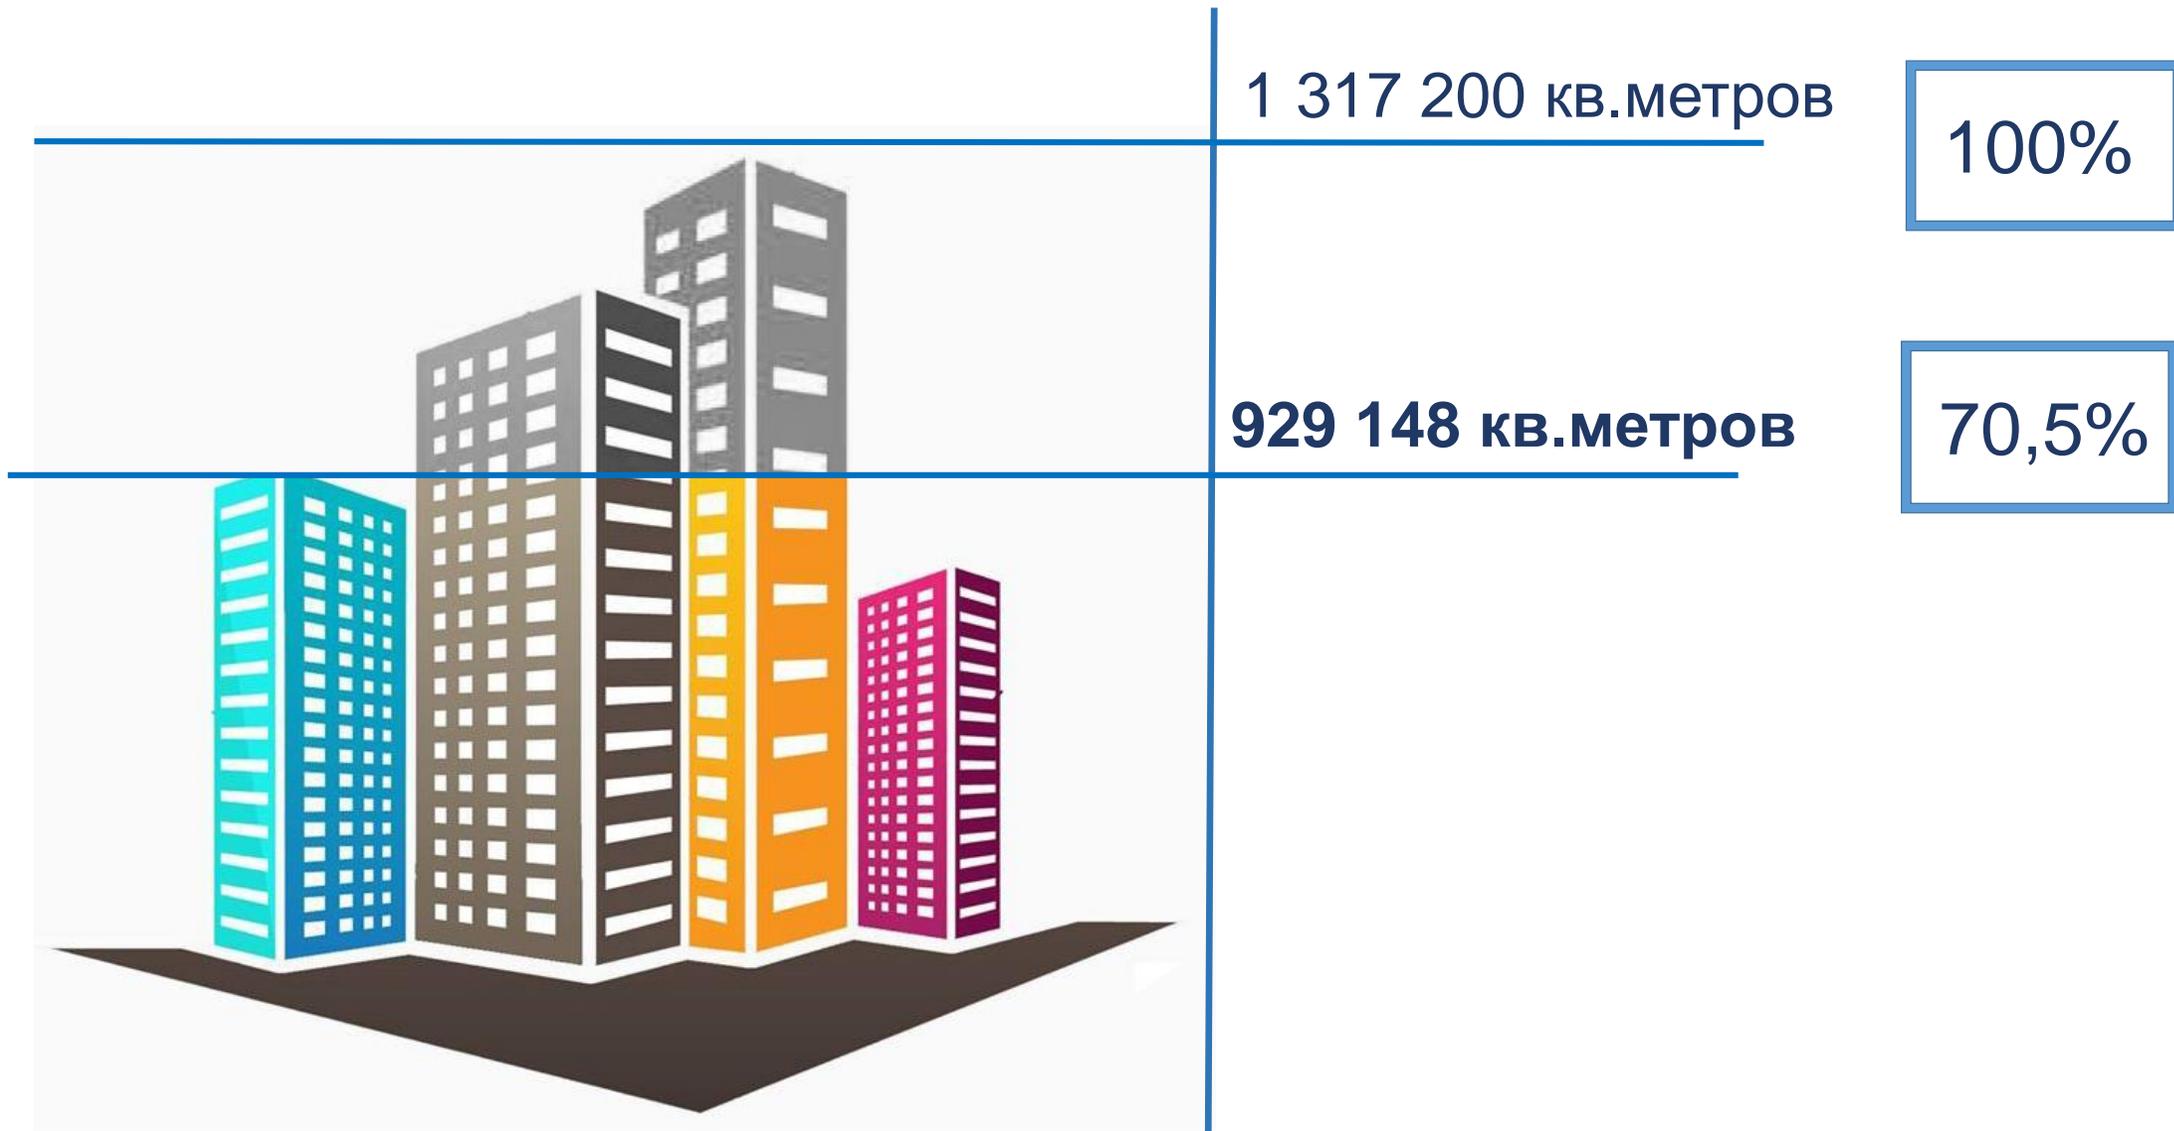



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			высокая (70-100%)
1	Агрызский	1	1
2	Альметьевский	3	3
3	Арский	1	1
4	Буинский	1	1
6	Елабужский	2	2
7	Зеленодольский	2	2
9	Пестречинский	4	4
10	г.Набережные Челны	10	10
11	г.Казань	20	20
<b>ВСЕГО</b>		<b>44</b>	<b>44</b>



# Индивидуальное жилищное строительство



10 680 ДОМОВ

100%

9 900 ДОМОВ

92,7%



# Улучшение жилищных условий граждан

■ Заселено, ед. ■ Остаток, ед.

**МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ**

**100,0%**

План 46

обеспечено – 46

**МОЛОДЫЕ СЕМЬИ**

**97,9%**

**2,1%**

План 47

обеспечено – 46

**ДЕТИ-СИРОТЫ**

**50,7%**

**49,3%**

План 600

обеспечено – 304

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



# Отдельные категории граждан

■ Реализовано, ед. ■ Остаток, ед.

**ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ РАЙОНОВ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА**

**100%**

План 2

обеспечено – 2

**ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ**

**100%**

План 12

обеспечено – 12

**ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ**

**90%**

**10%**

План 10

обеспечено – 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%



## Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей
1	Арский	1	1	7	Нижекамский	5	5
2	Альметьевский	1	1	8	Нурлатский	1	1
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Ютазинский	1	1
5	Елабужский	1	1	11	г.Набережные Челны	10	10
6	Лаишевский	1	1	12	г.Казань	23	22
<b>ИТОГО</b>						<b>47</b>	<b>46</b>



## Отдельные категории граждан

№	Категория граждан	Оформлено сертификатов			
		Выдано	Открыт счет	Заявка на оплату	Реализовано
1	Чернобыльцы	9	9	9	9
2	Вынужденные переселенцы	12	12	9	9
2.1	Альметьевский	1	1	0	0
2.2	Казань	2	2	0	0
3	Выехавшие из районов Крайнего Севера	2	2	1	1
3.1	Верхнеуслонский	1	1	0	0
	<b>Итого</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>19</b>



# Дети-сироты

№	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено	№	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
1	Агрызский	4	0	-	-	12	Мензелинский	4	4	4	4
2	Актанышский	1	1	0	-	13	Нижнекамский	129	100	90	90
3	Альметьевский	82	82	79	79	14	Сабинский	1	0	-	-
4	Апастовский	1	1	0	-	15	Сармановский	4	4	4	4
5	Бугульминский	9	0	-	-	16	Тукаевский	3	3	3	-
6	Высокогорский	2	2	2	2	17	Тюлячинский	4	0	-	-
7	Елабужский	26	0	-	-	18	Черемшанский	2	0	-	-
8	Зеленодольский	2	2	2	2	19	Чистопольский	2	2	2	-
9	Кайбицкий	1	1	1	1	20	г.Наб. Челны	13	13	13	13
10	Кукморский	5	5	5	5	21	г.Казань	284	178	99	99
11	Лаишевский	5	5	5	5						
<b>ИТОГО</b>								<b>584</b>	<b>403</b>	<b>309</b>	<b>304</b>



# Количество несчастных случаев

■ Со смертельным исходом    ■ С тяжелым исходом

**ВСЕГО  
по РТ**

**11 мес 2017**



**26**

**11 мес 2018**



**21**

**11 мес 2019**



**18**

**11 мес 2020**



**17**

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

## Строительство административного здания, по ул. Н.Ершова, г. Казань



**Крутизна откосов котлована  
не соответствует проекту  
(глубина котлована 3-4 метра,  
откосы выполнены вертикально)**

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО СЗ «СтройУслуги». Генподрядчик: ООО «Аква Бренд»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

## Строительство общежития для студентов и аспирантов, г. Альметьевск



**Работники не обеспечены  
защитными касками,  
средствами индивидуальной  
защиты органов дыхания и рук  
(масками и рукавицами)**

Составлены протокол  
об административном правонарушении  
на физическое лицо

**Технический заказчик: ПАО «Татнефть».  
Генподрядчик: ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
Проведено проверок	2 337
Выявлено нарушений	566
Устранено нарушений	529
Процент устранения нарушений	93
Составлены предписания	278



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	Аксубаевский	26	1	0	0
2	Алексеевский	15	4	0	0
3	Лениногорский	29	4	0	0
4	Черемшанский	29	22	17	77
5	Альметьевский	64	42	37	88
6	г. Казань	463	158	141	89
7	Апастовский	27	10	9	90
8	г. Наб.Челны	48	67	67	100
9	Агрызский	33	0	0	-
10	Азнакаевский	42	0	0	-
11	Актанышский	47	0	0	-
12	Алькеевский	12	2	2	100
13	Арский	98	2	2	100
14	Атнинский	47	4	4	100
15	Бавлинский	26	0	0	-
16	Балтасинский	52	3	3	100



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Бугульминский	84	12	12	100
18	Буинский	33	21	21	100
19	Верхнеуслонский	16	10	10	100
20	Высокогорский	102	4	4	100
21	Дрожжановский	10	2	2	100
22	Елабужский	53	20	20	100
23	Заинский	29	17	17	100
24	Зеленодольский	104	32	32	100
25	Кайбицкий	22	16	16	100
26	Камско-Устьинский	28	20	20	100
27	Кукморский	96	0	0	-
28	Лаишевский	78	4	4	100
29	Мамадышский	33	20	20	100
30	Менделеевский	13	7	7	100
31	Мензелинский	22	0	0	-



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Муслюмовский	16	4	4	100
33	Нижнекамский	58	21	21	100
34	Новошешменский	26	0	0	-
35	Нурлатский	40	3	3	100
36	Пестречинский	87	0	0	-
37	Рыбно-Слободский	16	3	3	100
38	Сабинский	120	7	7	100
39	Сармановский	32	0	0	-
40	Спасский	10	1	1	100
41	Тетюшский	18	14	14	100
42	Тукаевский	49	5	5	100
43	Тюлячинский	43	2	2	100
44	Чистопольский	19	2	2	100
45	Ютазинский	22	0	0	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 337</b>	<b>566</b>	<b>529</b>	<b>93</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 227	-
Вынесено постановлений: - об административной ответственности,	128	5 538,0
- в том числе предупреждений	48	-
Взыскано всего	44	3 049,5
Не истёк срок оплаты	33	2 227,5
Обжалуются в суде	3	211,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (саморегулируемые организации РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
<b>Проведено проверок, в том числе:</b>	<b>1 521</b>
- с выездом на объекты строительства	623
<b>Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:</b>	<b>1 094</b>
- выдано предписаний	359
- приостановлено право осуществлять строительство	239
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	61
- выдано предупреждений	435



**Спасибо за внимание!**
