




Здравоохранение

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ**

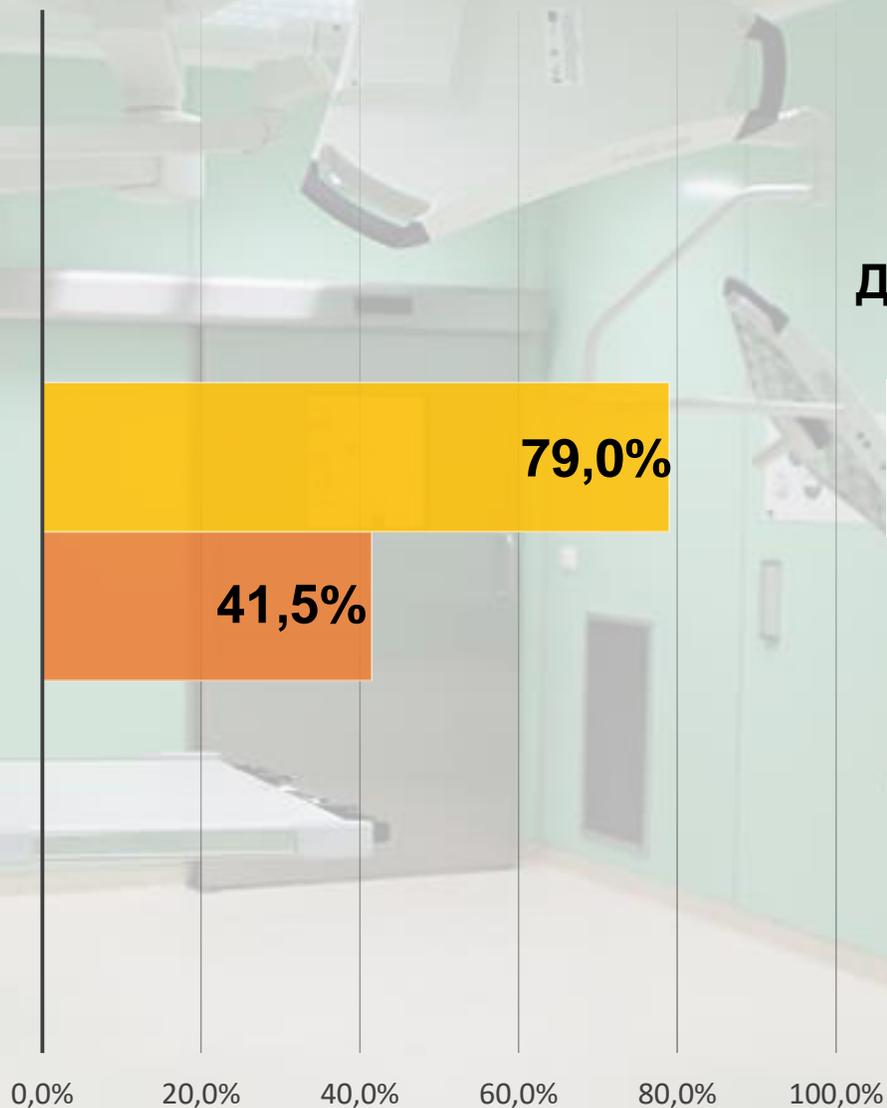

Динамика

8%

Всего 1 объект

завершено – 0



Строительство офиса врача общей практики

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Офис врача общей практики ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, пос.Бирюлинского зверосовхоза	27 985,23	79,0	8,0




Формирование комфортной городской среды

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

61 ПРОГРАММНЫЙ ОБЪЕКТ

Динамика

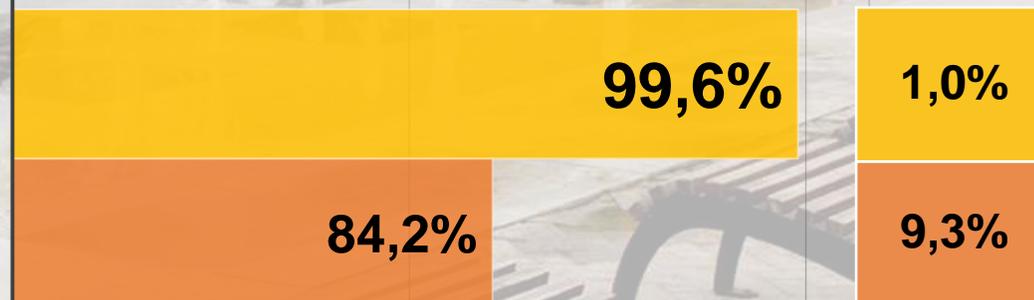

завершено – 56

60,0%

80,0%

100,0%



Формирование комфортной городской среды


№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Сармановский, Центральный сквер по ул.Ленина, 2 очередь, пгт.Джалиль	16 984,76	94	4
2	г.Набережные Челны, Парк «Гренада», 2 очередь, пр.Московский	121 029,11	95	5
3	Бугульминский, Активация городского центра, 2 очередь, г.Бугульма, ул.Владимира Ленина	81 453,534	96	3
4	Лениногорский, Сквер им.Ленина, г.Лениногорск	63 730,747	97	2
5	Нижнекамский, Мемориальный комплекс, г.Нижнекамск	20 000,0	99	1
ИТОГО по 61 объекту		2 768 396,24	99,6	1,0



Сельское хозяйство

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО
КОРОВНИКОВ
И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ**

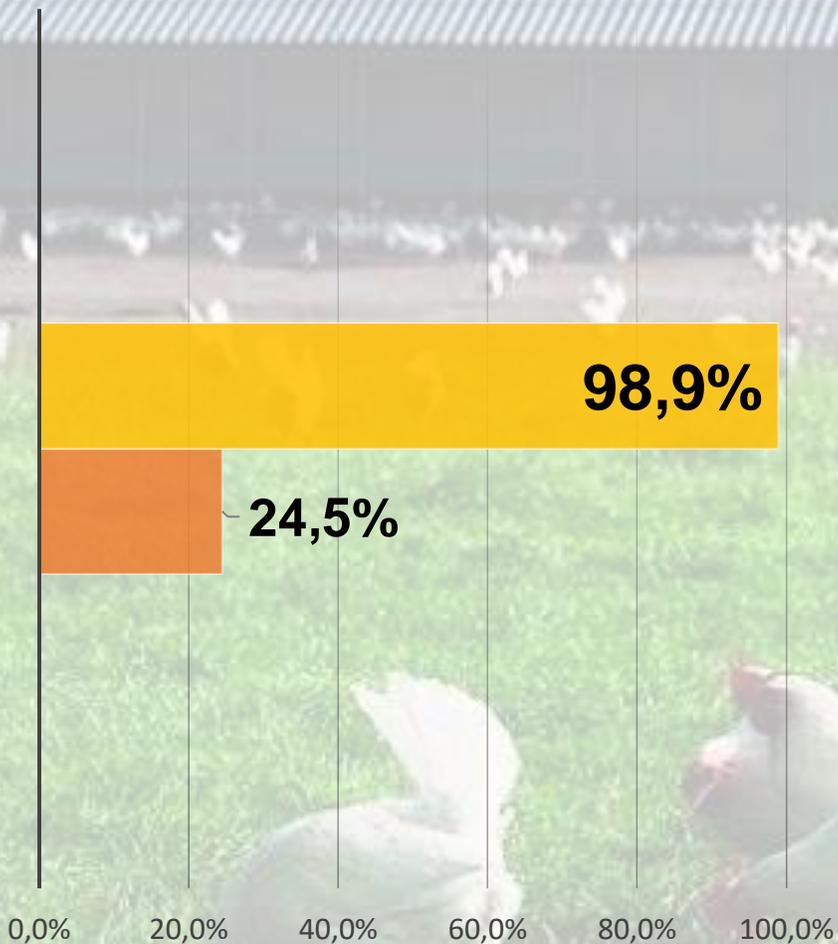

Динамика

8,4%

Всего 7 объектов
завершено – 6



Сельское хозяйство

Строительство коровников и овцеводческих ферм


№	МО РТ	Сметная стоимость, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Сабинский район, с.Тюбяк	52 339,00	93,0	21,0
ИТОГО по 7 объектам		333 333,00	98,9	8,4



Иные социальные программы

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-
МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ
КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ**

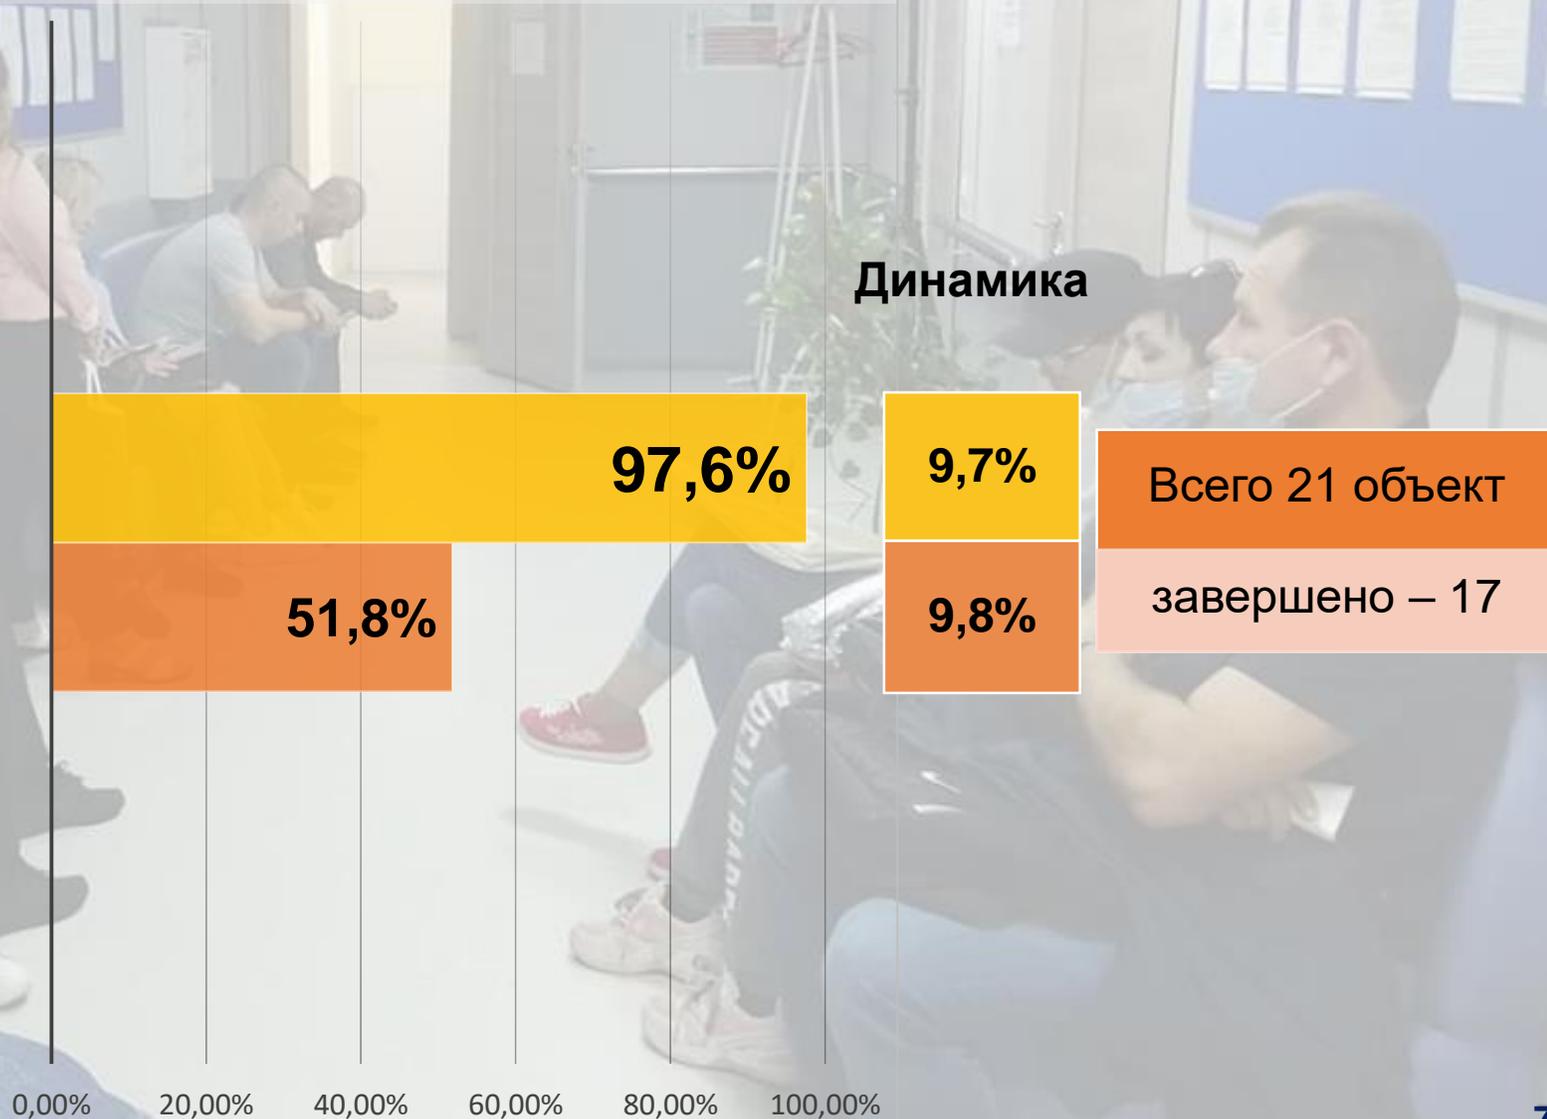



Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах


№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Кудашево, ул.Тукая	2 673,96	81,5	4,5
2	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Дуслык	2 673,96	84,0	6,0
3	Сабинский, с.Старый Мичан, ул.Залесная	2 673,96	84,0	5,3
4	Алькеевский, с.Верхнее Алькеево, ул.Мира	2 673,96	99,5	9,5
ИТОГО по 21 объекту		56 153,16	97,6	9,7



Образование

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

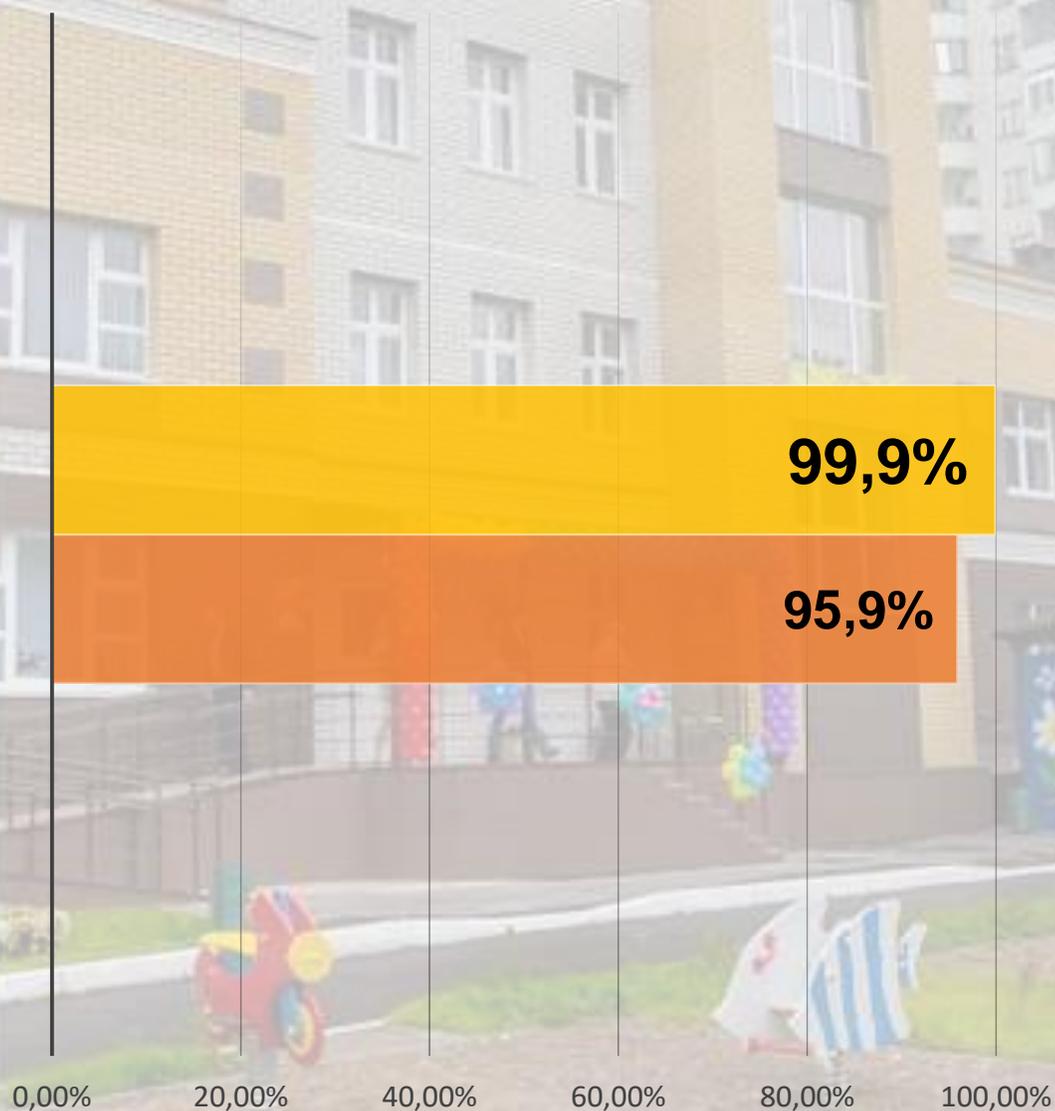

Динамика

0,4%

Всего 22 объект

2,5%

завершено – 21



Строительство дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Детский сад на 340 мест в г.Казань, ЖР «Западное Заречье» (ул.Серова-Баруди)	355 521,73	99,0	2,0
ИТОГО по 22 объектам		5 282 814,68	99,9	0,4



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
1	Строительство ДОО на 340 мест, с.Высокая Гора	+	+	100	передан
2	Строительство ДОО на 340 мест, г.Казань, ЖК «Залесный Сити»	+	не требуются	100	передан
3	Строительство ДОО на 140 мест, Тукаевский МО, д.Азьмушкино	+	+	100	передан
4	Строительство ДОО на 220 мест жилой комплекс «Усадьба Царево»	+	+	100	передан
5	Строительство ДОО на 140 мест, г.Арск	+	+	100	передан
6	Строительство ДОО на 220 мест, г.Зеленодольск, ЖР «Красный металлист»	+	+	100	передан



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
7	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, ЖР «Замелекесье», мкр.25	+	+	100	акт в МЗИО РТ
8	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, ЖР «Замелекесье», мкр.22	+	+	100	акт в МЗИО РТ
9	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, п.ЗЯБ, мкр.19	+	+	100	акт в МЗИО РТ
10	Строительство ДОО на 260 мест 2 квартал жилого района «Салават купере»	+	не требуются	100	акт в МЗИО РТ
11	Строительство ДОО на 260 мест 3 квартал жилого района «Салават купере»	+	не требуются	100	акт в МЗИО РТ
12	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.35А	+	+	100	акт в МЗИО РТ
13	Строительство ДОО на 260 мест, г.Буинск	+	+	100	акт в МЗИО РТ



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
14	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Казань, мкр. «Седьмое небо»	+	не требуются	100	акт в МЗИО РТ
15	Строительство дошкольной образовательной организации на 50 мест в Сабинском районе, д.Илебер	+	-	100	акт в МЗИО РТ
16	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.29	+	+	100	акт в МЗИО РТ
17	Строительство ДОО на 120 мест, г.Казань, жилой комплекс «Весна 2»	+	не требуются	100	
18	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в Лаишевском районе, ЖК «Южный парк»	+	не требуются	98,2	



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
1	Формирование комфортной городской среды	1 452 790,33	1 380 575,18	72 215,15	РКМ № 1891-р от 29.09.2020
2	Реконструкция, строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах Республики Татарстан	162 200,00	150 846,00	11 354,00	РКМ № 2481-р от 18.11.2020
3	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений Республики Татарстан	69 900,00	65 007,00	4 893,00	РКМ № 2499-р от 20.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан	225 000,00	224 900,00	100,00	РКМ № 2500-р от 20.11.2020
Министерство спорта РТ					
5	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	300 000,00	292 289,10	7 710,90	РКМ № 2445-р от 13.11.2020
6	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,00	484 175,08	15 824,92	РКМ № 2494-р от 20.11.2020
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
7	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов)	60 000,00	60 000,00	0,00	РКМ № 2449-р от 13.11.2020
8	Капитальный ремонт овощехранилищ	15 000,00	15 000,00	0,00	РКМ № 2450-р от 13.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии	30 000,00	30 000,00	0,00	РКМ № 2513-р от 23.11.2020
10	Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений	20 000,00	20 000,00	0,00	
11	Строительство силосно-сенажных траншей	54 600,00	54 600,00	0,00	РКМ № 2677-р от 07.12.2020
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ					
12	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания	100 000,00	100 000,00	0,00	РКМ № 2566-р от 26.11.2020
Министерство лесного хозяйства РТ					
13	Капитальный ремонт подведомственных зданий	70 500,00	70 500,00	0,00	РКМ № 2611-р от 28.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимита финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Управление Росгвардии по РТ					
14	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии	111 403,45	111 403,45	0,00	РКМ № 2720-р от 11.12.2020
Государственный комитет РТ по архивному делу					
15	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	48 890,00	1 110,00	РКМ № 2558-р от 25.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ, зашедшие в КМ РТ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
1	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	50 000,00	2 920,56	вх. КМ РТ № 67921 от 03.12.2020
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»					
2	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов	100 000,00	97 501,13	2 498,87	вх. КМ РТ № 67745 от 03.12.2020
Министерство здравоохранения РТ					
3	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения	330 000,00	318 119,88	11 880,12	вх. в КМ РТ № 70135 от 14.12.2020
4	Строительство и капитальный ремонт стационаров	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	вх. в КМ РТ № 71157 от 17.12.2020



Формирование государственных программ на 2021 год

Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство по делам молодежи РТ					
1	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	согл-9993502-3 от 16.11.2020
2	Капитальный ремонт молодежных центров	95 000,00	91 390,00	3 610,00	согл-9889917-6 от 20.10.2020
3	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	96 200,00	3 800,00	согл-9907278-4 от 23.10.2020
Министерство образования и науки РТ					
4	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,8	179 654,72	10 395,08	согл-9971769-6 от 11.11.2020
5	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,0	481 000,00	19 000,00	согл-9971422-3 от 11.11.2020
6	Строительство дошкольных образовательных организаций	3 021 020,04	3 014 003,1	7 016,94	согл-10016146-2 от 20.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство внутренних дел по РТ					
7	Строительство и капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	150 000,00	148 860,00	1 140,00	согл-9846875-3 от 09.10.2020
Министерство культуры РТ					
8	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	300 000,00	288 600,00	11 400,00	согл-9850189-6 от 09.10.2020
9	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	150 000,00	144 300,00	5 700,00	согл-9850286-8 от 09.10.2020
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
10	Обеспечение населения питьевой водой	650 000,00	589 250,00	60 750,00	согл-9742193-9 от 15.09.2020
11	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	167 100,00	167 100,00	0,00	согл-9849577-3 от 09.10.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
12	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах	150 000,00	150 000,00	0,00	Возвращен от КМ РТ на доработку. Ведется корректировка РКМ с учетом замечаний



Формирование государственных программ на 2021 год. Проводится работа по формированию программ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство образования и науки РТ					
1	Капремонт объектов образования	2 000 000,0	1 921 079,41	78 920,59	Перечень определен, необходимы документы по части объектов
2	Организация горячего питания в школах	1 000 000,00			Перечень определен, ожидается предоставление документации от районов, параллельно ведется работа по расчету стоимости объектов



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
1	Аксубаевский	161 420,07	115 468,43	71,53	9,39	45 951,64
2	Р.-Слободский	269 093,66	193 402,92	71,87	12,77	75 690,74
3	Казань	11 355 395,08	9 342 003,29	82,27	4,38	2 013 391,79
4	Азнакаевский	213 148,19	178 272,75	83,64	3,02	34 875,45
5	Чистопольский	475 435,54	410 775,84	86,40	29,61	64 659,70
6	Зеленодольский	1 142 055,70	995 122,06	87,13	2,79	146 933,64
7	Сабинский	389 833,87	339 849,84	87,18	9,31	49 984,02
8	Агрызский	180 813,28	158 607,50	87,72	2,17	22 205,79
9	Наб.Челны	3 989 679,07	3 531 380,16	88,51	0,55	458 298,91
10	Нурлатский	248 454,66	225 863,88	90,91	18,48	22 590,77
11	Алексеевский	150 347,88	137 803,19	91,66	10,56	12 544,68
12	Мамадышский	208 744,54	194 371,87	93,11	2,40	14 372,67
13	Высокогорский	751 324,09	707 061,24	94,11	11,44	44 262,85
14	Мензелинский	118 904,23	112 236,74	94,39	1,44	6 667,48
15	Нижнекамский	2 830 140,67	2 679 318,18	94,67	4,33	150 822,49
	Итого по РТ:	30 798 968,91	27 508 361,30	89,32	4,96	3 290 607,61



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
16	Арский	378 849,25	362 249,12	95,62	4,94	16 600,12
17	Кукморский	363 273,59	347 525,48	95,66	2,73	15 748,11
18	Заинский	378 000,67	363 669,23	96,21	4,93	14 331,44
19	Бугульминский	588 172,46	567 973,03	96,57	0,00	20 199,43
20	Тукаевский	384 001,25	372 538,65	97,01	4,34	11 462,60
21	Муслюмовский	140 759,82	137 576,55	97,74	7,21	3 183,27
22	Атнинский	83 975,04	82 091,17	97,76	14,60	1 883,87
23	Черемшанский	156 885,88	153 905,59	98,10	7,58	2 980,29
24	Новошешминский	90 568,76	88 864,55	98,12	5,10	1 704,21
25	Камско-Устьинский	320 218,33	315 763,24	98,61	0,79	4 455,09
26	Пестречинский	423 175,07	418 249,03	98,84	1,27	4 926,03
27	Елабужский	515 832,13	509 987,73	98,87	1,73	5 844,40
28	Алькеевский	195 465,56	193 309,89	98,90	20,68	2 155,67
29	Альметьевский	1 001 145,11	990 640,32	98,95	5,44	10 504,79
30	Актанышский	207 067,98	205 041,22	99,02	3,61	2 026,76
	Итого по РТ:	30 798 968,91	27 508 361,30	89,32	4,96	3 290 607,61



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
31	Лаишевский	489 701,17	485 423,21	99,13	9,31	4 277,96
32	Тетюшский	179 730,41	178 265,12	99,18	0,90	1 465,29
33	Менделеевский	77 188,25	76 607,74	99,25	22,05	580,51
34	Сармановский	156 395,88	155 354,01	99,33	1,78	1 041,87
35	Ютазинский	75 763,98	75 267,66	99,34	0,00	496,32
36	Верхнеуслонский	99 310,66	99 084,27	99,77	4,10	226,40
37	Кайбицкий	67 436,08	67 304,53	99,80	3,72	131,54
38	Тюлячинский	81 250,71	81 101,16	99,82	1,67	149,55
39	Лениногорский	259 846,18	259 473,49	99,86	8,79	372,70
40	Спасский	141 334,07	141 210,29	99,91	0,76	123,78
41	Апастовский	313 814,19	313 602,23	99,93	0,00	211,96
42	Дрожжановский	156 238,36	156 140,46	99,94	3,03	97,91
43	Балтасинский	177 194,19	177 119,00	99,96	3,36	75,19
44	Буинский	605 340,08	605 242,15	99,98	1,38	97,92
45	Бавлинский	206 243,30	206 243,29	100,00	4,07	0,00
Итого по РТ:		30 798 968,91	27 508 361,30	89,32	4,96	3 290 607,61



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Аксубаевский	147 925,33	101 973,69	68,94	10,25	45 951,64
2	Р.-Слободский	244 786,90	169 096,16	69,08	14,04	75 690,74
3	Казань	5 295 312,59	3 907 524,24	73,79	3,32	1 387 788,35
4	Азнакаевский	190 790,89	155 915,44	81,72	3,37	34 875,45
5	Наб.Челны	2 602 831,48	2 197 564,68	84,43	0,13	405 266,81
6	Агрызский	143 068,35	120 862,57	84,48	2,74	22 205,79
7	Сабинский	251 742,88	213 036,51	84,62	13,84	38 706,37
8	Нурлатский	144 768,31	124 240,14	85,82	13,46	20 528,17
9	Чистопольский	460 848,05	396 188,35	85,97	30,55	64 659,70
10	Зеленодольский	1 096 406,19	949 976,29	86,64	2,91	146 429,90
11	Алексеевский	136 112,37	123 567,69	90,78	10,88	12 544,68
12	Мамадышский	102 468,31	93 521,68	91,27	4,89	8 946,63
13	Мензелинский	86 600,84	79 933,36	92,30	1,97	6 667,49
14	Нижнекамский	1 397 753,81	1 290 703,44	92,34	5,74	107 050,38
15	Кукморский	306 384,19	291 913,65	95,28	1,91	14 470,55
	Итого по РТ:	19 314 706,25	16 800 816,91	86,98	4,64	2 513 889,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Арский	333 195,19	317 936,20	95,42	4,66	15 258,99
17	Высокогорский	586 542,31	561 981,12	95,81	14,43	24 561,19
18	Заинский	363 876,49	349 545,05	96,06	2,12	14 331,44
19	Бугульминский	529 833,08	511 440,44	96,53	0,00	18 392,65
20	Тукаевский	348 868,90	337 406,30	96,71	2,81	11 462,60
21	Атнинский	70 789,54	68 905,68	97,34	17,32	1 883,87
22	Елабужский	179 015,78	174 499,64	97,48	5,00	4 516,14
23	Муслюмовский	128 186,88	125 003,61	97,52	1,05	3 183,27
24	Черемшанский	99 142,18	96 730,21	97,57	5,97	2 411,97
25	Альметьевский	435 965,85	425 461,06	97,59	7,11	10 504,79
26	Актанышский	98 962,05	96 964,22	97,98	5,79	1 997,82
27	Алькеевский	135 762,67	133 607,00	98,41	29,77	2 155,68
28	Тетюшский	135 213,09	133 831,28	98,98	0,32	1 381,80
29	Сармановский	111 060,90	110 019,03	99,06	2,51	1 041,87
30	Лаишевский	475 248,90	471 033,81	99,11	9,60	4 215,09
Итого по РТ:		19 314 706,25	16 800 816,91	86,98	4,64	2 513 889,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Менделеевский	67 819,26	67 238,74	99,14	0,00	580,51
32	Ютазинский	62 210,34	61 714,02	99,20	0,00	496,32
33	Пестречинский	402 976,10	400 056,15	99,28	1,34	2 919,95
34	Тюлячинский	56 575,06	56 425,51	99,74	1,96	149,55
35	Новошешминский	57 277,61	57 192,47	99,85	5,32	85,13
36	Кайбицкий	55 101,98	55 022,04	99,85	4,55	79,93
37	Дрожжановский	96 336,41	96 238,50	99,90	2,59	97,91
38	Спасский	123 148,52	123 024,74	99,90	0,88	123,78
39	Балтасинский	139 324,72	139 249,53	99,95	1,85	75,19
40	Камско-Устьинский	277 781,31	277 679,94	99,96	0,90	101,37
41	Буинский	541 786,12	541 688,19	99,98	1,54	97,92
42	Бавлинский	189 505,31	189 505,31	100,00	0,00	0,00
43	Апастовский	288 234,13	288 234,13	100,00	0,00	0,00
44	Лениногорский	239 726,76	239 726,76	100,00	9,43	0,00
45	Верхнеуслонский	77 438,35	77 438,35	100,00	0,43	0,00
Итого по РТ:		19 314 706,25	16 800 816,91	86,98	4,64	2 513 889,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Высокогорский	164 781,78	145 080,12	88,04	0,00	19 701,66
2	Камско-Устьинский	42 437,02	38 083,29	89,74	0,14	4 353,73
3	Пестречинский	20 198,97	18 192,89	90,07	0,00	2 006,08
4	Новошешминский	26 329,63	24 879,57	94,49	0,00	1 450,06
5	Казань	67 929,19	64 937,22	95,60	0,00	2 991,97
6	Мамадышский	37 054,32	35 547,32	95,93	0,00	1 507,00
7	Лениногорский	20 119,43	19 746,73	98,15	1,26	372,70
8	Зеленодольский	45 649,50	45 145,77	98,90	0,00	503,74
9	Верхнеуслонский	21 872,32	21 645,92	98,96	0,00	226,40
10	Апастовский	22 084,56	21 872,61	99,04	0,00	211,96
11	Лаишевский	14 452,28	14 389,40	99,56	0,00	62,87
12	Кайбицкий	12 334,10	12 282,49	99,58	0,00	51,61
13	Тетюшский	44 517,33	44 433,84	99,81	0,00	83,49
14	Актанышский	108 105,93	108 076,99	99,97	0,00	28,94
15	Арский	7 272,21	7 272,21	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 030,13	1 281 477,93	97,45	0,53	33 552,20



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Агрызский	14 783,42	14 783,42	100,00	0,00	0,00
17	Сабинский	17 712,88	17 712,88	100,00	1,95	0,00
18	Елабужский	13 860,59	13 860,59	100,00	0,00	0,00
19	Сармановский	23 238,05	23 238,05	100,00	0,00	0,00
20	Бавлинский	16 737,98	16 737,98	100,00	0,00	0,00
21	Муслюмовский	12 572,94	12 572,94	100,00	0,00	0,00
22	Чистопольский	14 587,50	14 587,50	100,00	0,00	0,00
23	Балтасинский	37 869,47	37 869,47	100,00	0,00	0,00
24	Черемшанский	29 379,20	29 379,20	100,00	14,98	0,00
25	Кукморский	33 423,95	33 423,95	100,00	5,08	0,00
26	Тюлячинский	12 922,35	12 922,35	100,00	1,91	0,00
27	Алексеевский	12 547,93	12 547,93	100,00	0,00	0,00
28	Атнинский	13 185,49	13 185,49	100,00	0,00	0,00
29	Бугульминский	16 721,40	16 721,40	100,00	0,00	0,00
30	Менделеевский	9 368,99	9 368,99	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 030,13	1 281 477,93	97,45	0,53	33 552,20



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Р.-Слободский	24 306,76	24 306,76	100,00	0,00	0,00
32	Спасский	18 185,55	18 185,55	100,00	0,00	0,00
33	Наб.Челны	17 630,46	17 630,46	100,00	0,00	0,00
34	Заинский	14 124,18	14 124,18	100,00	0,00	0,00
35	Дрожжановский	59 901,96	59 901,96	100,00	0,00	0,00
36	Нурлатский	25 889,68	25 889,68	100,00	0,00	0,00
37	Аксубаевский	13 494,74	13 494,74	100,00	0,00	0,00
38	Буинский	63 553,96	63 553,96	100,00	0,00	0,00
39	Ютазинский	13 553,64	13 553,64	100,00	0,00	0,00
40	Азнакаевский	22 357,30	22 357,30	100,00	0,00	0,00
41	Мензелинский	13 576,10	13 576,10	100,00	0,00	0,00
42	Нижнекамский	22 140,99	22 140,99	100,00	0,00	0,00
43	Альметьевский	19 842,66	19 842,67	100,00	0,00	0,00
44	Тукаевский	35 132,35	35 132,35	100,00	0,00	0,00
45	Алькеевский	17 289,09	17 289,09	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 030,13	1 281 477,93	97,45	0,53	33 552,20



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Казань	5 992 153,30	5 369 541,82	89,61	6,13	622 611,48
2	Сабинский	120 378,11	109 100,45	90,63	0,96	11 277,66
3	Мамадышский	69 221,91	65 302,87	94,34	0,00	3 919,04
4	Кукморский	23 465,44	22 187,88	94,56	9,99	1 277,56
5	Бугульминский	41 617,98	39 811,20	95,66	0,00	1 806,78
6	Наб.Челны	1 369 217,13	1 316 185,03	96,13	1,23	53 032,10
7	Арский	38 381,85	37 040,72	96,51	28,67	1 341,13
8	Нижнекамский	1 410 245,87	1 366 473,76	96,90	0,05	43 772,11
9	Нурлатский	77 796,67	75 734,06	97,35	41,15	2 062,61
10	Новошешминский	6 961,52	6 792,50	97,57	15,12	169,02
11	Черемшанский	28 364,50	27 796,17	98,00	5,64	568,32
12	Елабужский	322 955,77	321 627,50	99,59	0,00	1 328,27
13	Алексеевский	1 687,58	1 687,58	100,00	26,88	0,00
14	Тюлячинский	11 753,30	11 753,30	100,00	0,00	0,00
15	Агрызский	22 961,51	22 961,51	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		10 169 232,54	9 426 066,46	92,69	6,13	743 166,08



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Алькеевский	42 413,80	42 413,80	100,00	0,00	0,00
17	Альметьевский	545 336,59	545 336,59	100,00	0,00	0,00
18	Мензелинский	18 727,28	18 727,28	100,00	0,00	0,00
19	Апастовский	3 495,49	3 495,49	100,00	0,00	0,00
20	Сармановский	22 096,93	22 096,93	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		10 169 232,54	9 426 066,46	92,69	6,13	743 166,08



Итоги ввода жилья в Республике Татарстан в 2020 году

КВ.М.

Введено в эксплуатацию	в том числе		
	МКД инвестиционное	Социальная ипотека	ИЖС
2 680 087	1 010 928	216 474	1 452 685



Ключевые показатели ввода жилья по Республике Татарстан на период до 2030 года

ТЫС. КВ.М.


Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Всего введено, в т.ч.	2 670	2 755	2 830	2 945	3 060	3 075	3 290	3 405	3 520	3 520
МКД	1 300	1 365	1 410	1 465	1 520	1 535	1 640	1 685	1 750	1 750
ИЖС	1 370	1 390	1 420	1 480	1 540	1 540	1 650	1 720	1 770	1 770



Улучшение жилищных условий граждан

■ Заселено, ед. ■ Остаток, ед.

ДЕТИ-СИРОТЫ

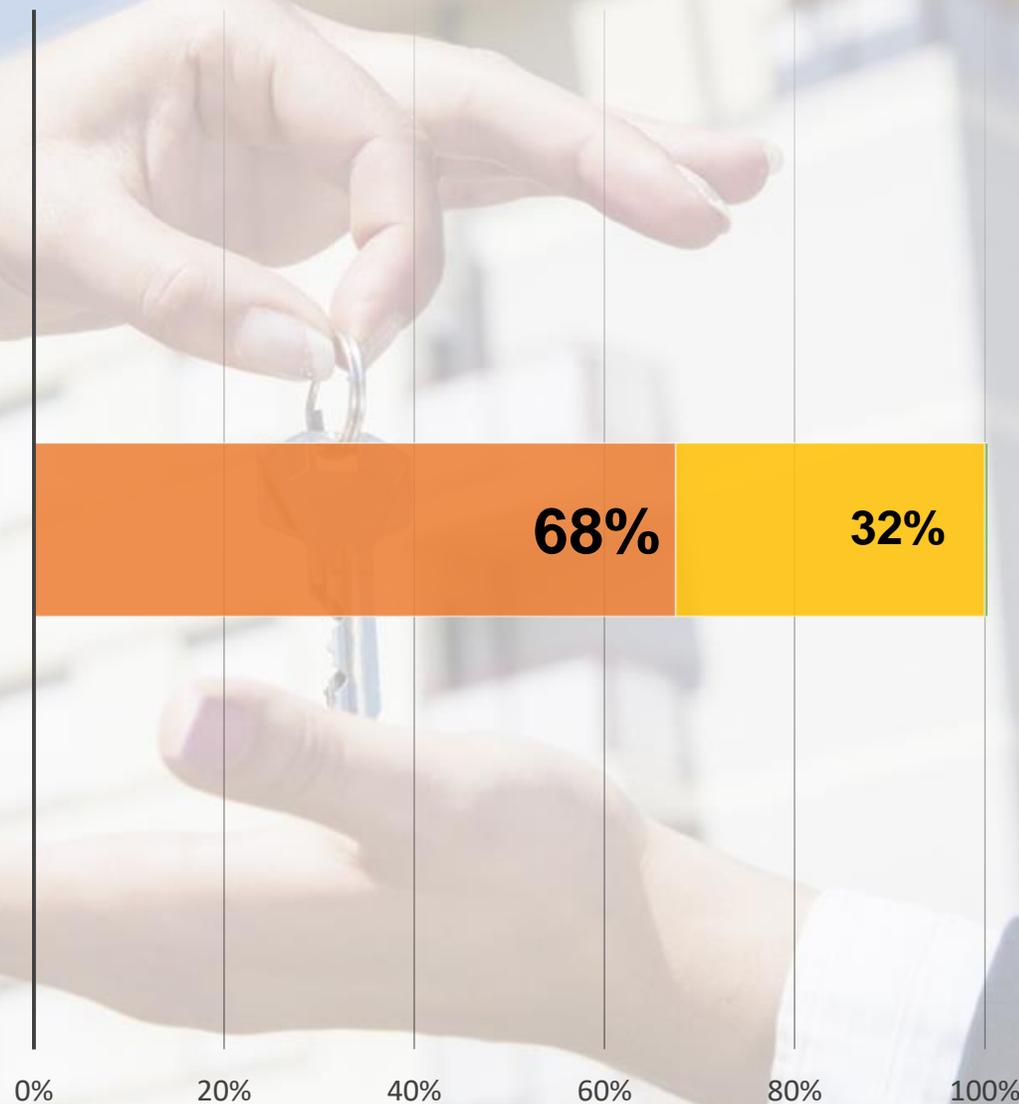

План 600

обеспечено – 405



Дети-сироты

№	МО РТ	Выставлено для выбора	Передано по актам приема-передачи	Заселено	№	МО РТ	Выставлено для выбора	Передано по актам приема-передачи	Заселено
1	Агрызский	4	4		12	Лаишевский	5	5	5
2	Азнакаевский	3	3		13	Мензелинский	4	4	4
3	Актанышский	1	1	1	14	Нижекамский	132	132	101
4	Альметьевский	82	82	82	15	Сабинский	1	1	
5	Апастовский	1	1	1	16	Сармановский	4	4	4
6	Бугульминский	9	9		17	Тукаевский	3	3	3
7	Высокогорский	2	2	2	18	Тюлячинский	4	4	
8	Елабужский	26	26		19	Черемшанский	2	2	2
9	Зеленодольский	2	2	2	20	Чистопольский	12	12	2
10	Кайбицкий	1	1	1	21	г.Наб. Челны	13	13	13
11	Кукморский	5	5	5	22	г.Казань	284	284	177
ИТОГО							600	600	405



Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Реконструкция АЗС, по пр. Яшьлек, г. Набережные Челны



**Электропитание не оборудовано
запирающими устройствами**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Татнефть-АЗС Центр». Подрядчик: ООО «СТРОЙТРЕСТ»

Реконструкция административного здания по ул. Гладилова, г. Казань



Работники не обеспечены спецодеждой, спецобувью, защитными касками, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук (масками и перчатками)


Составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо

Застройщик: ООО «АрхСтрой-Проект». Генподрядчик: ООО «ИНСТРОЙ»



Количество несчастных случаев

■ Со смертельным исходом ■ С тяжелым исходом

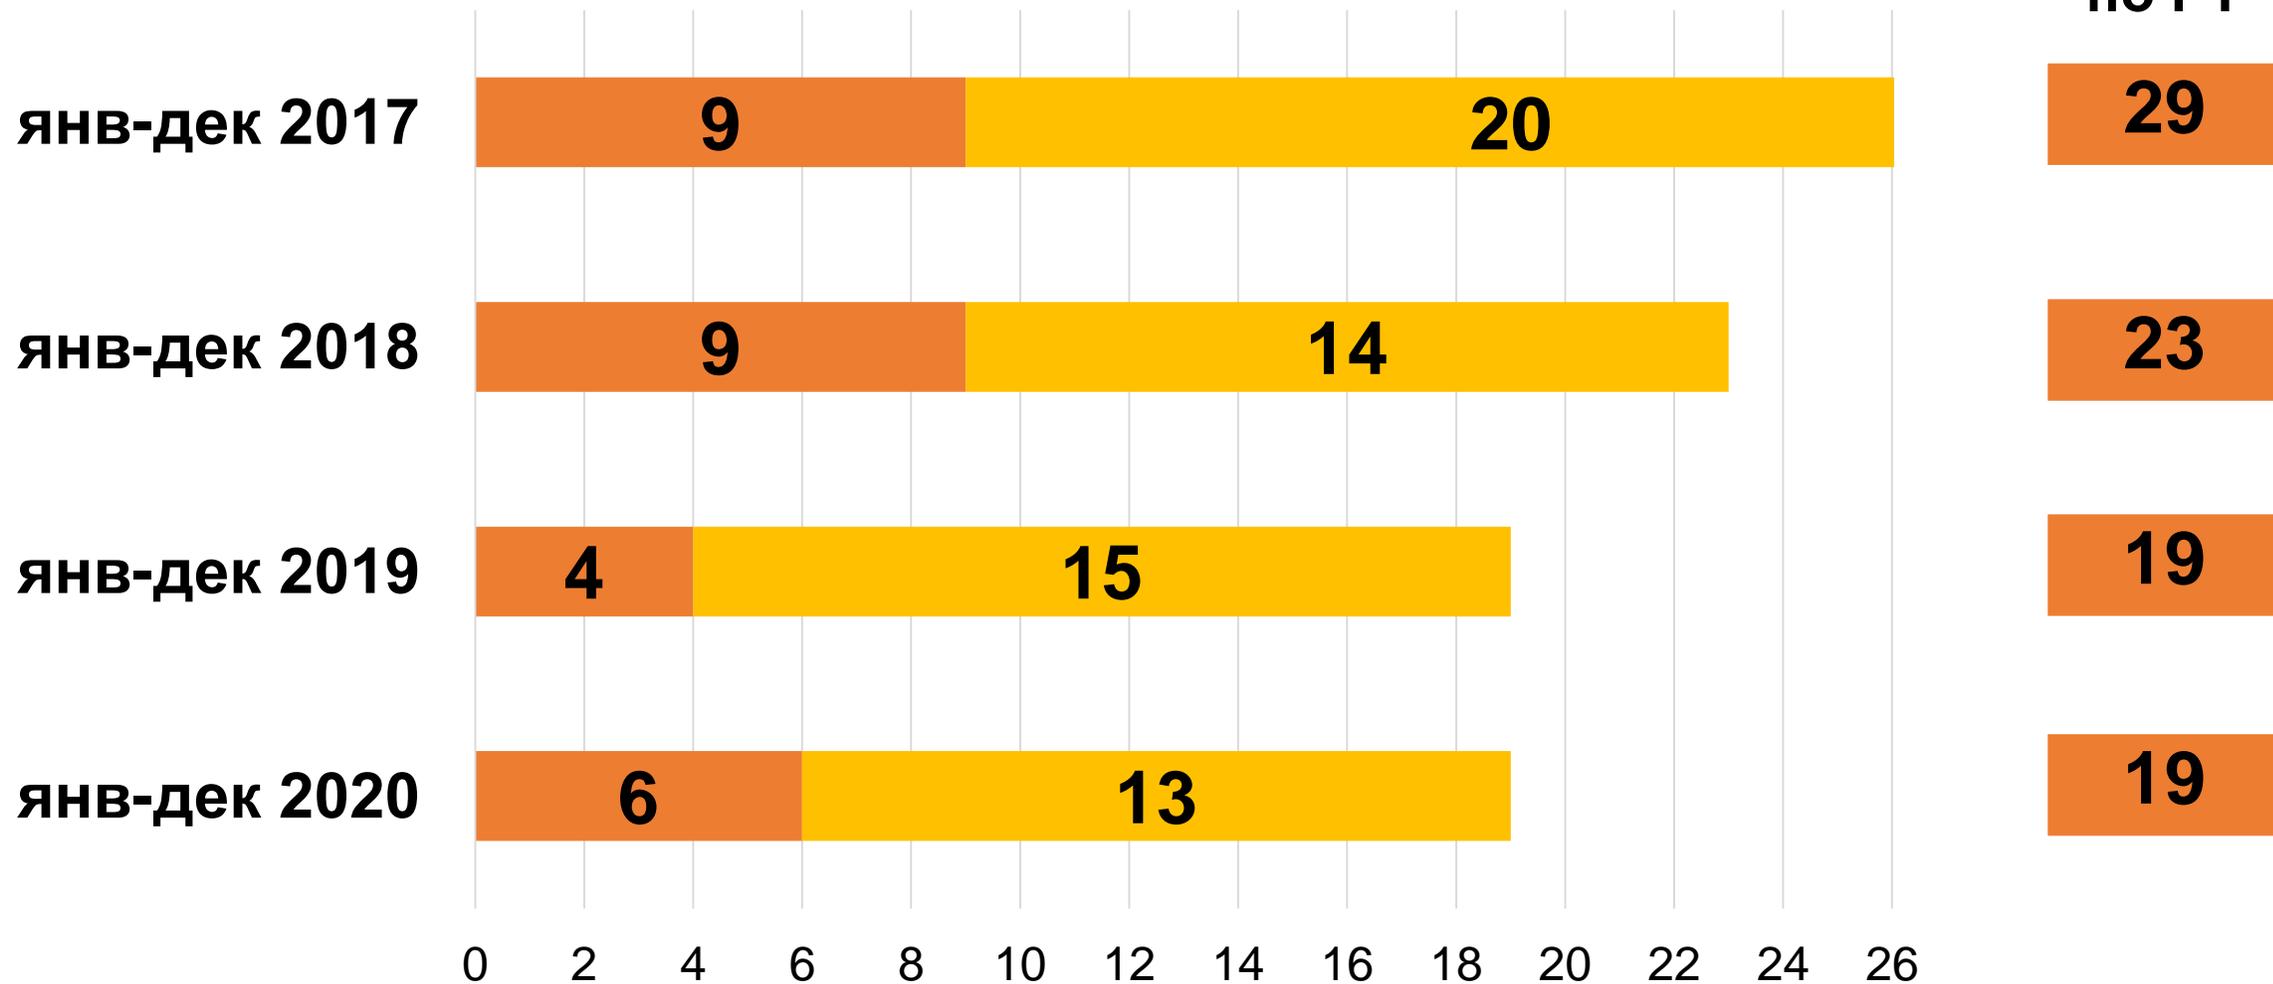



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
Проведено проверок	2 352
Выявлено нарушений	637
Устранено нарушений	628
Процент устранения нарушений	98
Составлены предписания	297



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г. Казань	471	206	197	96
2	г. Наб.Челны	48	67	67	100
3	Агрызский	33	0	0	-
4	Азнакаевский	42	0	0	-
5	Аксубаевский	26	1	1	100
6	Актанышский	47	0	0	-
7	Алексеевский	15	4	4	100
8	Алькеевский	12	2	2	100
9	Альметьевский	64	42	42	100
10	Апастовский	27	10	10	100
11	Арский	98	2	2	100
12	Атнинский	47	4	4	100
13	Бавлинский	26	0	0	-
14	Балтасинский	52	3	3	100
15	Бугульминский	84	12	12	100
16	Буинский	34	23	23	100



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	16	10	10	100
18	Высокогорский	102	4	4	100
19	Дрожжановский	10	2	2	100
20	Елабужский	53	20	20	100
21	Заинский	29	17	17	100
22	Зеленодольский	104	32	32	100
23	Кайбицкий	22	16	16	100
24	Камско-Устьинский	29	24	24	100
25	Кукморский	98	4	4	100
26	Лаишевский	80	11	11	100
27	Лениногорский	29	4	4	100
28	Мамадышский	33	20	20	100
29	Менделеевский	13	7	7	100
30	Мензелинский	22	0	0	-
31	Муслюмовский	16	4	4	100



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	58	21	21	100
33	Новошешменский	26	0	0	-
34	Нурлатский	40	3	3	100
35	Пестречинский	87	0	0	-
36	Рыбно-Слободский	16	6	6	100
37	Сабинский	120	7	7	100
38	Сармановский	32	0	0	-
39	Спасский	10	1	1	100
40	Тетюшский	19	17	17	100
41	Тукаевский	49	5	5	100
42	Тюлячинский	43	2	2	100
43	Черемшанский	29	22	22	100
44	Чистопольский	19	2	2	100
45	Ютазинский	22	0	0	-
ИТОГО:		2 352	637	628	98



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 298	-
Вынесено постановлений: - об административной ответственности, - в том числе предупреждений	141 49	6 138,0 -
Взыскано всего	50	3 344,5
Не истёк срок оплаты	39	2 582,5
Обжалуются в суде	3	211,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (саморегулируемые организации РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
Проведено проверок, в том числе:	1 676
- с выездом на объекты строительства	704
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 185
- выдано предписаний	394
- приостановлено право осуществлять строительство	267
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	66
- выдано предупреждений	458



Спасибо за внимание!
