




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

15 мая 2021 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	72 000,00	35,00	4,00
ИТОГО		72 000,00	35,00	4,00

ГАУЗ «ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ», СТАЦИОНАР, ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский МР, Янга-Аулский	3 993,98	0,00	-
2	Актанышский МР, Старо-Зияшевский	3 993,97	0,00	-
3	Алексеевский МР, Подлесно-Шенталинский	3 993,97	0,00	-
4	Алькеевский МР, Каракульский	3 993,97	0,00	-
5	Апастовский МР, Шигаевский	3 993,97	0,00	-
6	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 993,98	0,00	-
7	Буинский МР, Малобуинковский	3 993,98	0,00	-
8	Верхнеуслонский МР, Введено-Слободский	3 993,98	0,00	-
9	Высокогорский МР, Ювасинский	3 993,97	0,00	-
10	Дрожжановский МР, Коршанга-Шигалинский	2 514,94	0,00	-
11	Елабужский МР, Гарийский	3 993,98	0,00	-
12	Зеленодольский МР, Ильинский	3 993,97	0,00	-
13	Кайбицкий МР, Бурундуковский	3 993,98	0,00	-
14	Камско-Устьинский МР, Шапкинский	3 993,98	0,00	-
ИТОГО		166 114,90	2,14	1,43

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Лаишевский МР, Шуранский	3 993,98	0,00	-
16	Мамадышский МР, Малокирменский	3 993,97	0,00	-
17	Менделеевский МР, Актазиковский	3 993,97	0,00	-
18	Мензелинский МР, Атряклинский	3 993,97	0,00	-
19	Нижнекамский МР, Верхне-Челнинский	3 993,98	0,00	-
20	Пестречинский МР, Карповский	3 993,97	0,00	-
21	Рыбно-Слободский МР, Шеморбашский	3 993,98	0,00	-
22	Спасский МР, Чечеклинский	3 993,97	0,00	-
23	Тетюшский МР, Больше-Атрясский	3 993,97	0,00	-
24	Тукаевский МР, Новотроицкий	5 320,04	0,00	-
	ИТОГО	166 114,90	2,14	1,43
25	Балтасинский МР, Смаильский	3 993,97	5,00	5,00
26	Азнакаевский МР, Ильбяковский	3 993,98	5,00	0,00
27	Бавлинский МР, Татарско-Тумбарлинский	3 993,97	5,00	0,00
28	Бугульминский МР, Наратлинский	3 993,97	5,00	0,00

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
29	Заинский МР, Кадыровский	3 993,98	5,00	0,00
30	Ютазинский МР, Ташкичуйский	2 514,94	5,00	0,00
31	Черемшанский МР, Карамышевский	3 993,97	5,00	2,00
32	Лениногорский МР, Нижне-Чершилинский	3 993,97	5,00	4,00
33	Нурлатский МР, Андреевский	3 993,97	5,00	4,00
34	Аксубаевский МР, Новоузеевский	3 993,98	5,00	5,00
35	Альметьевский МР, Клементейкинский	3 993,97	5,00	5,00
36	Арский МР, Среднекорсинский	3 993,97	5,00	5,00
37	Атнинский МР, Дусюмский	3 993,97	5,00	5,00
38	Кукморский МР, Янцобинский	3 993,97	5,00	5,00
39	Новошешминский МР, Андреевский	3 993,97	5,00	5,00
40	Сабинский МР, Миченбашский	3 993,98	5,00	5,00
41	Сармановский МР, Юлтимеровский	3 993,97	5,00	5,00
42	Тюлячинский МР, Шармашинский	3 993,98	5,00	5,00
ИТОГО		166 114,90	2,14	1,43

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ ГАУЗ «ЮТАЗИНСКАЯ ЦРБ», ФАП ТАШКИЧУЙСКИЙ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 435,57	0,00	0,00
2	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 288,61	5,00	0,00
3	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 435,57	5,00	4,00
4	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 288,61	5,00	5,00
ИТОГО		55 448,36	3,75	2,25

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ ГАУЗ «АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ», ВАХИТОВСКАЯ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

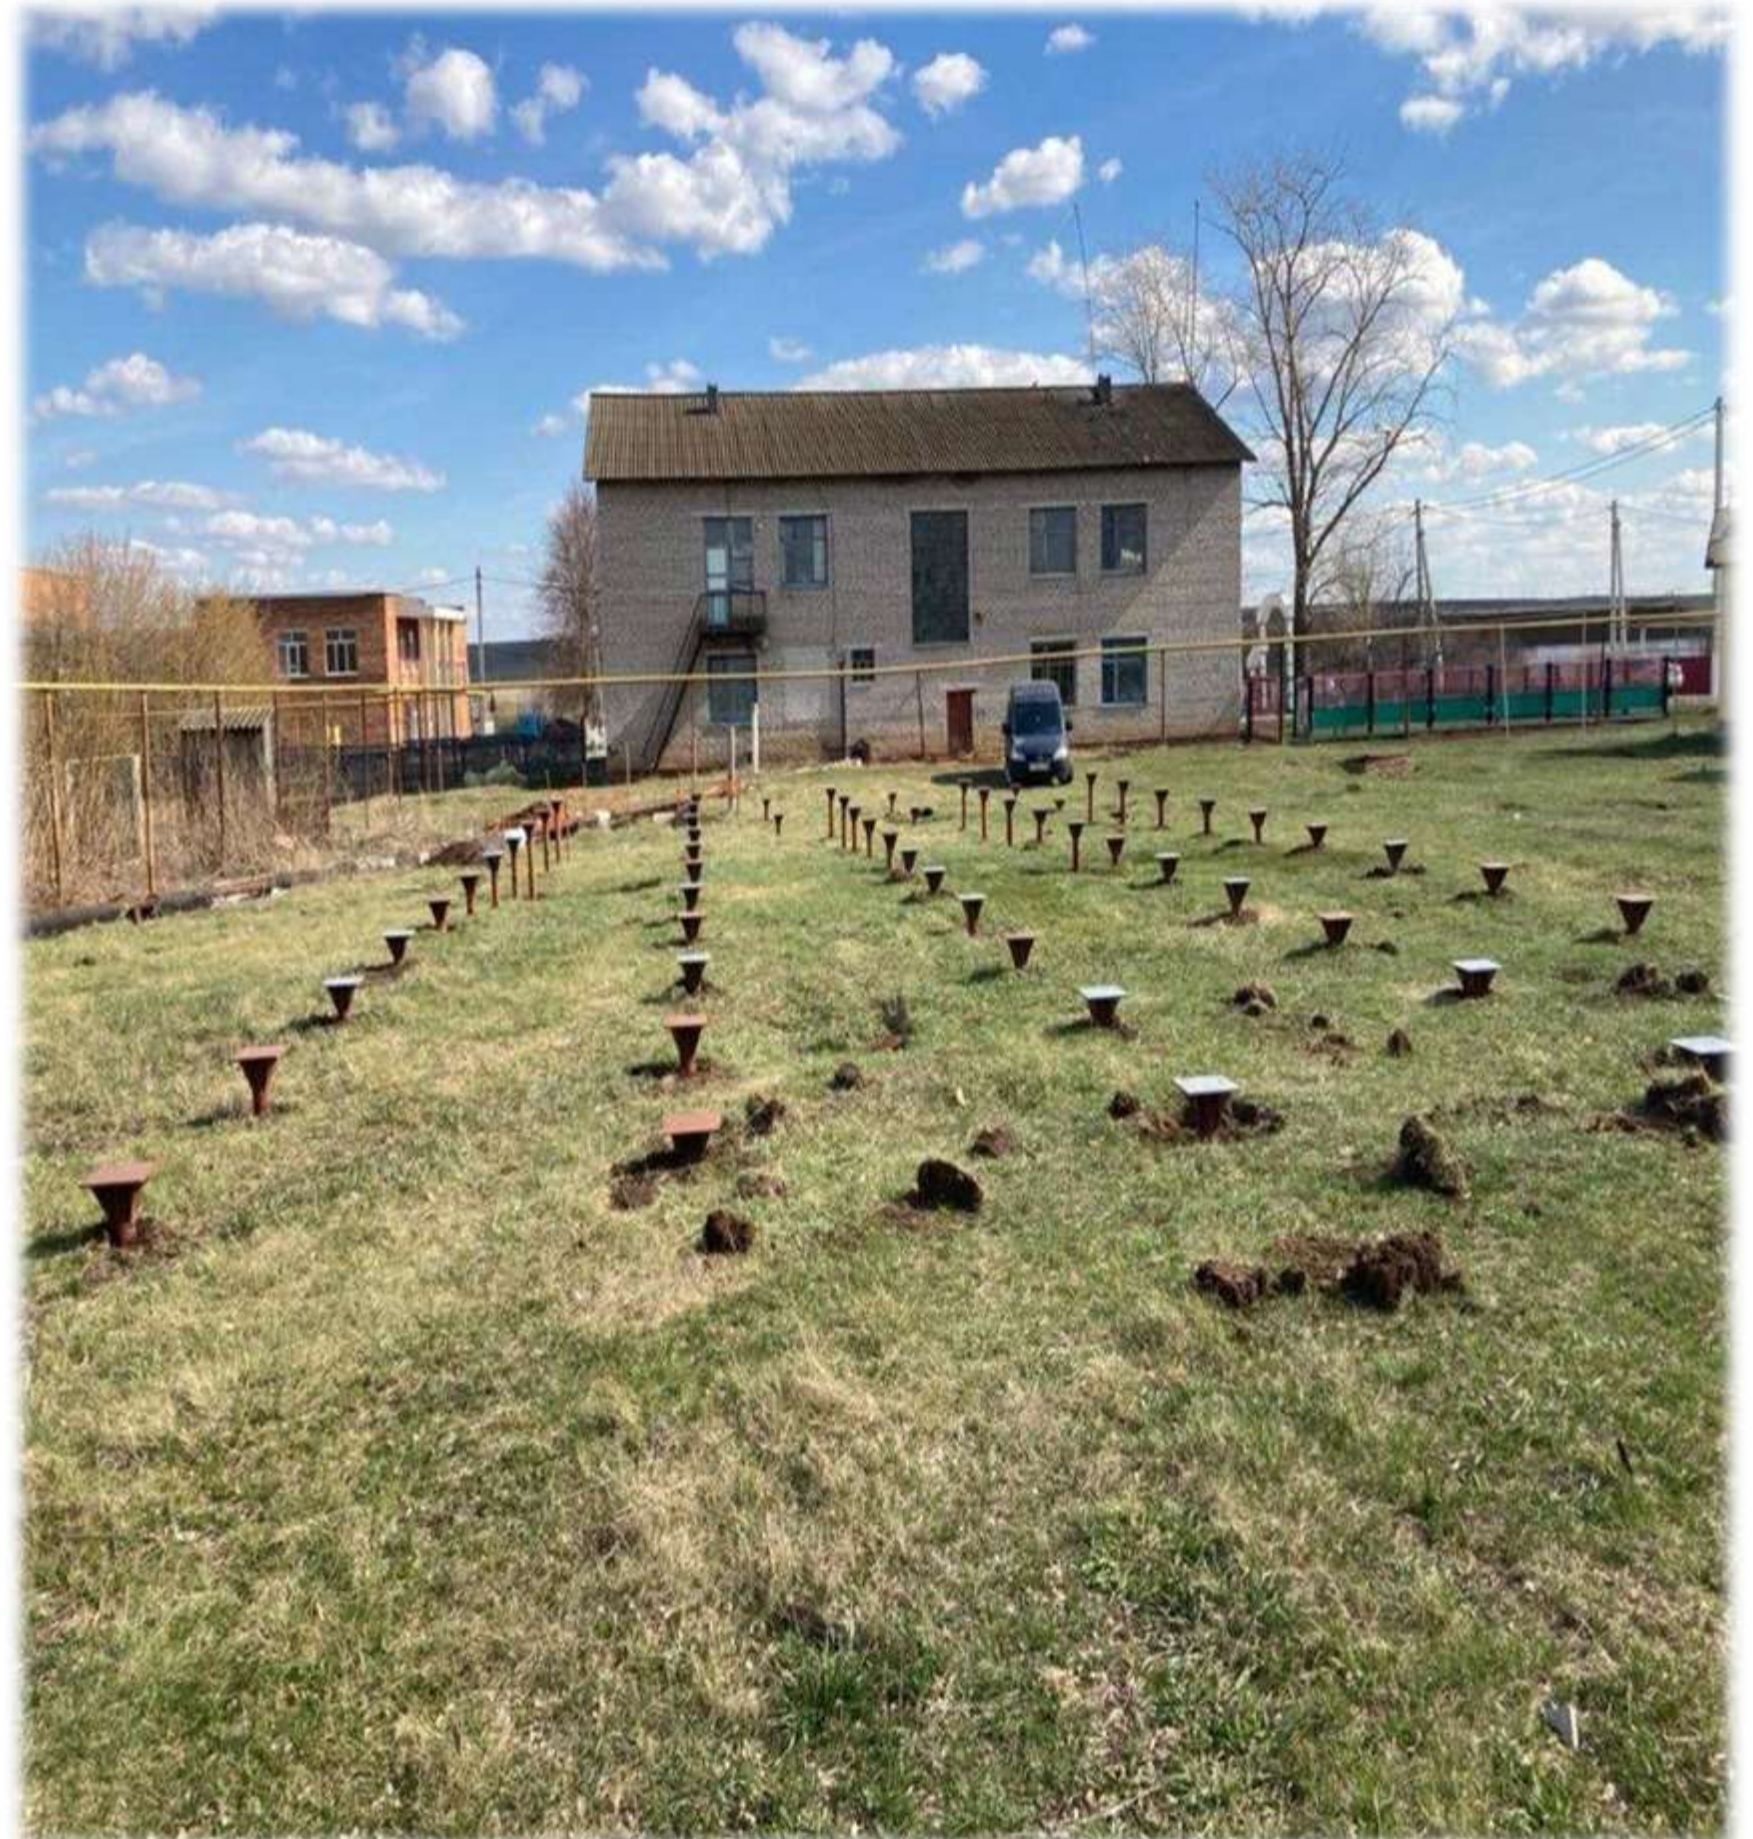

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	с.Кугарчино, ул.Зайтова, Рыбно-Слободский	5 598,78	4,00	1,00
2	с.Поисево, ул. Кирова, д.2А, Актанышский	5 598,78	17,00	5,00
3	с.Юхмачи, Ленина, д.1а, Алькеевский	5 598,78	20,00	5,00
4	с.Верхний Субаш, ул.Ленина, д.4, Балтасинский	5 598,78	22,00	12,00
5	г.Мензелинск, ул.Социалистическая, 65А, Мензелинский	5 598,78	24,00	14,00
6	дер.Пойкино, ул.Первомайская, 51, Мамадышский	5 598,78	32,00	6,00
ИТОГО		72 784,13	33,69	9,38
7	с.Альшеево ул. Центральная, Буинский	5 598,78	35,00	10,00
8	с.Шугурово, ул. Ленина, д. 37, Лениногорский	5 598,78	38,00	10,00
9	с.Татарское Ходяшево, Пестречинский	5 598,78	40,00	15,00
10	с.Баландыш, ул.Гагарина, д.4, Тюлячинский	5 598,78	42,00	4,00
11	с.Теньки, ул.Октябрьская, д.88А, Камско-Устьинский	5 598,78	43,00	6,00
12	п. Юлдуз, пер.Центральной, з/у 2а,Чистопольский	5 598,78	46,00	19,00
13	с.Бакрчи, ул.Гагарина, з/у 25а ,Тетюшский	5 598,78	75,00	15,00

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В С.БАЛАНДЫШ, УЛ.ГАГАРИНА, Д.4, ТЮЛЯЧИНСКИЙ МР



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В С.АЛЬШЕЕВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,БУИНСКИЙ МР



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНЫХ МОДУЛЬНЫХ ЛЫЖНЫХ БАЗ С МЕБЕЛЬЮ, ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Дрожжановский МР, с.Старое Дрожжаное	10 332,90	25,00	18,00
2	Апастовский муниципальный район, пгт.Апастово, ул.Газовая, д.11а	10 332,90	100,00	-
ИТОГО		20 665,80	62,50	18,00

ДРОЖЖАНОВСКИЙ РАЙОН, С.СТАРОЕ ДРОЖЖАНОЕ, ЛЫЖНАЯ БАЗА



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Менделеевский МР	6 730,72	0,00	-
2	г.Казань, Советский	6 730,72	5,00	5,00
3	г.Набережные Челны (МБОУ Пушкинский пролицией №78, бульвар Строителей, д.9)	6 730,72	5,00	5,00
4	г.Набережные Челны (МБОУ «Средняя школа №43»)	6 730,72	7,00	2,00
5	Нижнекамский МР	6 730,72	10,00	3,00
	ИТОГО	53 925,42	12,97	10,10
6	Зеленодольский МР	6 730,72	15,00	15,00
7	г.Казань, Ново-Савинский	3 405,19	25,00	15,00
8	г.Казань, Московский	6 730,72	28,00	27,00
9	г.Казань, Вахитовский	3 405,19	42,00	42,00

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК Г.КАЗАНЬ, МОСКОВСКИЙ РАЙОН




100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №43»)



СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	55 852,77	1,00	0,00
2	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	55 852,77	6,00	3,00
3	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.140б	55 852,77	9,00	8,00
4	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	55 852,77	11,00	10,00
ИТОГО		223 411,08	6,75	5,25

БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН, Г.БУГУЛЬМА, УЛ.НЕФТЯНИКОВ, Д.19, ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	196 861,49	3,00	3,00
2	Строительство зданий и сооружений модульных конструкций муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	21 142,79	10,00	4,00
3	Строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 715,79	13,00	4,00
ИТОГО		386 035,87	18,74	3,45

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МБУ «ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «КАМСКИЙ АРТЕК» НИЖНЕКАМСКОГО МР



СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский МР, овцеводческая ферма № 2 на 1000 голов индивидуального предпринимателя – главы КФХ Заикиной С.Ю. в с.Новоникольск	4 123,80	0,00	-
2	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Восток-Агро» в с.Большой Сардек	8 220,00	0,00	-
3	Кукморский МР, коровник на 210 голов АО «Кукморагрохимсервис» в с.Урясьбаш	8 220,00	0,00	-
4	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Уныш» в с.Ташлы-Елга	8 220,00	0,00	-
5	Тетюшский МР, коровник на 300 голов ООО Агрофирма «Нур» в с.Малые Атряси	13 696,20	0,00	-
6	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Асанбаш-Агро» в с.Березняк	8 220,00	4,00	1,00
ИТОГО		60 000,00	12,17	0,78
7	Ютазинский МР, коровник №2 на 250 голов индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Вафауллина А.А. в с.Ютаза	9 300,00	75,00	5,00

СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛОСНО-СЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Арский район (7 объектов)	5 550,00	0,00	-
2	Атнинский район (5 объектов)	4 710,00	0,00	-
3	Балтасинский район (7 объектов)	3 150,00	0,00	-
4	Буинский район (7 объектов)	4 050,00	0,00	-
5	Высокогорский район (3 объекта)	2 250,00	0,00	-
6	Дрожжановский район (1 объект)	600,00	0,00	-
7	Кукморский район (7 объектов)	4 230,00	0,00	-
8	Менделеевский район (2 объекта)	900,00	0,00	-
9	Тетюшский район (9 объектов)	5 400,00	0,00	-
10	Тюлячинский район (2 объектов)	2 250,00	0,00	-
	ИТОГО 67 объектов	54 600,00	22,68	0,41
11	Сабинский район (5 объектов)	12 810,00	47,66	1,00
12	Тукаевский район (3 объекта)	2 250,00	58,00	7,20
13	Ютазинский район (1 объект)	900,00	75,00	7,00
14	Актанышский район (8 объектов)	5 550,00	77,41	1,00

СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛОСНО-СЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН




РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

ТОРГИ ПРОВЕДЕНЫ ЧАСТИЧНО



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	<p>Строительство (2) и капитальный ремонт (23) стационаров</p> <p>Всего 25 объектов, в т.ч. 21 СМР, 4 ПИР</p>	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	<p>Строительство: ГК от 15.02.2021 на 1 объект Капитальный ремонт: ГК от 15.02.2021 на 9 объектов ГК от 26.04.2021 на 3 объекта ГК от 19.02.2021 на 3 объекта (ПИР)</p> <p>Планируется: ГК ориент. 31.05.2021 на 3 объекта к/р ГК ориент. 30.06.2021 на 5 объектов, из них 1 стр.</p>
2	<p>Капитальный ремонт (6), строительство и реконструкция (6) детских оздоровительных лагерей</p> <p>Всего 12 объектов</p>	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	<p>Строительство: ГК от 19.04.2021 на 3 объекта Капитальный ремонт: ГК от 20.02.2021 на 3 объекта; ГК от 26.04.2021 на 2 объекта;</p> <p>Планируется: ГК ориент. 28.05.2021 на 1 объект к/р ГК ориент. 30.06.2021 на 3 объекта стр.</p>

НАЛИЧИЕ ГОС. КОНТРАКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СМР ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	Контракт на СМР	СМР/%
НП «ЖИЛЬЕ»	1. ФП «ЖИЛЬЕ»	1-школа (поставка оборудования)	+	20,00
		3-детских сада	+	17,79
		3 (1-очистн. сооруж., 2-наруж.сети водоснабж.)	+	-
	2. ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы)	+ (46), - (3) (ГК ориентировочно 30.06.2021г.)	2,73
		8 (конкурс малых городов 2021 г.)	+	3,86
	3. ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	1 (строительство станц. водопод.)	+	25,00
НП «ЭКОЛОГИЯ»	4. ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	1 реконструкция БОСК г.Казань	+	8,57
		1 строительство БОС в с.Коцаково	+	76,00
	5. ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки, переходящие объекты)	+	14,05
НП «ЗДРАВООХРАНЕН ИЕ»	6. ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	+	26,00
ИТОГО:		95	+ (87), - (8)	

НАЛИЧИЕ ГОС. КОНТРАКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СМР ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	Контракт на СМР	СМР/%
НП «КУЛЬТУРА»	7. ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	3 - строительство дома культуры	- (3)	-
		2- капитальный ремонт детских музыкальных школ	+	8,27
		2 - строительство центра культурного развития	+	2,48
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	8. ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	+	41,01
	9. ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал) 1 (Поставка оборудования для создания ФОК)	+	47,58
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	10. ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	- (ГК ориентировочно 24.05.2021г.)	-
	11. ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	+	15,9
ИТОГО:		95	+ (87), - (8)	

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ, ТЫС.РУБ.	КОНТРАКТ НА СМР	ФАКТ СМР%
1	Общеобразовательная школа на 1 501 место с бассейном в жилом комплексе по ул. Н. Ершова Советского района г. Казани (поставка оборудования)	80 484,26	№16-21/СМР от 24.02.2021	20,00
2	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	976,18	№10-21/смр от 20.02.2021г.	Работы начнутся в конце мая
3	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	31 752,34	№10-21/смр от 20.02.2021г.	Работы начнутся в конце мая
4	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса «Светлая долина» г.Казани.	17 950,22	№20-21/смр от 01.03.2021г.	Работы начаты
ИТОГО		131 163,00		

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 1 501 МЕСТО С БАССЕЙНОМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ПО УЛ. Н.ЕРШОВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ, ТЫС.РУБ.	КОНТРАКТ НА СМР	ФАКТ СМР%
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 355 050,74	№9-21/СМР от 20.02.2021 №22-21/СМР от 01.03.2021	8,57
2	Строительство биологических очистных сооружений в с. Коцаково Пестречинского муниципального района	66 528,72	№21-20/СМР от 29.04.2020	86,00
ИТОГО		1 421 579,46		

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОСК Г.КАЗАНИ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ с. КОЩАКОВО, ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	376 980,05	9,50	1,30
2	Строительство ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район в районе ул.Ф.Амирхана, ул.Чистопольская, ул.Адоратского	272 705,73	21,00	2,00
3	Строительство ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, Высокогорское сельское поселение, северо-западнее д.Эстачи	272 705,73	23,00	2,00
4	Строительство ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	184 748,60	23,50	8,45
5	Строительство ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал жилого района «Салават Купере» (позиция 2)	281 156,38	24,00	3,00
6	Строительство ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	184 748,60	25,00	2,00
7	Строительство ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК Лето	270 618,34	25,00	3,00
8	Строительство ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	180 177,80	25,00	8,00
9	Строительство ДОО на 120 мест в г. Казани, жилой комплекс «Весна-2» (позиция 2)	167 589,09	26,00	2,00
10	Строительство ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	270 085,01	28,00	6,00
11	Строительство ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	104 994,59	30,00	3,00
	ИТОГО	3 839 728,62	36,00	4,88
12	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	269 841,33	44,00	12,00
13	Строительство ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	188 561,48	44,00	5,00
15	Строительство ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	269 420,39	66,30	2,46
14	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	286 693,16	75,00	12,00
16	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	258 702,33	87,00	7,00

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 260 МЕСТ В Г.КАЗАНИ, ЖК ЛЕТО



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 50 МЕСТ В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ, С. ДЕРЖАВИНО



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ, ТЫС.РУБ.	КОНТРАКТ НА СМР	ФАКТ СМР%
1	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ» г.Казань (Строительство Центра детской онкологии, гематологии, хирургии)	1 095 798,00	№18-21/СМР от 24.02.2021 Мед. оборудование: заключено 22 Г/к	76,00

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ», УЛ.ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ, ТЫС.РУБ.	КОНТРАКТ НА СМР	ФАКТ СМР%
1	Универсальный спортивный зал в г.Кукмор, Кукморский район	275 605,67	№2-21/СМР от 15.02.2021, №28-21/СМР от 09.03.2021	63,05

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА В Г.КУКМОР



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, ул. Карла Маркса, 3 очередь	26 249,04	0,00	0,00
2	Азнакаевский, ул. Сююмбике, 2 очередь	45 453,53	0,00	0,00
3	Алексеевский, Сквер по ул. Казакова (Парк Победы), 3 очередь	18 874,90	0,00	0,00
4	Алькеевский, Сквер "Спортивный"	14 117,06	0,00	0,00
5	Балтасинский, Набережная вдоль реки Шошма	17 697,25	0,00	0,00
6	Высокогорский, Сквер "100 лет ТАССР", 2 очередь	38 981,22	0,00	0,00
7	Альметьевский, Внутриквартальный бульвар микрорайона Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул.Бигаш)	78 962,54	0,00	0,00
8	Апастовский, Набережная р.Табарка	14 749,77	0,00	0,00
9	Арский, Площадь Советская и ул. Большая, 4 очередь	38 772,59	0,00	0,00
10	Атнинский, Парк по ул. Пионерская	9 738,69	0,00	0,00
11	Елабужский, Парк «Дуслык»	16 304,73	0,00	0,00
12	Камско-Устьинский. Набережная р. Волга, 2 очередь	11 147,75	0,00	0,00
13	Менделеевский, Бульвар Интернационалистов	22 726,38	0,00	0,00
ИТОГО		1 460 262,10	2,73	2,43

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
14	Нижнекамский, Центральный сквер, 2 очередь	10 000,00	0,00	0,00
15	Нижнекамский, Экстрим-парк	70 000,00	0,00	0,00
16	Новошешминский, Площадь перед зданием ЗАГС, 2 очередь	9 662,34	0,00	0,00
17	Нурлатский, Городское озеро	41 836,38	0,00	0,00
18	Пестречинский, Детский городок	34 057,83	0,00	0,00
19	Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 4 очередь	18 735,06	0,00	0,00
20	Сабинский, Парк по ул. З.Юсупова, 2 очередь	23 290,31	0,00	0,00
21	Спасский, Центральная площадь, 3 очередь	14 059,61	0,00	0,00
22	Тетюшский, Березовая роща, 2 очередь	16 316,07	0,00	0,00
23	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки, 4 очередь	10 415,25	0,00	0,00
24	Тюлячинский, Пруд в селе Баландыш	10 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 460 262,10	2,73	2,43

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
25	Чистопольский, Парк отдыха, 2 очередь	32 678,64	0,00	0,00
26	Чистопольский, Центральная площадь	24 526,62	0,00	0,00
27	Ютазинский, Сквер по ул. Ленина	15 306,14	0,00	0,00
28	Н.Челны, Бульвар Юных Ленинцев, 2 очередь	50 000,00	0,00	0,00
29	Альметьевский, Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская)	78 962,54	0,60	0,60
30	Елабужский, Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани	64 576,85	1,00	1,00
31	Зеленодольский. Парк «Березовая роща», мкр. Мирный, 2 очередь	93 420,71	1,00	1,00
32	Сармановский, Сквер «100 летия ТАССР»	25 875,60	1,00	1,00
33	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 2 очередь	7 381,60	1,00	1,00
34	Аксубаевский, Сквер по ул. Мазилина, 3 очередь	21 162,36	1,43	0,00
35	Тукаевский, Парк «Дружбы народов»	16 067,74	2,00	2,00
ИТОГО		1 460 262,10	2,73	2,43

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
36	Нижнекамский, Пр.Химиков, 2 очередь	45 000,00	3,00	3,00
37	Нижнекамский, Школьный бульвар	10 000,00	3,00	3,00
38	Тукаевский, Сквер по ул.Центральная	16 067,74	3,00	3,00
39	Черемшанский, ул. Советская	14 122,35	3,00	3,00
40	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, 3 очередь,	35 848,63	5,00	5,00
41	Нижнекамский, Экопарк, 2 очередь	45 000,00	5,00	5,00
42	Лениногорский, Парк «Мэхэббэт»	61 282,77	7,00	4,00
43	Муслюмовский, Парк "Спортивный"	14 609,17	8,00	8,00
44	Нижнекамский, Сквер по ул. Корабельная	28 884,08	20,00	20,00
45	Заинский, Площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь	40 592,12	25,00	20,00
46	Бавлинский, Парк Победы и Трудовой славы, 3 очередь	27 061,21	25,00	25,00
ИТОГО		1 460 262,10	2,73	2,43

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	50 000,00	0,00	0,00
2	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	50 000,00	0,00	0,00
3	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	50 000,00	0,00	0,00
4	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	70 000,00	0,30	0,30
5	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	50 000,00	2,00	2,00
6	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	80 000,00	2,00	2,00
ИТОГО		490 000,00	3,86	2,00
7	Буинский, Центральная площадь	70 000,00	5,00	3,00
8	Азнакаевский, Набережная реки Черная	70 000,00	18,00	7,00

БАВЛИНСКИЙ РАЙОН, ПАРК ПОБЕДЫ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 3 ОЧЕРЕДЬ




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

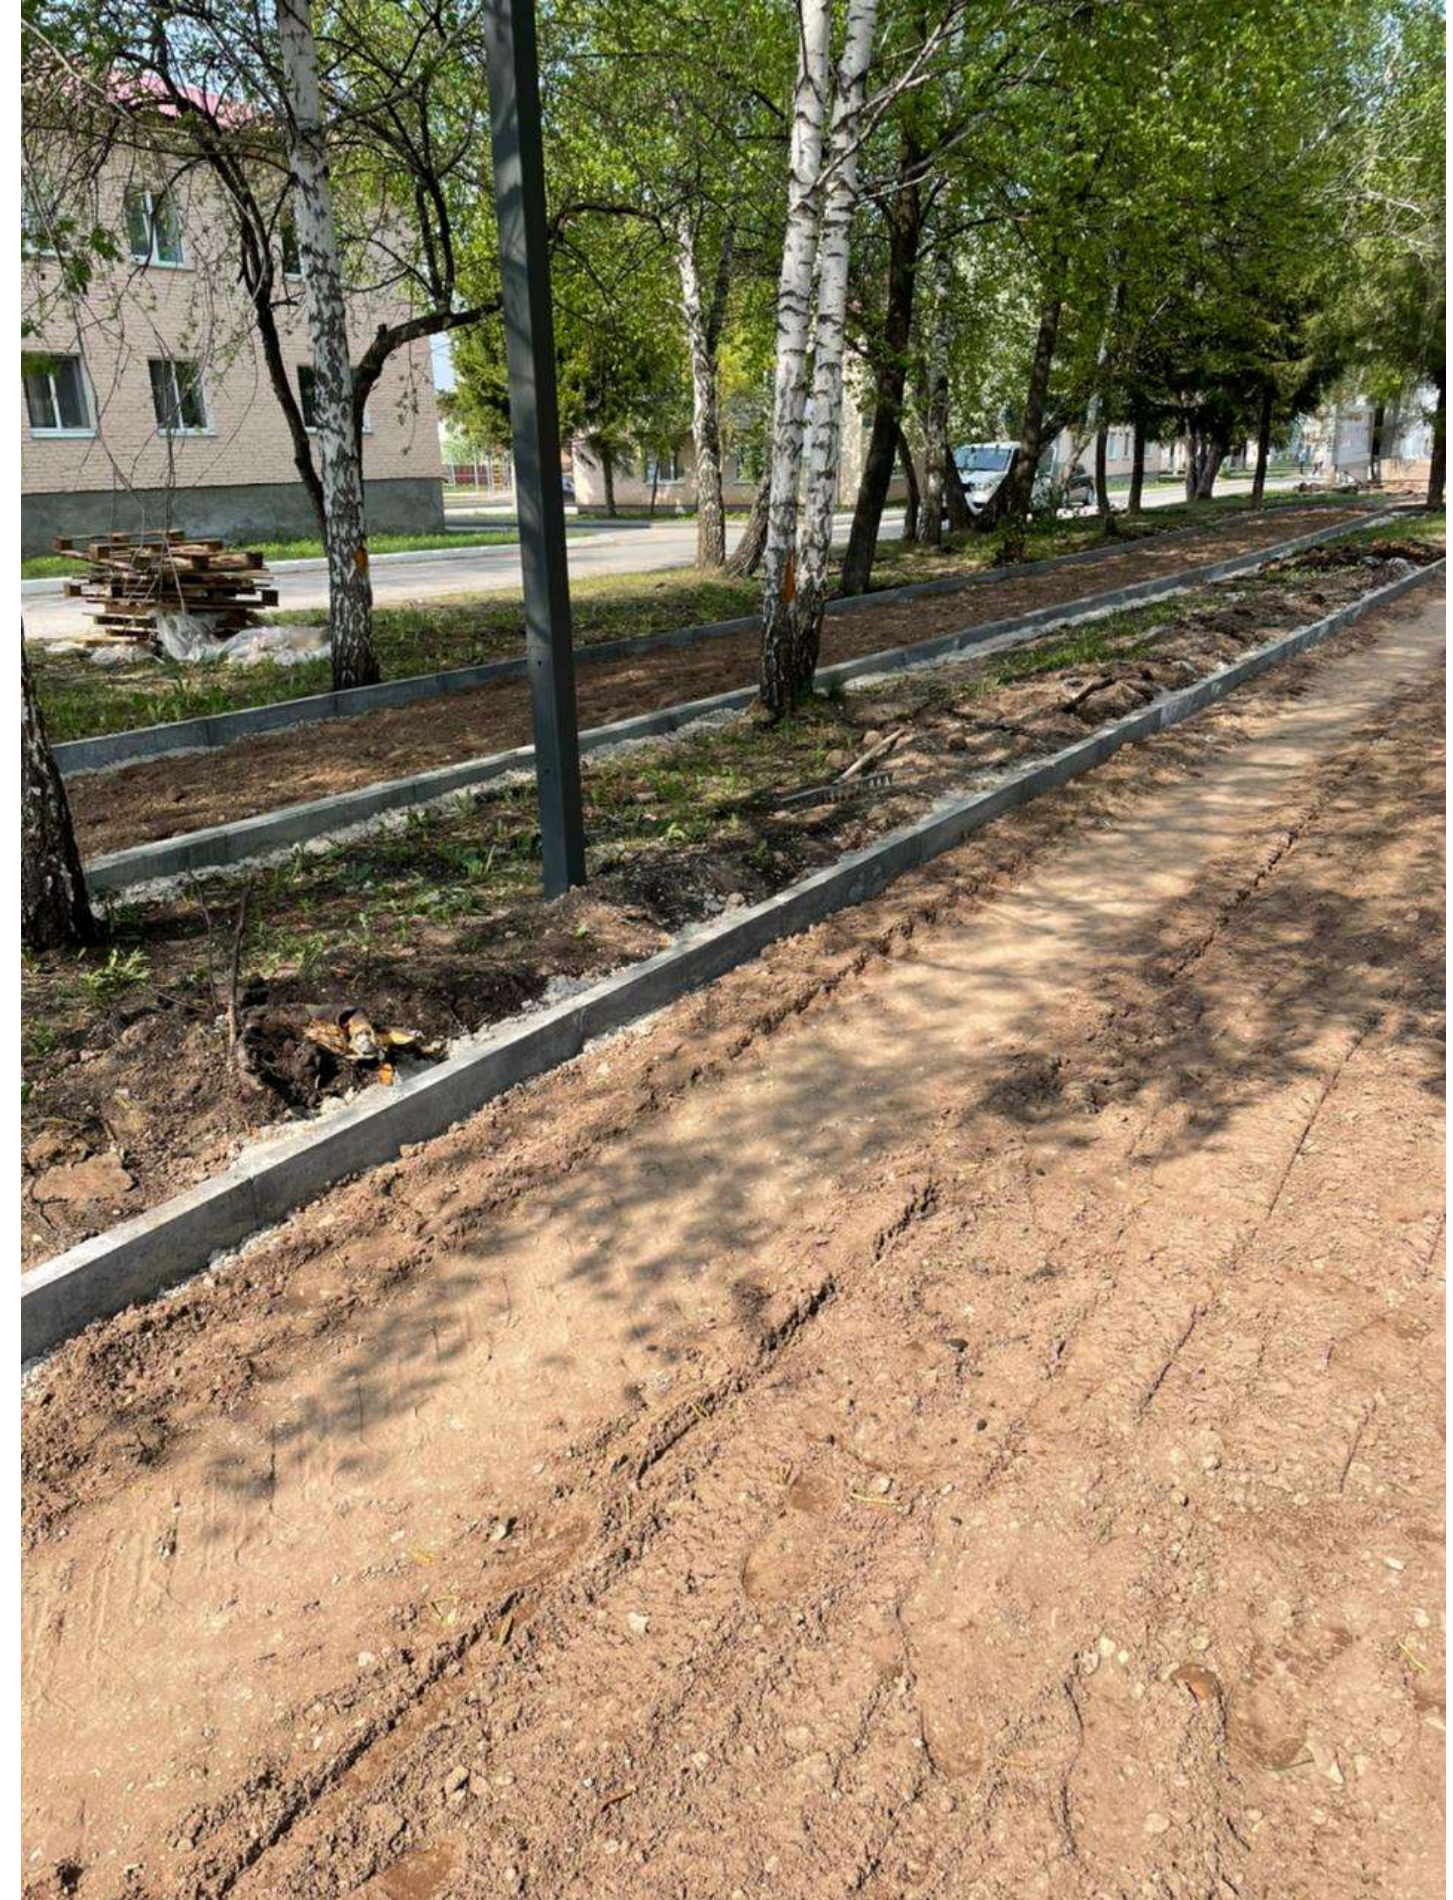

ЗАЙНСКИЙ РАЙОН, ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДК «ЭНЕРГЕТИК» И БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 2 ОЧЕРЕДЬ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

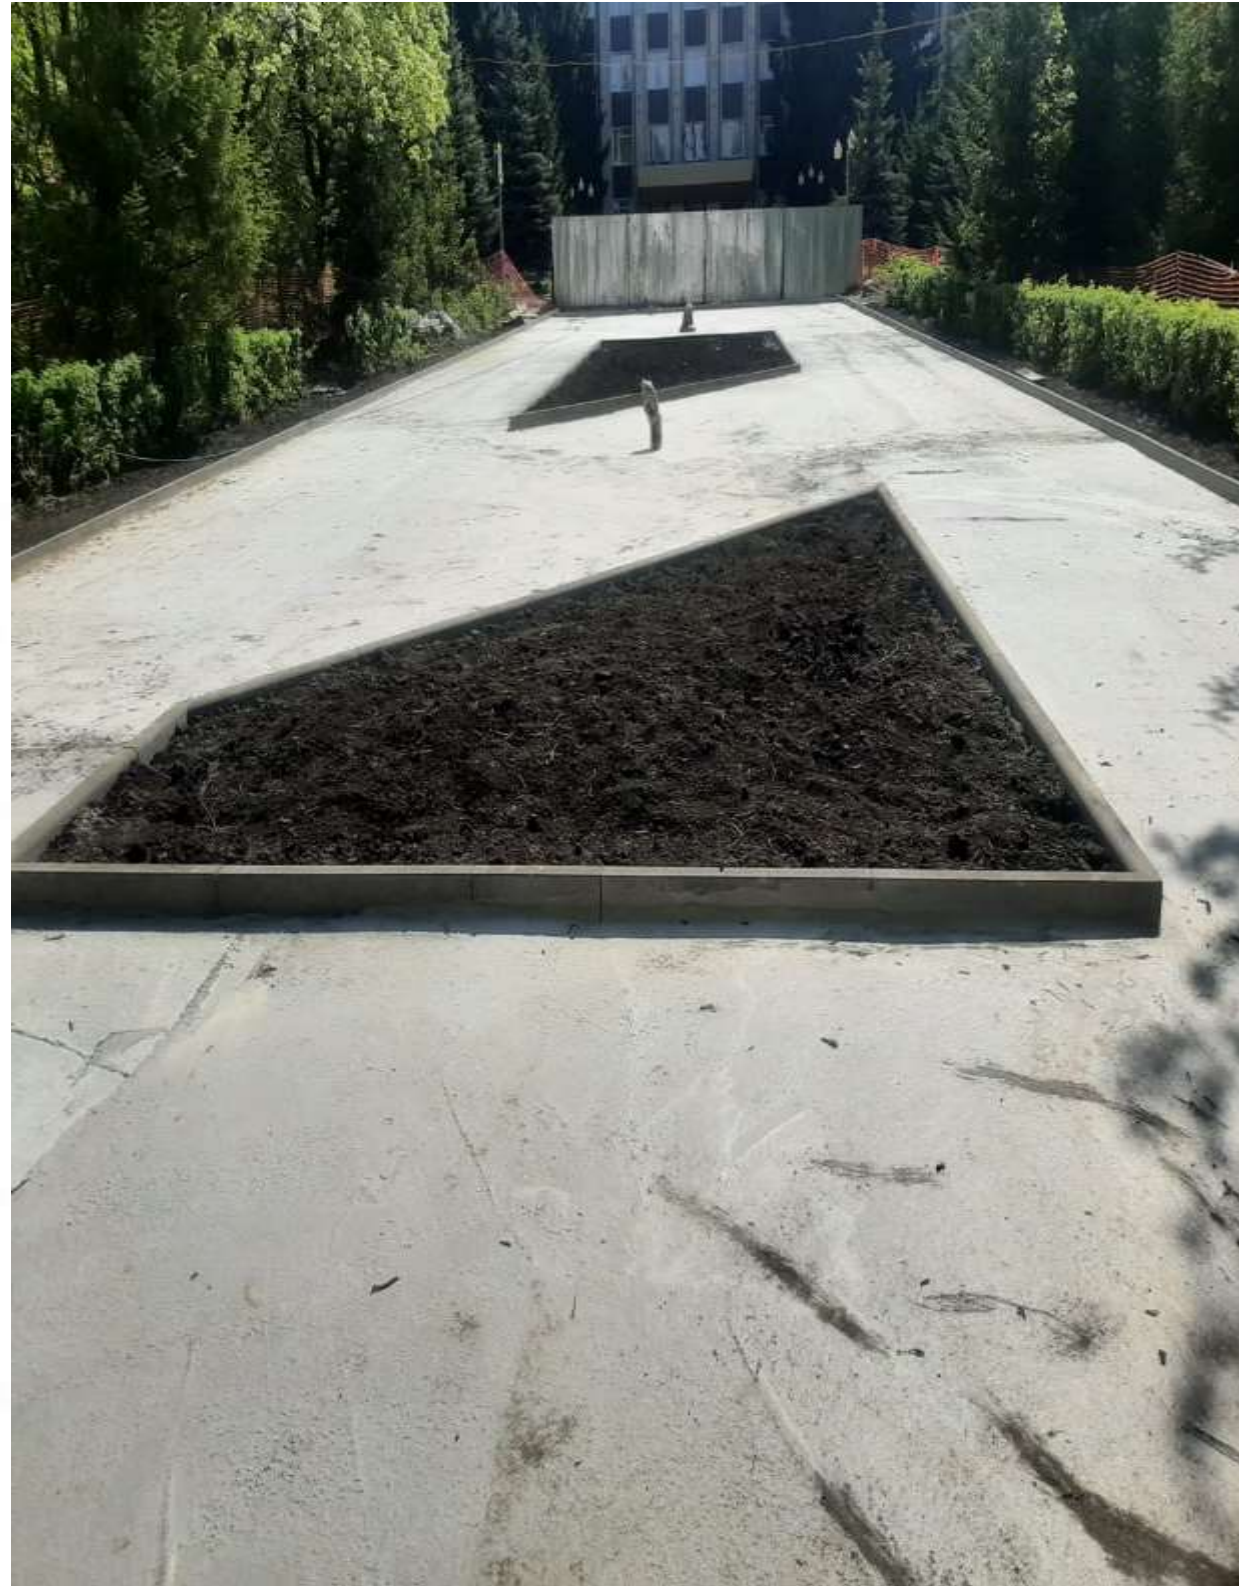


ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	29	161	5
2	Чистопольский	183	109	74	6
3	Казань	89	61	28	0
4	Высокогорский	76	53	23	0
5	Кукморский	53	45	8	0
6	Агрызский	21	17	4	2
7	Бугульминский	12	10	2	0
8	Спасский	29	28	1	0
9	Лаишевский	20	19	1	0
10	Арский	54	53	1	0
11	Альметьевский	14	13	1	0
ВСЕГО по РТ		1102	798	304	13

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Земельные участки с ОКН, подлежат замене

№	МО РТ	ОКН	Необходимо заменить	Всего
1	Чистопольский	49		49
2	Высокогорский		20	20
3	Зеленодольский	18		18
4	город Казань	3	5	8
5	Агрызский		4	4
6	Бугульминский		2	2
7	Арский		1	1
8	Кукморский	1		1
	ВСЕГО по РТ	71	32	103

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)




Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не снесен	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Подготовка акта о сносе МКД	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский	1	1		125	5	11	143
2	Чистопольский		2	9	8	4	2	25
3	город Казань						20	20
4	Кукморский	2	3				2	7
5	Высокогорский						3	3
6	Спасский			1				1
7	Альметьевский		1					1
8	Лаишевский			1				1
ВСЕГО по РТ		3	7	11	133	9	38	201

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

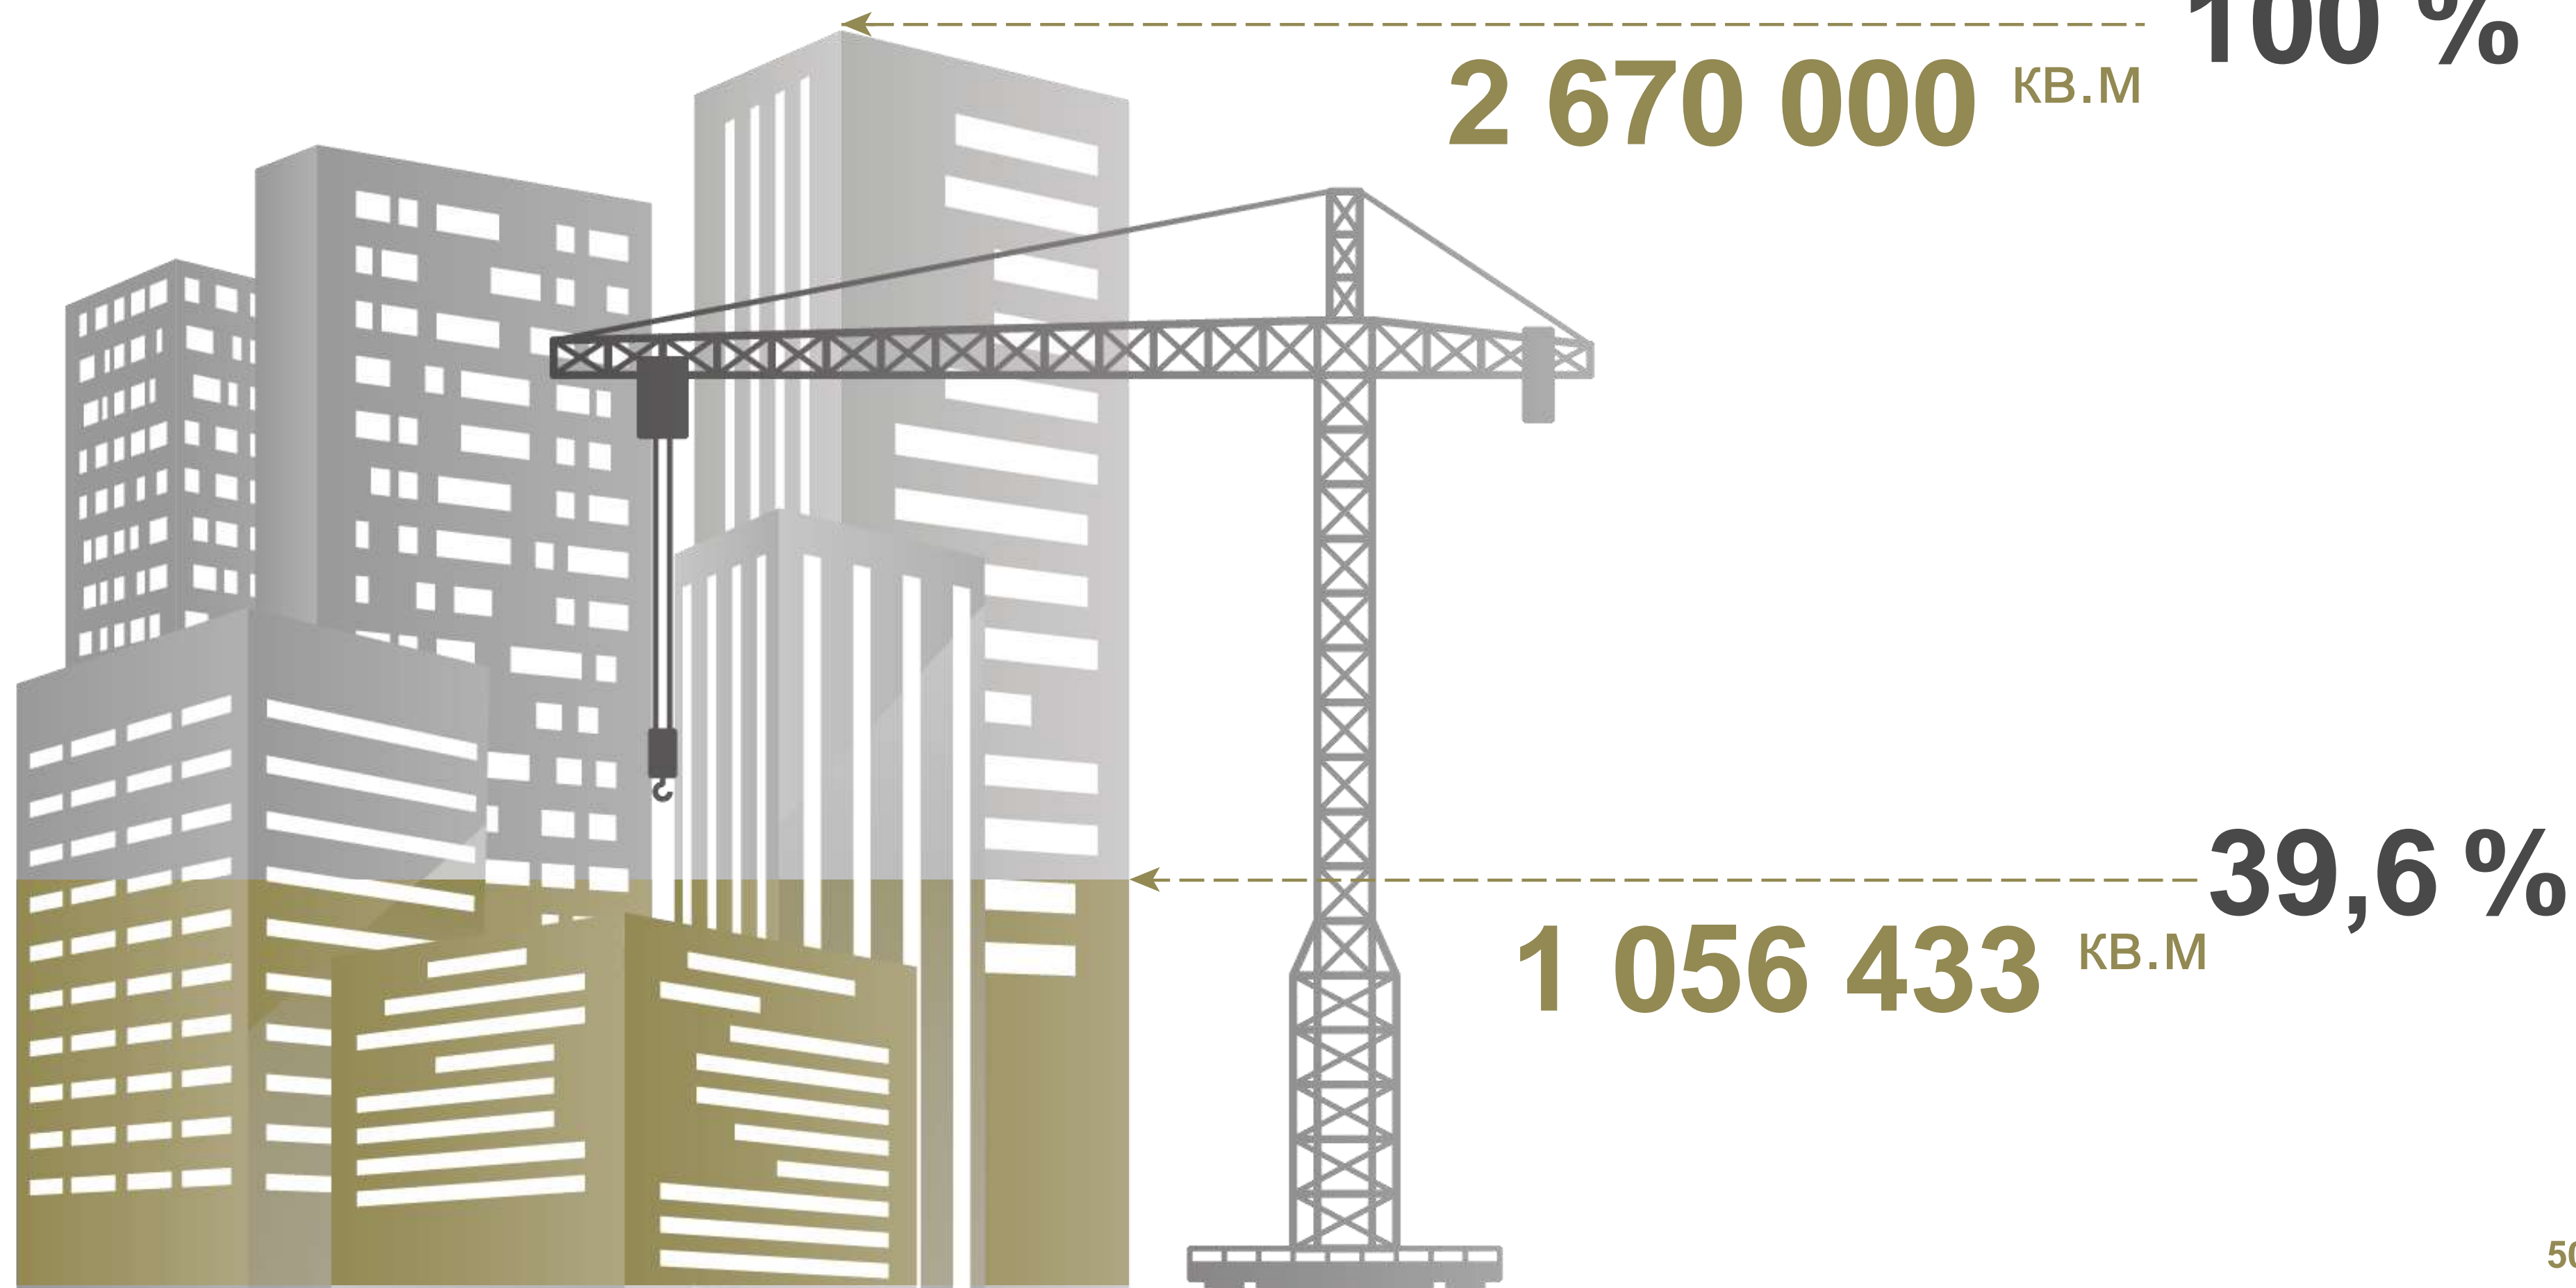

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Муслюмовский	10 000	693	6,9	9 398
2	Лениногорский	25 000	2 659	10,6	22 976
3	Буинский	16 000	2 431	15,2	14 128
4	Новошешминский	5 000	764	15,3	4 615
5	Менделеевский	13 000	2 465	19,0	11 809
6	Арский	25 000	5 726	22,9	20 647
7	Нижнекамский	70 000	16 588	23,7	55 235
8	Спасский	5 000	1 305	26,1	3 970
9	Чистопольский	22 000	6 062	27,6	17 199
10	Тетюшский	10 000	2 968	29,7	8 655
11	Бугульминский	35 000	10 649	30,4	28 363
12	Азнакаевский	22 000	6 968	31,7	17 580
13	Алексеевский	16 000	5 102	31,9	11 925
14	Агрызский	18 000	5 866	32,6	13 305
15	г.Казань	930 000	310 951	33,4	619 049
ВСЕГО по РТ		2 670 000	1 056 433	39,6	1 613 567

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Дрожжановский	7 000	2 352	33,6	4 973
17	Сабинский	22 000	7 473	34,0	16 448
18	Зеленодольский	90 000	30 833	34,3	70 007
19	К-Устьинский	7 000	2 434	34,8	4 997
20	В-Услонский	35 000	12 434	35,5	26 937
21	Р-Слободский	15 000	5 352	35,7	10 654
22	Альметьевский	120 000	44 062	36,7	80 699
23	Ютазинский	13 000	4 776	36,7	9 150
24	Апастовский	8 000	2 963	37,0	5 886
25	Атнинский	4 000	1 558	39,0	3 112
26	Аксубаевский	8 000	3 126	39,1	5 265
27	Тукаевский	110 000	43 107	39,2	71 873
28	Елабужский	60 000	24 265	40,4	42 104
29	Бавлинский	15 000	6 435	42,9	10 456
30	Нурлатский	17 000	7 295	42,9	11 414
ВСЕГО по РТ		2 670 000	1 056 433	39,6	1 613 567

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Тюлячинский	7 000	3 036	43,4	4 314
32	Заинский	20 000	8 766	43,8	13 855
33	Балтасинский	15 000	6 680	44,5	10 285
34	Актанышский	15 000	6 781	45,2	9 697
35	г.Наб.Челны	320 000	145 652	45,5	204 650
36	Алькеевский	8 000	3 666	45,8	5 721
37	Мензелинский	14 000	6 470	46,2	9 499
38	Высокогорский	110 000	51 368	46,7	63 486
39	Мамадышский	20 000	9 665	48,3	11 198
40	Кайбицкий	5 000	2 421	48,4	3 198
41	Сармановский	10 000	4 927	49,3	6 749
42	Кукморский	27 000	13 370	49,5	19 381
43	Лаишевский	160 000	87 141	54,5	86 888
44	Пестречинский	190 000	122 808	64,6	82 755
45	Черемшанский	6 000	4 020	67,0	2 975
ВСЕГО по РТ		2 670 000	1 056 433	39,6	1 613 567

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-	-
2	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	-	-
3	АРСКИЙ	2	1	1	-
4	БУИНСКИЙ	2	1	1	-
5	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	2	5	-
6	ВЫСОКОГОРСКИЙ	3	3	-	-
7	ЕЛАБУЖСКИЙ	3	2	-	1
8	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	3	1	2	-
9	ЛАИШЕВСКИЙ	2	1	1	-
10	НИЖНЕКАМСКИЙ	1	1	-	-
11	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-	-
12	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	17	4	6	7
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	16	10	6	-
14	Г.КАЗАНЬ	45	20	13	12
ВСЕГО по РТ		104	49	35	20

ПРОГРАММА ГЖФ РТ




280 496 КВ.М

100 %

75 832 КВ.М

27,0 %

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	161	39	0	122	75	22	25
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	5 159	1 384	0	3 775	1 267	1 938	570
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	280,50	75,80	0	204,70	71,30	101,90	31,50

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



8 330 ДОМОВ

100 %

4 940 ДОМОВ

59,0 %

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	9	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	3	6,87	6,87	-
ИТОГО:	741	1 196,65	100,28	1 096,37

ДЕТИ-СИРОТЫ


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора
1	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18
2	АКТАНЫШСКИЙ	4
3	АТНИНСКИЙ	1
4	БАЛТАСИНСКИЙ	4
5	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6
6	НИЖНЕКАМСКИЙ	28
7	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4
8	САРМАНОВСКИЙ	1
9	ЮТАЗИНСКИЙ	1
10	Г.КАЗАНЬ	73
ИТОГО:		140

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
1	АЗНАКАЕВСКИЙ	1
2	АРСКИЙ	1
3	БАВЛИНСКИЙ	1
4	БУГУЛЬМИНСКИЙ	1
5	БУИНСКИЙ	1
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	1
8	НУРЛАТСКИЙ	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
9	САБИНСКИЙ	1
10	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1
11	ЮТАЗИНСКИЙ	1
12	АПАСТОВСКИЙ	2
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	8
14	НИЖНЕКАМСКИЙ	11
15	Г.КАЗАНЬ	17
ИТОГО:		49

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	0
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	0
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	0
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	0
5	АРСКИЙ	2	0
6	БАВЛИНСКИЙ	1	0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	1
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	0
9	БУИНСКИЙ	1	0
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	0
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	0
12	ЗАИНСКИЙ	1	0
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	0
14	КУКМОРСКИЙ	1	0


№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
16	МАМАДЫШСКИЙ	1	0
17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	0
18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	0
19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	0
20	НУРЛАТСКИЙ	3	0
21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
22	САБИНСКИЙ	1	0
23	САРМАНОВСКИЙ	1	0
24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	0
25	Г.КАЗАНЬ	2	1
26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	3
ИТОГО:		47	5

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН



№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	4	1	1	1
1.1	Альметьевский	1	1	1	1
1.2	Буинский	1	0	-	-
1.3	г.Казань	1	0	-	-
1.4	Менделеевский	1	0	-	-
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	2	2	0
2.1	г.Набережные Челны	2	2	2	0
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	3	1	1	0
3.1	Буинский	1	0	-	-
3.2	г.Казань	1	1	1	0
3.3	Тетюшский	1	0	-	-
ВСЕГО по РТ		9	4	4	1

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

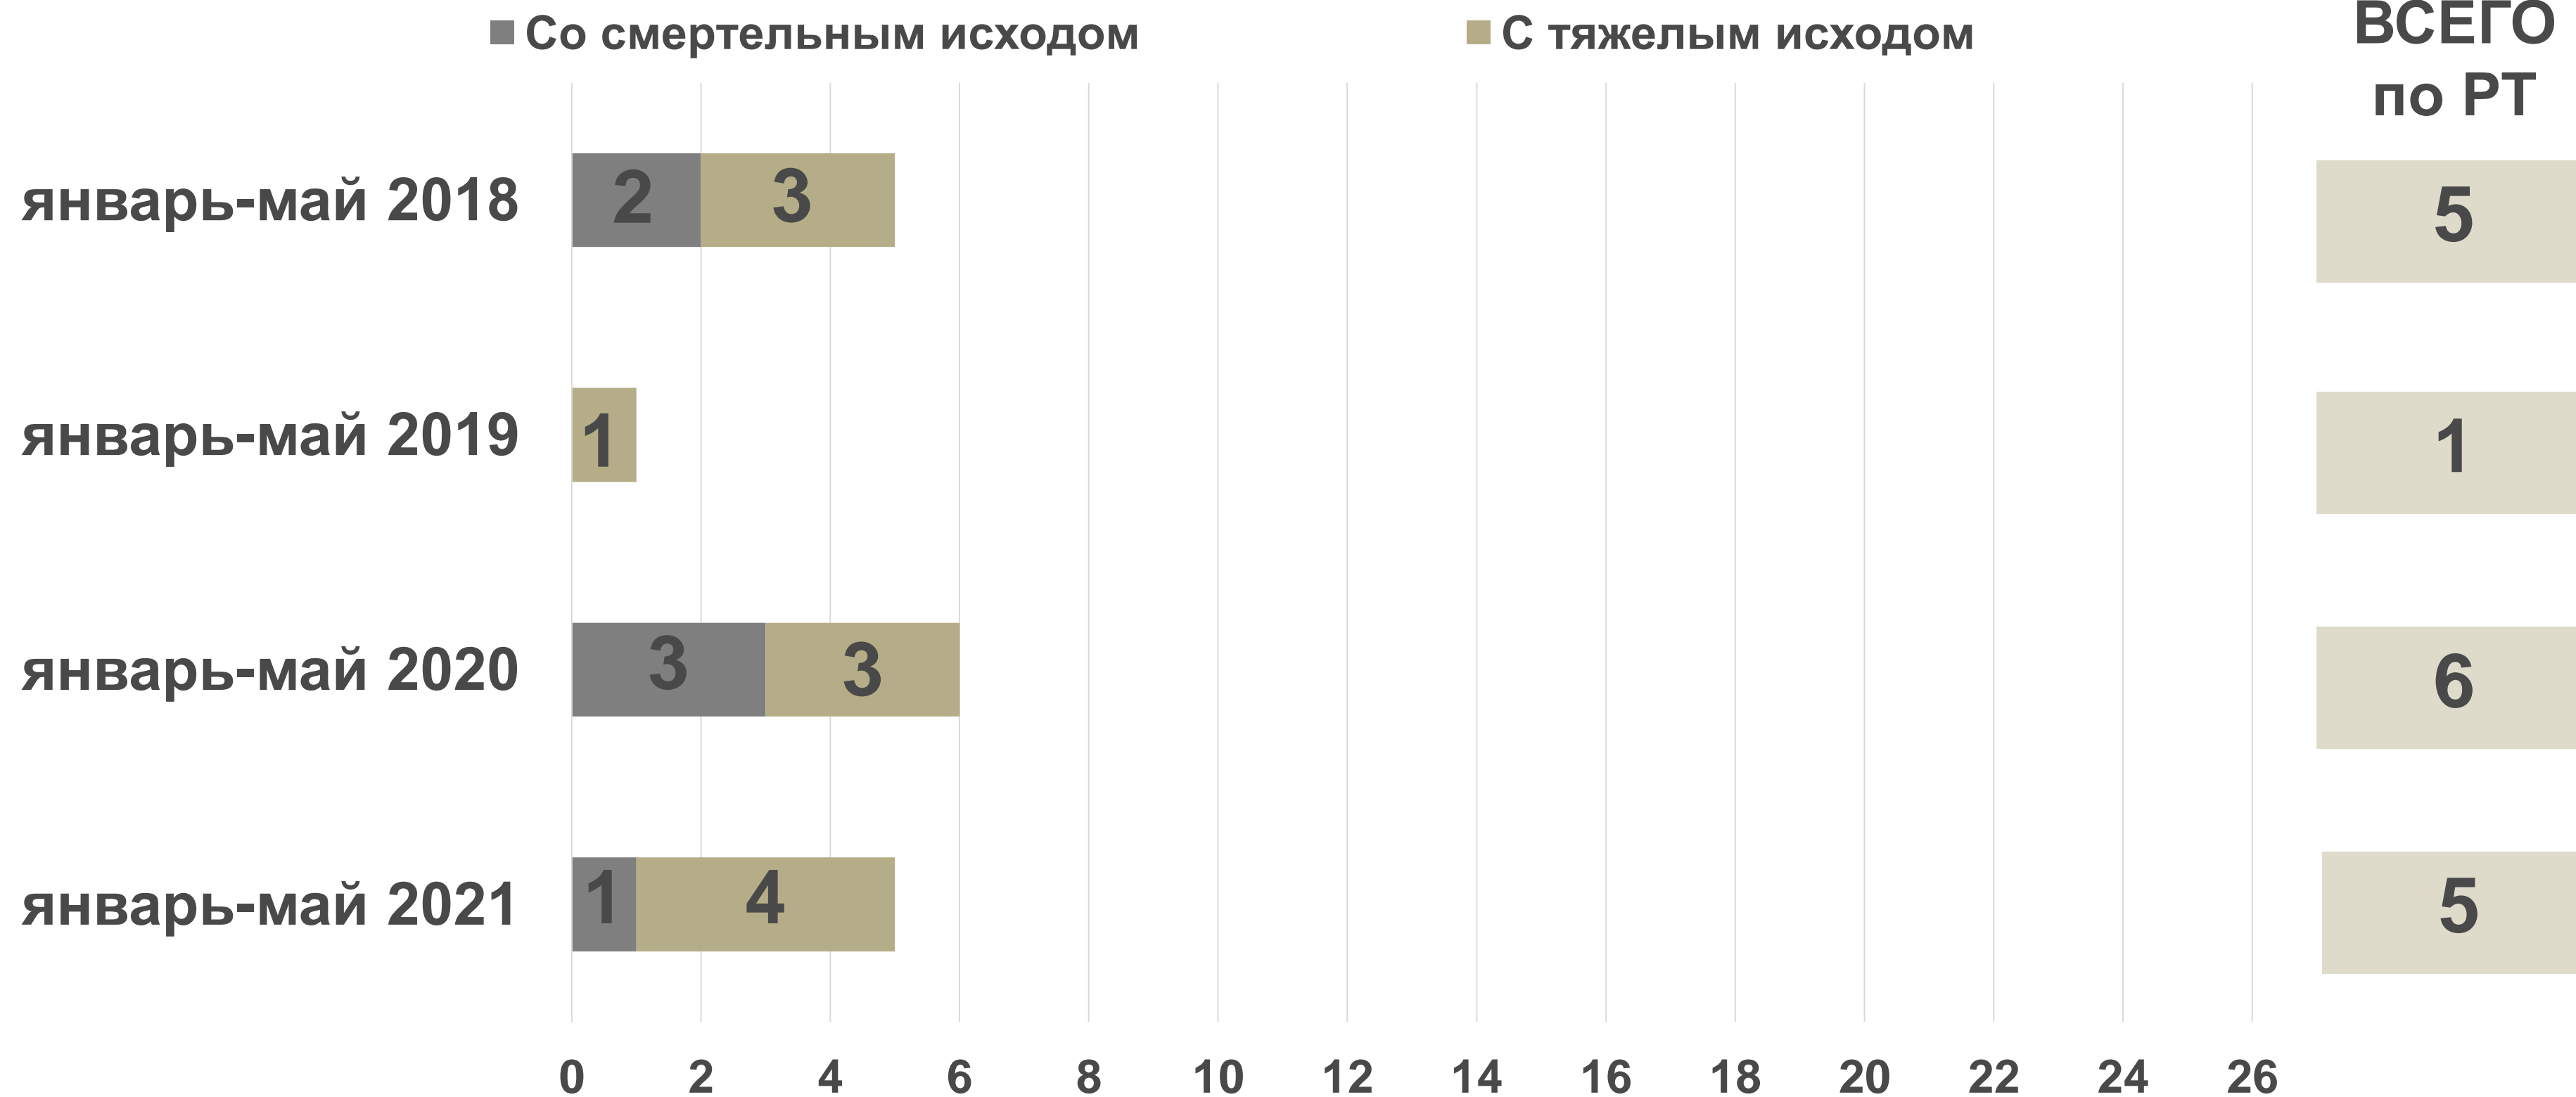

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



Строительство ж/д по ул. С.Садыковой, г. Казань




**Строительные леса допущены
в эксплуатацию без приемки
комиссией и оформления акта.
Не осуществляется
периодический осмотр**

**Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица**

Заказчик: ООО АСК «Градостроительные решения»
Подрядчик: ООО «Компания Унитехстрой»

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	616	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	51	3 555,00
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	19	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	9	1 380,00
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	23	2 175,00

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	686
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	365
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	362
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	175
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	52
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	38
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	97

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	450
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	459
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	457
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	111

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	107	161	159	98
2	г.Набережные Челны	32	30	30	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	4	0	0	-
5	Аксубаевский	4	0	0	-
6	Актанышский	5	1	1	100
7	Алексеевский	9	16	16	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	8	32	32	100
10	Апастовский	15	19	19	100
11	Арский	3	4	4	100
12	Атнинский	0	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	5	13	13	100
16	Буинский	12	9	9	100
ВСЕГО по РТ		450	459	457	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»




№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	4	4	4	100
18	Высокогорский	2	14	14	100
19	Дрожжановский	8	9	9	100
20	Елабужский	21	6	6	100
21	Заинский	2	17	17	100
22	Зеленодольский	3	7	7	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	4	8	8	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	6	12	12	100
27	Лениногорский	17	20	20	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	3	0	0	-
31	Муслюмовский	4	0	0	-
ВСЕГО по РТ		450	459	457	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	26	8	8	100
33	Новошешминский	4	18	18	100
34	Нурлатский	8	4	4	100
35	Пестречинский	4	14	14	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	2	0	0	-
38	Сармановский	3	15	15	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	7	0	0	-
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	2	0	0	-
44	Чистопольский	5	3	3	100
45	Ютазинский	23	0	0	-
ВСЕГО по РТ		450	459	457	99

**КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА РТ**



**«Чистая стройка»
санитарно-экологический двухмесячник**

Наименование	Количество, ед.
1. Проведено проверок	406
2. Выявлено нарушений	39
3. Составлено протоколов, в том числе:	41
на юридических лиц / на должностных лиц	19 / 22
4. Привлечено к административной ответственности, в том числе:	29
юридических лиц / должностных лиц	14 / 15
5. Наложено штрафов, тыс.руб.	1 631,00

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



Строительство ж/д по ул. Сююмбике, г. Нижнекамск



**Не обеспечивается
своевременный вывоз
строительных отходов**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО УК «Наш дом»

**Подрядчики: ООО СК «Татинвестстрой», ООО «ЗЯБ-Конструкция»,
ООО СК «ТехЭнергоСтрой»**

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



Строительство бизнес-парка «Азинский» по пр. Победы, г. Казань



**Не обеспечивается
своевременный вывоз
строительных отходов**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО УК «Столица». Генподрядчик: ООО СК «Экострой»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
