




МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

12 марта 2022 г.

Тема сегодняшнего доклада – республиканские программы, Нацпроекты, жилищное строительство и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

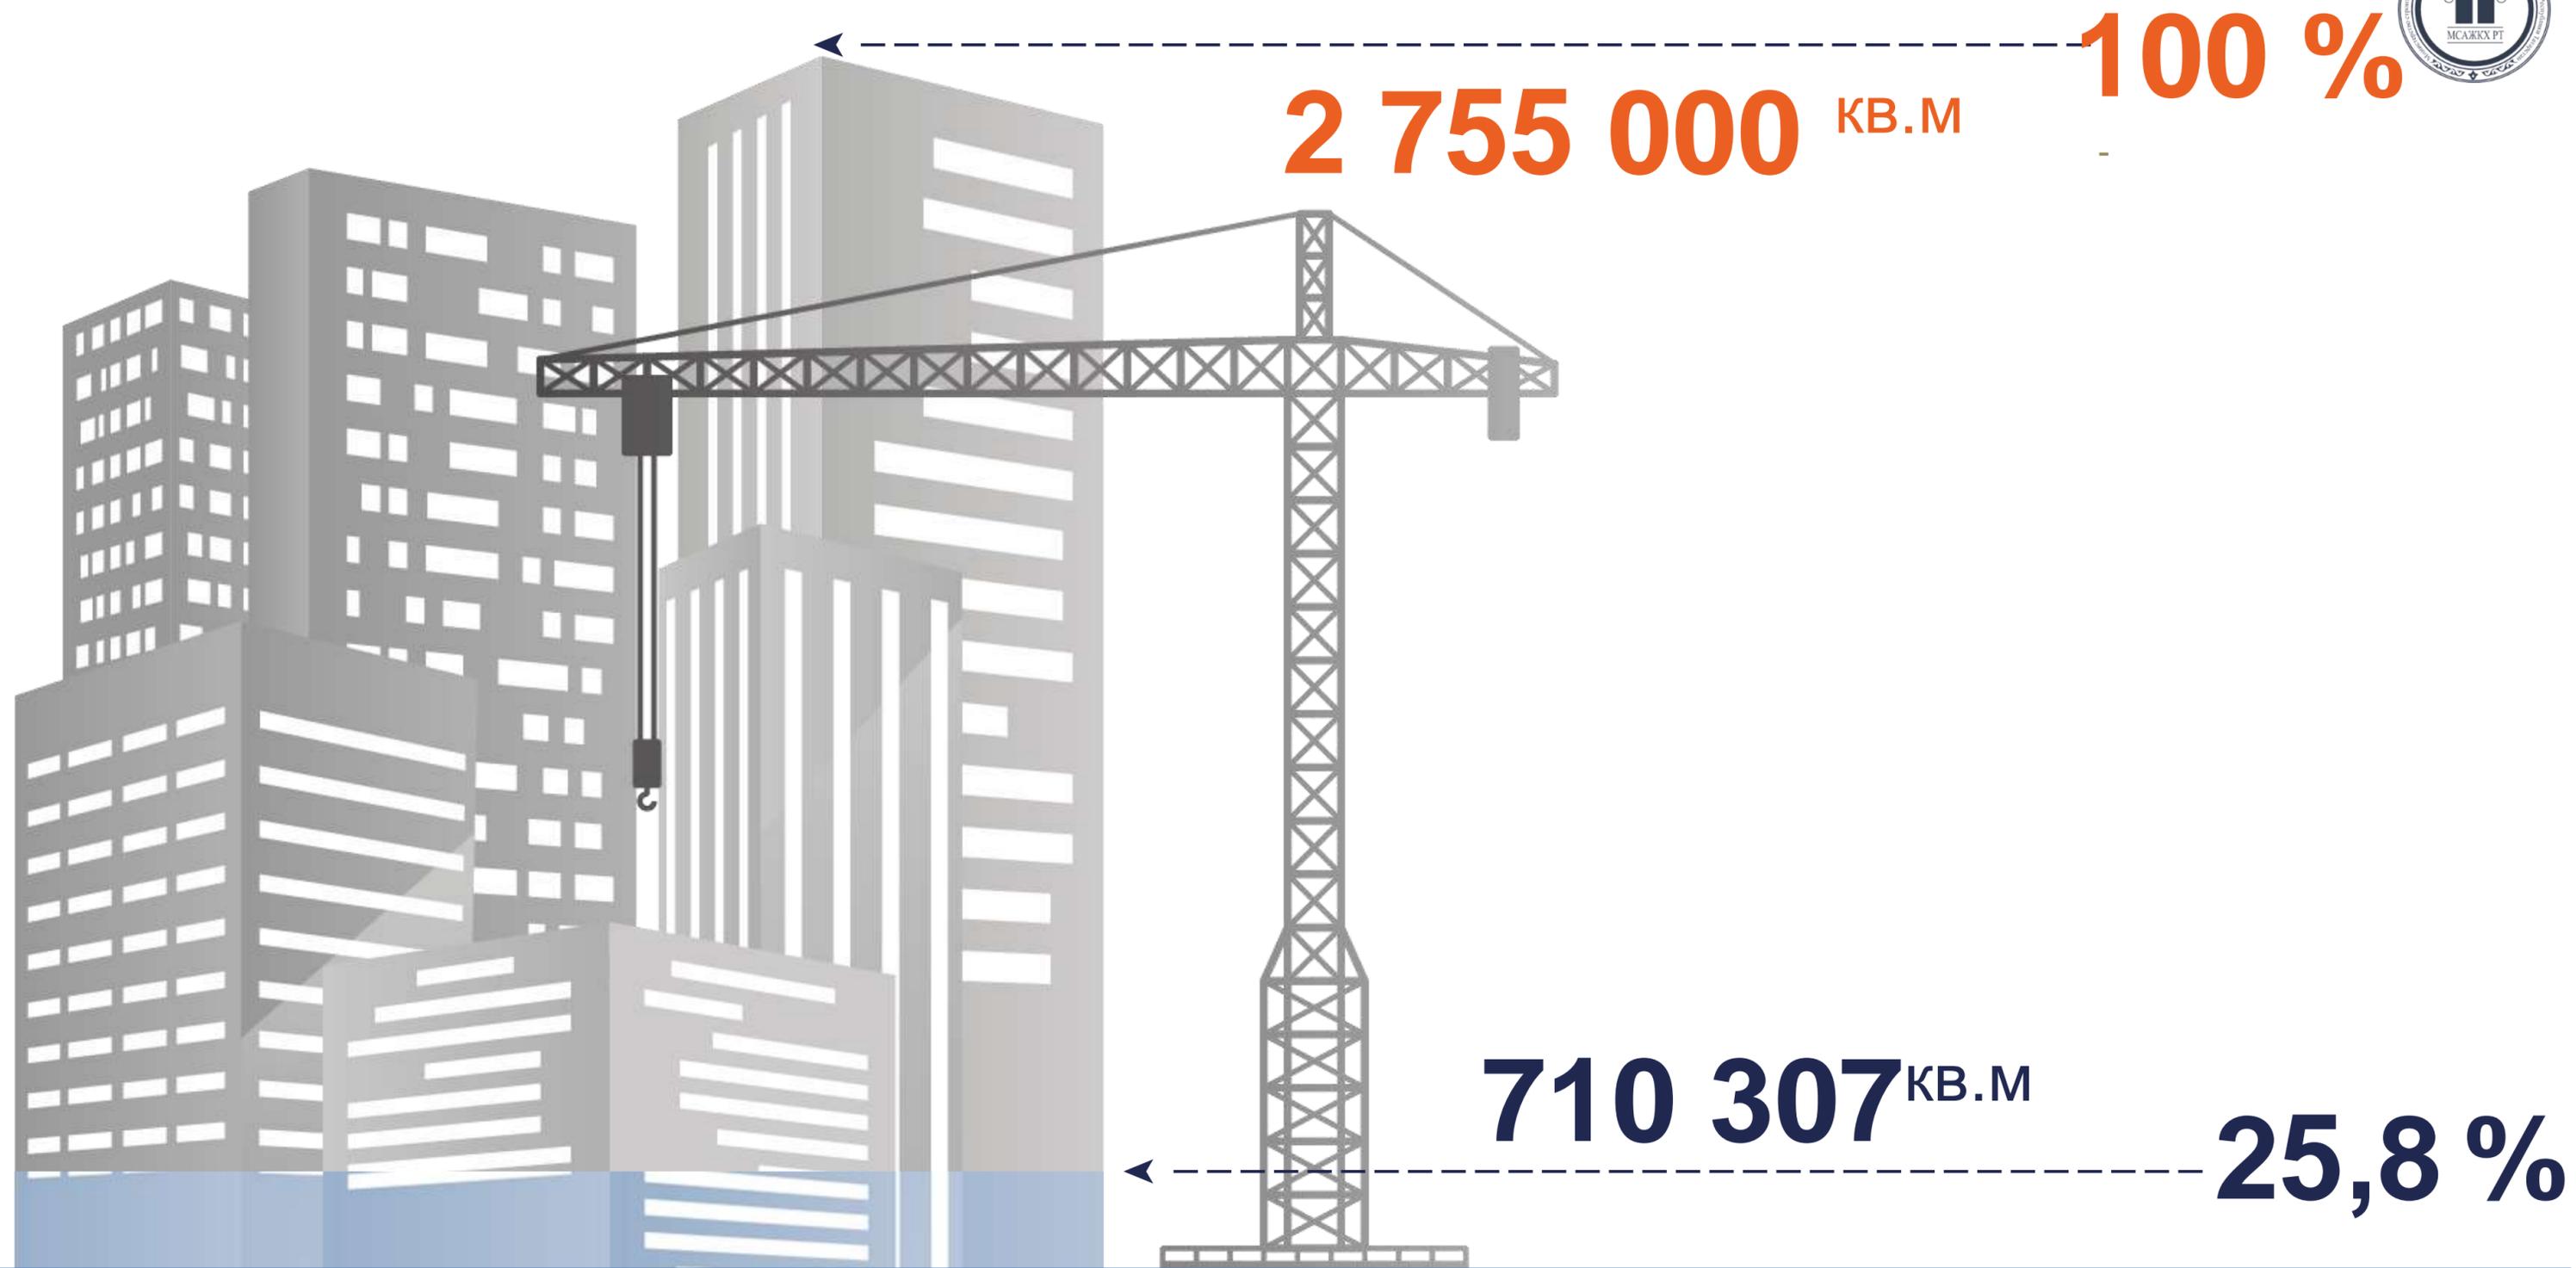

Стройка работает без простоев – на сегодня мы опережаем прошлогодние показатели на 16%.
Выполнение плана текущего года - 26% построено 710 тысяч квадратных метров.

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Тетюшский	10 000	171	1,7	9 829
2	Апастовский	8 000	454	5,7	7 546
3	Аксубаевский	8 000	459	5,7	7 541
4	Бугульминский	35 000	2 849	8,1	32 151
5	Спасский	5 000	414	8,3	4 586
6	Кайбицкий	5 000	451	9,0	4 549
7	Заинский	22 000	2 364	10,7	19 636
8	Ютазинский	13 000	1 399	10,8	11 601
9	Новошешминский	4 000	445	11,1	3 555
10	Дрожжановский	7 000	807	11,5	6 193
11	Буинский	16 000	1 958	12,2	14 042
12	Агрызский	18 000	2 246	12,5	15 754
13	Камско-Устьинский	5 000	630	12,6	4 370
14	Алексеевский	16 000	2 098	13,1	13 902
15	Балтасинский	15 000	2 069	13,8	12 931
ВСЕГО по РТ		2 755 000	710 307	25,8	2 044 693

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Рыбно-Слободский	15 000	2 143	14,3	12 857
17	г.Казань	956 000	147 587	15,4	808 413
18	Актанышский	15 000	2 373	15,8	12 627
19	Бавлинский	15 000	2 470	16,5	12 530
20	Черемшанский	6 000	1 095	18,3	4 905
21	Кукморский	29 000	5 373	18,5	23 627
22	Чистопольский	20 000	3 775	18,9	16 225
23	Азнакаевский	15 000	2 871	19,1	12 129
24	Елабужский	60 000	11 701	19,5	48 299
25	Алькеевский	7 000	1 445	20,6	5 555
26	Альметьевский	120 000	25 311	21,1	94 689
27	г.Наб.Челны	330 000	70 874	21,5	259 126
28	Мамадышский	20 000	4 538	22,7	15 462
29	Арский	25 000	5 991	24,0	19 009
30	Нижнекамский	70 000	19 250	27,5	50 750
ВСЕГО по РТ		2 755 000	710 307	25,8	2 044 693


ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Нурлатский	17 000	4 738	27,9	12 262
32	Сабинский	22 000	6 319	28,7	15 681
33	Менделеевский	13 000	3 834	29,5	9 166
34	Верхнеуслонский	35 000	10 606	30,3	24 394
35	Сармановский	10 000	3 599	36,0	6 401
36	Зеленодольский	100 000	36 227	36,2	63 773
37	Атнинский	4 000	1 607	40,2	2 393
38	Мензелинский	14 000	5 726	40,9	8 274
39	Тукаевский	115 000	50 227	43,7	64 773
40	Муслюмовский	10 000	4 442	44,4	5 558
41	Пестречинский	205 000	91 810	44,8	113 190
42	Лаишевский	180 000	89 536	49,7	90 464
43	Высокогорский	120 000	60 066	50,1	59 934
44	Тюлячинский	5 000	3 725	74,5	1 275
45	Лениногорский	15 000	12 234	81,6	2 766
ВСЕГО по РТ		2 755 000	710 307	25,8	2 044 693

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



150 120 КВ.М

100 %

56 ДОМОВ

70 095 КВ.М

46,7 %

14 ДОМОВ

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за неделю		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	56	14	0	42	22	17	3
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	2 752	1 271	0	1 481	1 405	50	26
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	150,12	70,1	0	80,02	75,82	2,8	1,4

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1 681,3 ТЫС.КВ.М

100 %


12 454 ДОМА

508,4 ТЫС.КВ.М

30,2 %

3 766 ДОМОВ

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



923 584 КВ.М

146 ДОМОВ

100 %

131 819 КВ.М

32 ДОМА

14,3 %

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ		
			ВЫСОКАЯ (70-100%)	СРЕДНЯЯ (30-70%)	НИЗКАЯ (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Алексеевский	2	-	1	1
3	Альметьевский	3	1	2	-
4	Арский	2	-	-	2
5	Буинский	6	2	3	1
6	Верхнеуслонский	8	3	4	1
7	Высокогорский	13	-	7	6
8	Елабужский	3	1	-	2
9	Зеленодольский	3	2	1	-
10	Кукморский	1	-	-	1
11	Лаишевский	1	-	1	-
12	Лениногорский	1	-	-	1
13	Нижнекамский	4	-	-	4
14	Нурлатский	1	1	-	-
15	Пестречинский	11	7	4	-
16	Ютазинский	1	-	-	1
17	г.Набережные Челны	23	18	5	-
18	г.Казань	30	13	13	4
ВСЕГО ПО РТ		114	49	41	24

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ НА 2022 ГОД



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	600	959,64	56,08	903,56
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	22	229,18	-	229,18
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	50	67,29	17,79	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	5	23,64	23,64	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	18,29	18,29	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	2,91	2,91	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	2,44	2,44	-
ИТОГО:	677	1 279,75	97,51	1 182,24

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ	ОФОРМЛЕНО СЕРТИФИКАТОВ
1	Альметьевский	2	2
2	Арский	1	1
3	Балтасинский	4	4
4	Высокогорский	1	1
5	Елабужский	1	
6	Кукморский	1	1
7	Лаишевский	1	
8	Лениногорский	1	1
9	Мамадышский	1	
10	Мензелинский	1	1
11	Нижнекамский	1	
12	Рыбно-Слободский	1	
13	Тукаевский	1	1
14	г.Казань	3	2
15	г.Набережные Челны	2	
ИТОГО ПО РТ:		22	14

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№	МО РТ	Кол-во семей
1	Азнакаевский	2
2	Алексеевский	1
3	Апастовский	1
4	Арский	2
5	Бавлинский	3
6	Балтасинский	2
7	Бугульминский	1
8	Буинский	1
9	Высокогорский	1
10	Дрожжановский	1
11	Елабужский	1
12	Зеленодольский	3

№	МО РТ	Кол-во семей
13	Мамадышский	1
14	Нижнекамский	3
15	Нурлатский	1
16	Пестречинский	1
17	Сабинский	2
18	Черемшанский	1
19	Чистопольский	1
20	Ютазинский	1
21	г.Набережные Челны	6
22	г.Казань	14
ИТОГО ПО РТ:		50

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ **ГРАЖДАН**

№	МО РТ	Количество получателей
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	3
1.1	Азнакаевский	1
1.2	Кукморский	1
1.3	Пестречинский	1
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1
2.1	г.Казань	1
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1
3.1	г.Казань	1
ВСЕГО ПО РТ		5

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Алексеевский, Ялкынское СП, д.Ялкын, ул.Зеленая, д.35	7 237,80	0,00	0,00
2	Атнинский, Узюмское СП, с.Таш-Чишма, ул.Ш.Усманова, д.1б	7 237,80	0,00	0,00
3	Верхнеуслонский, Верхнеуслонское СП, с.Верхний Услон, ул.Чехова	7 237,80	0,00	0,00
4	Менделеевский, Тойгузинское СП, д.Тойгузино, пер.Школьный	7 237,80	0,00	0,00
5	Нижнекамский, Нижнеуратьминское СП, с.Нижняя Уратьма	7 237,80	0,00	0,00
6	Новошешминский, Петропавловское СП, с.Слобода Петропавловская, ул.Ленина	7 237,80	0,00	0,00
7	Нурлатский, Якушкинское СП, с.Якушкино, ул.Ленина	7 237,80	0,00	0,00
8	Сармановский, Новоимянское СП, с.Кутемели, ул.Гагарина, д.23	7 237,80	0,00	0,00
9	Елабужский, Костенеевское СП, с.Костенеево, ул.Центральная	7 237,80	12,00	12,00
ИТОГО		65 140,20	1,33	1,33

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН, КОСТЕНЕЕВСКОЕ СП, С.КОСТЕНЕЕВО,
УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	ЛИМИТ, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей пионерлагерь «Чулпан»	14 996,09	0,00	0,00
2	Строительство зданий и сооружений автономного детского оздоровительно-досугового учреждения «Ласточка»	115 031,95	1,00	0,00
3	Строительство зданий и сооружений МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (2 этап)	379 002,56	4,00	3,00
4	Строительство зданий и сооружений ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.» для размещения муниципального учреждения «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	26 632,09	9,00	4,00
ИТОГО		545 939,67	3,22	2,33

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Административное здание с ИВС межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории	149 250,00	7,00	2,00
ИТОГО		149 250,00	7,00	2,00



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.	
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» <i>37 объектов</i>	1. ФП «Жилье»	1 Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	
		1 Реконструкция очистных сооружений (переходящий объект с 2021 года)	140 804,81	
		1 Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе «Замелекесье» (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	
	2. ФП «Формирование комфортной городской среды»	27 (парки, скверы)	1 518 622,39	
		6 (конкурс малых городов 2022 г.)	395 062,50	
		3. ФП «Чистая вода»	1 (строительство системы водоснабж..)	279 081,36
		4. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	12,517 тыс. кв. метров	82 895,27
НП «ЭКОЛОГИЯ» <i>3 объекта</i>	5. ФП «Оздоровление волги»	1 Реконструкция БОСК г.Казань	1 855 062,22	
		1 Рекультивация иловых полей	3 300 814,69	
	6. ФП «Чистая страна»	1 Рекультивация Самосыровского полигона	200 000,00	
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» <i>49 объектов</i>	7. ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения»	49 (строительство и реконструкция: АПУ, ВОП, ВА, ФАП ,капитальный ремонт поликлиник и врачебных амбулаторий)	1 377 248,06	
ИТОГО		12	10 177 367,02	

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
НП «КУЛЬТУРА» 11 объектов	8. ФП «Культурная среда»	2 (капитальный ремонт дома культуры)	70 000,00
		2 (капитальный ремонт детских музыкальных школ и музеев)	49 616,14
		1 (реконструкция театра юного зрителя)	352 969,60
		5 (строительство сельских домов культуры)	106 544,70
НП «ДЕМОГРАФИЯ» 1 объект	9. ФП «Содействие занятости»	1 (строительство детских садов, переходящий объект на 2023 год)	71 986,30
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 3 объекта	10. ФП «Современная школа»	1 (строительство школы, переходящий объект на 2023 год)	63 016,00
	11. ФП «Успех каждого ребенка»	2 (капремонт спорт.залов)	2 914,20
НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 1 объект	12. ФП «Развитие туристической инфраструктуры»	Благоустройство территории вблизи объекта "Тюбетей тауер"	243 113,10
ИТОГО	12	104	10 177 367,02

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	Пестречинский	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево", с увеличением производительности от 2500 куб.м/сут до 4000 куб.м/сут	140 804,81	Всего - 53,8% (За 2022г. - 21,9%)
2	г.Казань	Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	0,00
3	г. Набережные Челны	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе Замелекесье (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	0,00
ИТОГО:			208 420,49	17,93

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Азнакаевский	Набережная р.Черной, 2 очередь	32 081,89
2	Аксубаевский	Сквер по ул.Мазилина, 4 очередь	14 951,50
3	Актанышский	Благоустройство набережной оз.Иске Идель	27 094,79
4	Альметьевский	Бульвар по ул.Ризы Фахретдина, (от ул.Ленина до ул.Советской), 2 очередь	56 588,51
5	Альметьевский	Внутриквартальный бульвар мкр.Западные Ворота (от ул.Гафиатуллина до ул.Бигаш), 2 очередь	56 588,51
6	Арский	Площадь Советская и ул.Большая, 5 очередь	20 000,00
7	Бугульминский	Благоустройство прилегающей территории по ул.М.Джалиля к центральному водоему, 2 очередь	55 021,37
8	Буинский	Центральная площадь, 3 очередь	72 160,80
9	Елабужский	Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул.Марджани, 2 очередь	41 930,96
10	г.Казань	Парк у жилого комплекса «Салават Купере», 2 очередь	500 539,14
11	Кукморский	Набережная р.Нурминки, 3 очередь	78 000,00
12	Лениногорский	Парк «Мэхэббэт», 2 очередь	43 628,30
13	Мамдышский	Набережная р.Вятки, 3 очередь	22 380,49
ИТОГО:			1 444 050,99

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
14	Менделеевский	Бульвар Интернационалистов, 2 очередь	16 134,20
15	Мензелинский	Парк им.В.И.Ленина, 2 очередь	14 869,39
16	Муслюмовский	Парк Спортивный, 2 очередь	10 384,92
17	г.Набережные Челны	Парк «Прибрежный»	155 214,42
18	Нижнекамский	Экстрим-парк, 2 очередь	48 000,00
19	Нижнекамский	Школьный бульвар, 2 очередь	20 000,00
20	Нурлатский	Парк «Кондурча», 2 очередь	29 589,79
21	Пестречинский	Детский городок, 2 очередь	26 787,74
22	Сабинский	Парк по ул.З.Юсупова, 3 очередь	16 644,80
23	Сармановский	Сквер «100-летия ТАССР», 2 очередь	18 413,68
24	Тетюшский	«320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 2 очередь	11 451,80
25	Тюлячинский	Пруд в с.Баландыш, 2 очередь	5 000,00
26	Черемшанский	Улица Советская, 2 очередь	9 979,27
27	Чистопольский	Центральная площадь, 2 очередь	40 614,73
ИТОГО:			1 444 050,99

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Агрызский	Благоустройство улицы Карла Маркса, г.Агрыз	50 000,00
2	Алексеевский	Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", с.Билярск	56 250,00
3	Арский	ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул.Коммуны, г.Арск	70 000,00
4	Бавлинский	Благоустройство общественных пространств 27 микрорайона Соединяя Бавлы, г.Бавлы	70 000,00
5	Кукморский	Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина, г.Кукмор	50 000,00
6	Чистопольский	Городская набережная реки Кама "Наречье", г.Чистополь	80 000,00
ИТОГО:			376 250,00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Нурлатский	Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом	279 081,36
ИТОГО:			279 081,36

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»



Этап Программы	Год реализации	Человек	Кол-во помещений, ед.	Общая площадь, кв.м.
Этап 2021 года (срок реализации 2021-2022гг)	Всего	294	100	3 772,19
	2021 год (факт)	216	79	2 945,36
	2022 год (план)	78	21	826,83
Этап 2022 года (срок реализации 2022-2023гг)	Всего	988	403	12 517,71
	2022 год (план)	763	303	8 800,16
	2022 год (факт)	71	30	920,18
	2023 год (план)	225	100	3717,55
Всего план на 2022 год		841	324	9 626,99

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЗУ	ЗУ ПЕРЕДАНЫ	ЗУ НЕ ПЕРЕДАНЫ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Чистопольский	183	182	1	0
2	Зеленодольский	190	166	24	1
3	Кукморский	53	49	4	0
4	Высокогорский	76	76	0	1
ВСЕГО ПО РТ:		1 102	1 073	29	2

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



ПЕРЕДАЧА ЗУ БЕЗ ЗАМЕНЫ

№	МО РТ	МКД не снесены	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский		6	9	9	24
2	Кукморский	2			2	4
3	Чистопольский		1			1
ВСЕГО ПО РТ:		2	7	9	11	29

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %
1	Реконструкция БОС г.Казани	1 855 062,22	Всего - 30,55% (За 2022г. - 5,35%)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ ПО КОНТРАКТУ, ТЫС. РУБ.	СМР, %
		ФАКТ
Рекультивация Самосыровского полигона г. Казани	872 158,72	35,01



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Тукаевский	Строительство общеобразовательной организации на 100 мест	63 016,00
ИТОГО:			63 016,00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	Бавлинский	МБОУ «Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа»	1 275,06	70,0%
2	Апастовский	МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	1 639,14	19,0%
ИТОГО:			2 914,20	44,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
МБОУ «АПАСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	г. Казань	Дошкольная образовательная организация на 220 мест в квартале 59 г.Казани	71 986,30	5,50



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
1	Азнакаевский	Сухояшевский ФАП ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница"	6 732,91
2	Актанышский	Актанышбашский ФАП ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница"	6 732,91
3	Алексеевский	Краснобаранский ФАП ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница"	6 732,91
4	Альметьевский	Строительство центра ВОП и педиатра в г.Альметьевске	38 324,58
5	Альметьевский	Молодежный ФАП ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	8 149,41
6	Апастовский	Чуру-Барышевский ФАП ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница"	6 732,91
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
7	Арский	Урнякский ФАП ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	8 149,41
8	Бавлинский	Потапово-Тумбарлинский ФАП ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница"	6 732,91
9	Балтасинский	Бурнакский ФАП ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница"	6 732,91
10	Бугульминский	Прогрессский ФАП ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	6 732,91
11	Верхнеуслонский	Октябрьский ФАП ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница"	6 732,91
12	Высокогорский	Дачный ФАП ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница"	6 732,91
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
13	Заинский	Новоспасский ФАП ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"	6 732,91
14	Зеленодольский	Больше-Ходяшевский ФАП ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	6 732,91
15	г.Казань	Филиал детской поликлиники ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	380 845,94
16	Кайбицкий	Чутеевский ФАП ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"	6 732,91
17	Камско-Устьинский	Азимово-Курлибашский ФАП ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная больница"	6 732,91
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
18	Лениногорский	Старо-Кувакская ВА ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	26 171,32
19	Лениногорский	Тимяшевский ФАП ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	8 149,41
20	Мамадышский	Нижнесуньский ФАП ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница"	6 732,91
21	Мензелинский	Юртовский ФАП ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница"	6 732,91
22	г.Набережные Челны	Залесный ФАП ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	8 149,41
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
23	Нижнекамский	Верхне-Уратьминский ФАП ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"	8 149,41
24	Новошешминский	Слобода-Екатерининский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91
25	Новошешминский	Красно-Октябрьский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91
26	Нурлатский	Ново-Иглайкинский ФАП ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница"	6 732,91
27	Рыбно-Слободский	Бердибяковский ФАП ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница"	6 732,91
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО			
28	Сабинский	Юлбатский ФАП ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"	6 732,91
29	Сармановский	Сарайлинский ФАП ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница"	5 006,48
30	Тукаевский	Мусабай-Заводский ФАП ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница"	8 149,41
31	Тюлячинский	Аланский ФАП ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница"	6 732,91
32	Чистопольский	Нижне-Кондратинский ФАП ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница"	6 732,91
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
33	Аксубаевский	ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница", поликлиника, пгт.Аксубаево	30 298,61
34	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", поликлиника, пгт.Алексеевское	10 465,90
35	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", клинико-диагностическая поликлиника, пгт.Алексеевское	15 042,14
36	Верхнеуслонский	ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница", поликлиника, с.Верхний Услон	11 300,23
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
37	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", поликлиника, г.Заинск	300,00
38	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", женская консультация, г.Заинск	5 162,10
39	Зеленодольский	ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница", поликлиника №1, г. Зеленодольск	14 000,28
40	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", поликлиника, с.Б.Кайбицы	466,80
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
41	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", женская консультация, с.Б.Кайбицы	911,69
42	Кукморский	ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница", поликлиника, г. Кукмор	12 445,56
43	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", здание поликлиники медико-санитарной части, г.Лениногорск	20 170,28
44	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", гериатрическое отделение, с. Шугурово	51 015,00
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
45	Мамадышский	ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница", поликлиника, г.Мамадыш	23 181,95
46	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", поликлиника, с.Тюлячи	45 430,83
47	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", детская поликлиника, с.Тюлячи	6 761,63
48	Зеленодольский	Строительство Многопрофильная поликлиника ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" с.Осиново	227 639,86
49	Пестречинский	Строительство Врачебная амбулатория ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница"	204 538,87
ИТОГО:			1 325 500,43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО					
1	Арский	Строительство сельского дома культуры в с.Штырь	12 323,73	0,00	0,00
2	Бавлинский	Строительство сельского дома культуры в д.Уба	12 323,73	0,00	0,00
3	Дрожжановский	Строительство многофункционального центра в д. Старая Задоровка	12 323,73	0,00	0,00
4	Зеленодольский	Строительство сельского дома культуры в п.Октябрьский	34 520,39	0,00	0,00
5	Мамадышский	Строительство культурно-досугового центра с.Катмыш	34 520,39	0,00	0,00
ИТОГО:			576 334,39	3,03	3,03

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ					
6	Нижнекамский	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска	351 204,75	2,00	2,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ					
7	Арский	Здание муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Арская детская школа искусств»	19 919,00	0,00	0,00
8	Лаишевский	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина»	29 548,66	0,00	0,00
9	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Байлянгар	34 825,00	8,00	8,00
10	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Ядыгерь	34 825,00	22,00	22,00
ИТОГО:			576 334,39	3,03	3,03

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Верхнеуслонский	Благоустройство территории и строительство инфраструктуры для объекта «Тубетей Тауэр»	243 113,10

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
ГП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» <i>16 объектов</i>	ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	7 (комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку)	95 487,3
	ФП «Современный облик сельских территорий»	3 (строительство 3 школ)	478 372,35
		6 (капитальный ремонт объектов комплексного обустройства)	176 261,7
ГП «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ» <i>4 объекта</i>	ФП «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности»	4 объекта восстановления воинских захоронений	12 397,00
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» <i>1 объект</i>	ФП «Сохранение культурного и исторического наследия»	1 (Строительство Русского драматического театра "Мастеровые")	897 268,50
ИТОГО		104	5 825 096,9

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» <i>66 объектов</i>	Капитальный ремонт школ	66 объектов капитального ремонта школ	3 798 036,67
ГП «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» <i>15 объектов</i>	ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	15 объектов (1- Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Камское Устье РТ и 14 объектов Кап.ремонт гидротехнических сооружений)	233 940,10
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» <i>2 объект</i>	ФП «Бизнес-спринт»	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	133 333,33
ИТОГО		104	5 825 096,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Мензелинский	МБОУ «Николаевская ООШ» с.Николаевка	51 434,87	0,00	0,00
2	Нурлатский	МАОУ «Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза М.Е.Сергеева» г.Нурлат	25 577,47	0,00	0,00
3	Рыбно-Слободский	МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия № 1» пгт.Рыбная Слобода	39 041,81	0,00	0,00
4	Спасский	МБОУ «Болгарская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Болгар	69 685,32	0,00	0,00
5	Спасский	МБОУ «Трехозерская СОШ» с.Три Озера	81 461,31	0,00	0,00
6	Лаишевский	МБОУ «Кирбинская СОШ» с.Кирби	71 927,22	1,00	1,00
ИТОГО 32 объекта из 66:			3 789 023,78	3,70	3,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
7	Новошешминский	МБОУ «Архангельская ООШ» с.Слобода Архангельская	52 175,64	1,00	1,00
8	Нурлатский	МАОУ «СОШ № 1» г.Нурлат	65 086,93	2,00	2,00
9	Агрызский	МБОУ «СОШ № 2» г.Агрыз	69 648,17	2,00	2,00
10	Алексеевский	МБОУ «Ялкынская основная общеобразовательная школа» д.Ялкын	77 001,06	2,00	2,00
11	Алексеевский	МБОУ «Реченская основная общеобразовательная школа», с.Речное	63 790,61	2,00	2,00
12	Муслюмовский	МБОУ «Салауз-Муханская ООШ» д.Салауз-Мухан	28 832,12	2,00	2,00
ИТОГО 32 объекта из 66:			3 789 023,78	3,70	3,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
13	Нурлатский	МБОУ «Якушкинская СОШ» с.Якушкино	64 512,82	2,00	2,00
14	Нурлатский	МБОУ «Мамыковская СОШ» с.Мамыково	54 419,70	2,00	2,00
15	Новошешминский	МБОУ «Екатерининская ООШ» с.Слобода Екатерининская	38 112,98	3,00	3,00
16	Кукморский	МБОУ «Нырьянская средняя школа» с.Нырья	109 762,60	4,00	4,00
17	Мензелинский	МБОУ «Верхнетакерменская ООШ имени Габделхая Сабитова» с.Верхний Такермен	33 215,26	4,00	4,00
18	Новошешминский	МБОУ «Утяшкинская ООШ» с.Татарское Утяшкино	60 378,59	4,00	4,00
ИТОГО 32 объекта из 66:			3 789 023,78	3,70	3,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
19	Мамадышский	МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» с.Дюсьметьево	56 789,46	5,00	5,00
20	Мамадышский	МБОУ «Кемеш-Кульская ООШ» с.Кемеш- Куль	56 789,46	5,00	5,00
21	Мамадышский	МБОУ «Кляушская СОШ» с.Кляуш	65 917,42	5,00	5,00
22	Черемшанский	МБОУ «Черемшанский лицей» с.Черемшан	82 539,23	6,00	6,00
23	Агрызский	МБОУ «СОШ № 3 имени Тази Гиззата» г.Агрыз	22 092,81	7,00	7,00
24	Нурлатский	МБОУ «Тимерликовская ООШ имени Героя Советского Союза Козлова Н.А.с.Чувашский Тимерлек	42 532,60	7,00	7,00
25	Агрызский	МБОУ «Кучуковская СОШ» с.Нижнее Кучуково	32 674,47	8,00	8,00
ИТОГО 32 объекта из 66:			3 789 023,78	3,70	3,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ




№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
26	Кукморский	МБОУ «Кукморская средняя школа № 3» г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.40	60 817,05	9,00	9,00
27	Ютазинский	МБОУ «Уруссинская СОШ № 3» пгт.Уруссу	67 695,65	10,00	10,00
28	Ютазинский	МБОУ «Каразерикская СОШ им.Г.Вильданова» с.Старый Каразерик	59 944,11	10,00	10,00
29	Ютазинский	МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» с.Старые Уруссу	47 592,01	10,00	10,00
30	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» пгт.Уруссу	48 401,44	11,00	11,00
31	Черемшанский	МБОУ «Шешминская ООШ» с.Шешминская Крепость	43 899,73	12,00	12,00
32	Ютазинский	МБОУ «Дым-Тамакская ООШ» с.Дым-Тамак	49 813,85	12,00	12,00
ИТОГО 32 объекта из 66:			3 789 023,78	3,70	3,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	г. Набережные Челны	Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г.Набережные Челны	1 794 536,50	58,00

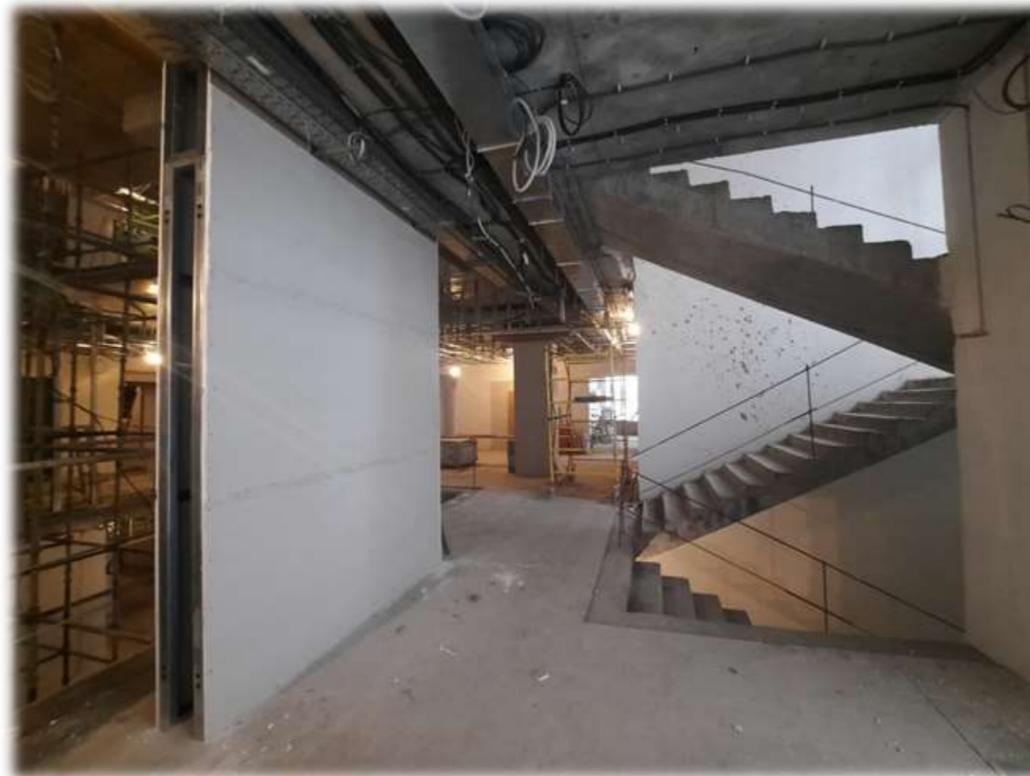

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Кукморский	Строительство начальной школы на 15 мест в н.п.Балыклы	41 843,07	7,00	7,00
2	Мамадышский	Строительство школы-сада на 240/120 мест г.Мамадыш	223 909,14	5,00	5,00
3	Сабинский	Строительство школы на 500 мест в н.п.Богатые Сабы	211 347,83	18,63	18,63
4	Кукморский	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Олуяз	46 561,45	8,00	8,00
ИТОГО:			523 661,48	10,93	10,93

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Кукморский	Строительство водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз	13 404,69
2	Кукморский	Строительство сетей водоснабжения в н.п.Балыклы	39 673,21
3	Лаишевский	Строительство системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	17 295,19
4	Лаишевский	Строительство системы газоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	45 913,21
5	Мамадышский	Строительство линии канализации и теплотрассы по ул.Советской	13 180,00
ИТОГО:			129 466,30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» **КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ**



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ
1	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Новотроицкое" на 636 домов (газоснабжение)	363,854
2	Кукморский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 127 жилых домов в д.Балыклы) (автомобильная дорога)	12 283,95
3	Лаишевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 268 жилых домов в н.п. Песчаные Ковали (автомобильная дорога)	18 425,93
4	Пестречинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 150 жилых домов в с.Конь (дорога)	5 830,33
5	Сабинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 25 жилых домов в н.п.Богатые Сабы(благоустройство)	12 283,95
6	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Новотроицкое жилого микрорайона «Энергия» на 636 домов (благоустройство)	10 393,45
7	Черемшанский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 256 домов в микрорайоне «Южный с.Черемшан (автомобильная дорога)	33 901,74
ИТОГО:			93 483,20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
1	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Садилово, Высокогорский МР	7 659,73
2	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Татарский Дюм-Дюм, Елабужский МР	7 659,73
3	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз, Елабужский МР	7 659,73
4	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Бузаево, Зеленодольский МР	7 659,73
5	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Большие Яки, Зеленодольский МР	7 659,73
6	Капитальный ремонт ГТС в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш, Мамадышский МР	7 659,73
7	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Арташка, Мамадышский МР	7 659,73
ИТОГО		107 236,32

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
8	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Сартык, Мамадышский МР	7 659,73
9	Капитальный ремонт ГТС пруда у п.Ушня, Пестречинский МР	7 659,73
10	Капитальный ремонт ГТС пруда на правом притоке р.Ушня у д.Салкын Чишма, Пестречинский МР	7 659,73
11	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Мичанбаш, Сабинский МР	7 659,73
12	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.Девичья Поляна, Черемшанский МР	7 659,73
13	Капитальный ремонт ГТС пруда № 2 в с.Новое Ильмово, Черемшанский МР	7 659,73
14	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Каргали, Чистопольский МР	7 659,73
ИТОГО		107 236,32

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Камско- Устьинский	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища с .Камское –Устье	126 164,90

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Верхнеуслонский	Восстановление и установка мемориального знака на могиле летчика Шпигуна Д.А., погибшего 11.02.1944 при перегоне военного самолета из г.Свердловска на фронт с.Нижний Услон	140,86
2	Верхнеуслонский	Восстановление и установка мемориального знака на братской могиле летчиков Евсеева В.П., Завьялова А.И., Сурова А.А. – погибших 16.02.1942 при перелете из г.Чистополя на фронт, д.Елизаветино	140,86
3	Верхнеуслонский	Восстановление могилы младшего сержанта Труханова В.С., погибшего 24.08.1942, с.Майдан	72,04
4	г.Казань	Восстановление воинских захоронений на кладбище «Арское»	12 043,24
ИТОГО:			12 397,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	г. Казань	Поставка спортивного оборудования в школу г. Казани № 49	33 333,00
2	Зеленодольский	Поставка спортивного оборудования в школу Зеленодольского района с. Большие ключи	100 000,00
ИТОГО			133 333,00

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

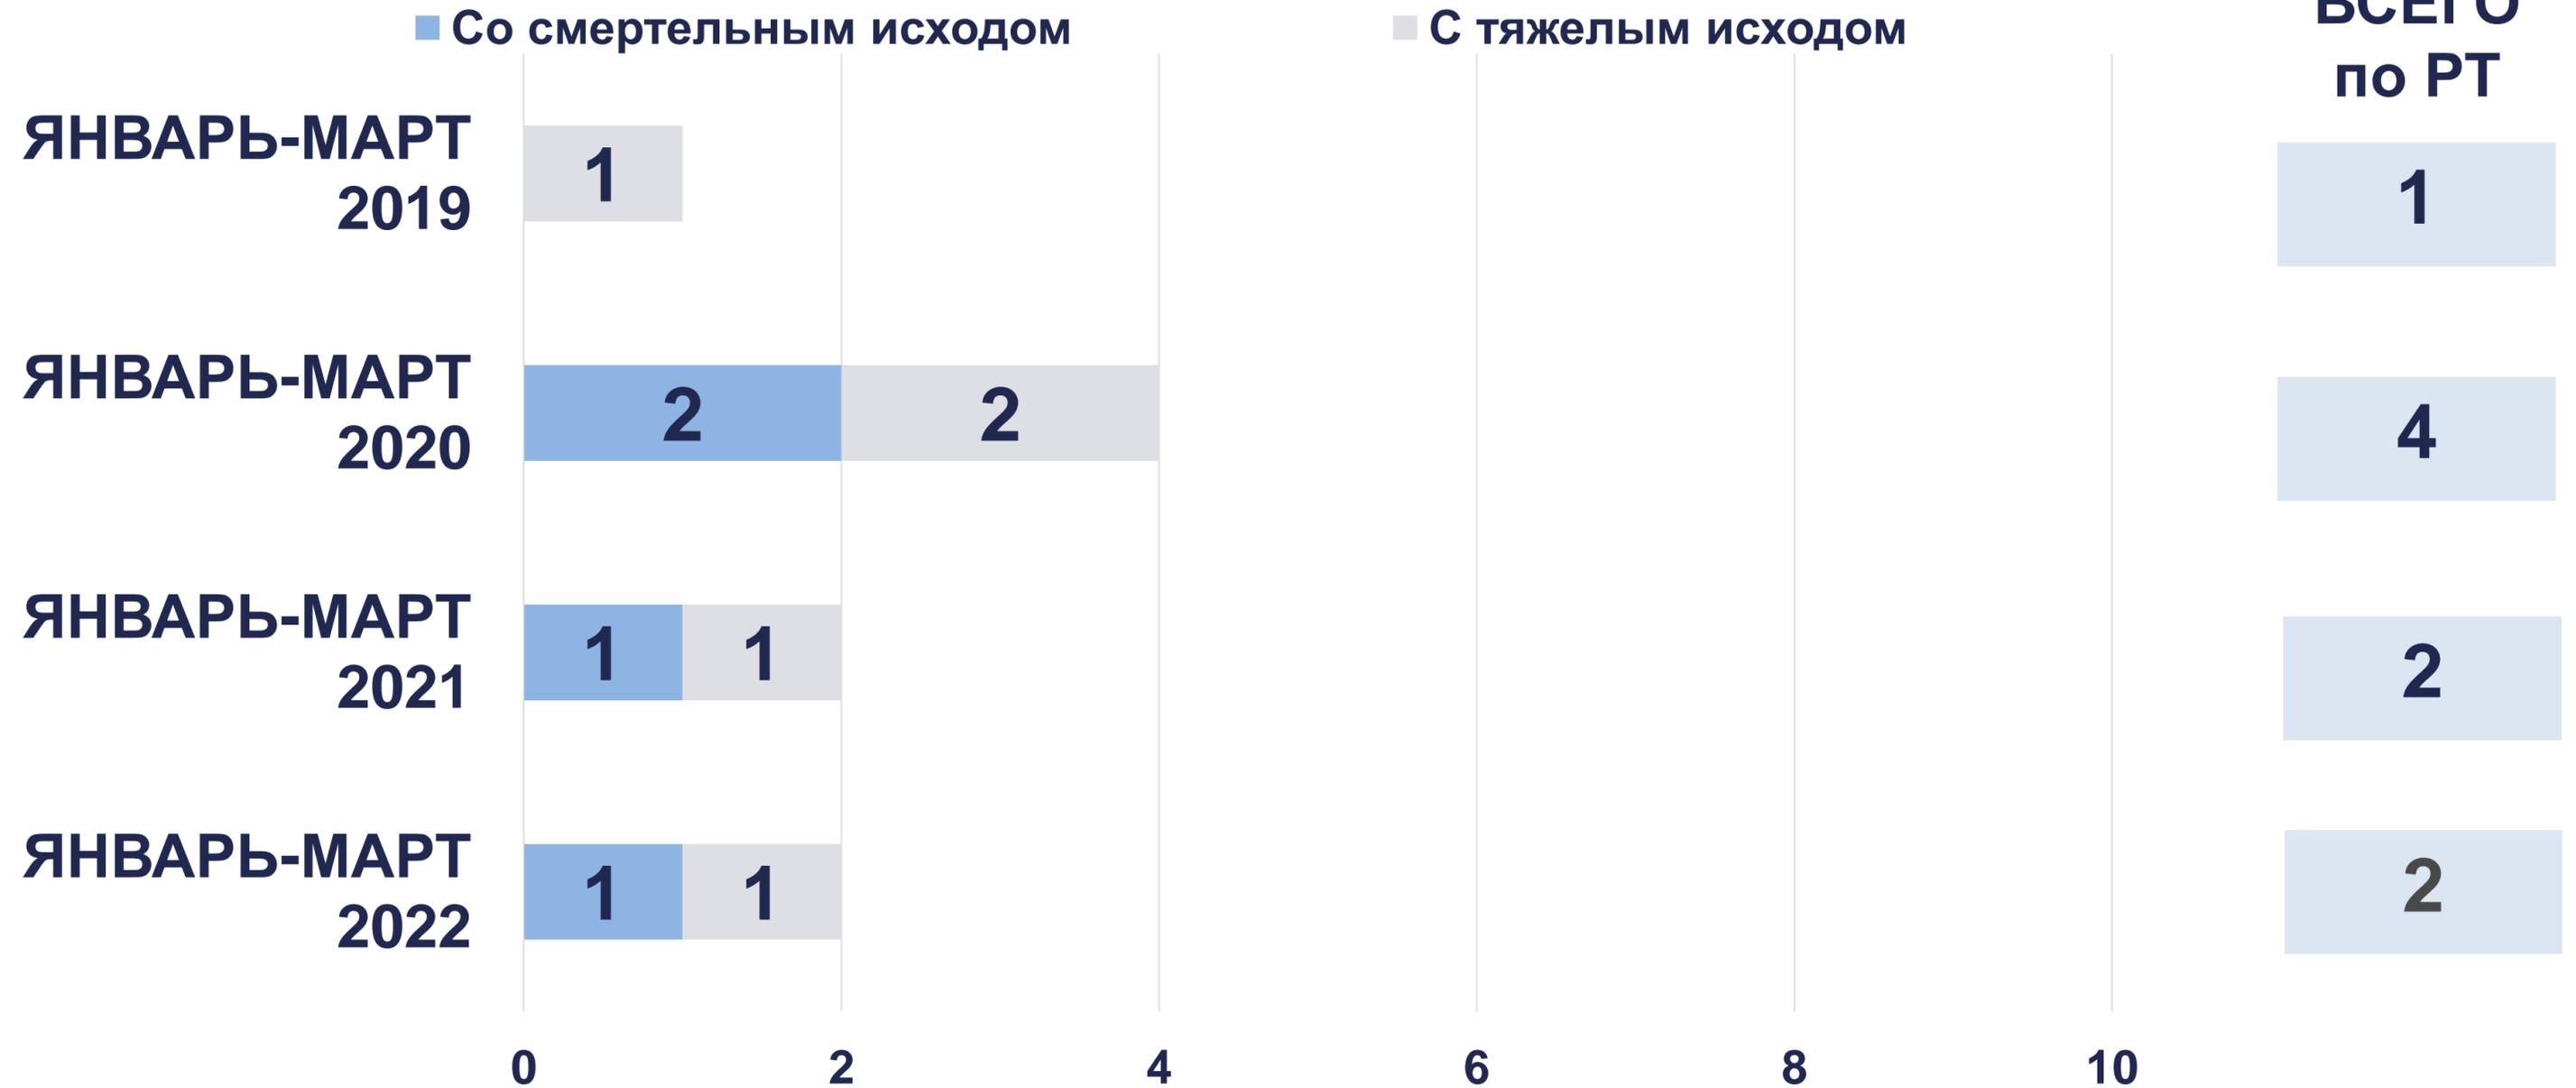

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	207	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	6	330,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	4	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	-	-
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	-	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	210
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	100
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	107
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	46
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	20
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	17
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	24

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	307
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	162
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	153
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	44

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	77	67	58	87
2	г.Набережные Челны	20	0	0	-
3	Агрызский	-	-	-	-
4	Азнакаевский	6	6	6	100
5	Аксубаевский	2	1	1	100
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	16	2	2	100
8	Алькеевский	2	2	2	100
9	Альметьевский	17	14	14	100
10	Апастовский	7	6	6	100
11	Арский	5	0	0	-
12	Атнинский	2	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	-	-	-	-
15	Бугульминский	5	12	12	100
16	Буинский	5	2	2	100
ВСЕГО по РТ		307	162	153	94

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	9	4	4	100
18	Высокогорский	2	0	0	-
19	Дрожжановский	6	2	2	100
20	Елабужский	6	4	4	100
21	Заинский	-	-	-	-
22	Зеленодольский	14	4	4	100
23	Кайбицкий	5	3	3	100
24	Камско-Устьинский	4	0	0	-
25	Кукморский	3	0	0	-
26	Лайшевский	2	0	0	-
27	Лениногорский	2	0	0	-
28	Мамадышский	-	-	-	-
29	Менделеевский	-	-	-	-
30	Мензелинский	2	0	0	-
31	Муслюмовский	2	0	0	-
ВСЕГО по РТ		307	162	153	94

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	23	10	10	100
33	Новошешминский	3	0	0	-
34	Нурлатский	2	0	0	-
35	Пестречинский	4	3	3	100
36	Рыбно-Слободский	1	0	0	-
37	Сабинский	9	0	0	-
38	Сармановский	6	18	18	100
39	Спасский	1	0	0	-
40	Тетюшский	15	0	0	-
41	Тукаевский	8	0	0	-
42	Тюлячинский	-	-	-	-
43	Черемшанский	6	0	0	-
44	Чистопольский	5	2	2	100
45	Ютазинский	-	-	-	-
ВСЕГО по РТ		307	162	153	94

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ НА 2023-2024 Г.Г.



№	Наименование программы	Ответственное министерство	Наличие перечня	Примечание
1	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	Минобр РТ	-	Перечень будет представлен по мере готовности
2	Капитальный ремонт объектов образования		-	Перечень будет представлен по мере готовности
3	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей		-	Перечень будет представлен по мере готовности
4	Капитальный ремонт пищеблоков		-	Перечень будет представлен по мере готовности
4	Капитальный ремонт и строительство объектов, подведомственных Управлению Росгвардии	Управление Росгвардии РТ	-	Перечень будет представлен по мере готовности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
