




МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

23 апреля 2022 г.

Открою сегодняшний доклад статистикой жилищного строительства.

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

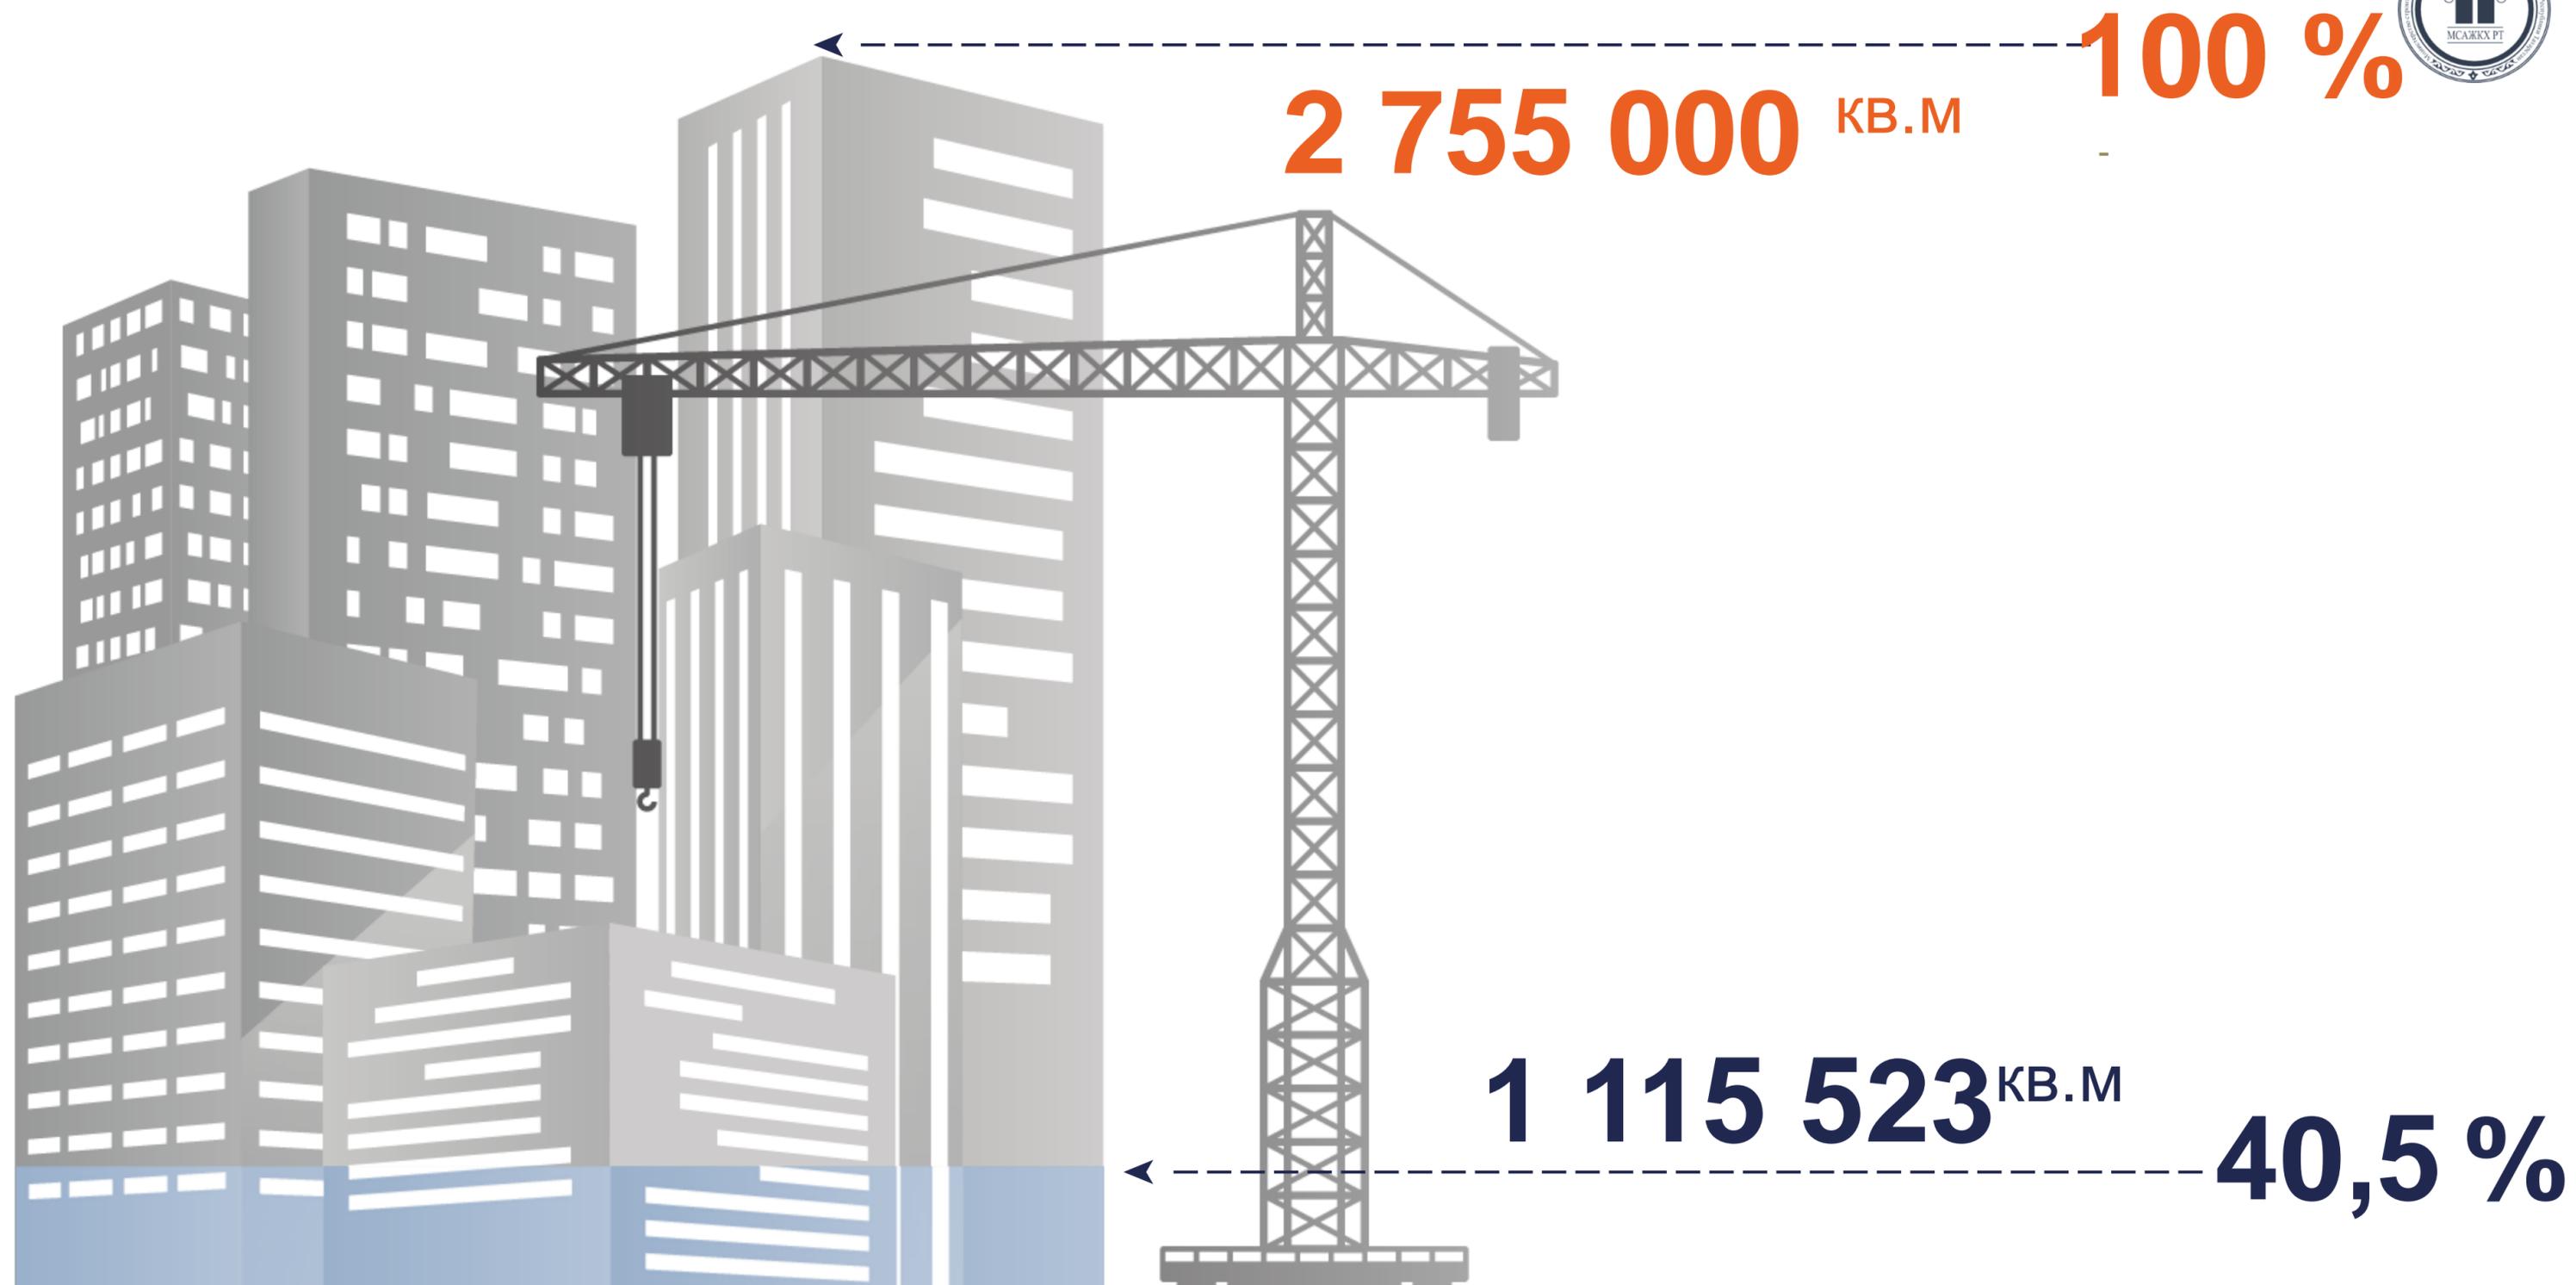

Выполнение годового плана на сегодня составляет 40,5%. Подрядчиками сдано 1 116 тысяч квадратных метров.

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Тетюшский	10 000	542	5,4	9 458
2	Апастовский	8 000	690	8,6	7 310
3	Бугульминский	35 000	3 442	9,8	31 558
4	Аксубаевский	8 000	960	12,0	7 040
5	Дрожжановский	7 000	957	13,7	6 043
6	Спасский	5 000	721	14,4	4 279
7	Кайбицкий	5 000	753	15,1	4 247
8	Агрызский	18 000	2 977	16,5	15 023
9	Буинский	16 000	2 925	18,3	13 075
10	Заинский	22 000	4 093	18,6	17 907
11	Р-Слободский	15 000	2 803	18,7	12 197
12	Бавлинский	15 000	2 955	19,7	12 045
13	Актанышский	15 000	3 083	20,6	11 917
14	Ютазинский	13 000	2 829	21,8	10 171
15	Новошешминский	4 000	885	22,1	3 115
ВСЕГО по РТ		2 755 000	1 115 523	40,5	1 639 477

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	К-Устьинский	5 000	1 227	24,5	3 773
17	Азнакаевский	15 000	4 039	26,9	10 961
18	Елабужский	60 000	16 290	27,2	43 710
19	Алексеевский	16 000	4 524	28,3	11 476
20	Альметьевский	120 000	34 343	28,6	85 657
21	Балтасинский	15 000	4 344	29,0	10 656
22	г.Наб.Челны	330 000	96 472	29,2	233 528
23	г.Казань	956 000	287 380	30,1	668 620
24	Мамадышский	20 000	6 317	31,6	13 683
25	Кукморский	29 000	9 354	32,3	19 646
26	Алькеевский	7 000	2 286	32,7	4 714
27	Нурлатский	17 000	5 932	34,9	11 068
28	Нижнекамский	70 000	26 113	37,3	43 887
29	Сабинский	22 000	8 694	39,5	13 306
30	В-Услонский	35 000	14 931	42,7	20 069
ВСЕГО по РТ		2 755 000	1 115 523	40,5	1 639 477


ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Черемшанский	6 000	2 632	43,9	3 368
32	Арский	25 000	11 292	45,2	13 708
33	Мензелинский	14 000	6 969	49,8	7 031
34	Сармановский	10 000	5 115	51,2	4 885
35	Муслюмовский	10 000	5 358	53,6	4 642
36	Менделеевский	13 000	7 010	53,9	5 990
37	Чистопольский	20 000	11 779	58,9	8 221
38	Атнинский	4 000	2 415	60,4	1 585
39	Зеленодольский	100 000	62 561	62,6	37 439
40	Пестречинский	205 000	131 981	64,4	73 019
41	Высокогорский	120 000	83 090	69,2	36 910
42	Тукаевский	115 000	80 940	70,4	34 060
43	Лаишевский	180 000	132 913	73,8	47 087
44	Тюлячинский	5 000	4 261	85,2	739
45	Лениногорский	15 000	14 346	95,6	654
ВСЕГО по РТ		2 755 000	1 115 523	40,5	1 639 477

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



150 120 КВ.М

56 ДОМОВ

100 %

99 393 КВ.М

22 дома

66,2 %

По-прежнему самая высокая динамика в соципотечном строительстве. Годовой план программы составляет 150 тыс. квадратных метров, из которых сдано практически 100 тыс. кв. метров. В относительных показателях это 66% от плана (22 дома).

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	56	22	4	34	14	17	3
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	2 752	1 884	329	868	792	50	26
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	150,12	99,4	16,3	50,7	46,5	2,8	1,4

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1 681,3 ТЫС.КВ.М

100 %


12 454 дома

749,8 ТЫС.КВ.М

44,6 %

5 554 дома

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



923 584 КВ.М

148 ДОМОВ

100 %

266 372 КВ.М

55 ДОМОВ

28,8 %

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ		
			ВЫСОКАЯ (70-100%)	СРЕДНЯЯ (30-70%)	НИЗКАЯ (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Алексеевский	2	-	2	-
3	Альметьевский	3	1	2	-
4	Буинский	6	2	3	1
5	Верхнеуслонский	8	3	4	1
6	Высокогорский	13	-	7	6
7	Елабужский	3	1	-	2
8	Зеленодольский	2	1	1	-
9	Кукморский	1	-	-	1
10	Лениногорский	1	-	-	1
11	Нижнекамский	4	-	-	4
12	Нурлатский	1	1	-	-
13	Пестречинский	1	1	-	-
14	Ютазинский	1	-	-	1
15	г.Набережные Челны	21	18	3	-
16	г.Казань	25	11	10	4
ВСЕГО ПО РТ		93	40	32	21

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ НА 2022 ГОД



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	600	959,64	56,08	903,56
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	22	229,18	-	229,18
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	50	67,29	17,79	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	5	23,64	23,64	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	18,29	18,29	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	2,91	2,91	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	2,44	2,44	-
ИТОГО:	677	1 279,75	97,51	1 182,24

ДЕТИ - СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	Выставлено на выбор
1	г.Казань	48
2	Лаишевский	72
3	Нурлатский	6
4	Сабинский	6
5	Чистопольский	37
6	г.Набережные Челны	10
ИТОГО ПО РТ:		179

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	ОФОРМЛЕНО СЕРТИФИКАТОВ	РЕАЛИЗОВАНО СЕРТИФИКАТОВ
1	Арский	1	1
2	Тукаевский	1	1
3	Аксубаевский	2	0
4	Альметьевский	2	0
5	Балтасинский	4	0
6	Высокогорский	1	0
7	Елабужский	1	0
8	Кукморский	1	0
9	Лаишевский	1	0
10	Лениногорский	2	0
11	Мамадышский	1	0
12	Мензелинский	2	0
13	Рыбно-Слободский	2	0
14	г.Казань	3	0
15	г.Набережные Челны	1	0
ИТОГО ПО РТ:		25	2

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№	МО РТ	Кол-во семей
1	Азнакаевский	2
2	Алексеевский	1
3	Апастовский	1
4	Арский	2
5	Бавлинский	3
6	Балтасинский	2
7	Бугульминский	1
8	Буинский	1
9	Высокогорский	1
10	Дрожжановский	1
11	Елабужский	1
12	Зеленодольский	3

№	МО РТ	Кол-во семей
13	Мамадышский	1
14	Нижнекамский	3
15	Нурлатский	1
16	Пестречинский	1
17	Сабинский	2
18	Черемшанский	1
19	Чистопольский	1
20	Ютазинский	1
21	г.Набережные Челны	6
22	г.Казань	14
ИТОГО ПО РТ:		50

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ **ГРАЖДАН**



№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	3	2
1.1	Азнакаевский	1	0
1.2	Кукморский	1	1
1.3	Пестречинский	1	1
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	0
2.1	г.Казань	1	0
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	0
3.1	г.Казань	1	0
ВСЕГО ПО РТ		5	2

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛЯНОЙ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Мензелинский муниципальный район, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля	75 905,61	2,00	2,00
2	Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова	75 905,61	2,00	2,00
3	Нурлатский муниципальный район, с.Средняя Камышла, ул.А.Волкова	75 905,61	4,00	3,00
4	Высокогорский муниципальный район, с.Высокая Гора, ул.Стадионная	75 905,61	5,00	4,00
5	Буинский муниципальный район, г.Буинск, ул.Школьная	75 905,61	5,00	4,00
6	Мамадышский муниципальный район, г.Мамадыш, ул.Давыдова	75 905,61	6,00	4,00
ИТОГО		455 433,69	4,00	3,17

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И ЛЫЖНОЙ БАЗЫ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ
1	УСП по ул.Хади Такташ, д.122 (вар.5), г. Казань	3 753,24
2	УСП по ул.Оренбургский тракт, д.132 (вар.4), г. Казань	7 418,71
3	УСП по ул.Беломорская, д.18а (вар.5) , г. Казань	3 753,24
4	УСП в с.Карашай-Саклово, ул. Ленина (вар.6), Сармановский район	1 386,29
5	Блочно- модульная лыжная база с мебелью, инвентарем и оборудованием, пгт.Камское Устье, ул.Сары Садыковой	11 879,22
ИТОГО		28 190,70

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Агрызский МР, Азевский	5 006,48	0,00	-
2	Апастовский МР, Тутаевский	5 006,48	0,00	-
3	Буинский МР, Старобурундуковский	6 732,91	0,00	-
4	Дрожжановский МР, Старозадоровский	5 006,48	0,00	-
5	Елабужский МР, Больше-Качкинский	5 006,48	0,00	-
6	Менделеевский МР, Татарско-Ахтиялский	6 732,91	0,00	-
7	Тетюшский МР, Малоатрясский	5 006,48	0,00	-
8	Уруссинский МР, Байларовский	5 006,48	0,00	-
9	Зеленодольский МР, Уразлинский	6 732,91	15,00	15,00
10	Аксубаевский МР, Щербенский	6 732,91	15,00	15,00
11	Алексеевский МР, Горский	6 732,91	15,00	15,00
12	Алькеевский МР, Татарско-Бурнаевский	6 732,91	15,00	15,00
ИТОГО		142 771,87	10,43	7,83

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
13	Атнинский МР, Старо-Узюмский	6 732,91	15,00	15,00
14	Высокогорский МР, Альдермышский	6 732,91	15,00	0,00
15	Заинский МР, Гулькинский	6 732,91	15,00	15,00
16	Кукморский МР, Княбашский	6 732,91	15,00	0,00
17	Лаишевский МР, Пальцовский	5 006,48	15,00	15,00
18	Пестречинский МР, Ковалинский	6 732,91	15,00	15,00
19	Рыбно-Слободский МР, Анатышский	6 732,91	15,00	15,00
20	Сабинский МР, Новомичанский	6 732,91	15,00	0,00
21	Сармановский МР, Кульметьевский	6 732,91	15,00	15,00
22	Спасский МР, Тукаевский	6 732,91	15,00	15,00
23	Черемшанский МР, Нижне-Кармалкинский	6 732,91	15,00	15,00
ИТОГО		142 771,87	10,43	7,83

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	ЛИМИТ, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей пионерлагерь «Чулпан», Атнинский район	14 996,09	0,00	0,00
2	Строительство зданий и сооружений автономного детского оздоровительно-досугового учреждения «Ласточка» Бавлинский район	115 031,95	1,00	0,00
3	Строительство зданий и сооружений МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (2 этап), г.Казань	379 002,56	17,00	4,00
4	Строительство зданий и сооружений ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.» для размещения муниципального учреждения «Оздоровительный лагерь «Солнышко», Сабинский район	26 632,09	20,00	2,00
ИТОГО		545 939,67	13,07	1,50

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

ГБОУ «ИКШУРМИНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ БАЙКИЕВА К.С.», САБИНСКИЙ РАЙОН



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Атнинский, Узюмское СП, с.Таш-Чишма, ул.Ш.Усманова, д.16	7 237,80	1,00	0,00
2	Новошешминский, Петропавловское СП, с.Слобода Петропавловская, ул.Ленина	7 237,80	6,00	6,00
3	Верхнеуслонский, Верхнеуслонское СП, с.Верхний Услон, ул.Чехова	7 237,80	7,00	4,00
4	Сармановский, Новоимянское СП, с.Кутемели, ул.Гагарина, д.23	7 237,80	10,00	5,00
5	Менделеевский, Тойгузинское СП, д.Тойгузино, пер.Школьный	7 237,80	15,00	0,00
6	Нурлатский, Якушкинское СП, с.Якушкино, ул.Ленина	7 237,80	16,00	6,00
7	Нижнекамский, Нижнеуратьминское СП, с.Нижняя Уратьма	7 237,80	17,00	14,00
8	Алексеевский, Ялкынское СП, д.Ялкын, ул.Зеленая, д.35	7 237,80	23,00	16,00
9	Елабужский, Костенеевское СП, с.Костенеево, ул.Центральная	7 237,80	45,00	3,00
ИТОГО		65 140,20	15,56	6,00

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Административное здание с ИВС межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории	149 250,00	16,00	2,00



СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР,%	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	84 328,70	32,00	4,00



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.	
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» <i>37 объектов</i>	1. ФП «Жилье»	1 Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	
		1 Реконструкция очистных сооружений (переходящий объект с 2021 года)	140 804,81	
		1 Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе «Замелекесье» (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	
	2. ФП «Формирование комфортной городской среды»	27 (парки, скверы)	1 518 622,39	
		6 (конкурс малых городов 2022 г.)	395 062,50	
		3. ФП «Чистая вода»	1 (строительство системы водоснабж..)	279 081,36
		4. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	12,517 тыс. кв. метров	82 895,27
НП «ЭКОЛОГИЯ» <i>3 объекта</i>	5. ФП «Оздоровление волги»	1 Реконструкция БОСК г.Казань	1 855 062,22	
		1 Рекультивация иловых полей	3 300 814,69	
	6. ФП «Чистая страна»	1 Рекультивация Самосыровского полигона	200 000,00	
НП «ЗДРАВООХРА-НЕНИЕ» <i>49 объектов</i>	7. ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения»	49 (строительство и реконструкция: АПУ, ВОП, ВА, ФАП ,капитальный ремонт поликлиник и врачебных амбулаторий)	1 377 248,06	
ИТОГО		12	10 591 299,06	

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
НП «КУЛЬТУРА» <i>11 объектов</i>	8. ФП «Культурная среда»	2 (капитальный ремонт дома культуры)	70 000,00
		2 (капитальный ремонт детских музыкальных школ и музеев)	49 616,14
		1 (реконструкция театра юного зрителя)	352 969,60
		5 (строительство сельских домов культуры)	114 926,73
		1 (Реконструкция районного дома культуры)	405 550,00
НП «ДЕМОГРАФИЯ» <i>1 объект</i>	9. ФП «Содействие занятости»	1 (строительство детских садов)	71 986,30
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» <i>3 объекта</i>	10. ФП «Современная школа»	1 (строительство школы)	63 016,00
	11. ФП «Успех каждого ребенка»	2 (капремонт спорт.залов)	2 914,20
НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» <i>1 объект</i>	12. ФП «Развитие туристической инфраструктуры»	Благоустройство территории вблизи объекта "Тюбетей тауер"	243 113,10
ИТОГО	12	105	10 591 299,06

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	г. Набережные Челны	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе Замелекесье (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	0,00
2	г.Казань	Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	1,00
3	Пестречинский	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево", с увеличением производительности от 2500 куб.м/сут до 4000 куб.м/сут	140 804,81	Всего – 58,99 (За 2022г. – 29,99)
ИТОГО:			208 420,49	10,33

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ

27 объектов
на **1 436,83** млрд рублей

6 объектов
на **374,36** млн рублей



***32** объекта на **847,34** млн рублей
по республиканской программе

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ
1	Агрызский	Благоустройство улицы Карла Маркса, г.Агрыз	49 750,00
2	Алексеевский	Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", с.Билярск	55 968,75
3	Арский	ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул.Коммуны, г.Арск	69 650,00
4	Бавлинский	Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», г.Бавлы	69 650,00
5	Кукморский	Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина, г.Кукмор	49 750,00
6	Чистопольский	Городская набережная реки Кама "Наречье", г.Чистополь	79 600,00
ИТОГО:			374 368,75

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Лениногорский	Парк «Мэхэббэт», 2 очередь	43 410,16	1,00	1,00
2	Пестречинский	Детский городок, 2 очередь	26 653,80	1,00	1,00
3	Нижнекамский	Школьный бульвар, 2 очередь	19 900,00	1,00	1,00
4	г.Казань	Парк у жилого комплекса «Салават Купере», 2 очередь	498 036,44	20,00	3,00
ИТОГО из 27:			1 436 830,733	7,00	0,22

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

ПАРК У ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «САЛАВАТ КУПЕРЕ», 2 ОЧЕРЕДЬ



РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ОБУСТРОЙСТВУ В 2023 г.



НА 22.04.2022 г.

№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ, ЧЕЛ.	ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАВШИХ, ЧЕЛ.	% ПРОГОЛОСОВАВШИХ
1	Тюлячинский	11 569	842	7,28
2	Чистопольский	62 617	4 315	6,89
3	Сармановский	28 421	1 944	6,84
4	Кайбицкий	11 054	645	5,83
5	Азнакаевский	48 523	2801	5,77
6	Арский	41 803	2 349	5,62
7	Алексеевский	20 438	1 126	5,51
8	Менделеевский	24 513	1 095	4,47
9	Ютазинский	16 492	702	4,26
10	Тетюшский	18 273	754	4,13
11	Рыбно-Слободский	21 296	828	3,89
12	Высокогорский	43 082	1 483	3,44
13	Тукаевский	36 449	1 233	3,38
14	Апастовский	16 635	540	3,25
15	Балтасинский	27 238	854	3,14
ИТОГО		3 203 516	68 615	

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ОБУСТРОЙСТВУ В 2023 г.



НА 22.04.2022 г.

№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ, ЧЕЛ.	ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАВШИХ, ЧЕЛ.	% ПРОГОЛОСОВАВШИХ
16	Сабинский	24 775	731	2,95
17	Нурлатский	45 891	1 310	2,85
18	Пестречинский	40 112	1 140	2,84
19	Альметьевский	168 398	4 713	2,80
20	Камско-Устьинский	12 557	343	2,73
21	Верхнеуслонский	13 721	370	2,70
22	Муслюмовский	16 023	406	2,53
23	Аксубаевский	23 268	580	2,49
24	Алькеевский	15 429	379	2,46
25	Зеленодольский	138 874	3 175	2,29
26	Агрызский	28 532	641	2,25
27	Спасский	15 691	352	2,24
28	г. Набережный Челны	432 043	9 126	2,11
29	Заинский	44 509	922	2,07
30	Дрожжановский	18 620	331	1,78
ИТОГО		3 203 516	68 615	

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ОБУСТРОЙСТВУ В 2023 г.



НА 22.04.2022 г.

№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ, ЧЕЛ.	ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАВШИХ, ЧЕЛ.	% ПРОГОЛОСОВАВШИХ
31	Лаишевский	41 609	731	1,76
32	Мензелинский	22 911	399	1,74
33	Новошешминский	10 337	177	1,71
34	Актанышский	24 105	394	1,63
35	Бавлинский	28 211	453	1,61
36	г. Казань	1 021 141	15 518	1,52
37	Лениногорский	67 287	919	1,37
38	Черемшанский	15 596	206	1,32
39	Буинский	34 646	366	1,06
40	Нижнекамский	226 636	2 048	0,90
41	Елабужский	72 072	591	0,82
42	Кукморский	41 427	260	0,63
43	Бугульминский	84 940	416	0,49
44	Мамадышский	34 854	95	0,27
45	Атнинский	10 898	12	0,11
ИТОГО		3 203 516	68 615	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом, Нурлатский район	279 081,36	0,5	0,5



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»



Этап Программы	Год реализации	Человек	Кол-во помещений, ед.	Общая площадь, кв.м.
Этап 2021 года (срок реализации 2021-2022гг)	Всего	294	100	3 772,19
	2021 год (факт)	216	79	2 945,36
	2022 год (план)	78	21	826,83
Этап 2022 года (срок реализации 2022-2023гг)	Всего	988	403	12 517,71
	2022 год (план)	763	303	8 800,16
	2022 год (факт)	384	172	4 501,22
	2023 год (план)	225	100	3717,55
Всего план на 2022 год		841	324	9 626,99

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЗУ	ЗУ ПЕРЕДАНЫ	ЗУ НЕ ПЕРЕДАНЫ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Зеленодольский	172	150	22	1
2	Кукморский	52	48	4	0
ВСЕГО ПО РТ:		1 031	1005	26	1

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	МКД не снесены	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский		6	9	7	22
2	Кукморский	2			2	4
ВСЕГО ПО РТ:		2	6	9	9	26

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОС г.Казани	1 855 062,22	30,91	0,10



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Рекультивация иловых полей, г. Казань	3 300 814,69	8,35	0,35



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Рекультивация Самосыровского полигона г. Казани	872 158,72	36,42	0,47



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство общеобразовательной организации на 100 мест в с.Шильнебаш, Тукаевский район	63 016,00	6,00	1,00



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	МБОУ «Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа», Бавлинский район	1 268,69	85,00	40,00
2	МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	1 630,94	100,00	0,00
ИТОГО:		2 899,63	93,44	40,00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
МБОУ «ПОКРОВСКО-УРУСТАМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Дошкольная образовательная организация на 220 мест в квартале 59 г.Казани	71 986,30	11,00	2,50



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Многопрофильная поликлиника (взрослое и детское население) ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" Зеленодольский муниципальный район, с. Осиново	226 501,66	4,00	1,00
2	Врачебная амбулатория ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница" Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, с.Куюки	203 516,17	4,00	2,00
3	Филиал детской поликлиники ГАУЗ «Городская детская поликлиника №6» г.Казань	380 845,94	6,00	3,00
4	Мусабай-Заводский ФАП ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница"	8 149,41	10,50	10,50
5	Нижнесуньский ФАП ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница"	6 732,91	12,00	12,00
6	Старо-Кувакская ВА ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	26 171,32	14,25	14,25
7	Сухояшевский ФАП ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
8	Краснобаранский ФАП ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
9	Урнякский ФАП ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	8 149,41	15,00	15,00
10	Потапово-Тумбарлинский ФАП ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
11	Бурнакский ФАП ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
12	Октябрьский ФАП ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
ИТОГО из 34:		1 088 733,01	6,35	6,35

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
13	Больше-Ходяшевский ФАП ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
14	Прогрессский ФАП ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
15	Дачный ФАП ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
16	Новоспасский ФАП ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
17	Слобода-Екатерининский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
18	Красно-Октябрьский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
19	Ново-Иглайкинский ФАП ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
20	Бердибяковский ФАП ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
21	Юлбатский ФАП ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
22	Сарайлинский ФАП ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница"	5 006,48	15,00	15,00
23	Тимяшевский ФАП ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	8 149,41	51,70	5,70
24	Аланский ФАП ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница"	6 732,91	69,25	28,75
ИТОГО из 34:		1 088 733,01	6,35	6,35

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**



**ТИМЯШЕВСКИЙ ФАП ГАУЗ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА»**



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
1	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", поликлиника (корпус № 3), г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	298,50	0,00	0,00
2	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", поликлиника, Тюлячинский муниципальный район, с.Тюлячи, ул.Ленина, д.35, корпус А	45 203,68	7,00	3,00
3	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", поликлиника, Алексеевский муниципальный район, п.г.т.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85	10 413,60	9,00	5,00
4	ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница", поликлиника, г. Кукмор, ул. Ворошилова, д. 24	12 383,33	9,00	5,00
5	ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница", поликлиника №1, г.Зеленодольск, ул.Энгельса д.25	13 930,28	10,00	9,00
6	ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница", поликлиника, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т.Аксубаево, ул.Мазилина, д.41	30 147,11	10,00	4,00
7	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", женская консультация (корпус №1), г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	5 136,29	11,00	11,00
ИТОГО:		245 718,26	19,89	13,07

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
8	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", клиничко-диагностическая поликлиника, Алексеевский муниципальный район, пгт.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85	14 966,93	13,00	7,00
9	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", здание поликлиники медико-санитарной части, г.Лениногорск, ул.Горького д.36, строение 1	20 069,43	19,00	4,00
10	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", врачебная амбулатория (гериатрическое отделение), Лениногорский муниципальный район, с. Шугурово, ул. Горького, д.4, строение 2	50 759,92	22,00	5,00
11	ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница", поликлиника, г.Мамадыш, ул.Ленина, д.105	23 066,04	27,00	8,00
12	ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница", поликлиника, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медицинский городок, д. 21	11 243,72	75,00	5,00
13	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", детская поликлиника, Тюлячинский муниципальный район, с.Тюлячи, ул.Ленина, д.35, корпус Б	6 727,82	85,00	25,00
14	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", женская консультация, Кайбицкий муниципальный район, с. Б.Кайбицы ул. Гисматуллина д.1	907,13	100,00	85,00
15	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", поликлиника, Кайбицкий муниципальный район, с. Б.Кайбицы ул. Гисматуллина д.1	464,47	100,00	20,00
ИТОГО:		245 718,26	19,89	13,07

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**



**ГАУЗ «ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,
ПОЛИКЛИНИКА, ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ РАЙОН**



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Строительство культурно-досугового центра с.Катмыш, Мамадышский район	34 520,39	0,00	0,00
2	Строительство сельского дома культуры в д.Уба, Бавлинский район	12 323,73	2,00	2,00
3	Строительство сельского дома культуры в п.Октябрьский, Зеленодольский район	34 520,39	2,00	2,00
4	Строительство сельского дома культуры в с.Штырь, Арский район	12 323,73	6,00	6,00
5	Строительство многофункционального центра в д.Старая Задоровка, Дрожжановский район	12 323,73	8,00	8,00
ИТОГО :		106 011,97	2,28	2,28

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
6	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина»	29 548,66	8,00	6,00
7	Здание муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Арская детская школа искусств»	19 819,40	31,00	6,00
8	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Байлянгар, Кукморский район	34 825,00	42,00	10,00
9	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Ядыгерь, Кукморский район	34 825,00	43,00	10,00
ИТОГО:		119 018,06	32,02	8,00
РЕКОНСТРУКЦИЯ				
11	Реконструкция Районного дома культуры в г.Буинск	403 522,25	2,00	1,00
10	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска	351 204,75	6,00	2,00
ИТОГО:		754 727,00	3,86	1,50

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
ЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Верхнеуслонский	Благоустройство территории и строительство инфраструктуры для объекта «Тубетей Тауэр»	243 113,10

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
ГП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» <i>16 объектов</i>	ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	7 (комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку)	95 487,3
	ФП «Современный облик сельских территорий»	3 (строительство 3 школ)	478 372,35
		6 (капитальный ремонт объектов комплексного обустройства)	176 261,7
ГП «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ» <i>4 объекта</i>	ФП «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности»	4 объекта восстановления воинских захоронений	12 397,00
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» <i>1 объект</i>	ФП «Сохранение культурного и исторического наследия»	1 (Строительство Русского драматического театра "Мастеровые")	897 268,50
ИТОГО		104	5 834 743,59

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» <i>66 объектов</i>	Капитальный ремонт школ	66 объектов капитального ремонта школ	3 798 036,67
ГП «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» <i>15 объектов</i>	ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	15 объектов (1- Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Камское Устье РТ и 14 объектов Кап.ремонт гидротехнических сооружений)	233 940,10
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» <i>2 объект</i>	ФП «Бизнес-спринт»	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	133 333,33
ИТОГО		104	5 834 743,59

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	г.Казань	3	209 857,61	3,30	0,92
2	Рыбно-Слободский	1	39 041,81	5,50	3,00
3	Спасский	2	151 146,64	11,00	4,00
4	Алексеевский	2	140 791,67	17,09	8,09
5	Мензелинский	2	84 650,12	17,75	8,78
6	Нурлатский	5	252 129,52	17,94	5,71
7	Зеленодольский	2	251 273,32	18,52	4,51
8	Лаишевский	1	71 927,22	20,00	5,00
9	Новошешминский	3	150 667,21	20,15	7,12
10	Альметьевский	14	564 178,76	21,47	7,26
ИТОГО:		66	3 779 046,48	22,16	7,19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
11	Кукморский	2	170 579,65	22,14	6,93
12	Агрызский	3	124 415,46	22,92	4,74
13	Нижнекамский	7	537 390,05	23,29	8,94
14	Ютазинский	5	273 447,06	25,24	5,00
15	Мамадышский	3	179 496,34	26,00	9,00
16	Черемшанский	2	126 438,96	26,25	5,39
17	Кайбицкий	1	63 816,81	30,00	12,00
18	Муслюмовский	1	28 832,12	35,00	15,00
19	Апастовский	5	284 672,49	38,28	15,64
20	Дрожжановский	2	74 293,67	49,12	5,00
ИТОГО:		66	3 779 046,48	22,16	7,19

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МБОУ «СРЕДНЕБАЛТАЕВСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА АБЗАЛОВА РЕМА АБЗАЛОВИЧА» АПАСТОВСКИЙ РАЙОН**



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»
НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН**



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г.Набережные Челны	1 794 536,50	64,00	2,00



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство школы-сада на 240/120 мест г.Мамадыш	223 909,14	10,00	2,00
2	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Олуяз, Кукморский район	46 561,45	28,00	11,00
3	Строительство начальной школы на 15 мест в н.п.Балыклы, Кукморский район	41 843,07	30,00	18,00
4	Строительство школы на 500 мест в н.п.Богатые Сабы	211 347,83	37,10	1,40
ИТОГО:		523 661,48	24,14	8,10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 15 МЕСТ В Н.П.БАЛЫКЛЫ КУКМОРСКИЙ РАЙОН



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз, Кукморский район	13 337,67	0,00	0,00
2	Строительство сетей водоснабжения в н.п.Балыклы, Кукморский район	39 474,84	7,00	7,00
3	Строительство системы газоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	45 683,64	20,00	20,00
4	Строительство линии канализации и теплотрассы по ул.Советской, Мамадышский район	13 114,10	20,00	20,00
5	Строительство системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	17 208,71	75,00	75,00
ИТОГО:		128 818,96	24,40	24,40

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ
1	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Новотроицкое" на 636 домов (газоснабжение), Тукаевский район	363,854
2	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 127 жилых домов в д.Балыклы) (автомобильная дорога),Кукморский район	12 283,95
3	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 268 жилых домов в н.п. Песчаные Ковали (автомобильная дорога), Лаишевский район	18 425,93
4	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 150 жилых домов в с.Конь (дорога), Пестречинский район	5 830,33
5	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 25 жилых домов в н.п.Богатые Сабы(благоустройство)	12 283,95
6	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Новотроицкое жилого микрорайона «Энергия» на 636 домов (благоустройство), Тукаевский район	11 925,96
7	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 256 домов в микрорайоне «Южный с.Черемшан (автомобильная дорога), Черемшанский район	33 901,74
ИТОГО:		95 015,71

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Татарский Дюм-Дюм, Елабужский район	7 659,73	2,00	0,00
2	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз, Елабужский район	7 659,73	2,00	0,00
3	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Каргали, Чистопольский МР	7 659,73	4,00	4,00
4	Капитальный ремонт ГТС в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш, Мамадышский район	7 659,73	50,00	20,00
ИТОГО из 14:		107 236,32	4,14	1,71

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища с .Камское –Устье	126 164,90

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ
1	Восстановление воинских захоронений на кладбище «Арское», г.Казань	10 658,27
2	Восстановление могилы младшего сержанта Труханова В.С., погибшего 24.08.1942, с.Майдан, Верхнеуслонский район	63,76
3	Восстановление и установка мемориального знака на могиле летчика Шпигуна Д.А., погибшего 11.02.1944 при перегоне военного самолета из г.Свердловска на фронт с.Нижний Услон, Верхнеуслонский район	124,66
4	Восстановление и установка мемориального знака на братской могиле летчиков Евсеева В.П., Завьялова А.И., Сурова А.А. – погибших 16.02.1942 при перелете из г.Чистополя на фронт, д.Елизаветино, Верхнеуслонский район	124,66
ИТОГО:		10 971,35


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ
1	Закупка оборудования для создания «умных» площадок в Зеленодольском районе и г.Казани	133 333,33

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

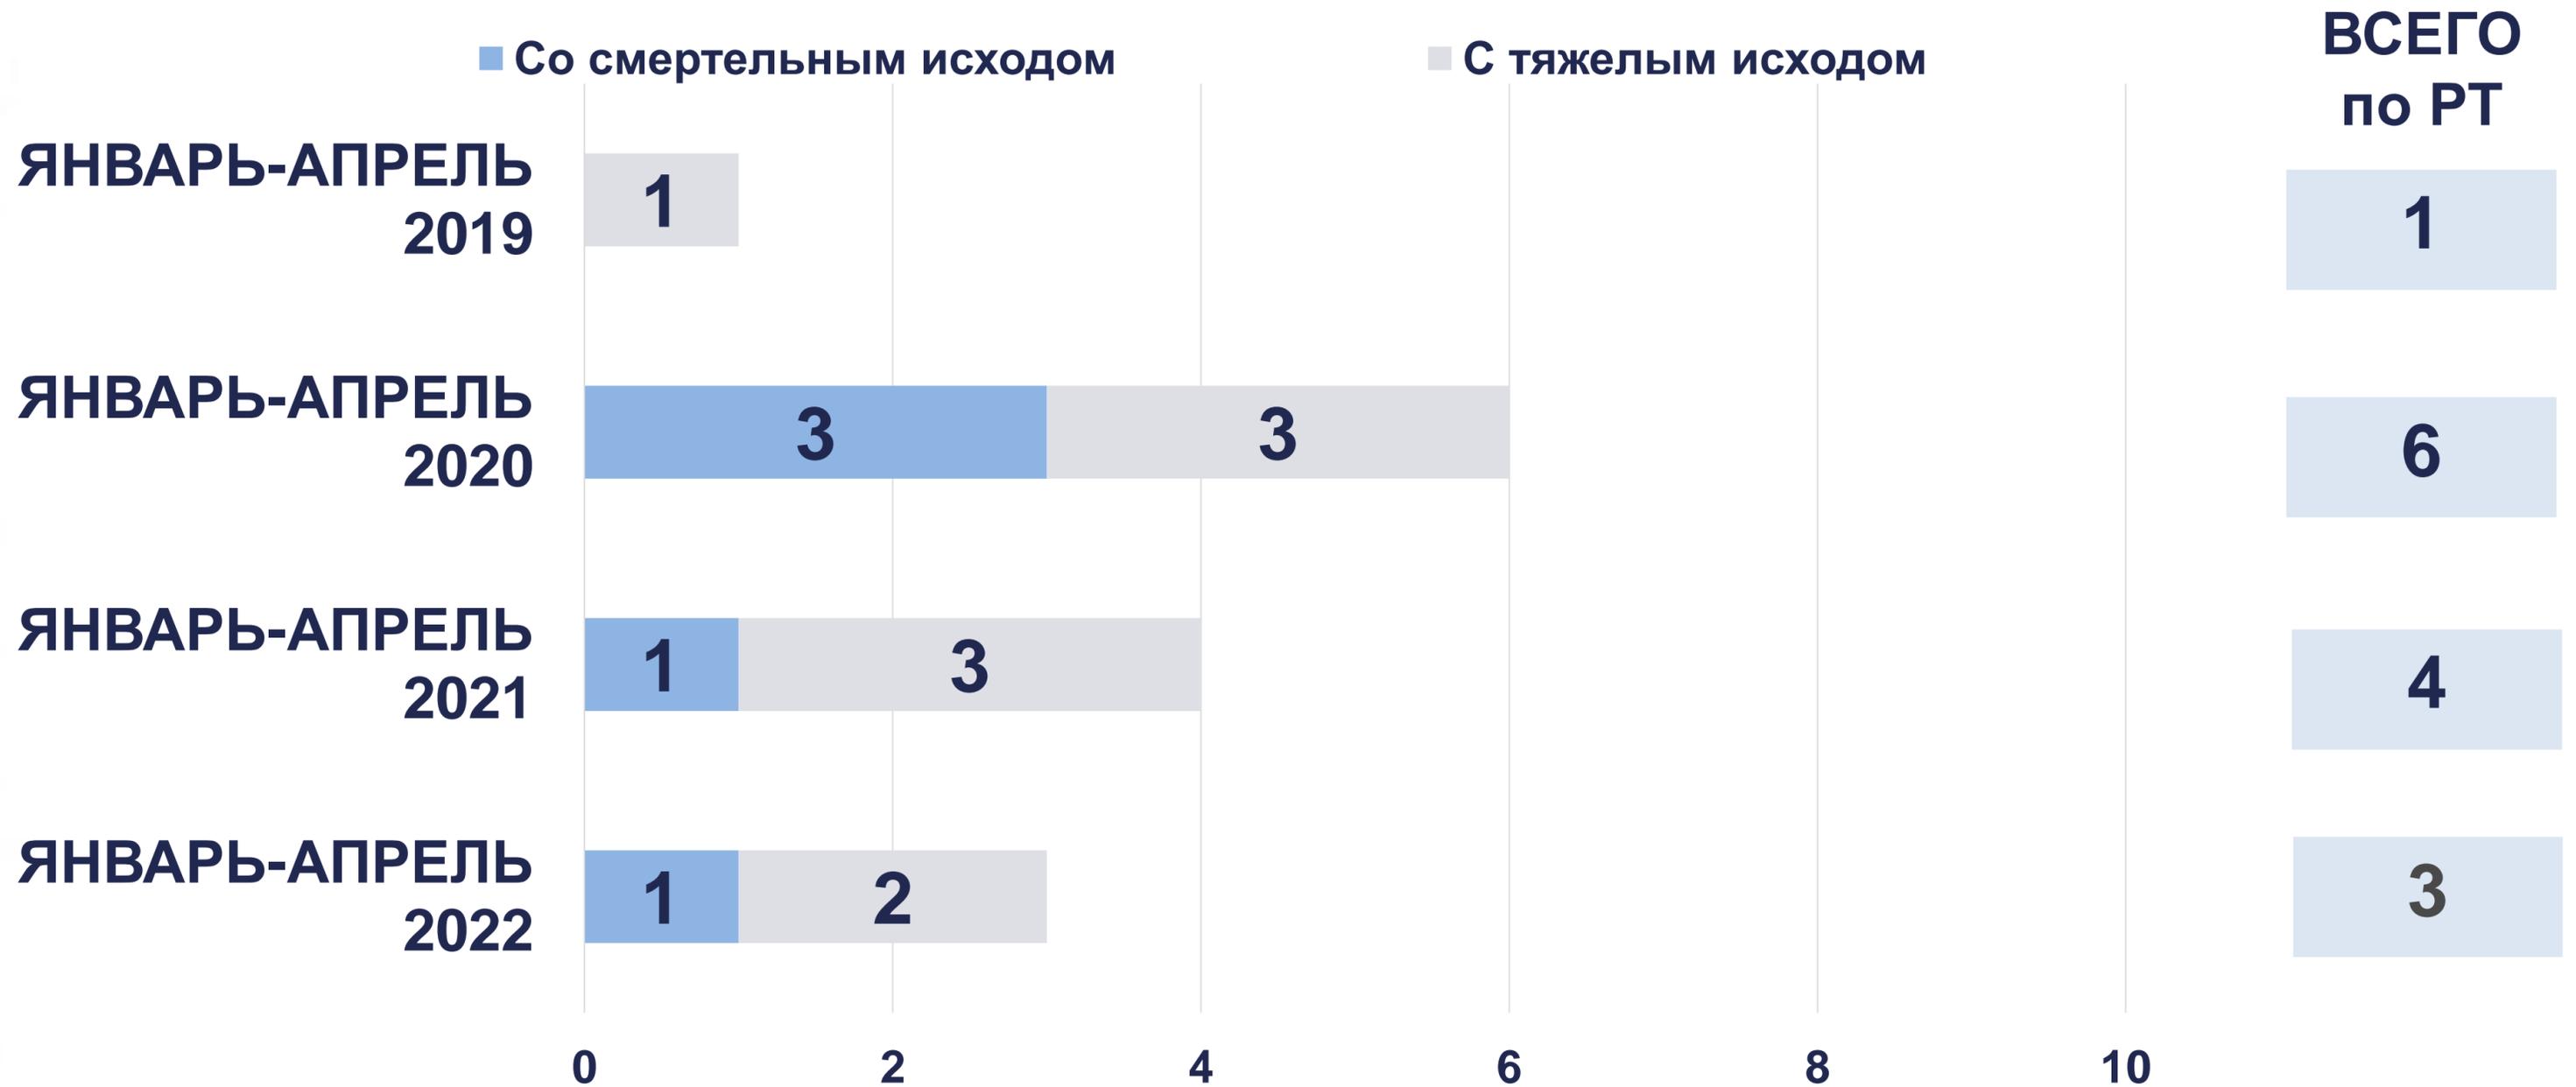

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	417	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	6	330,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	4	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	-	-
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	-	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	311
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	160
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	140
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	68
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	27
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	21
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	24

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	346
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	297
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	286
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	82

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	85	108	97	90
2	г.Набережные Челны	20	0	0	-
3	Агрызский	1	3	3	100
4	Азнакаевский	6	6	6	100
5	Аксубаевский	2	1	1	100
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	18	5	5	100
8	Алькеевский	2	2	2	100
9	Альметьевский	22	38	38	100
10	Апастовский	8	9	9	100
11	Арский	5	0	0	-
12	Атнинский	2	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	-	-	-	-
15	Бугульминский	5	12	12	100
16	Буинский	5	2	2	100
ВСЕГО по РТ		346	297	286	96

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	9	4	4	100
18	Высокогорский	2	0	0	-
19	Дрожжановский	6	2	2	100
20	Елабужский	7	8	8	100
21	Заинский	-	-	-	-
22	Зеленодольский	18	14	14	100
23	Кайбицкий	6	6	6	100
24	Камско-Устьинский	4	0	0	-
25	Кукморский	4	2	2	100
26	Лайшевский	2	0	0	-
27	Лениногорский	5	10	10	100
28	Мамадышский	1	1	1	100
29	Менделеевский	-	-	-	-
30	Мензелинский	2	0	0	-
31	Муслюмовский	3	10	10	100
ВСЕГО по РТ		346	297	286	96

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	28	18	18	100
33	Новошешминский	3	0	0	-
34	Нурлатский	3	1	1	100
35	Пестречинский	5	5	5	100
36	Рыбно-Слободский	1	0	0	-
37	Сабинский	9	0	0	-
38	Сармановский	6	18	18	100
39	Спасский	1	0	0	-
40	Тетюшский	15	0	0	-
41	Тукаевский	8	0	0	-
42	Тюлячинский	1	1	1	100
43	Черемшанский	8	9	9	100
44	Чистопольский	5	2	2	100
45	Ютазинский	-	-	-	-
ВСЕГО по РТ		346	297	286	96

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ **ОХРАНЫ ТРУДА**



28
апреля

Безопасный труд - основа качественной
и полноценной жизни каждого человека

**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
