



2016
январь - июль

2017
январь - июль


2018
январь - июль

2019
январь - июль

**Со смертельным
исходом**

**С тяжелым
исходом**

**ВСЕГО
по РТ**

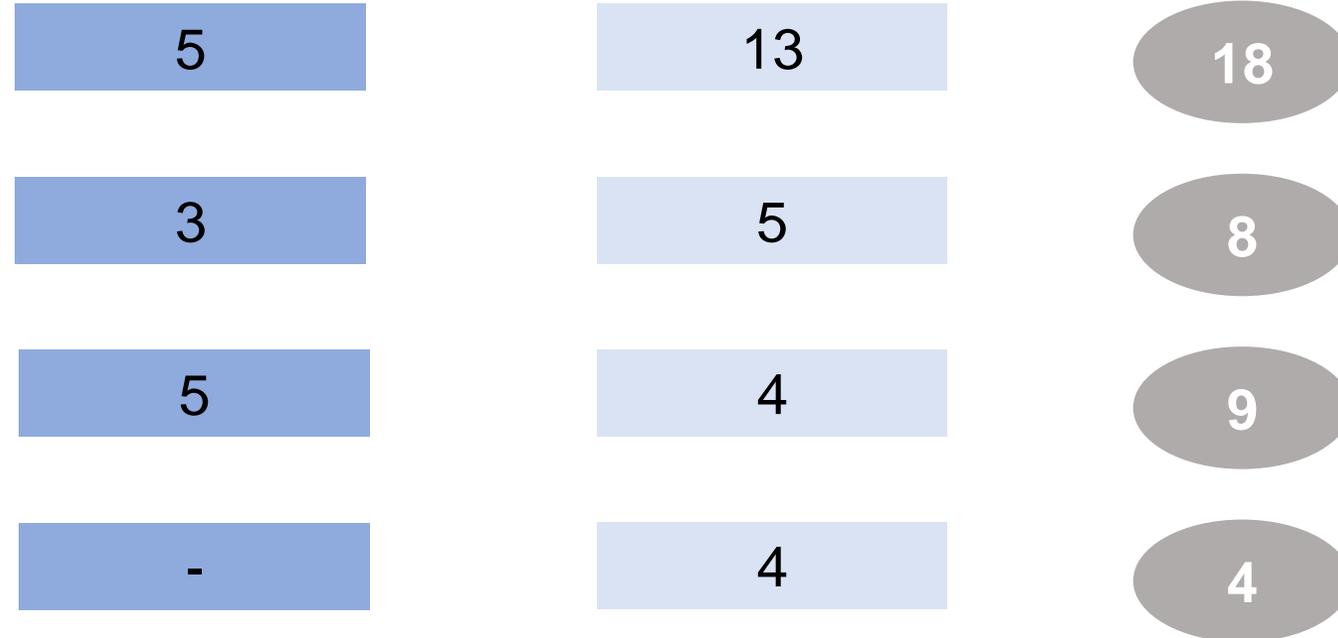



Работники не обеспечены защитными касками

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ГКУ «Главинвестстрой РТ»
Подрядчик: ООО СФ «Евроальянсстрой»



Токоведущие части
распределительного щита
в бытовом помещении
выполнены в открытом
исполнении, допущена
возможность случайного
прикосновения к ним

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО ПСК «КАЖ»
Подрядчик: ООО «СК ДИЗАЙН-КУБ»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	760	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	181 64	6 926,0 -
Взыскано всего	60	3 780,0
Не истек срок оплаты	55	3 026,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	663
- с выездом на объекты строительства	142
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	523
- выдано предписаний	260
- приостановлено право осуществлять строительство	79
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	32
- выдано предупреждений	152



Ввод жилья

2 425 000 кв.м.

100 %

1 458 836 кв.м.

60,2 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 458 836	60,2	966 164
1	Нижнекамский	100 000	11 068	11,1	88 932
2	Менделеевский	14 000	2 512	17,9	11 488
3	Апастовский	10 000	2 347	23,5	7 653
4	Атнинский	4 500	1 260	28,0	3 240
5	г.Наб.Челны	310 000	94 387	30,4	215 613
6	Зеленодольский	110 000	36 706	33,4	73 294
7	Лениногорский	26 000	9 692	37,3	16 308
8	Бугульминский	35 000	13 056	37,3	21 944
9	Сабинский	20 000	7 951	39,8	12 049
10	Дрожжановский	6 000	2 452	40,9	3 548
11	В-Услонский	40 000	16 373	40,9	23 627
12	Чистопольский	28 000	11 467	41,0	16 533
13	Новошешминский	5 000	2 094	41,9	2 906
14	Альметьевский	130 000	54 851	42,2	75 149
15	Елабужский	50 000	21 847	43,7	28 153

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 458 836	60,2	966 164
16	Сармановский	10 000	4 459	44,6	5 541
17	Муслюмовский	9 000	4 180	46,4	4 820
18	Буинский	15 000	7 395	49,3	7 605
19	Арский	25 000	12 465	49,9	12 535
20	К-Устьинский	8 000	4 002	50,0	3 998
21	Спасский	6 500	3 261	50,2	3 239
22	Азнакаевский	20 000	10 152	50,8	9 848
23	Актанышский	14 000	7 139	51,0	6 861
24	Заинский	17 000	8 861	52,1	8 139
25	Черемшанский	5 000	2 725	54,5	2 275
26	Мамадышский	17 000	9 267	54,5	7 733
27	Тетюшский	10 000	5 717	57,2	4 283
28	Бавлинский	12 000	6 868	57,2	5 132
29	Мензелинский	14 000	8 088	57,8	5 912
30	Алексеевский	14 000	8 142	58,2	5 858

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 28 июня 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 458 836	60,2	966 164
31	Кайбицкий	5 000	3 106	62,1	1 894
32	Тукаевский	90 000	58 602	65,1	31 398
33	Алькеевский	7 000	4 675	66,8	2 325
34	Аксубаевский	7 000	4 690	67,0	2 310
35	Нурлатский	16 000	10 729	67,1	5 271
36	Балтасинский	14 000	9 476	67,7	4 524
37	Р-Слободский	13 500	9 191	68,1	4 309
38	Ютазинский	11 000	7 840	71,3	3 160
39	г.Казань	850 000	637 847	75,0	212 153
40	Тюлячинский	8 000	6 226	77,8	1 774
41	Высокогорский	80 000	63 567	79,5	16 433
42	Агрызский	15 000	12 209	81,4	2 791
43	Пестречинский	140 000	122 806	87,7	17 194
44	Кукморский	20 000	18 543	92,7	1 457
45	Лаишевский	100 000	98 545	98,5	1 455



438 302 кв.м.

100%

144 649 кв.м.

33%





на 10.07.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	46	0	119	59	29	31
Количество квартир	7 838	2 494	0	5 344	2 259	1 246	1 839
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	144,6	0	293,7	120,8	71,6	101,3



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	15 577 996	10 788 783	168 873	8 155 432	211 975	11 543 314	589 215
введены в эксплуатацию	5 052 988	5 052 988		4 569 014		4 943 348	
высокая 70-100%	4 626 314	4 071 774	69 513	2 677 656	103 538	4 064 195	359 073
средняя 30-70%	2 420 798	978 359	65 382	639 190	66 422	1 240 482	99 268
низкая 0-30%	3 477 896	685 663	33 978	269 573	42 016	1 295 289	130 874



Строительство 24 квартирного ж. д. поз.1 с. Ср. Камышла Нурлатский район с наружными инженерными сетями



Не установлены
навигационные знаки, стенды
со схемой движения
транспорта, схема строповки
материалов

Выданы предписания на устранение
замечаний до 15.07.2019г

Заказчик: ГКУ «ГИСУ РТ»
Подрядчик: ООО «Памир»



1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финансирование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	52	17
многодетные семьи	33	155,9	33	100
молодые семьи	54	57,9	0	0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	45	101,4	40	89
Чернобыльцы	21	44,7	21	100
Вынужденные переселенцы	23	53,5	18	78
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	+1	1	+1	0	0
2	Аксубаевский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	5	5		4	0	4	+1
4	Бугульминский	1	1		1	+1	1	+1
5	Буинский	3	3		2	+1	1	+1
6	Высокогорский	2	2		0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1		0	0	0	0
8	Кукморский	3	3		0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1		1	+1	1	+1
10	Мамадышский	2	2		2		0	0
11	Муслюмовский	1	1		0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6		6		6	
13	Сабинский	1	1		1		1	
14	г.Казань	4	4		4		4	
ИТОГО		33	33	+1	23	+4	19	+4



№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Нижнекамский	10
4	Сабинский	1
5	г.Н.Челны	13
6	г.Казань	28
ИТОГО		54



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Буинский	1	1		0	0	0	0
3	Елабужский	2	2	0	1	0	1	0
4	Н.Челны	4	4	+2	2	+1	2	+2
5	Нижнекамский	3	3	+1	0	0	0	0
6	Сабинский	1	1		1		1	+1
7	Тукаевский	1	1		1	+1	1	+1
8	Тюлячинский	2	2	+2	0	0	0	0
9	Чистопольский	2	2		2	+1	2	+2
10	г.Казань	4	3	0	2	+1	2	+1
ИТОГО по РТ		21	20	+6	9	+4	9	+7



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка	11.07.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1		1	+1	1	+1
2	Зеленодольский	3	3		3	+1	3	+1
3	Лаишевский	1	1		0	0	0	0
4	Муслюмовский	1	1	+1	0	0	0	0
5	Сармановский	1	0	0	0	0	0	0
6	г.Казань	11	9	0	6		6	+2
ИТОГО		18	15	+1	10	+2	10	+4



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Арский
4. Бавлинский
5. Буинский
6. Высокогорский
7. Елабужский
8. Зеленодольский
9. Лаишевский
10. Пестречинский
11. г.Наб.Челны
12. г.Казань

Количество объектов	Степень готовности	
	Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
58	29	29
1	-	1
1	1	-
2	2	-
1	1	-
2	-	2
3	-	3
2	1	1
3	1	2
1	1	-
12	6	6
21	8	13
9	8	1



Малоэтажное строительство (в том числе ИЖС)

7 325 домов

100%

5 100 домов

69,6%





Количество дворов по РТ	Проведены замеры (полевые работы)		Подготовлены схемы (камеральные работы)	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
9 439	4722	50	1534	16,3



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ






№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 33 - артезианские скважины	Построено 93 км трубопроводов (44%), установлено 15 ВНБ (36%), пробурено 19 скважин (56%),
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлен 5 713 светильник (46%), проложено 131,1 км СИП (55%), установлено 86 ВЩУ(50%)



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	Закуплено 119 котлов (100%), выполнен монтаж 89 котлов (75%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 870 заявлений от собственников квартир (90%), установлено 423 котла (43%)
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	Подготовка документов на торги



Сельское хозяйство

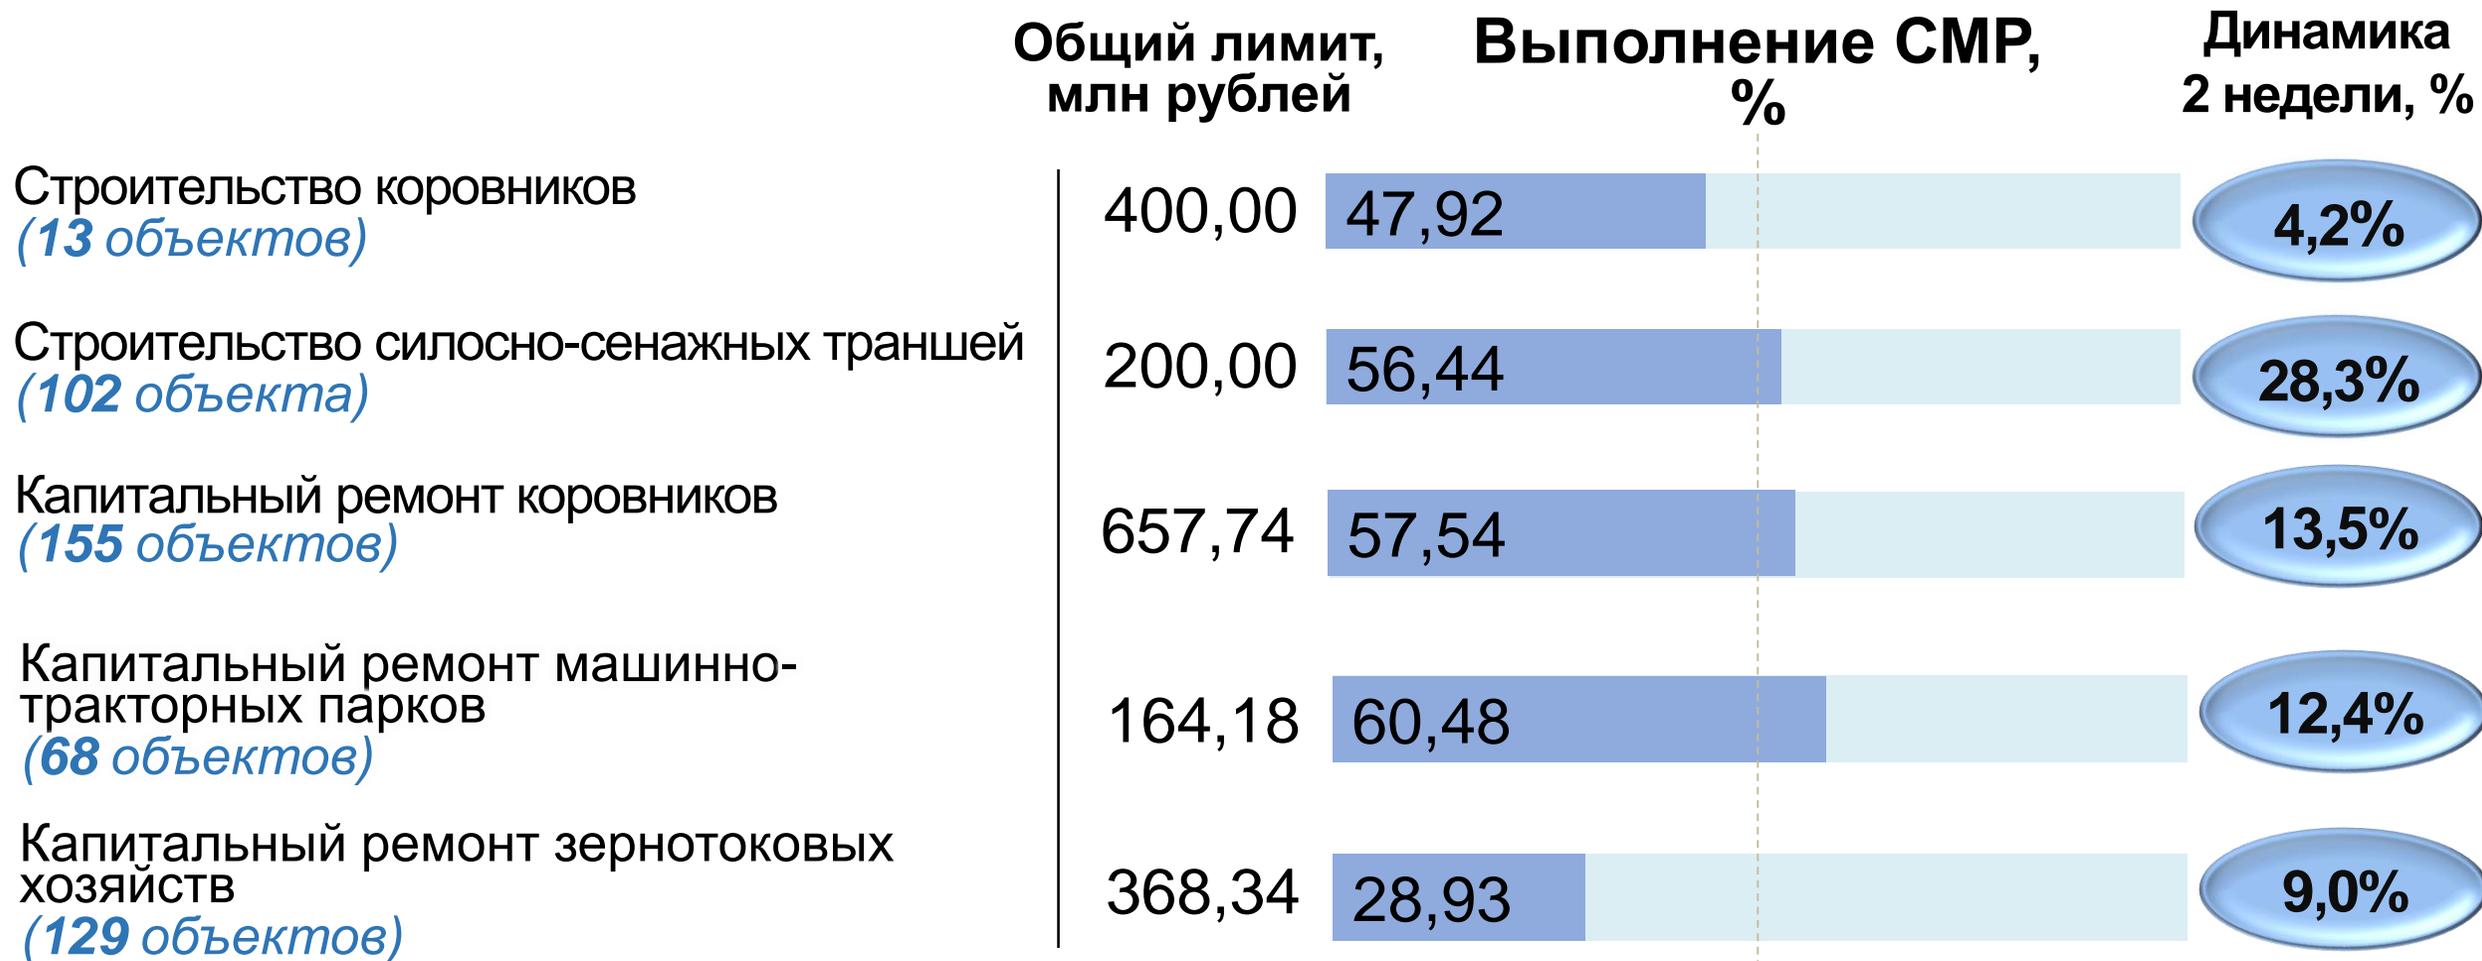



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	13	400 000,00	47,92	4,15
1	Высокогорский	2	78 000,00	3,08	0,00
2	Балтасинский	1	105 928,84	7,00	2,00
3	Лаишевский	1	17 766,00	38,00	23,00
4	Ютазинский	1	36 018,26	66,00	6,00
5	Тукаевский	1	18 326,20	87,00	19,00
6	Кукморский	1	60 982,50	88,00	3,00
7	Актанышский	6	82 978,20	98,50	3,50



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	102	200 000,00	56,44	28,28
1	Новошешминский	1	1 500,00	0,00	0,00
2	Тетюшский	4	6 000,00	2,50	0,00
3	Нурлатский	1	1 500,00	3,00	3,00
4	Черемшанский	4	7 500,00	4,00	4,00
5	Лаишевский	3	6 000,00	14,00	1,50
6	Буинский	4	6 000,00	15,00	12,00
7	Дрожжановский	4	6 000,00	22,50	16,25
8	Альметьевский	2	3 000,00	25,00	18,33
9	Высокогорский	1	1 500,00	25,00	10,00
10	Тюлячинский	5	13 500,00	26,67	22,22
11	Менделеевский	3	4 500,00	30,00	30,00
12	Тукаевский	3	6 200,00	43,55	9,55
13	Бавлинский	1	1 500,00	50,00	25,00
14	Ютазинский	2	3 000,00	52,50	2,50



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	102	200 000,00	56,44	28,28
15	Балтасинский	13	25 500,00	59,41	41,47
16	Елабужский	3	4 500,00	61,67	13,33
17	Арский	4	9 000,00	68,33	61,06
18	Сабинский	5	10 000,00	70,50	30,00
19	Кукморский	12	18 500,00	71,76	28,30
20	Атнинский	7	21 000,00	74,29	31,43
21	Актанышский	7	10 500,00	76,57	58,57
22	Лениногорский	2	3 000,00	77,50	32,50
23	Алексеевский	1	4 000,00	85,00	48,64
24	Мензелинский	1	3 000,00	90,00	87,00
25	Мамадышский	9	23 300,00	93,24	16,31



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		155	657 738,00	57,54	13,54
1	Менделеевский	1	4 000,00	15,00	5,00
2	Черемшанский	5	24 000,00	18,13	13,67
3	Азнакаевский	2	9 000,00	18,89	10,00
4	Верхнеуслонский	1	5 000,00	20,00	11,00
5	Ютазинский	5	24 000,00	26,08	5,00
6	Тетюшский	5	21 000,00	31,38	3,33
7	Мензелинский	4	17 000,00	33,53	20,00
8	Бугульминский	3	9 000,00	34,72	6,94
9	Арский	12	42 950,00	36,41	18,04
10	Дрожжановский	4	17 000,00	37,35	10,59
11	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	38,00	38,00
12	Лениногорский	2	7 000,00	38,57	9,50
13	Буинский	4	17 000,00	39,71	15,29
14	Альметьевский	3	14 000,00	42,14	14,29



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	57,54	13,54
15	Лаишевский	9	34 000,00	11,76	0,00
16	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	50,00
17	Нурлатский	4	18 000,00	51,11	15,11
18	Балтасинский	8	35 000,00	57,63	9,77
19	Мамадышский	4	14 000,00	60,36	7,50
20	Сабинский	9	44 000,00	63,59	15,05
21	Тукаевский	8	36 000,00	64,97	9,03
22	Агрызский	1	4 000,00	65,00	35,00
23	Высокогорский	8	36 000,00	67,00	12,64
24	Новошешминский	2	9 000,00	69,44	2,78
25	Пестречинский	2	8 000,00	70,00	20,00
26	Елабужский	7	30 500,00	70,66	9,59
27	Актанышский	8	35 000,00	73,31	18,60
28	Аксубаевский	4	15 800,00	76,99	23,24



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	57,54	13,54
29	Алькеевский	1	5 000,00	85,00	30,00
30	Кукморский	18	82 388,00	86,04	8,50
31	Бавлинский	1	5 000,00	95,00	35,00
32	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00
33	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00
34	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	60,48	12,35
1	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
2	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	0,00	0,00
3	Атнинский	2	5 000,00	13,00	3,00
4	Ютазинский	2	5 834,00	13,58	5,14
5	Муслюмовский район	2	4 000,00	15,00	2,50
6	Дрожжановский	2	3 000,00	20,00	11,50
7	Тетюшский	3	7 000,00	27,50	8,00
8	Лаишевский	4	7 300,00	47,22	1,71
9	Сабинский	6	16 640,00	54,72	19,47
10	Высокогорский	1	1 500,00	55,00	25,00
11	Лениногорский	2	4 500,00	55,00	11,33



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	60,48	12,35
12	Тукаевский	8	20 108,70	56,67	9,25
13	Нурлатский	1	2 500,00	60,00	0,00
14	Балтасинский	4	11000,00	65,00	5,00
15	Арский	7	21 500,00	74,65	20,56
16	Азнакаевский	4	9 480,00	77,03	35,49
17	Елабужский	3	7 000,00	80,00	10,00
18	Зеленодольский	1	1 330,00	82,00	82,00
19	Кукморский	5	14 500,00	83,86	8,17
20	Актанышский	3	9 000,00	86,33	7,00
21	Бавлинский	1	1 500,00	95,00	15,00
22	Мамадышский	2	3 500,00	98,29	4,29
23	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	10,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	28,93	9,02
1	Муслюмовский	4	9900,00	3,00	0,00
2	Чистопольский	1	2 500,00	15,00	1,00
3	Аксубаевский	1	6 000,00	27,00	12,00
4	Пестречинский	2	3600,00	30,00	12,50
5	Тетюшский	8	22900,00	31,53	6,03
6	Верхнеуслонский	1	3 000,00	35,00	19,00
7	Алькеевский	2	2100,00	38,10	0,00
8	Буинский	2	4 000,00	47,50	22,50
9	Нурлатский	3	8934,00	48,34	40,56
10	Дрожжановский	6	12 700,00	48,66	20,50
11	Мамадышский	2	7 500,00	51,67	6,67
12	Менделеевский	1	5 000,00	52,00	2,00
13	Лениногорский	5	13 000,00	53,08	31,77
14	Балтасинский	4	11 600,00	53,75	11,25



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	28,93	9,02
15	Агрызский	1	3 500,00	70,00	35,00
16	Альметьевский	1	3 000,00	70,00	25,00
17	Арский	11	28 344,00	71,02	31,53
18	Сабинский	6	18 934,00	71,12	26,42
19	Тукаевский	9	21377,00	71,34	30,18
20	Азнакаевский	5	18 500,00	72,32	50,27
21	Елабужский	4	14 300,00	75,87	13,64
22	Черемшанский	5	13 200,00	77,42	35,91
23	Кукморский	4	14000,00	77,43	14,21
24	Высокогорский	7	21 000,00	78,45	8,81
25	Тюлячинский	5	11000,00	83,64	6,36
26	Новошешминский	6	15 000,00	84,17	13,33
27	Актанышский	11	41 052,00	86,79	11,53
28	Мензелинский	4	11500,00	92,61	71,30



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	28,93	9,02
29	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
30	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00
31	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	40,00
32	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00
33	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	10,00
34	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	75,00
35	Ютазинский	1	5000,00	100,00	6,00



№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	СМР, %
ИТОГО				83,6
1	г. Набережные Челны	1 224	"Евростиль"	76,1
2	г. Нижнекамск	800	"Евростиль"	77
3	г. Казань, пристрой «93 гимназия»	360	"РСС Инжиниринг"	81,2
4	г. Казань, ЖК «Весна»	1 501	"Ак Таш"	86
5	г. Казань, пристрой «Солнце»	150	"РСС Инжиниринг"	90,7
6	г. Казань, ул. Р.Гареева	1 224	"Ак Таш"	90,8



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ «Лицей-интернат № 2» г.Казань	29 851,7	23,0	8,0
2	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкай" Высокогорский муниципальный район	11 115,7	25,0	8,0
3	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа», Атнинский	40 041,9	39,8	15,3
	Итого по РТ	537 125,3	61,8	13,2



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова», Зеленодольский	47 467,1	27,0	12,0
2	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова», г.Казань	29 993,3	27,0	6,0
3	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича», Мензелинский	29 206,3	40,0	19,0
4	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	20 610,5	50,0	11,0
Итого по РТ		226 792,4	50,9	14,5
