

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2014 года	37	15	22
январь - август 2015 года	33	9	24
январь - август 2016 года	20	6	14
январь - август 2017 года	19	5	14



Строительство молочно-товарной фермы в н.п. Акташ, Альметьевский район



Опоры лесов установлены
на неустойчивые основания

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик и генподрядчик: АО «СМП-Нефтегаз».



Строительство ж/д в мкр.64, г.Наб.Челны



Отсутствуют защитные (страховочные) ограждения на рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО ЖСК «Комфортное жилье».
Генподрядчик: ООО «СтройТраст»



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
1	г. Казань	6 929	6 929	100%
2	г.Наб.Челны	4 383	4 055	93%
3	Агрызский	33	33	100%
4	Азнакаевский	436	436	100%
5	Аксубаевский	29	29	100%
6	Актанышский	-	-	-
7	Алексеевский	-	-	-
8	Алькеевский	66	66	100%
9	Альметьевский	942	942	100%
10	Апастовский	13	13	100%
11	Арский	346	346	100%
12	Атнинский	-	-	-
13	Бавлинский	125	94	75%
14	Балтасинский	46	46	100%
15	Бугульминский	1 212	1 212	100%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

5

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
16	Буинский	142	64	46%
17	Верхнеуслонский	185	185	100%
18	Высокогорский	70	70	100%
19	Дрожжановский	72	72	100%
20	Елабужский	-	-	-
21	Заинский	398	398	100%
22	Зеленодольский	341	310	91%
23	Кайбицкий	8	8	100%
24	Камско-Устьинский	340	306	90%
25	Кукморский	-	-	-
26	Лаишевский	131	131	100%
27	Лениногорский	3 102	2 429	78%
28	Мамадышский	92	92	100%
29	Менделеевский	167	54	32%
30	Мензелинский	-	-	-



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
31	Муслюмовский	122	122	100%
32	Нижнекамский	3 155	3 155	100%
33	Новошешменский	68	60	88%
34	Нурлатский	95	95	100%
35	Пестречинский	66	66	100%
36	Рыбно-Слободский	24	24	100%
37	Сабинский	411	349	85%
38	Сармановский	33	33	100
39	Спасский	52	52	100%
40	Тетюшский	78	58	74%
41	Тукаевский	43	43	100%
42	Тюлячинский	-	-	-
43	Черемшанский	78	78	100%
44	Чистопольский	277	277	100%
45	Ютазинский	-	-	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 079	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	314 93	10 068,0 -
Взыскано всего	133	5 684,0
Не истек срок оплаты	84	4 330,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	907
- с выездом на объекты строительства	126
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	360
- выдано предписаний	185
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	40
- прекращено действие Свидетельств	61
- выдано предупреждений	74



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 августа 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 409 894	58,7	992 106
1	Буинский	15 000	3 720	24,8	11 280
2	Чистопольский	50 000	15 560	31,1	34 440
3	Азнакаевский	25 000	8 901	35,6	16 099
4	Нижнекамский	130 000	47 013	36,2	82 987
5	Кукморский	25 000	9 862	39,4	15 138
6	Зеленодольский	150 000	59 972	40,0	90 028
7	г.Наб.Челны	300 000	120 174	40,1	179 826
8	Новошешминский	5 000	2 131	42,6	2 869
9	Арский	27 000	11 964	44,3	15 036
10	Ютазинский	10 000	4 643	46,4	5 357
11	Бавлинский	17 000	8 159	48,0	8 841
12	Альметьевский	155 000	74 737	48,2	80 263
13	Апастовский	12 000	6 179	51,5	5 821
14	Елабужский	50 000	26 012	52,0	23 988
15	Муслюмовский	8 000	4 324	54,1	3 676



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 августа 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 409 894	58,7	992 106
16	К-Устьинский	10 000	5 441	54,4	4 559
17	Тукаевский	80 000	45 004	56,3	34 996
18	Кайбицкий	4 800	2 776	57,8	2 024
19	г.Казань	800 000	466 230	58,3	333 770
20	Сабинский	18 000	10 527	58,5	7 473
21	Агрызский	20 000	12 119	60,6	7 881
22	Тюлячинский	7 500	4 595	61,3	2 905
23	Заинский	17 000	10 426	61,3	6 574
24	Аксубаевский	6 000	3 702	61,7	2 298
25	Лениногорский	25 000	15 462	61,8	9 538
26	Атнинский	4 000	2 475	61,9	1 525
27	Мензелинский	16 000	10 111	63,2	5 889
28	Балтасинский	14 000	8 875	63,4	5 125
29	Сармановский	10 000	6 413	64,1	3 587
30	Мамадышский	16 000	10 546	65,9	5 454




Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 18 августа 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 409 894	58,7	992 106
31	Дрожжановский	5 000	3 316	66,3	1 684
32	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
33	Тетюшский	10 000	6 738	67,4	3 262
34	Р-Слободский	13 000	9 352	71,9	3 648
35	Менделеевский	10 000	7 494	74,9	2 506
36	Бугульминский	40 000	30 881	77,2	9 119
37	Алексеевский	14 000	11 131	79,5	2 869
38	Актанышский	12 000	9 718	81,0	2 282
39	В-Услонский	30 000	24 656	82,2	5 344
40	Алькеевский	6 500	5 452	83,9	1 048
41	Нурлатский	21 000	17 796	84,7	3 204
42	Черемшанский	4 500	3 925	87,2	575
43	Высокогорский	64 000	57 811	90,3	6 189
44	Лаишевский	83 500	77 947	93,3	5 553
45	Пестречинский	85 000	120 251	141,5	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

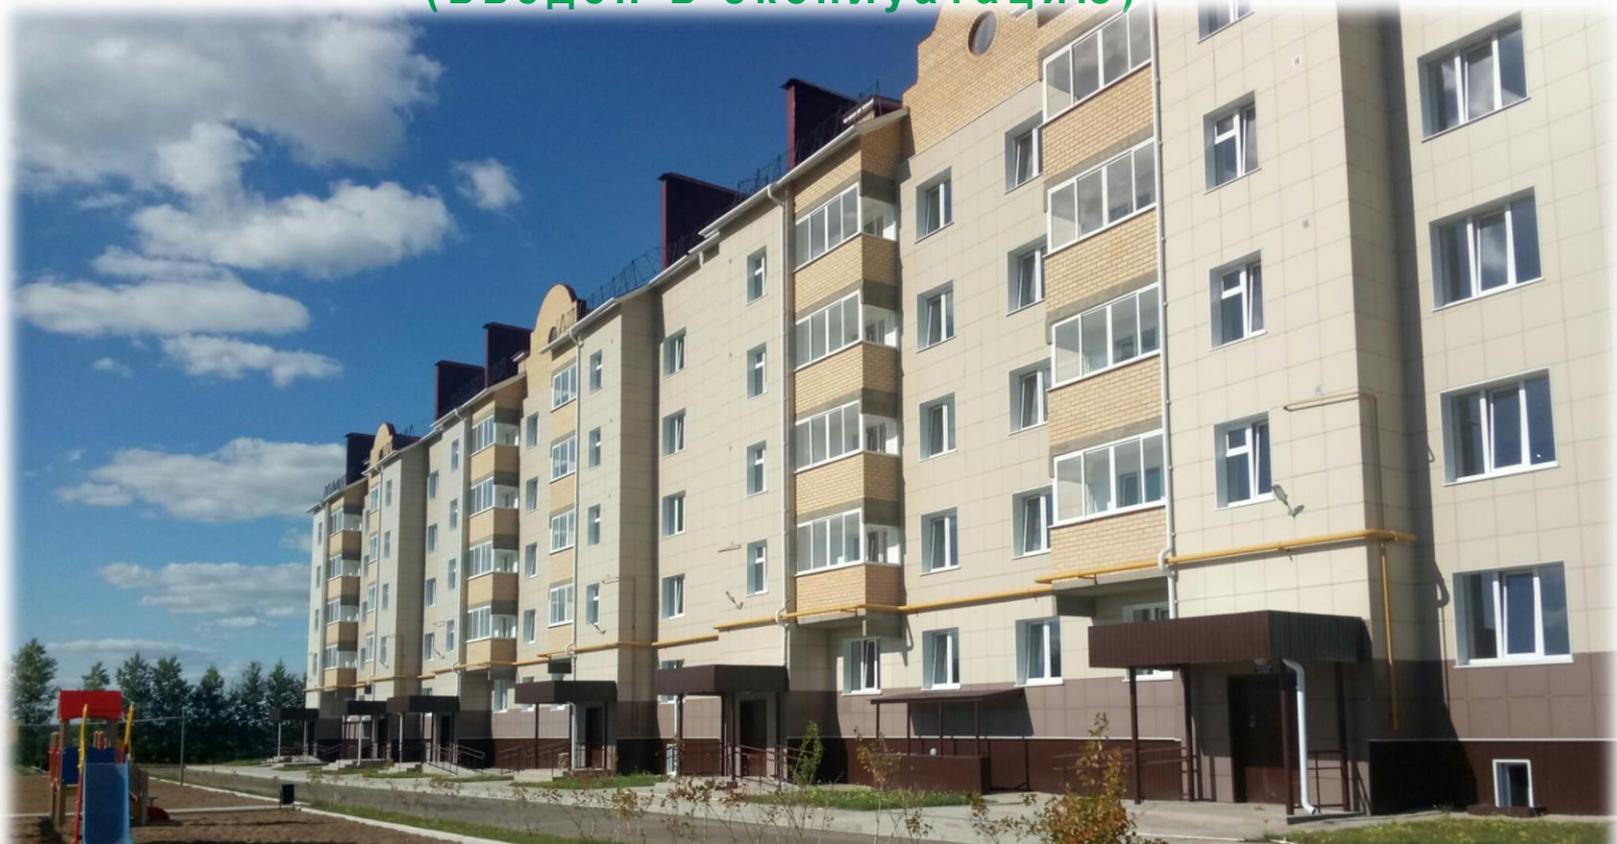

**г.Менделеевск, 68-кв. дом поз. №1 по ул.Г.Тукая
подрядчик – ЗАО «Мамадышстрой»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

13



**г.Нижнекамск, 80-кв. дом № 16 в микрорайоне 47
подрядчик – ООО «ЖИК-НК»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 18.08.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	95	116	79	29	8
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	235,8	290,3	209,3	78,9	2,1
Количество квартир	9 876	4 311	5 565	4 091	1 539	43



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	80 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		17	50	9	8
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	-	1
3	Сабинский	2	4	1	1
4	г. Казань	11	35	6	5
5	Кайбицкий	1	1	1	-
6	Мензелинский	1	1	1	-

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	105	105	135	
1	Агрызский	6	3	3	3	9	Апастовский	5	4	4	4
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2			
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	5				16	Кайбицкий	6	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

18

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	105	105	135	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	7	7	7	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	4	1	1	1	30	Тукаевский	20			
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	12				31	Черемшанский	5			
23	Нижнекамский	30			30	32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	14	5	5	5
25	Нурлатский	19				34	г. Казань	3	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье



г.Нижнекамск, жилой дом № 23 по ул.Менделеева
Торжественное заселение 30 детей-сирот



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			19.08.17	19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка	
1	Агрызский	2	2	0	0	0	0	
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0	
3	Аксубаевский	3	3	3	0	2	0	
4	Алькеевский	1	1	0	0	0	0	
5	Арский	1	1	1	0	0	0	
6	Бугульминский	2	2	2	+2	0	0	
7	Буинский	4	4	4	+1	0	0	
8	Дрожжановский	4	4	3	0	0	0	
9	г.Казань	2	2	1	0	0	0	
ИТОГО		50	50	35	+4	7	0	



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			19.08.17	19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка	
12	Кукморский	6	6	6	0	0	0	
13	Лениногорский	3	3	3	+1	0	0	
14	Мамадышский	9	9	7	0	3	0	
15	Нижнекамский	1	1	1	0	0	0	
16	Н.Челны	1	1	0	0	0	0	
17	Сармановский	2	2	0	0	0	0	
18	Спасский	1	1	1	0	0	0	
19	Тетюшский	1	1	1	0	0	0	
20	Чистопольский	2	2	2	0	2	0	
21	Ютазинский	4	4	0	0	0	0	
ИТОГО		50	50	35	+4	7	0	



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	14
6	Лаишевский	1					
ИТОГО						61	45



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2	0	1	+1	0	0
3	Арский	2	2	0	0	0	0	0
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	0	1	
8	Кукморский	1	1	+1	0		0	
9	Н.Челны	3	3		3		3	
10	Нижнекамский	2	2		2		2	
11	Тетюшский	1	1	0	1	+1	1	+1
12	г.Казань	2	2	0	1	0	1	0
ИТОГО по РТ		19	19	+1	13	+2	12	+1



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка	19.08.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	2	+2	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	0	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	+1	1	+1
10	Нижнекамский	3	3	0	1	+1	1	+1
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	0	0	0	0	0	0
13	г.Казань	9	6	+2	3	+3	0	0
ИТОГО		26	20	+4	11	+5	8	+2




Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

26

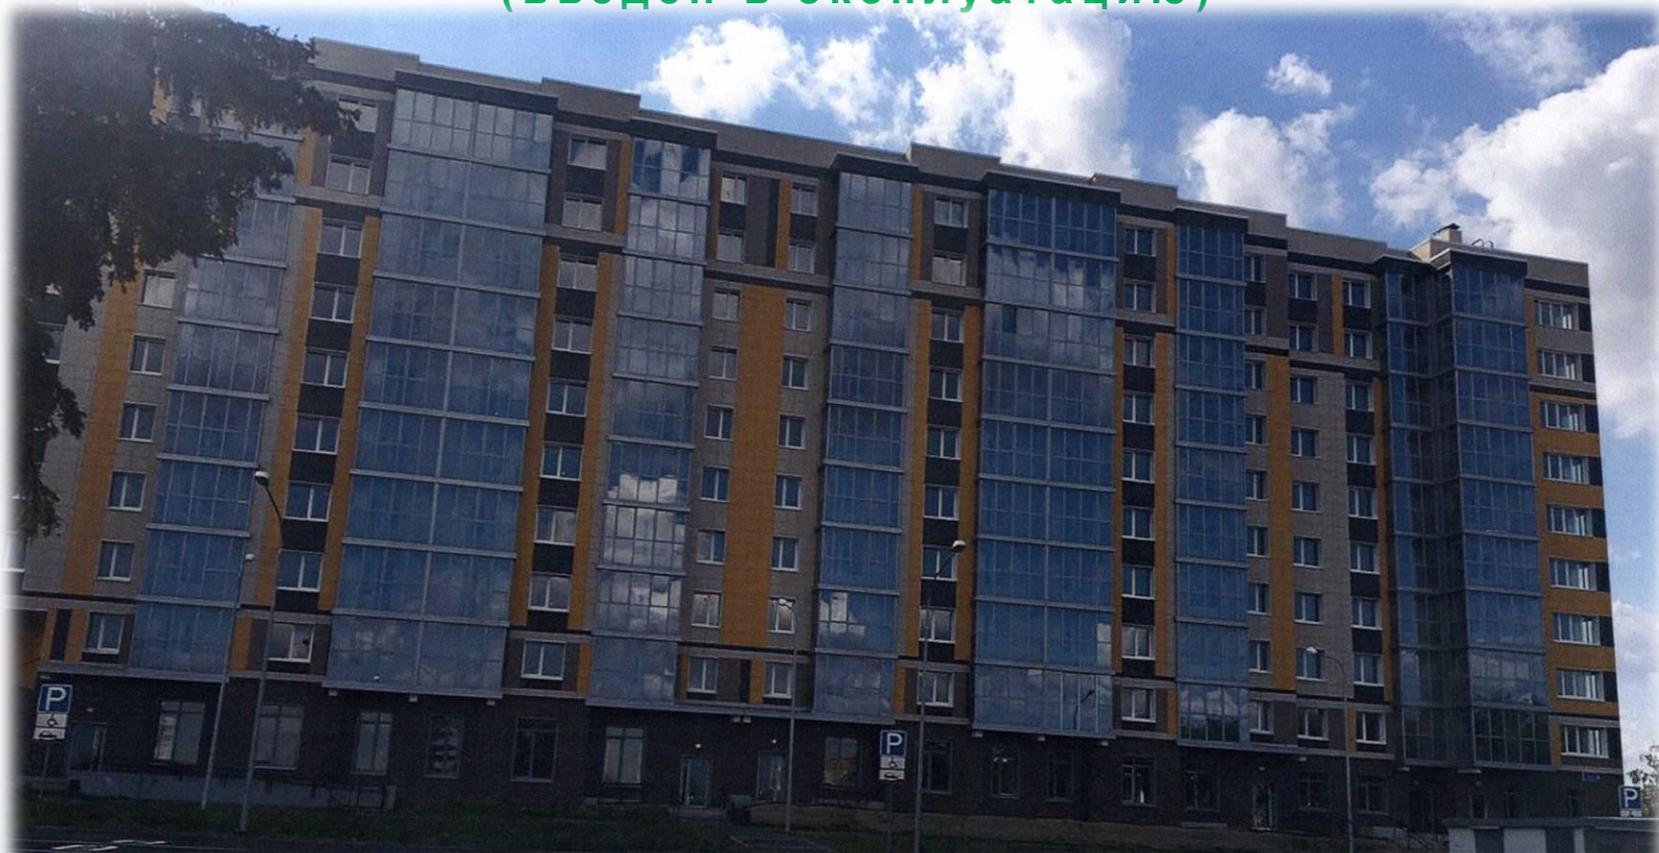

г.Казань, 556- кв. жилой дом № 4 по ул.Тэцевская ЖК «Острова»
Застройщик – ООО «Казанские окна»



Многоквартирное инвестиционное жилье

27

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		64	33	31
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	-	1
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	7	4	3
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	4	2	2
7	Лениногорский	1	1	-
8	Нижнекамский	2	1	1
9	г.Набережные Челны	23	12	11
10	г.Казань	22	10	12



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	6 067	2 733



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



Верхнеуслонский район, п.Бакча Сарай
Генподрядчик: ООО «БарсЭлитСтрой»



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Алькеевский, с.Старое Камкино	50	6 366,25	100	-
2	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50	6 366,25	100	-
3	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50	6 366,25	100	-
4	Заинский, с.Поповка	50	6 366,25	100	-
5	Кайбицкий, с.Янсуринское	50	6 366,25	100	-
6	Бугульминский, п.Плодопитомник	50	6 366,25	100	2
7	Нурлатский, д.Ерепкино	50	6 366,25	99	1
8	Арский, с.Сарай-Чекурча	50	6 366,25	99	2
9	Тетюшский, д.Вожжи	50	6 366,25	99	4
10	Нижнекамский, с.Городище	50	6 366,25	98	2



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
11	Мензелинский, с.Бикбулово	50	6 366,25	98	9
12	Сабинский, д.Нижний Симет	50	6 366,25	97	1
13	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50	6 366,25	95	1
14	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50	6 366,25	95	2
15	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50	6 366,25	94	1
16	Мамадышский, с.Соколка	100	12 752,31	92	9
17	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50	6 366,25	88	2
18	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50	6 366,25	86	12
19	Ютазинский, п. Подгорный	100	12 752,31	84	8
20	Менделеевский, с.Тойгузино	50	6 366,25	83	6



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
21	Агрызский, с.Азеево	50	6 366,25	82	5
22	Тюлячинский, д.Ачи	50	6 366,25	80	23
23	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100	12 752,31	72	2
24	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50	6 366,25	70	5
25	Мензелинский, с.Калтаково	50	6 366,25	69	2
26	Высокогорский, п.Дачное	200	14 794,84	68	7
27	г.Казань, жилой массив Отары	300	17 831,43	65	3
28	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50	22 000,00	60	15
29	Зеленодольский, с.Нурлаты	300	17 831,43	55	10
30	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50	6 366,25	54	2
31	г.Наб. Челны, пр.Чулман п.Прибрежный	300	17 831,43	39	1



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
2	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
3	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	-
4	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
5	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
6	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
8	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
9	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
10	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
11	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-
12	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	99	-
13	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	99	1
14	Актанышский, с.Актаныш	1 200	87	2
15	г.Казань	2 000	42	15



Фельдшерско-акушерские пункты

37



Спасский район, с.Полянка

Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Азнакаевский» Сапеевский				
2	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
3	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
4	«Альметьевский» Маметьевский				
5	«Арский» Нусинский				
6	«Апастовский» Мурзинский				
7	«Бавлинский» Александровский				
8	«Бугульминский» Спасский				
9	«Буинский» Кайбицкий				
10	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
11	«Елабужский» Малоречинский				
12	«Заинский» Александрово-Слободский				
13	«Камско-Полянский» Свердловецкий				
14	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				



Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
16	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский				
17	«Сабинский» Два Поля Арташский				
18	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
19	«Спасский» Полянский				
20	«Тукаевский» Малтабаровский				
21	«Тетюшский» Кляшевский				
22	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
23	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
24	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
25	«Агрызский» Бимский				
26	«Аксубаевский» Кривоозерский				
27	«Актанышский» Кировский				
28	«Атнинский» Берескинский				
29	«Балтасинский» Кугунурский				



Фельдшерско-акушерские пункты

40

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
31	«Высокогорский» Мало-Сулабашский				
32	«Зеленодольский» Кугеевский				
33	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
34	«Камско-Устьинский» Кирельский				
35	«Кукморский» Олуязский				
36	«Лаишевский» Нармонский				
37	«Лениногорский» Каркалинский				
38	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
39	«Менделеевский» Бизякинский				
40	«Нурлатский» Богдашкинский				
41	«Пестречинский» Богородский				
42	«Ютазинский» Байряк-Тамакский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Высокогорский				
3	Нижнекамский				
4	Муслюмовский				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Пестречинский				
2	г.Казань				
3	Заинский				
4	Сармановский				
5	Высокогорский				
6	Елабужский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно- поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	98,6	-	<i>не предусмотрено</i>	98,6
2	Бугульминский	100	-	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	85,6	6,6	85,6	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	80,25	2,2	100	73,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	50
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	72



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
1	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	15,0	5,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	16,0	6,0
5	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	16,0	4,0
6	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	16,5	5,0
7	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	16,5	4,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	17,0	3,0
9	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	17,0	8,0
10	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	17,0	4,5
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	18,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	18,0	4,5
13	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	18,0	3,0
14	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	18,0	2,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	18,5	6,5
16	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	19,0	2,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	19,0	3,5
18	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	20,0	5,0
19	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	22,0	3,0
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	22,0	5,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	22,5	5,5
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	23,0	20,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	23,0	8,0
24	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	23,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	25,0	5,0
26	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	25,0	5,0
27	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	25,0	4,0
28	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	25,0	4,0
29	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	25,0	7,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	26,0	11,0
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	27,0	4,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	27,0	10,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	27,0	2,0
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	27,0	6,0
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	27,0	4,0
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	28,0	3,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	28,0	3,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	29,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
39	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	30,0	9,0
40	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	30,0	10,0
41	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	30,0	5,0
42	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	32,0	9,0
43	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	32,0	9,0
44	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	32,0	5,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	32,0	4,0
46	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	33,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
47	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	33,0	5,0
48	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	33,0	12,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	34,0	7,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	34,0	4,0
51	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	35,0	6,0
52	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	35,0	4,0
53	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	35,0	6,0
54	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	35,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
55	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	35,0	3,0
56	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	35,0	6,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	35,0	14,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	37,0	6,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	38,0	3,5
60	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	38,0	2,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	39,0	12,0
62	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	39,0	21,0
63	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	45,0	15,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	27,4	5,5
64	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	48,0	4,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	50,0	5,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	51,0	4,0
67	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	55,0	15,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	55,0	37,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	57,0	5,0
70	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	60,0	10,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	64,0	29,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	65,0	3,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	70,0	31,0
74	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	78,0	5,0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

53

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	100	0
2	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	97,6	5,1
3	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	96	5,8
4	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	96	2
5	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	95,4	8,1
6	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	95	1
7	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	93,6	3,6
8	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	89,3	6,8
9	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	88	1,5
10	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	85,3	15
11	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	82,1	3,6



Строительство пунктов комплексного обслуживания населения в 2017 г.

54

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Строительство пунктов комплексного обслуживания населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ	53 объекта	83,953

Утверждено РКМ РТ № 968-р от 12.05.2017



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский, с.Левашево				
2	Заинский, с.Имянлебаш				
3	Черемшанский, д.Якты-Тау				
4	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка				
5	Заинский, с.Куш-Елга				
6	Агрызский, с.Варклед-Бодья				
7	Агрызский, с.Пелемеш				
8	Азнакаевский, д.Агирово				
9	Актанышский, с.Старое Тлякеево				
10	Актанышский, с.Новое Курмашево				
11	Алексеевский, с.Большие Тиганы				
12	Алькеевский, с.Новые Салманы				
13	Альметьевский, д.Кителга				
14	Бавлинский, с.Салихово				



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Бавлинский, д.Измайлово				
16	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть				
17	Бугульминский, д.Чирково				
18	Бугульминский, д.Елховка				
19	Буинский, с.Бикмуразово				
20	Буинский, с.Бикмуразово				
21	Верхнеуслонский, с.Сеитово				
22	Верхнеуслонский, с.Ключищи				
23	Высокогорский, п.Новый Поселок				
24	Высокогорский, д.Макаровка				
25	Высокогорский, д.Яшь Кеч				
26	Елабужский, д.Большая Тарловка				
27	Кайбицкий, д.Баймурзино				
28	Кайбицкий, с.Федоровское				



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Камско-Устьинский, с.Антоновка				
30	Камско-Устьинский, с.Кирельское				
31	Кукморский, д.Татарская Тулба				
32	Кукморский, с.Псяк				
33	Лаишевский, с.Курманаково				
34	Лаишевский, с.Карадули				
35	Мамадышский, д.Тогуз				
36	Мензелинский, д.Усаево				
37	Мензелинский, д.Дружба				
38	Новошешминский, с.Акбуре				
39	Новошешминский, с.Шахмайкино				
40	Нурлатский, п.Чишма				
41	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка				
42	Сабинский, с.Малый Шинар				



Пункты комплексного обслуживания населения

58

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
43	Сабинский, с.Шемордан				
44	Сармановский, д.Яхши-Каран				
45	Сармановский, с.Рантамак				
46	Спасский, с.Танкеевка				
47	Тетюшский, с.Малые Атряси				
48	Тетюшский, с.Пролей-Каша				
49	Тукаевский, с.Старые Гардали				
50	Чистопольский, д.Данауровка				
51	Чистопольский, с.Бахта				
52	Чистопольский, с.Татарское Адельшино				
53	Ютазинский, д.Алабакуль				



Универсальные спортивные площадки



**Агрызский МО, с.Кучуково, ул.Тукая, д.2;
Подрядчик: ООО «СК «СтройГрад»»**



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
1	Агрызский	2	100	100	-
2	Азнакаевский	3	100	100	-
3	Альметьевский	3	100	100	-
4	Апастовский	1	100	100	-
5	Арский	2	100	100	-
6	Бавлинский	1	100	100	-
7	Бугульминский	2	100	100	-
8	Буинский	2	100	100	-
9	Высокогорский	2	100	100	-
10	г.Наб. Челны	6	100	100	-
11	Елабужский	2	100	100	-
12	Заинский	2	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
13	Зеленодольский	5	100	100	-
14	Кукморский	2	100	100	1
15	Мамадышский	1	100	100	-
16	Менделеевский	4	100	100	-
17	Мензелинский	2	100	100	-
18	Нурлатский	2	100	100	-
19	Пестречинский	1	100	100	2
20	Сабинский	3	100	100	-
21	Сармановский	1	100	100	-
22	Черемшанский	1	100	100	36
23	Чистопольский	2	100	100	-
24	Нижнекамский	4	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
25	Балтасинский	3	100	100	-
26	Верх.-Услонский	3	100	100	-
27	Новошешминский	3	100	100	-
28	Рыб.-Слободский	3	100	100	17
29	Кайбицкий	2	100	100	5
30	Лаишевский	2	100	100	-
31	Тетюшский	2	100	100	-
32	Актанышский	1	100	99	1
33	Алексеевский	2	100	99	1
34	Спасский	2	100	99	1
35	г.Казань	15	100	97	1
36	Атнинский	2	100	96	30

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
37	Дрожжановский	3	100	94	12
38	Лениногорский	2	100	85	1
39	Тюлячинский	3	100	81	8
40	Алькеевский	3	100	80	8
41	Ютазинский	3	100	79	1
42	Аксубаевский	3	100	72	7
43	Тукаевский	2	100	63	1
44	Муслюмовский	3	99	75	10
45	Кам.-Устьинский	2	98	53	2

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Строительство блочно-модульных лыжных баз, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	11 объектов	66,00

Утверждено РКМ РТ № 2808-р от 06.12.2016

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.08.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.08.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.08.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.08.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.08.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	+	30.08.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.08.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.08.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.08.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.08.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.08.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.08.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.08.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.08.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.08.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

73

Выполнение плана на 18 августа

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	915	98,3	1 032	1 011	98	1 032	972	95	1 032	874	85
МКД Спец.счета	178	168	94,4	184	184	100	-	-		184	170	92
СКБ				164	135	82	164	164	100	164	127	77
ИТОГО:	1 109	1 083	97,6	1 380	1 330	96,4	1 196	1 031	96	1 380	1 171	85

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	76,62	77,05	100,56
СМР	44,53	44,96	100,96
Оборудование	32,09	32,09	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	143,38	143,94	100,39
СМР	111,29	111,85	100,51
Оборудование	32,09	32,09	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	2 485,19	2 488,20	100,13

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	13,90	14,31	102,95
СМР	13,90	14,31	102,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	35,81	36,42	101,70
СМР	35,81	36,42	101,70
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	228,22	241,60	105,86

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	32,93	33,28	101,06
СМР	32,93	33,28	101,06
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	83,62	84,07	100,53
СМР	83,62	84,07	100,53
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	905,50	912,31	100,75

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	10,09	10,36	102,67
СМР	10,09	10,36	102,67
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	23,29	23,69	101,71
СМР	23,29	23,69	101,71
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	159,54	159,51	98,99

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	168,70	169,55	100,50
СМР	128,70	129,55	100,66
Оборудование	40,00	40,00	100,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	299,97	302,31	100,78
СМР	156,39	158,73	101,50
Оборудование	143,58	143,58	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	865,62	868,51	100,33

**Строительство школы 1224 места
в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	37,15	37,78	101,70
СМР	37,15	37,78	101,70
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	105,29	106,83	101,46
СМР	105,29	106,83	101,46
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	629,66	630,41	100,12

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	5,93	6,01	101,77
СМР	5,93	6,01	101,77
Оборудование			
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	11,81	12,01	101,69
СМР	11,81	12,01	101,69
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	37,77	38,01	100,63

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (12.08.2017г. – 18.08.2017г.)	1,20	1,15	95,83
СМР	1,20	1,15	95,83
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 18.08.2017г.)	3,12	3,03	97,12
СМР	3,12	3,03	97,12
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2017г.)	83,38	81,61	97,87
СМР	83,38	81,61	97,87
