



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

| Наименование | Количество несчастных случаев, ед. | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Всего | в том числе: | |
| | | со смертельным исходом | с тяжелым исходом |
| январь - июль 2015 года | 25 | 7 | 18 |
| январь - июль 2016 года | 16 | 5 | 11 |
| январь – июль 2017 года | 10 | 3 | 7 |
| январь – июль 2018 года | 9 | 5 | 4 |



Травматизм в строительной отрасли (смертельные случаи в разрезе МО)

| № | МО | Количество случаев за январь-июнь, ед. | |
|---|-----------------|--|----------|
| | | 2017г. | 2018г. |
| 1 | г. Казань | - | 2 |
| 2 | г.Наб.Челны | - | 2 |
| 3 | Арский | 1 | - |
| 4 | Нижекамский | - | 1 |
| 5 | Пестречинский | 1 | - |
| | за пределами РТ | 1 | - |
| | ИТОГО: | 3 | 5 |




Травматизм в строительной отрасли

(тяжелые случаи в разрезе МО)

| № | МО | Количество случаев за январь-июнь, ед. | |
|---|-----------------|--|----------|
| | | 2017г. | 2018г. |
| 1 | г. Казань | - | 2 |
| 2 | г.Наб.Челны | 3 | 1 |
| 3 | Бугульминский | 1 | - |
| 5 | Зеленодольский | 1 | - |
| 6 | Нижекамский | - | 1 |
| 7 | за пределами РТ | 2 | - |
| | ИТОГО: | 7 | 4 |



Виды несчастных случаев

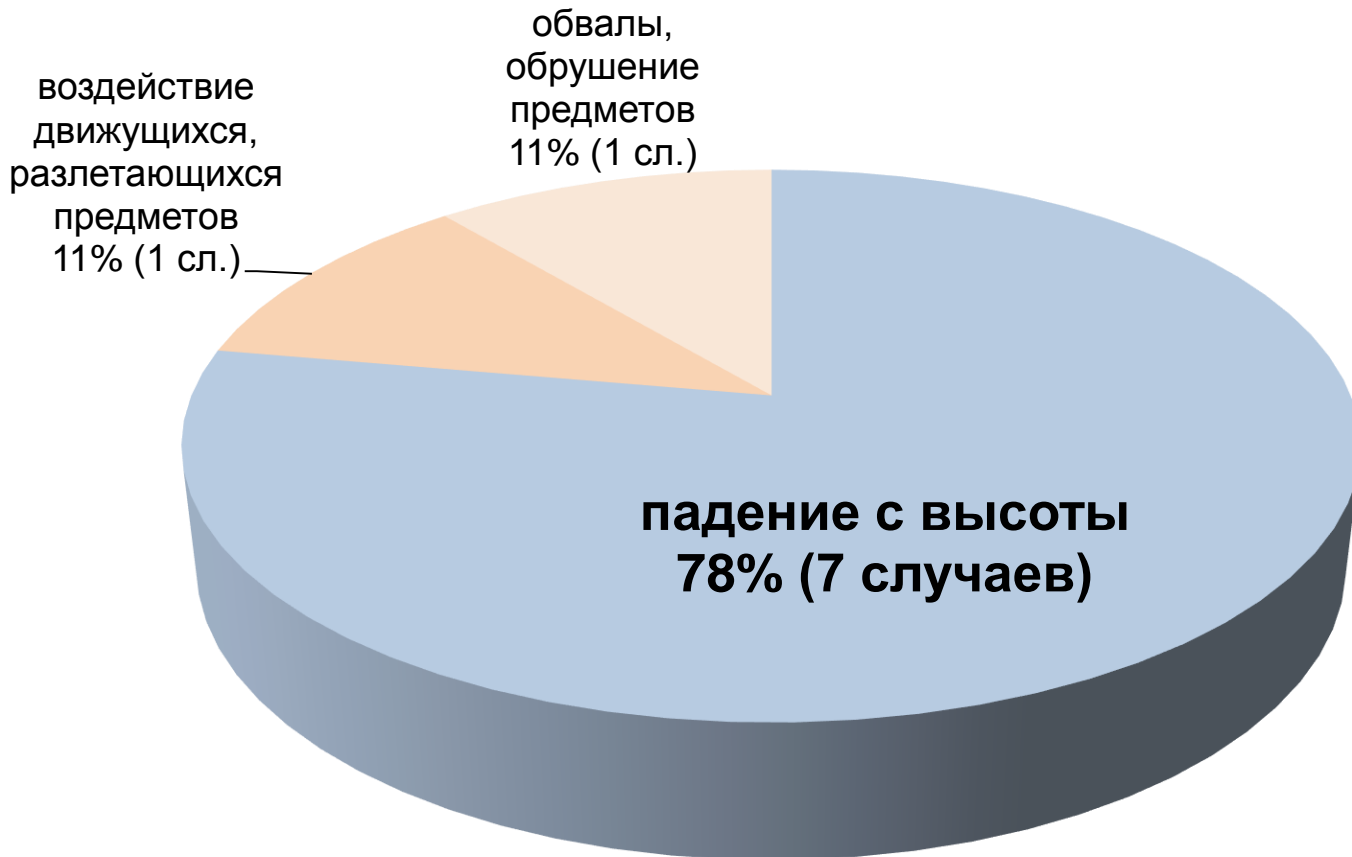



Строительство ж/д в мкр.4-5 , г.Елабуга



Работники допущены
к работе без средств
индивидуальной защиты

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Домкор»
Генподрядчик: ООО «Домкор Строй»



Строительство котельной, Черемшанский район



Траншея не оборудована переходными мостиками и защитными ограждения

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Генподрядчик: ООО «СК «Континент»

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

| Наименование | Количество, ед. | Сумма, тыс. руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Количество проверок | 749 | - |
| Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений | 246 60 | 9 235,0 - |
| Взыскано всего | 115 | 6 234,0 |
| Не истек срок оплаты | 70 | 2 701,0 |
| Обжалуются в суде | 1 | 300,0 |



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Проведено проверок, в том числе: | 1 169 |
| - с выездом на объекты строительства | 85 |
| Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе: | 636 |
| - выдано предписаний | 273 |
| - приостановлено право осуществлять строительство | 99 |
| - рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО | 38 |
| - выдано предупреждений | 226 |



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 19 июля 2018 года**

9

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 279 125 | 53,2 | 1 123 875 |
| 1 | Лениногорский | 25 000 | 4 934 | 19,7 | 20 066 |
| 2 | Нижнекамский | 110 000 | 28 068 | 25,5 | 81 932 |
| 3 | Новошешминский | 5 000 | 1 304 | 26,1 | 3 696 |
| 4 | Азнакаевский | 25 000 | 6 871 | 27,5 | 18 129 |
| 5 | Атнинский | 4 000 | 1 189 | 29,7 | 2 811 |
| 6 | Апастовский | 12 000 | 3 820 | 31,8 | 8 180 |
| 7 | Арский | 27 000 | 9 059 | 33,6 | 17 941 |
| 8 | г.Наб.Челны | 300 000 | 103 509 | 34,5 | 196 491 |
| 9 | Альметьевский | 155 000 | 57 063 | 36,8 | 97 937 |
| 10 | Бугульминский | 40 000 | 16 075 | 40,2 | 23 925 |
| 11 | Муслюмовский | 8 000 | 3 398 | 42,5 | 4 602 |
| 12 | Кайбицкий | 4 800 | 2 129 | 44,4 | 2 671 |
| 13 | Спасский | 8 000 | 3 620 | 45,3 | 4 380 |
| 14 | Елабужский | 50 000 | 22 958 | 45,9 | 27 042 |
| 15 | Дрожжановский | 6 000 | 2 912 | 48,5 | 3 088 |



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 19 июля 2018 года**

10

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 279 125 | 53,2 | 1 123 875 |
| 16 | Буинский | 15 000 | 7 374 | 49,2 | 7 626 |
| 17 | Сармановский | 10 000 | 4 961 | 49,6 | 5 039 |
| 18 | Нурлатский | 18 000 | 9 062 | 50,3 | 8 938 |
| 19 | Зеленодольский | 120 000 | 60 774 | 50,6 | 59 226 |
| 20 | Сабинский | 18 000 | 9 148 | 50,8 | 8 852 |
| 21 | Тетюшский | 10 000 | 5 116 | 51,2 | 4 884 |
| 22 | К-Устьинский | 10 000 | 5 132 | 51,3 | 4 868 |
| 23 | В-Услонский | 49 000 | 25 148 | 51,3 | 23 852 |
| 24 | Заинский | 17 000 | 8 990 | 52,9 | 8 010 |
| 25 | Балтасинский | 14 000 | 7 523 | 53,7 | 6 477 |
| 26 | Мамадышский | 16 000 | 8 751 | 54,7 | 7 249 |
| 27 | Бавлинский | 17 000 | 9 298 | 54,7 | 7 702 |
| 28 | г.Казань | 800 000 | 437 594 | 54,7 | 362 406 |
| 29 | Агрызский | 20 000 | 11 104 | 55,5 | 8 896 |
| 30 | Р-Слободский | 13 000 | 7 235 | 55,7 | 5 765 |



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 19 июля 2018 года**

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 279 125 | 53,2 | 1 123 875 |
| 31 | Аксубаевский | 8 000 | 4 467 | 55,8 | 3 533 |
| 32 | Чистопольский | 35 000 | 19 581 | 55,9 | 15 419 |
| 33 | Тюлячинский | 7 500 | 4 373 | 58,3 | 3 127 |
| 34 | Мензелинский | 16 000 | 9 333 | 58,3 | 6 667 |
| 35 | Актанышский | 14 000 | 8 473 | 60,5 | 5 527 |
| 36 | Тукаевский | 90 000 | 55 685 | 61,9 | 34 315 |
| 37 | Кукморский | 25 000 | 15 802 | 63,2 | 9 198 |
| 38 | Алексеевский | 14 000 | 8 871 | 63,4 | 5 129 |
| 39 | Менделеевский | 10 000 | 6 600 | 66,0 | 3 400 |
| 40 | Лаишевский | 90 000 | 63 435 | 70,5 | 26 565 |
| 41 | Черемшанский | 4 500 | 3 183 | 70,7 | 1 317 |
| 42 | Алькеевский | 6 500 | 4 618 | 71,0 | 1 882 |
| 43 | Высокогорский | 70 000 | 50 943 | 72,8 | 19 057 |
| 44 | Ютазинский | 10 000 | 7 734 | 77,3 | 2 266 |
| 45 | Пестречинский | 120 000 | 131 908 | 109,9 | - |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 19.07.2018

| | План | Введено | Остаток | Степень готовности | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) | Низкая (0-30%) |
| Количество объектов | 280 | 104 | 176 | 87 | 57 | 32 |
| Количество квартир | 9 247 | 2 831 | 6 416 | 4 841 | 1 380 | 195 |
| Общая площадь (тыс.кв.м.) | 527,0 | 153,9 | 373,1 | 285,6 | 77,5 | 10,0 |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

не начаты строительством

| № | Место расположения, наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | (%) СМР | Примечание |
|---|---|--------------|-----------------|------------|--|
| 1 | Алексеевский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | ООО СК ГИПС | не определен | 0 | Ведется заключение договора подряда |
| 2 | Альметьевский, <i>1 кв. жилой дом – 5 шт.</i> | ГКУ ГИСУ РТ | ООО Камстрой | 0 | ГЖФ исключить объекты из программы на основании письма района |
| 3 | Бавлинский, <i>1 кв. жилой дом – 2 шт.</i> | не определен | не определен | 0 | Ведется заключение договоров инвестирования и подряда |
| 4 | Кайбицкий, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | не определен | не определен | 0 | Сирота в находится в тюрьме. Минобразования РТ исключил из своей программы |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

не начаты строительством

| № | Место расположения, наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | (%) СМР | Примечание |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 5 | Лениногорский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | МКУ ОКС Лениногорского р-на | ООО ЛИС | 0 | Нет средств на строительство наружных сетей и финансирование на строительство объекта от ГЖФ |
| 6 | Новошешминский, <i>1 кв. жилой дом - 4шт.</i> | ГКУ ГИСУ РТ | ИП Сабиров, ИП Манукян | 0 | 2 дома- договоры подписаны, ведется закупка строит. материалов 2 дома - ведется заключение договоров подряда |
| 7 | Бугульминский, 38 кв.ж/д по ул.Герцена 61-70 г.Бугульма | ООО СК ГИПС | ООО Строй- сервис | 0 | Не завершены работы по выносу из зоны строительства эл.сетей (0,4 и 0,6 кВ) |



Арендное жилье 2018 года

| МО РТ, Наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | % готов. |
|---|---------------------------|---------------------|----------|
| Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт. | «СК ГИПС» | ЗАО «Мамадышстрой» | 94% |
| Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт. | УКС ИК Актанышского МР | «ПМК+» | 80% |
| В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт. | «АК БАРС Инжиниринг» | ПСК «АК БАРС Строй» | 71% |
| Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт. | «СК ГИПС» | «Век» | 69% |
| Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт. | ЗАО «Мамадышстрой» | «ПСК «Народный дом» | 64% |



Арендное жилье 2018 года

| МО РТ, Наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | % готов. |
|---|---------------|--|----------|
| Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 11 шт. | «СК ГИПС» | «Керамика Маркет» | 55% |
| Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт. | «СК ГИПС» | «Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф» | 48% |
| Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт. | ГКУ «ГИСУ РТ» | «Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой» | 22% |
| Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт. | ГКУ «ГИСУ РТ» | «ИП Сабиров», «ИП Манукян» | 3% |
| Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт. | не определен | не определен | 0% |



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

| № | МО РТ | Кол-во объектов | Кол-во квартир | Степень готовности объектов | |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) |
| Всего по РТ | | 9 | 19 | 7 | 2 |
| 1 | Альметьевский | 1 | 3 | - | 1 |
| 2 | Арский | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | г. Казань | 6 | 14 | 6 | - |
| 4 | г. Наб.Челны | 1 | 1 | - | 1 |



Реализация прав детей-сирот на жилье

| № | МО РТ | Помещений, | | | | № | МО РТ | Помещений, | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Выставлено для выбора | Из них: | | | | | Выставлено для выбора | Из них | | |
| | | | Право ГЖФ | Право РТ | Заселено | | | | Право ГЖФ | Право РТ | Заселено |
| ИТОГО по РТ | | | | | | | 219 | 64 | 62 | 62 | |
| 1 | Азнакаевский | 3 | | | 10 | Мамадышский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Алексеевский | 2 | | | 11 | Нижнекамский | 24 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Алькеевский | 7 | | | 12 | Новошешминский | 2 | 2 | | | |
| 4 | Апастовский | 2 | 2 | 2 | 13 | Пестречинский | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | Бугульминский | 13 | 5 | 5 | 14 | Спасский | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 6 | Елабужский | 12 | 12 | 12 | 15 | Тукаевский | 1 | | | | |
| 7 | Зеленодольский | 5 | | | 16 | Тюлячинский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Кам.-Устьинский | 5 | 5 | 5 | 17 | Чистопольский | 16 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | Лаишевский | 21 | | | 18 | г. Казань | 73 | | | | |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | В базе ГЖФ | Закреплено помещений | Оплачено | |
| | | | | | 20.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Агрызский | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Актанышский | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Алексеевский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Альметьевский | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Арский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Бугульминский | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Буинский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Елабужский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Заинский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Зеленодольский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Кайбицкий | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Кукморский | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО | | 46 | 46 | 46 | 21 | +1 |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | В базе ГЖФ | Закреплено помещений | Оплачено | |
| | | | | | 20.07.18 | Дин-ка |
| 13 | Лениногорский | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 14 | Менделеевский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Муслюмовский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Наб.Челны | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Нижнекамский | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Р.-Слободский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Сармановский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Тукаевский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Черемшанский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Чистопольский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО | | 46 | 46 | 46 | 21 | +1 |



Молодые семьи

| № | МО РТ | Квоты | № | МО РТ | Квоты |
|--------------|----------------|-------|----|---------------|-----------|
| 1 | Альметьевский | 1 | 7 | Лениногорский | 1 |
| 2 | Бавлинский | 1 | 8 | Нижнекамский | 11 |
| 3 | Бугульминский | 1 | 9 | Нурлатский | 1 |
| 4 | Высокогорский | 1 | 10 | Сабинский | 1 |
| 5 | Елабужский | 1 | 11 | Ютазинский | 1 |
| 6 | Зеленодольский | 1 | 12 | г.Н.Челны | 16 |
| | | | 13 | г.Казань | 30 |
| ИТОГО | | | | | 67 |



Чернобыльцы

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Алькеевский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | Бугульминский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Елабужский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Н.Челны | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 5 | Нижнекамский | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Рыбно-Слободский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тукаевский | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 8 | г.Казань | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по РТ | | 13 | 12 | +2 | 7 | +1 | 6 | 0 |



Вынужденные переселенцы

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Актанышский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Альметьевский | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Апастовский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | Бавлинский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Верхнеуслонский | 1 | 1 | | 1 | +1 | 1 | +1 |
| 6 | Высокогорский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Елабужский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зеленодольский | 1 | 1 | | 1 | +1 | 1 | +1 |
| 9 | Кукморский | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г.Н.Челны | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нижнекамский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | г.Казань | 13 | 11 | +3 | 5 | +3 | 5 | +3 |
| ИТОГО | | 27 | 22 | +4 | 8 | +5 | 8 | +5 |



Переселенцы с Крайнего Севера

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|--------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Буинский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Верхнеуслонский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | К.-Устьянский | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Уволенные военнослужащие

| № | МО РТ | Форма обеспечения | Гражданин | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|--------|----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | В базе ГЖФ | | Закреплено помещений | | Оплачено | |
| | | | | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка | 20.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Верхне-услонский | Единовременная денежная выплата | 2 | X | х | X | х | 2 | |
| 2 | г.Казань | Единовременная денежная выплата | 3 | X | х | X | х | 2 | |
| | | Жилое помещение | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | 8 | 3 | | 0 | 0 | 4 | |



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

26



**г.Казань 144-кв. жилой дом по ул.Мавлютова ЖК «Три богатыря»
Застройщик – ООО «Конкорд Билд»**



Многоквартирное инвестиционное жилье

| №2 | МО РТ | Кол-во объектов | Степень готовности объектов | |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) |
| Всего по РТ | | 48 | 28 | 20 |
| 1 | Агрызский | 1 | - | 1 |
| 2 | Альметьевский | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Бавлинский | 1 | 1 | - |
| 4 | Елабужский | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Зеленодольский | 1 | - | 1 |
| 6 | Лаишевский | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Пестречинский | 6 | 6 | - |
| 8 | г.Наб.Челны | 12 | 7 | 5 |
| 9 | г.Казань | 19 | 10 | 9 |



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

| | План | Введено | Остаток |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Количество домов | 8 370 | 4 513 | 3 857 |



Долевое строительство

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

| № | Наименование объекта | Заказчик/ застройщик | Площадь (тыс.кв.м.) | Стадия строительства |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань | ООО «ФОН» | 9,0 | 95% |
| 2 | 40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы | ООО «Стройинвест» | 1,5 | 80% |
| 3 | Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань | ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН») | 14,6 | 73% |
| 4 | Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны | ЗАО «ФОН» | 7,4 | 70% |
| 5 | Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань | ООО «ЖК Молодежный» | 5,8 | 55% |
| 6 | Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина» | ООО «Фирма «Свей» | 7,1 | 50% |
| Всего по РТ | | | 45,4 | |



Сельские клубы



Заинский район, с.Карманово
Генподрядчик: ООО "Форвард"



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 65,9 | 8,0 |
| 1 | г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка | 300 | 16 883,2 | 9,0 | 3,0 |
| 2 | Сабинский район, с.Корсабаш | 100 | 12 178,5 | 9,7 | 3,0 |
| 3 | Азнакаевский район, в д.Якты-Куль | 50 | 6 653,2 | 42,0 | 4,0 |
| 4 | Елабужский район, с.Большое Елово | 50 | 6 653,2 | 44,5 | 3,0 |
| 5 | Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал | 50 | 6 653,2 | 45,0 | 7,2 |
| 6 | Агрызский район, с.Салауши | 100 | 12 178,5 | 45,0 | 3,0 |
| 7 | Бавлинский район, д.Муртаза | 50 | 6 653,2 | 47,0 | 5,5 |
| 8 | Сабинский район, д.Тнекеево | 50 | 6 653,2 | 53,7 | 6,2 |
| 9 | Тетюшинский район, с.Бакрчи | 100 | 12 178,5 | 54,4 | 9,6 |
| 10 | Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского | 50 | 6 653,2 | 55,0 | 9,0 |



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 65,9 | 8,0 |
| 11 | Спасский район, с.Измери | 50 | 6 653,2 | 60,0 | 12,2 |
| 12 | Атнинский район, с.Коморгузя | 200 | 14 028,1 | 60,3 | 10,5 |
| 13 | Балтасинский район, с.Янгулово | 200 | 14 028,1 | 63,0 | 3,0 |
| 14 | Арский район, с.Нижняя Ура | 50 | 6 653,2 | 68,0 | 16,0 |
| 15 | Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка | 50 | 6 653,2 | 70,0 | 11,0 |
| 16 | Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября | 200 | 14 028,1 | 71,5 | 6,0 |
| 17 | Алексеевский район, д.Тиган-Буляк | 50 | 6 653,2 | 71,9 | 18,9 |
| 18 | Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино | 50 | 6 653,2 | 77,0 | 6,7 |
| 19 | Рыбно-Слободский район, с.Кукеево | 100 | 12 178,5 | 80,6 | 10,5 |



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 65,9 | 8,0 |
| 20 | Кукморский район, с.Старая Кня | 50 | 6 653,2 | 88,0 | 3,0 |
| 21 | Актанышский район, с.Такталачук | 200 | 14 028,1 | 91,0 | 7,0 |
| 22 | Кайбицкий район, с.Большое Русаково | 100 | 12 178,5 | 94,0 | 14,0 |
| 23 | Дрожжановский район, с.Старое Ильмово | 50 | 6 653,2 | 96,0 | 8,3 |
| 24 | Нурлатский район, д.Салдакаево | 50 | 6 653,2 | 97,0 | 24,7 |
| 25 | Арский район, с.Средние Верези | 50 | 6 653,2 | 98,0 | 1,0 |
| 26 | Алькеевский район, с.Старые Матаки | 100 | 12 178,5 | 98,0 | 8,0 |
| 27 | Заинский район, с.Карманово | 20 | 6653,2 | 100 | 25 |
| 28 | Мамадышский район, с.Зюри | 200 | 14028,1 | 100 | 1,0 |



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

34

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб | СМР, % | Динамика, % |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 29 991,0 | 99,4 | 0,1 |
| 1 | г.Казань | 9 000 | 98 | 1 |
| 2 | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 500 | 99 | 1 |
| 3 | Мензелинский, г.Мензелинск | 600 | 100 | 3 |
| 4 | Балтасинский, пгт.Балтаси | 500 | 100 | 2 |
| 5 | Аксубаевский, пгт.Аксубаево | 1 000 | 100 | - |
| 6 | Спасский, г.Болгар | 500 | 100 | - |
| 7 | Агрызский, г.Агрыз | 500 | 100 | - |
| 8 | Азнакаевский, г.Азнакаево | 500 | 100 | - |
| 9 | Актанышский, с.Актаныш | 500 | 100 | - |
| 10 | Алексеевский, пгт.Алексеевское | 1 000 | 100 | - |
| 11 | Алькеевский, с.Базарные Матаки | 1 000 | 100 | - |
| 12 | Арский, г.Арск | 500 | 100 | - |
| 13 | Бавлинский, г.Бавлы | 1 000 | 100 | - |
| 14 | Бугульминский, г.Бугульма | 1 000 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|-------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 29 991,0 | 99,4 | 0,1 |
| 15 | Буинский, г.Буинск | 1000 | 100 | - |
| 16 | г.Нижнекамск | 500 | 100 | - |
| 17 | Заинский, г.Заинск | 1 500 | 100 | - |
| 18 | Лениногорский, г.Лениногорск | 1 000 | 100 | - |
| 19 | Мамадышский, г.Мамадыш | 750 | 100 | - |
| 20 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44 | 900 | 100 | - |
| 21 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48 | 2 000 | 100 | - |
| 22 | Новошешминский, с.Новошешминск | 500 | 100 | - |
| 23 | Нурлатский, г.Нурлат | 1 000 | 100 | - |
| 24 | Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода | 500 | 100 | - |
| 25 | Тетюшский, г.Тетюши | 1 000 | 100 | - |
| 26 | Черемшанский, с.Черемшан | 991 | 100 | - |
| 27 | Чистопольский район, г.Чистополь | 250 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 19 994,0 | 92,3 | 4,2 |
| 1 | Лениногорский, г.Лениногорск | 2 900 | 60 | 10 |
| 2 | г.Казань | 1 500 | 75 | 19 |
| 3 | Бавлинский, г.Бавлы | 1 500 | 100 | 14 |
| 4 | Апастовский, пгт.Апастово | 700 | 100 | 5 |
| 5 | Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора | 900 | 100 | 2 |
| 6 | Агрызский, г.Агрыз | 700 | 100 | 3 |
| 7 | Кукморский, г.Кукмор | 2 900 | 100 | 2 |
| 8 | Сармановский, с.Сарманово | 350 | 100 | 8 |
| 9 | Алькеевский, с.Базарные Матаки | 800 | 100 | 1 |
| 10 | Тетюшский, г.Тетюши | 800 | 100 | 1 |
| 11 | Актанышский, с.Актаныш | 1 000 | 100 | - |
| 12 | Арский, г.Арск | 900 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 19 994,0 | 92,3 | 4,2 |
| 13 | Буинский, г.Буинск | 800 | 100 | - |
| 14 | Заинский, г.Заинск | 400 | 100 | - |
| 15 | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 700 | 100 | - |
| 16 | Мамадышский, г.Мамадыш | 400 | 100 | - |
| 17 | Нижнекамский, г.Нижнекамск | 1 000 | 100 | - |
| 18 | Пестречинский, с.Пестрецы | 900 | 100 | - |
| 19 | Тюлячинский, с.Тюлячи | 844 | 100 | - |



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 42 282,0 | 69,7 | 12,8 |
| 1 | Апастовский, Каратунское СП | 4 228,2 | 43,0 | 3,0 |
| 2 | Новошешминский, Шахмайкинское СП | 4 228,2 | 55,0 | 3,5 |
| 3 | Азнакаевский, Тумутукское СП | 4 228,2 | 63,3 | 6,6 |
| 4 | Алькеевский, Чувашско-Бродское СП | 4 228,2 | 65,0 | 15,0 |
| 5 | Аксубаевский, Урмандеевское СП | 4 228,2 | 66,0 | 26,0 |
| 6 | Тюлячинский, Тюлячинское СП | 4 228,2 | 67,5 | 7,5 |
| 7 | Альметьевский, Калейкинское СП | 4 228,2 | 74,0 | 5,0 |
| 8 | Нурлатский, Среднекамышлинское СП | 4 228,2 | 75,0 | 3,0 |
| 9 | Лениногорский, Тимяшевское СП | 4 228,2 | 93,0 | 36,0 |
| 10 | Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон | 4 228,2 | 99,0 | 23,0 |



Фельдшерско-акушерские пункты

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|---------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 1 | Заинский, Бухарайский | | | | |
| 2 | Менделеевский, Енабердинский | | | | |
| 3 | Сармановский, Рантамакский | | | | |
| 4 | Альметьевский, Бутинский | | | | |
| 5 | Бугульминский, Батырский | | | | |
| 6 | Новошешминский, Акбуринский | | | | |
| 7 | Черемшанский, Ново-Ильмовский | | | | |
| 8 | Актанышский, Азякульский | | | | |
| 9 | Нурлатский, Средне-Камышлинский | | | | |
| 10 | Бавлинский, Кзыл-Ярский | | | | |
| 11 | Ютазинский, Старо-Урусинский | | | | |
| 12 | Апастовский, Деушевский | | | | |
| 13 | Аксубаевский, Тахталинский | | | | |
| 14 | Азнакаевский, Маняузский | | | | |
| 15 | Высокогорский, Казакларский | | | | |



Фельдшерско-акушерские пункты

40

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 16 | Мензелинский, Гулюковский | | | | |
| 17 | Муслюмовский, Нижне-Табынский | | | | |
| 18 | Тукаевский, Старогардалинский | | | | |
| 19 | Мамадышский, Большешиинский | | | | |
| 20 | Нижнекамский, Больше-Атинский | | | | |
| 21 | Елабужский, Старо-Куклюкский | | | | |
| 22 | Кукморский, Нижне-Куморский | | | | |
| 23 | Лаишевский, Карадулинский | | | | |
| 24 | Лениногорский, Туктарово-Урдалинский | | | | |
| 25 | Пестречинский, Татарско-Ходяшевский | | | | |
| 26 | Сабинский, Туктарский | | | | |
| 27 | Спасский, Кимский | | | | |
| 28 | Тетюшский, Беденьговский | | | | |
| 29 | Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский | | | | |
| 30 | Чистопольский, Муслюмкинский | | | | |



Фельдшерско-акушерские пункты

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 31 | г.Казань, Борисковский | | | | |
| 32 | Рыб.-Слободский, Масловский | | | | |
| 33 | Алькеевский, Аппаковский | | | | |
| 34 | Агрызский, Девятернинский | | | | |
| 35 | Арский, Старо-Чурилинский | | | | |
| 36 | Атнинский, Комургузинский | | | | |
| 37 | Балтасинский, Мельничный | | | | |
| 38 | Алексеевский, Степношенталинский | | | | |
| 39 | Буинский, Аксунский | | | | |
| 40 | Верх.-Услонский, Печищинский | | | | |
| 41 | Дрожжановский, Старо-Дувановский | | | | |
| 42 | Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский | | | | |
| 43 | Кайбицкий, Федоровский | | | | |
| 44 | Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский | | | | |



Модульно-врачебные амбулатории

42

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети* | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 1 | Альметьевский | | | | |
| 2 | Нижнекамский | | | | |
| 3 | Высокогорский | | | | |
| 4 | Елабужский | - | | | |
| 5 | Зеленодольский | - | | | |
| 6 | Кайбицкий | - | | | |
| 7 | Лаишевский | - | | | |
| 8 | Пестречинский | - | | | |
| 9 | Чистопольский | - | | | |
| 10 | г.Казань (Салмачи) | - | | | |
| 11 | г.Казань (Мирный) | - | | | |

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

| № | МО РТ | Лимит | СМР % | Динамика % |
|---|---|------------------|-------------|---------------|
| | ИТОГО | 68 174,13 | 83,9 | 4,9 |
| 1 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2 | 1 700,00 | 90 | 5 |
| 2 | ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» | 7 700,00 | 80 | 7 |
| 3 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 36 387,79 | 77 | 5 |
| 4 | ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3 | 2 000,00 | 98 | 9 |
| 5 | ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а | 10 653,23 | 95 | 5 |
| 6 | Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница» | 3 892,65 | 92 | 1 |
| 7 | ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» | 5 840,46 | 100 | 2 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 94 из 97 | 73,7 | 52,2 | 17,2 |
| 1 | Алькеевский | 2 из 2 | 100 | 100,0 | 1,4 |
| 2 | Пестречинский | 1 из 1 | 100 | 100,0 | 5,9 |
| 3 | Высокогорский | 4 из 4 | 100 | 100,0 | 20,0 |
| 4 | Сармановский | 1 из 1 | 100 | 100,0 | 5,0 |
| 5 | Атнинский | 2 из 2 | 100 | 99,4 | 21,9 |
| 6 | Заинский | 3 из 3 | 100 | 97,9 | 10,8 |
| 7 | Бавлинский | 1 из 1 | 100 | 90,0 | 44,0 |
| 8 | г.Казань | 12 из 13 | 100 | 87,2 | 41,1 |
| 9 | Азнакаевский | 2 из 2 | 100 | 77,3 | 24,8 |
| 10 | Зеленодольский | 4 из 4 | 100 | 73,8 | 3,0 |
| 11 | Чистопольский | 3 из 3 | 100 | 66,5 | 4,7 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания, % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 94 из 97 | 73,7 | 52,2 | 17,2 |
| 12 | Ютазинский | 2 из 2 | 100 | 64,8 | 37,3 |
| 13 | Арский | 2 из 2 | 100 | 64,0 | 28,0 |
| 14 | Лениногорский | 2 из 2 | 100 | 63,3 | 36,2 |
| 15 | Нижнекамский | 3 из 3 | 100 | 62,0 | 12,7 |
| 16 | Альметьевский | 5 из 5 | 72 | 59,8 | 35,0 |
| 17 | г.Наб. Челны | 5 из 5 | 100 | 58,1 | 27,3 |
| 18 | Лаишевский | 1 из 1 | 100 | 57,5 | 1,0 |
| 19 | Тюлячинский | 2 из 2 | 85 | 57,3 | 36,0 |
| 20 | Новошешминский | 1 из 1 | 100 | 57,0 | 26,8 |
| 21 | Бугульминский | 3 из 3 | 83 | 55,3 | 26,3 |
| 22 | Рыб.-Слободский | 1 из 1 | 100 | 55,0 | 12,5 |
| 23 | Агрызский | 1 из 1 | 100 | 54,0 | 26,8 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания, % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 94 из 97 | 73,7 | 52,2 | 17,2 |
| 24 | Муслюмовский | 1 из 1 | 100 | 53,5 | 1,5 |
| 25 | Актанышский | 1 из 1 | 100 | 52,8 | 11,3 |
| 26 | Нурлатский | 3 из 3 | 57 | 51,9 | 30,4 |
| 27 | Дрожжановский | 1 из 1 | 100 | 51,0 | 29,0 |
| 28 | Елабужский | 3 из 3 | 73 | 50,5 | 44,8 |
| 29 | Буинский | 1 из 1 | 100 | 50,0 | 8,0 |
| 30 | Мензелинский | 1 из 1 | 100 | 45,0 | 33,0 |
| 31 | Мамадышский | 3 из 3 | 87 | 39,4 | 29,7 |
| 32 | Тукаевский | 1 из 1 | 100 | 37,0 | 2,0 |
| 33 | Спасский | 2 из 2 | 95 | 33,3 | 22,3 |
| 34 | Сабинский | 2 из 2 | 100 | 30,4 | 15,7 |
| 35 | Алексеевский | 1 из 1 | 80 | 29,0 | 5,0 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания, % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 94 из 97 | 73,7 | 52,2 | 17,2 |
| 36 | Верх.-Услонский | 1 из 1 | 70 | 29,0 | 16,5 |
| 37 | Кукморский | 2 из 3 | 66 | 28,2 | 2,3 |
| 38 | Аксубаевский | 1 из 1 | 50 | 24,0 | 14,0 |
| 39 | Черемшанский | 1 из 1 | 70 | 21,0 | 3,0 |
| 40 | Балтасинский | 1 из 2 | 25 | 7,5 | 7,5 |
| 41 | Кайбицкий | 1 из 1 | 20 | 6,0 | 6,0 |
| 42 | Апастовский | 1 из 1 | 15 | 4,5 | 3,0 |
| 43 | Менделеевский | 1 из 1 | 15 | 4,5 | 1,0 |
| 44 | Тетюшский | 1 из 1 | 10 | 2,5 | 2,5 |
| 45 | Кам.-Устьинский | 1 из 1 | 5 | 1,5 | 1,5 |



Строительство блочных модульных лыжных баз

48

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 109 748,84 | 35,7 | 16,6 |
| 1 | Буинский | 6 924,55 | 100 | - |
| 2 | Елабужский | 6 576,58 | 86,5 | 71,5 |
| 3 | Актанышский | 6 924,55 | 85 | 62 |
| 4 | Зеленодольский | 6 576,58 | 84,5 | 1,5 |
| 5 | Черемшанский | 6 924,55 | 81 | 64 |
| 6 | Балтасинский | 6 576,58 | 76,75 | 12,75 |
| 7 | Лениногорский | 6 924,55 | 51 | 48,5 |
| 8 | Нижнекамский | 6 924,55 | 5 | 5 |
| 9 | Аксубаевский | 6 924,55 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Азнакаевский | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 11 | Алексеевский | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 12 | Арский | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 13 | Бугульминский | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 14 | Кайбицкий | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 15 | Лаишевский | 6 924,55 | 0,0 | - |
| 16 | Тетюшский | 6 924,55 | 0,0 | - |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.07.2018

49

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 964 285,23 | 23,79 | 2,34 | 6 291 772,98 |
| 1 | Казань | 1 229 833,66 | 61 817,39 | 5,03 | 0,21 | 1 168 016,26 |
| 2 | Сабинский | 105 182,65 | 6 361,82 | 6,05 | 0,00 | 98 820,82 |
| 3 | Тюлячинский | 52 531,73 | 5 008,48 | 9,53 | 0,00 | 47 523,25 |
| 4 | Пестречинский | 134 809,92 | 17 183,26 | 12,75 | 2,58 | 117 626,66 |
| 5 | Арский | 132 405,31 | 18 430,93 | 13,92 | 1,13 | 113 974,39 |
| 6 | Елабужский | 278 316,08 | 40 778,21 | 14,65 | 0,90 | 237 537,87 |
| 7 | Новошешминский | 59 134,20 | 9 720,24 | 16,44 | 0,00 | 49 413,96 |
| 8 | Чистопольский | 314 130,35 | 52 270,70 | 16,64 | 2,72 | 261 859,65 |
| 9 | Рыбно- Слободский | 96 305,25 | 16 507,36 | 17,14 | 0,04 | 79 797,89 |
| 10 | Менделеевский | 98 215,46 | 17 783,06 | 18,11 | 0,70 | 80 432,39 |
| 11 | Зеленодольский | 263 236,02 | 47 798,28 | 18,16 | 1,63 | 215 437,74 |
| 12 | Тукаевский | 157 631,01 | 29 125,63 | 18,48 | 0,00 | 128 505,38 |
| 13 | Н.Челны | 1 136 786,34 | 213 014,25 | 18,74 | 2,50 | 923 772,10 |
| 14 | Нурлатский | 132 560,49 | 26 272,80 | 19,82 | 0,29 | 106 287,69 |
| 15 | Кукморский | 136 958,32 | 27 166,83 | 19,84 | 0,00 | 109 791,49 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.07.2018

50

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 964 285,23 | 23,79 | 2,34 | 6 291 772,98 |
| 16 | Высокогорский | 182 907,20 | 37 415,97 | 20,46 | 4,35 | 145 491,23 |
| 17 | Актанышский | 148 992,92 | 30 738,51 | 20,63 | 0,00 | 118 254,41 |
| 18 | Лениногорский | 397 932,53 | 89 620,62 | 22,52 | 0,19 | 308 311,91 |
| 19 | Альметьевский | 249 813,06 | 59 358,73 | 23,76 | 0,89 | 190 454,33 |
| 20 | Аксубаевский | 73 294,31 | 18 133,06 | 24,74 | 1,40 | 55 161,25 |
| 21 | Мамадышский | 79 517,01 | 22 006,15 | 27,67 | 3,95 | 57 510,86 |
| 22 | Нижнекамский | 403 469,66 | 118 547,89 | 29,38 | 1,10 | 284 921,77 |
| 23 | Ютазинский | 48 956,65 | 15 007,28 | 30,65 | 5,73 | 33 949,37 |
| 24 | Черемшанский | 164 387,40 | 50 554,54 | 30,75 | 0,00 | 113 832,86 |
| 25 | Сармановский | 183 725,44 | 56 707,02 | 30,87 | 1,14 | 127 018,41 |
| 26 | Азнакаевский | 242 906,96 | 77 165,72 | 31,77 | 2,93 | 165 741,24 |
| 27 | Спасский | 85 649,67 | 27 475,08 | 32,08 | 2,22 | 58 174,59 |
| 28 | Мензелинский | 96 815,48 | 31 189,82 | 32,22 | 5,66 | 65 625,65 |
| 29 | Верхнеуслонский | 69 952,07 | 23 877,61 | 34,13 | 18,98 | 46 074,46 |
| 30 | Атнинский | 42 358,98 | 14 672,44 | 34,64 | 0,00 | 27 686,54 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 20.07.2018

51

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Динамика, % | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 964 285,23 | 23,79 | 2,34 | 6 291 772,98 |
| 31 | Алексеевский | 83 440,98 | 29 100,10 | 34,88 | 7,92 | 54 340,88 |
| 32 | Тетюшский | 126 419,08 | 48 902,33 | 38,68 | 3,32 | 77 516,75 |
| 33 | Бавлинский | 46 918,93 | 18 203,79 | 38,80 | 7,74 | 28 715,14 |
| 34 | Агрызский | 35 475,49 | 14 501,17 | 40,88 | 0,00 | 20 974,33 |
| 35 | Бугульминский | 318 541,71 | 136 404,70 | 42,82 | 0,52 | 182 137,00 |
| 36 | Балтасинский | 135 208,00 | 61 254,03 | 45,30 | 6,83 | 73 953,98 |
| 37 | Кайбицкий | 49 777,10 | 23 132,94 | 46,47 | 9,60 | 26 644,17 |
| 38 | Дрожжановский | 25 555,06 | 12 268,42 | 48,01 | 4,06 | 13 286,64 |
| 39 | Муслюмовский | 56 141,07 | 27 499,89 | 48,98 | 15,65 | 28 641,18 |
| 40 | Заинский | 158 095,20 | 86 288,40 | 54,58 | 5,28 | 71 806,80 |
| 41 | Алькеевский | 40 360,00 | 22 365,15 | 55,41 | 2,13 | 17 994,85 |
| 42 | Буинский | 119 651,59 | 66 845,35 | 55,87 | 1,92 | 52 806,23 |
| 43 | Лаишевский | 181 671,18 | 102 061,18 | 56,18 | 7,82 | 79 610,00 |
| 44 | Апастовский | 43 405,04 | 26 953,14 | 62,10 | 30,87 | 16 451,90 |
| 45 | Камско-Устьинский | 36 681,65 | 26 794,97 | 73,05 | 25,45 | 9 886,68 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 20.07.2018

52

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Итого по РТ | | 1 332 603,00 | 447 306,59 | 33,57 | 396 906,70 |
| 1 | Мамадышский | 83 828,63 | 8 166,55 | 9,74 | 8 166,55 |
| 2 | Чистопольский | 23 597,99 | 2 700,00 | 11,44 | 2 700,00 |
| 3 | Дрожжановский | 58 032,09 | 6 984,88 | 12,04 | 6 984,88 |
| 4 | Высокогорский | 44 064,22 | 5 507,10 | 12,50 | 5 507,10 |
| 5 | Лаишевский | 21 593,18 | 3 162,26 | 14,64 | 3 162,26 |
| 6 | Балтасинский | 63 279,08 | 11 141,65 | 17,61 | 11 141,65 |
| 7 | Заинский | 16 083,81 | 3 120,36 | 19,40 | 3 120,36 |
| 8 | Черемшанский | 34 252,06 | 6 672,55 | 19,48 | 6 672,55 |
| 9 | Верхнеуслонский | 34 407,62 | 6 944,35 | 20,18 | 6 944,35 |
| 10 | Буинский | 65 666,51 | 13 601,00 | 20,71 | 13 601,00 |
| 11 | Лениногорский | 29 146,70 | 6 060,55 | 20,79 | 6 060,55 |
| 12 | Бугульминский | 30 196,06 | 6 511,80 | 21,57 | 6 511,80 |
| 13 | Тукаевский | 22 009,71 | 5 019,55 | 22,81 | 5 019,55 |
| 14 | Арский | 32 566,62 | 7 630,80 | 23,43 | 7 630,80 |
| 15 | Сармановский | 29 382,65 | 7 335,10 | 24,96 | 7 335,10 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 20.07.2018

53

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 1 332 603,00 | 447 306,59 | 33,57 | 396 906,70 |
| 16 | Кукморский | 20 286,88 | 5 857,75 | 28,87 | 5 857,75 |
| 17 | Агрызский | 17 675,78 | 5 364,00 | 30,35 | 5 364,00 |
| 18 | Сабинский | 23 549,37 | 7 148,95 | 30,36 | 7 148,95 |
| 19 | Аксубаевский | 27 882,77 | 8 643,53 | 31,00 | 8 394,78 |
| 20 | Тюлячинский | 12 366,69 | 4 054,80 | 32,79 | 4 054,80 |
| 21 | Тетюшский | 42 219,48 | 14 069,78 | 33,33 | 14 069,78 |
| 22 | Муслюмовский | 30 571,58 | 10 405,88 | 34,04 | 10 405,88 |
| 23 | Камско-Устьинский | 15 646,36 | 5 871,84 | 37,53 | 5 871,84 |
| 24 | Алексеевский | 17 176,36 | 6 672,55 | 38,85 | 6 672,55 |
| 25 | Азнакаевский | 18 863,50 | 7 459,75 | 39,55 | 7 459,75 |
| 26 | Казань | 64 506,00 | 25 792,80 | 39,99 | 25 792,80 |
| 27 | Спасский | 26 640,72 | 10 689,41 | 40,12 | 10 689,41 |
| 28 | Апастовский | 23 892,70 | 9 776,08 | 40,92 | 9 776,08 |
| 29 | Пестричинский | 19 118,65 | 7 865,35 | 41,14 | 7 865,35 |
| 30 | Менделеевский | 14 958,11 | 6 401,49 | 42,80 | 5 551,38 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 20.07.2018

54

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 1 332 603,00 | 447 306,59 | 33,57 | 396 906,70 |
| 31 | Нурлатский | 21 220,43 | 9 082,51 | 42,80 | 9 082,51 |
| 32 | Бавлинский | 15 099,37 | 6 732,55 | 44,59 | 6 732,55 |
| 33 | Набережные Челны | 39 800,00 | 17 836,80 | 44,82 | 17 836,80 |
| 34 | Атнинский | 14 758,96 | 6 732,55 | 45,62 | 6 732,55 |
| 35 | Мензелинский | 18 296,40 | 8 352,55 | 45,65 | 7 152,55 |
| 36 | Елабужский | 33 120,83 | 15 764,03 | 47,60 | 13 788,55 |
| 37 | Кайбицкий | 13 443,92 | 6 732,55 | 50,08 | 6 732,55 |
| 38 | Рыбно-Слободский | 36 359,81 | 19 386,55 | 53,32 | 19 386,55 |
| 39 | Алькеевский | 12 588,08 | 6 732,55 | 53,48 | 6 732,55 |
| 40 | Актанышский | 16 786,88 | 9 268,68 | 55,21 | 7 152,55 |
| 41 | Альметьевский | 19 828,34 | 11 166,55 | 56,32 | 11 166,55 |
| 42 | Зеленодольский | 35 332,34 | 19 977,28 | 56,54 | 19 213,39 |
| 43 | Нижнекамский | 23 417,68 | 14 882,71 | 63,55 | 14 882,71 |
| 44 | Новошешминский | 11 913,31 | 9 776,08 | 82,06 | 9 776,08 |
| 45 | Ютазинский | 57 174,75 | 48 250,13 | 84,39 | 5 004,60 |

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «СК «ПромГрадСтрой» | |
| Объем финансирования, млн.руб. | | 288,72 | |
| | | СМР | Оборудование |
| | | ПИР | |
| | | 182,26 | 100,56 |
| | | 5,9 | |
| Начало строительства | | 2016 г. | |
| Срок завершения строительства | | Июнь 2018 г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ (13.07.2018г. – 19.07.2018г.) | 1,24 | 1,20 | 96,77 |
| СМР | 1,24 | 1,20 | 96,77 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2018г. – 19.07.2018г.) | 4,92 | 4,75 | 95,96 |
| СМР | 4,92 | 4,75 | 95,96 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.07.2018г.) | 201,59 | 197,86 | 98,15 |
| СМР | 175,37 | 171,64 | 97,87 |
| Оборудование | 26,22 | 26,22 | 100,00 |
