



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - сентябрь 2015 года	35	11	24
январь - сентябрь 2016 года	23	9	14
январь – сентябрь 2017 года	17	6	11
январь – сентябрь 2018 года	17	6	11



Строительство завода стиральных машин по ул. Промышленная, г. Наб.Челны



Опасные зоны не выделены
предупредительными знаками
при производстве работ крана

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Хайер Лаундри Машин РУС»
Генподрядчик: ООО «Евростиль»



Строительство жилого дома по ул. Б. Урманче, г. Елабуга



Грузовые крюки не снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик и подрядчик: ОАО «Елабужская керамика»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 037	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	303 72	11 823,0 -
Взыскано всего	163	8 585,0
Не истек срок оплаты	67	2 938,0
Отменено решением суда	1	300,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 518
- с выездом на объекты строительства	120
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 011
- выдано предписаний	433
- приостановлено право осуществлять строительство	183
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	92
- выдано предупреждений	303



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 14 сентября 2018 года**

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 553 581	64,7	849 419
1	Азнакаевский	25 000	9 711	38,8	15 289
2	Нижнекамский	110 000	45 505	41,4	64 495
3	Атнинский	4 000	1 814	45,4	2 186
4	Арский	27 000	12 668	46,9	14 332
5	Альметьевский	155 000	73 246	47,3	81 754
6	Апастовский	12 000	5 700	47,5	6 300
7	г.Наб.Челны	300 000	143 690	47,9	156 310
8	Новошешминский	5 000	2 575	51,5	2 425
9	В-Услонский	49 000	26 648	54,4	22 352
10	Буинский	15 000	8 213	54,8	6 787
11	Елабужский	50 000	28 598	57,2	21 402
12	Зеленодольский	120 000	70 712	58,9	49 288
13	Муслюмовский	8 000	4 783	59,8	3 217
14	г.Казань	800 000	478 320	59,8	321 680
15	Спасский	8 000	4 804	60,1	3 196



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 14 сентября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 553 581	64,7	849 419
16	Лениногорский	25 000	15 480	61,9	9 520
17	Сармановский	10 000	6 268	62,7	3 732
18	Бавлинский	17 000	10 666	62,7	6 334
19	К-Устьинский	10 000	6 532	65,3	3 468
20	Аксубаевский	8 000	5 288	66,1	2 712
21	Бугульминский	40 000	26 483	66,2	13 517
22	Нурлатский	18 000	12 177	67,7	5 823
23	Дрожжановский	6 000	4 072	67,9	1 928
24	Сабинский	18 000	12 497	69,4	5 503
25	Актанышский	14 000	9 804	70,0	4 196
26	Агрызский	20 000	14 141	70,7	5 859
27	Заинский	17 000	12 066	71,0	4 934
28	Мензелинский	16 000	11 394	71,2	4 606
29	Чистопольский	35 000	25 207	72,0	9 793
30	Тетюшский	10 000	7 219	72,2	2 781



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 14 сентября 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	1 553 581	64,7	849 419
31	Балтасинский	14 000	10 357	74,0	3 643
32	Тукаевский	90 000	66 689	74,1	23 311
33	Алексеевский	14 000	10 452	74,7	3 548
34	Р-Слободский	13 000	9 829	75,6	3 171
35	Черемшанский	4 500	3 582	79,6	918
36	Мамадышский	16 000	13 139	82,1	2 861
37	Кукморский	25 000	21 250	85,0	3 750
38	Тюлячинский	7 500	6 375	85,0	1 125
39	Менделеевский	10 000	8 621	86,2	1 379
40	Ютазинский	10 000	8 768	87,7	1 232
41	Алькеевский	6 500	5 731	88,2	769
42	Кайбицкий	4 800	4 491	93,6	309
43	Высокогорский	70 000	67 684	96,7	2 316
44	Лаишевский	90 000	88 279	98,1	1 721
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-12 053



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию

9




г. Казань два 255-кв. жилых дома №№ 7-2, 7-3 в ЖР «Салават Купере»
Подрядчик – ООО «Ак Таш»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию

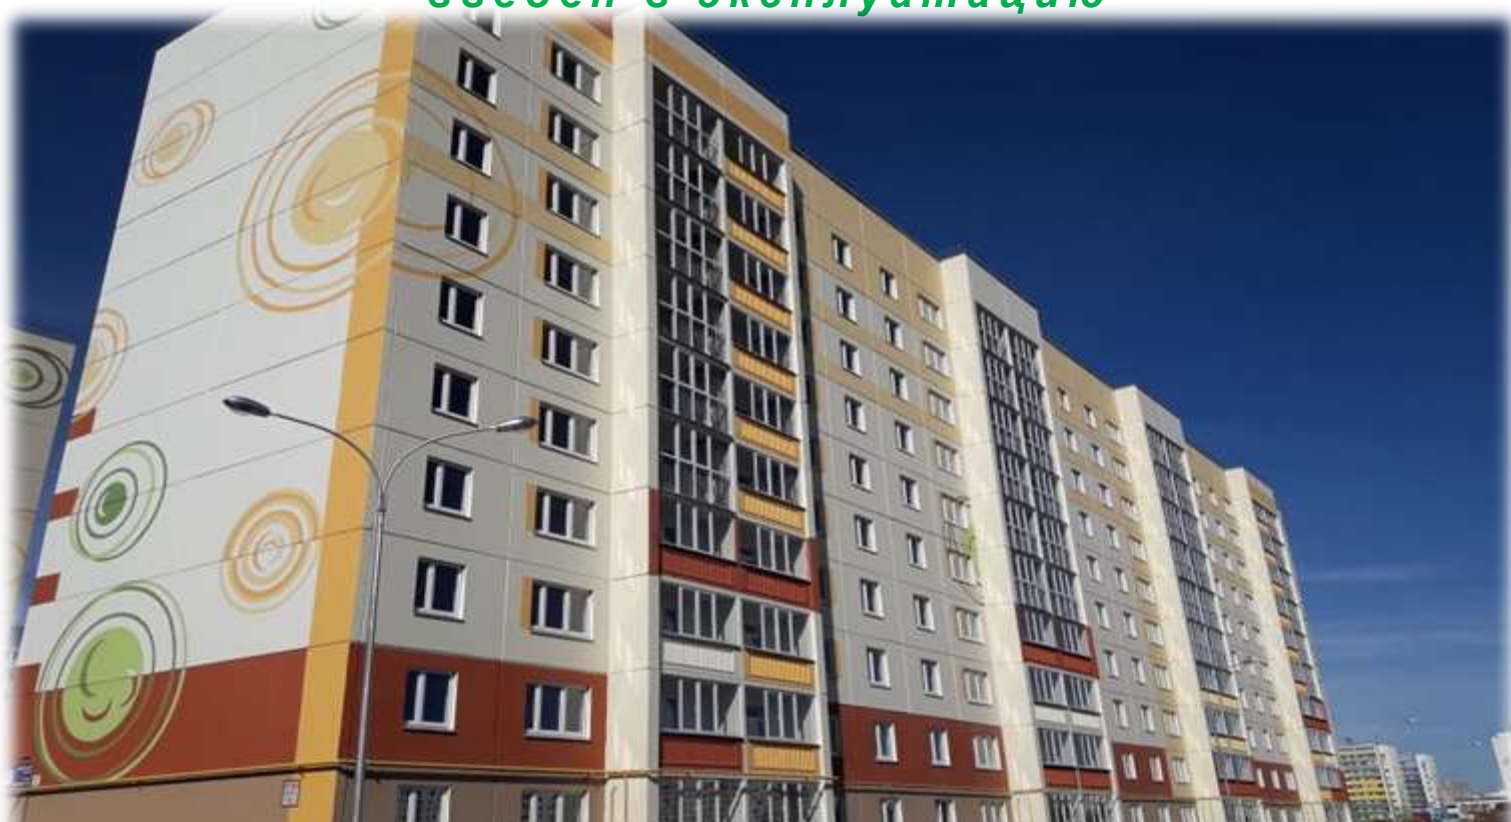

г. Нижнекамск 160-кв. жилой дом №18 в мкр. 49
Подрядчик – ООО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 14.09.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	121	159	93	39	27
Количество квартир	9 247	3 873	5 374	4 467	728	179
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	212,8	314,2	262,6	43,0	8,6



Арендное жилье 2018 года

12

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	98%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	95%
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	90%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	84%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	70%



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВ.
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	68%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	67%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	31%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров», «ИП Манукян»	15%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%
Алексеевский, 1 кв. жилой дом – 1 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Высокая степень готовности объектов (70-100%)
Всего по РТ		8	16	8
1	Альметьевский	1	3	1
2	Арский	1	1	1
3	г. Казань	5	11	5
4	г. Наб.Челны	1	1	1



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ						219	64	64	64		
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1		
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	1	1		
3	Алькеевский	7			12	Новошешминский	2	2	2		
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10		
5	Бугульминский	13	5	5	14	Спасский	21	21	21		
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1				
7	Зеленодольский	5			16	Тюлячинский	1	1	1		
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	4	4		
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73				



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					14.09.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	1	0
2	Актанышский	4	4	4	0	0
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	4	0
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	0	0
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	0	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	28	+2



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					14.09.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	1	0
14	Менделеевский	2	2	2	2	+2
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	0	0
20	Тукаевский	1	1	1	0	0
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	28	+2



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
ИТОГО					67



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1	+1	0	0
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		1	+1	0	0
7	Тукаевский	2	1	0	1	0	1	0
8	г.Казань	3	3		1	0	1	0
ИТОГО по РТ		14	13	0	11	+2	9	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	0	0	0	0	0	0
2	Актанышский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	1	1		0	0	0	0
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	+1
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	
8	Елабужский	1	1		1		1	
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		1	0	1	0
11	г.Н.Челны	3	3	0	2	+1	1	0
12	Нижнекамский	1	1		1		1	
13	г.Казань	13	13	0	10	+2	9	+2
ИТОГО		28	27	0	21	+3	19	+3



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка
1	Буинский	2	1		0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
3	К.-Устьинский	1	1		1		1	
ИТОГО		4	3		2	0	2	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Гражданин	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка	14.09.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	X	X	X	3	
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
ИТОГО			8	3		0	0	5	



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

23



г.Набережные Челны 112 - кв. жилой дом № 58/18
Застройщик – ООО «Нефтехимэнергоснаб»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		42	35	7
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Бавлинский	1	1	-
4	Елабужский	3	2	1
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	3	2	1
7	Пестречинский	5	5	-
8	г.Наб.Челны	7	6	1
9	г.Казань	19	16	3



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	5 872	2 498



Долевое строительство

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	99%
2	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	85%
3	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	80%
4	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55%
6	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			45,4	



Сельские клубы



Алькеевский район, с.Старые Матаки
Подрядчик: ООО "Строитель и К"



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,9	90,3	4,6
1	г.Казань, МФЦ с библиотечкой п.Константиновка	300	16 883,2	30,0	35	15,0
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	30,0	38	9,0
3	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	61,1	78	15,7
4	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	67,6	80	4,0
5	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	81,1	84	2,0
6	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	77,7	90	30,0
7	Тетюшский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	78,7	97	10,7
8	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	93,8	98	6,0
9	Азнакаевский район, д.Якты-Куль	50	6 653,2	49,1	100	19,0
10	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	73,1	100	6,0



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,9	90,3	4,6
11	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	77,5	100	-
12	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	80,0	100	3,0
13	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	83,9	100	-
14	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	84,0	100	-
15	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	87,2	100	4,0
16	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	88,3	100	0,5
17	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	88,8	100	-
18	Балтасинский район, с.Янгулово	50	6 653,2	89,0	100	-
19	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	90,7	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	79,9	90,3	4,6
20	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	91,2	100	2,0
21	Заинский район, с.Карманово	20	6 653,2	91,5	100	-
22	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	91,9	100	-
23	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	92,1	100	-
24	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	92,6	100	-
25	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	92,6	100	-
26	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	92,6	100	-
27	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	95,0	100	-
28	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	95,0	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	87,5
1	г.Казань	9 000	100	66,7
2	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	77,9
3	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	84,5
4	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	94,2
5	Спасский, г.Болгар	500	100	94,5
6	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	97,3
7	г.Нижнекамск	500	100	99
8	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	99,1
9	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	99,2
10	Агрызский, г.Агрыз	500	100	100
11	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	100
12	Актанышский, с.Актаныш	500	100	100
13	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	100
14	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	100



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	87,5
15	Арский, г.Арск	500	100	100
16	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	100
17	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	100
18	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100
19	Буинский, г.Буинск	1000	100	100
20	Заинский, г.Заинск	1 500	100	100
21	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	100
22	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	100
23	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	100
24	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
25	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	100
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	100
27	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

33

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	84,4
1	г.Казань	1 500	100	0
2	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	52,1
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	68,4
4	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	82,7
5	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	86
6	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	86,5
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	87,9
8	Буинский, г.Буинск	800	100	95,5
9	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	98
10	Арский, г.Арск	900	100	99,4
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	99,9
12	Агрызский, г.Агрыз	700	100	100
13	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	84,4
14	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	100
15	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	100
16	Заинский, г.Заинск	400	100	100
17	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	100
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	100
19	Сармановский, с.Сарманово	350	100	100



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

35

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
				на 14.09.18	Дина- мика
	ИТОГО	42 282,0	73,1	100	5,2
1	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	83,0	100	5
2	Нурлатский, Среднекамьшлинское СП	4 228,2	67,9	100	13
3	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	55,8	100	17
4	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	56,4	100	12
5	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	73,7	100	-
6	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	53,1	100	-
7	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	82,4	100	-
8	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	97,3	100	-
9	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	97,3	100	-
10	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	64,3	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
1	Заинский, Бухарайский				
2	Менделеевский, Енабердинский				
3	Сармановский, Рантамакский				
4	Альметьевский, Бутинский				
5	Бугульминский, Батырский				
6	Новошешминский, Акбуринский				
7	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
8	Актанышский, Азякульский				
9	Мензелинский, Гулюковский				
10	Тукаевский, Старогардалинский				
11	Азнакаевский, Маняузский				
12	Аксубаевский, Тахталинский				
13	Алькеевский, Аппаковский				
14	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
15	Мамадышский, Большешиинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
16	Елабужский, Старо-Куклюкский				
17	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
18	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
19	Нижнекамский, Больше-Атинский				
20	Апастовский, Деушевский				
21	Тетюшский, Беденьговский				
22	Сабинский, Туктарский				
23	Буинский, Аксунский				
24	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
25	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
26	Атнинский, Комургузинский				
27	Алексеевский, Степношенталинский				
28	Высокогорский, Казакларский				
29	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
30	Ютазинский, Старо-Уруссинский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Модуль	Завершен монтаж
31	Агрызский, Девятернинский				
32	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
33	Чистопольский, Муслюмкинский				
34	Рыб.-Слободский, Масловский				
35	Кайбицкий, Федоровский				
36	Арский, Старо-Чурилинский				
37	Кукморский, Нижне-Куморский				
38	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
39	Спасский, Кимский				
40	Балтасинский, Мельничный				
41	Верх.-Услонский, Печищинский				
42	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
43	Лаишевский, Карадулинский				
44	г.Казань, Борисковский				



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Кайбицкий				
3	Нижнекамский				
4	Лаишевский				
5	Чистопольский				
6	Высокогорский				
7	Елабужский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	ИТОГО	68 174,13	99,6	3,2
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	36 387,79	99	4
2	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	100	3
3	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	100	2
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	100	1
5	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	100	1
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	-
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Динамика, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	96 из 97	99,9	3,8	57,2
1	г.Казань	12 из 13	92,3	1	48,8
2	Алексеевский	1 из 1	100	41	0
3	Арский	2 из 2	100	-	0
4	Балтасинский	2 из 2	100	-	0
5	Муслюмовский	1 из 1	100	-	0
6	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	4,8	0
7	Сабинский	2 из 2	100	-	0
8	Аксубаевский	1 из 1	100	40,5	1,3
9	Мензелинский	1 из 1	100	-	1,3
10	Кукморский	3 из 3	100	-	9,2
11	Нижнекамский	3 из 3	100	-	16,7
12	Лениногорский	2 из 2	100	20	21,3



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Динамика, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	96 из 97	99,8	3,7	57,2
13	Пестречинский	1 из 1	100	-	24,8
14	Атнинский	2 из 2	100	-	25,7
15	Высокогорский	4 из 4	100	-	29,5
16	г.Наб. Челны	5 из 5	100	-	34,2
17	Нурлатский	3 из 3	100	-	35,7
18	Менделеевский	1 из 1	100	40	37,4
19	Тукаевский	1 из 1	100	-	38,4
20	Черемшанский	1 из 1	100	40	40,8
21	Лаишевский	1 из 1	100	-	48
22	Зеленодольский	4 из 4	100	-	52
23	Елабужский	3 из 3	100	-	60,7
24	Чистопольский	3 из 3	100	-	66,4
25	Тюлячинский	2 из 2	100	-	69,9



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Динамика, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	96 из 97	99,8	3,7	57,2
26	Ютазинский	2 из 2	100	-	84,1
27	Бугульминский	3 из 3	100	10	86
28	Новошешминский	1 из 1	100	-	87,6
29	Агрызский	1 из 1	100	-	88,2
30	Мамадышский	3 из 3	100	-	90,1
31	Актанышский	1 из 1	100	-	91,5
32	Азнакаевский	2 из 2	100	-	97,6
33	Апастовский	1 из 1	100	-	97,7
34	Буинский	1 из 1	100	-	97,8
35	Альметьевский	5 из 5	100	-	98,7
36	Бавлинский	1 из 1	100	-	98,9
37	Кайбицкий	1 из 1	100	40	98,9
38	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	-	98,9



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Динамика, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	96 из 97	99,8	3,7	57,2
39	Сармановский	1 из 1	100	-	98,9
40	Тетюшский	1 из 1	100	-	99
41	Алькеевский	2 из 2	100	-	99,8
42	Дрожжановский	1 из 1	100	-	99,8
43	Заинский	3 из 3	100	-	100
44	Верх.-Услонский	1 из 1	100	-	100
45	Спасский	2 из 2	100	-	100



Строительство блочных модульных лыжных баз

45

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %	Принято КС2, %
	ИТОГО	111 349,5	67,2	6,4	40,8
1	Алексеевский	6 959,30	5	-	0
2	Арский	6 959,30	5	-	0
3	Кайбицкий	6 959,30	5	-	0
4	Лаишевский	6 959,30	5	-	0
5	Тетюшский	6 959,30	11,5	11,5	3,9
6	Бугульминский	6 959,30	83,3	78,3	0
7	Аксубаевский	6 959,30	90	-	61
8	Актанышский	6 959,30	90	-	79,1
9	Нижнекамский	6 959,30	90	-	78,2
10	Азнакаевский	6 959,30	91	13	79,4
11	Елабужский	6 959,30	100	-	0
12	Зеленодольский	6 959,30	100	-	0
13	Черемшанский	6 959,30	100	-	79,2
14	Лениногорский	6 959,30	100	-	79,4
15	Балтасинский	6 959,30	100	-	94,5
16	Буинский район	6 959,30	100	-	98,8



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	100	-
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	100	-
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	100	-
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	100	-
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	100	-
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	100	-
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	100	-
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	100	-
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	100	-



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 14 сентября 2018 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Зеленодольский	780	695	89,1%	24	Верхнеуслонский	21	21	100,0%
2	Елабужский	249	239	96,0%	25	Спасский	42	42	100,0%
3	Азнакаевский	308	297	96,4%	26	Актанышский	68	68	100,0%
4	Менделеевский	121	118	97,5%	27	Сармановский	76	76	100,0%
5	Чистопольский	240	235	97,9%	28	Агрызский	88	88	100,0%
6	Бугульминский	594	583	98,1%	29	Буинский	106	106	100,0%
7	г. Казань	5281	5200	98,5%	30	Бавлинский	126	126	100,0%
8	Нижнекамский	940	932	99,1%	31	Лениногорский	354	354	100,0%
9	г. Наб. Челны	1295	1285	99,2%	32	Альметьевский	823	823	100,0%
10	Заинский	178	177	99,4%	33	Аксубаевский	0	0	-
11	Нурлатский	216	215	99,5%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Арский	1	1	100,0%	35	Алькеевский	0	0	-
13	Атнинский	1	1	100,0%	36	Апастовский	0	0	-
14	Камско-Устьинский	2	2	100,0%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Тетюшский	2	2	100,0%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Балтасинский	3	3	100,0%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Сабинский	4	4	100,0%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Тукаевский	6	6	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Кукморский	12	12	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Высокогорский	14	14	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Лаишевский	16	16	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Пестречинский	19	19	100,0%	ИТОГО по РТ		11992	11766	98,1%



Предъявление паспортов готовности за 2018/2019гг. по состоянию на 14 сентября 2018 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Зеленодольский	1026	905	88,2%	24	Тетюшский	90	89	98,9%
2	Балтасинский	44	39	88,6%	25	Чистопольский	499	494	99,0%
3	Азнакаевский	340	315	92,6%	26	Сабинский	107	106	99,1%
4	Бугульминский	879	817	92,9%	27	Нижнекамский	976	967	99,1%
5	Новошешминский	43	40	93,0%	28	Аксубаевский	109	108	99,1%
6	Камско-Устьинский	86	80	93,0%	29	Нурлатский	356	355	99,7%
7	Рыбно-Слободский	63	59	93,7%	30	Лениногорский	507	506	99,8%
8	Алькеевский	16	15	93,8%	31	Атнинский	5	5	100,0%
9	Высокогорский	266	250	94,0%	32	Кайбицкий	3	3	100,0%
10	Бавлинский	199	190	95,5%	33	Дрожжановский	19	19	100,0%
11	Тюлячинский	24	23	95,8%	34	Черемшанский	30	30	100,0%
12	Арский	207	199	96,1%	35	Апастовский	37	37	100,0%
13	Лаишевский	224	216	96,4%	36	Муслюмовский	57	57	100,0%
14	Пестречинский	321	313	97,5%	37	Спасский	72	72	100,0%
15	Елабужский	454	443	97,6%	38	Алексеевский	109	109	100,0%
16	Верхнеуслонский	85	83	97,6%	39	Мамадышский	129	129	100,0%
17	Заинский	219	214	97,7%	40	Сармановский	151	151	100,0%
18	Менделеевский	135	132	97,8%	41	Буинский	165	165	100,0%
19	Ютазинский	190	186	97,9%	42	Мензелинский	168	168	100,0%
20	г. Казань	5680	5588	98,4%	43	Агрызский	186	186	100,0%
21	Кукморский	126	124	98,4%	44	Тукаевский	257	257	100,0%
22	г. Наб. Челны	1328	1310	98,6%	45	Альметьевский	1004	1004	100,0%
23	Актанышский	78	77	98,7%	ИТОГО по РТ		17069	16635	97,5%



Результаты внеплановой проверки ГЖИ РТ паспортов готовности МО к отопительному периоду 2018/2019 года

- Альметьевский район – 100% - в реальности на **51 доме** проводится **капитальный ремонт**;
- Агрызский район – 100% - в реальности на **3-х домах** не завершен **капитальный ремонт**;
- Мамадышский район – 100%, в реальности на **12 домах** не завершен **капитальный ремонт**;
- Сармановский район – 100%, на **11 домах** в реальности не завершен **капитальный ремонт**.



Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ за 2018/2019гг. по состоянию на 14 сентября 2018 года

№ п/п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п/п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Наб. Челны	33	27	81,8%	24	Балтасинский	41	41	100,0%
2	г. Казань	399	366	91,7%	25	Заинский	41	41	100,0%
3	Новошешминский	43	40	93,0%	26	Муслюмовский	57	57	100,0%
4	Алькеевский	16	15	93,8%	27	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
5	Зеленодольский	246	233	94,7%	28	Буинский	59	59	100,0%
6	Камско-Устьинский	84	82	97,6%	29	Верхнеуслонский	64	64	100,0%
7	Ютазинский	190	186	97,9%	30	Бавлинский	73	73	100,0%
8	Арский	206	203	98,5%	31	Сармановский	75	75	100,0%
9	Лаишевский	208	205	98,6%	32	Тетюшский	88	88	100,0%
10	Пестречинский	302	298	98,7%	33	Агрызский	98	98	100,0%
11	Бугульминский	285	283	99,3%	34	Сабинский	103	103	100,0%
12	Елабужский	205	204	99,5%	35	Аксубаевский	109	109	100,0%
13	Кайбицкий	3	3	100,0%	36	Алексеевский	109	109	100,0%
14	Атнинский	4	4	100,0%	37	Кукморский	114	114	100,0%
15	Актанышский	10	10	100,0%	38	Мамадышский	129	129	100,0%
16	Менделеевский	14	14	100,0%	39	Нурлатский	140	140	100,0%
17	Дрожжановский	19	19	100,0%	40	Лениногорский	153	153	100,0%
18	Тюлячинский	24	24	100,0%	41	Мензелинский	168	168	100,0%
19	Спасский	30	30	100,0%	42	Альметьевский	181	181	100,0%
20	Черемшанский	30	30	100,0%	43	Тукаевский	251	251	100,0%
21	Азнакаевский	32	32	100,0%	44	Высокогорский	252	252	100,0%
22	Нижнекамский	36	36	100,0%	45	Чистопольский	259	259	100,0%
23	Апастовский	37	37	100,0%	ИТОГО по РТ		5077	5002	98,5%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года по Республике Татарстан

2 064	котельных	99%
3 225,5 км	тепловых сетей	98%
2 393	водозаборных сооружений	100%
310	водопроводных насосных станций	99%
17 875 км	водопроводных сетей	100%
4 491,7 км	канализационных сетей	96%





Сводный отчёт о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2018/2019 года

7 897 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ 2 091 объектов здравоохранения - 99,9%**
- ❖ 3 356 объектов образования - 99,6%**
- ❖ 1 992 объектов культуры - 99,7%**
- ❖ 276 спортивных объекта - 98,5%**
- ❖ 182 объекта социальной защиты
и центров занятости населения - 100%**





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 14.09.2018

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 829 479,66	37,70	2,38	6 329 628,40
1	Сабинский	143 107,81	22 634,17	15,82	2,14	120 473,64
2	Казань	1 789 264,14	289 862,26	16,20	3,69	1 499 401,89
3	Пестречинский	156 893,13	30 791,60	19,63	1,90	126 101,53
4	Арский	180 253,05	42 211,25	23,42	0,91	138 041,80
5	Рыбно- Слободский	110 057,97	25 819,10	23,46	1,84	84 238,87
6	Кукморский	174 699,80	42 490,65	24,32	4,02	132 209,15
7	Нурлатский	166 779,73	41 770,34	25,05	0,00	125 009,39
8	Елабужский	332 711,12	84 133,61	25,29	3,51	248 577,51
9	Менделеевский	112 971,74	31 827,13	28,17	0,26	81 144,61
10	Тукаевский	192 599,40	56 717,49	29,45	2,89	135 881,91
11	Чистопольский	354 664,35	108 170,68	30,50	1,82	246 493,67
12	Нижнекамский	546 662,49	171 544,14	31,38	1,39	375 118,35
13	Зеленодольский	343 772,37	123 999,59	36,07	8,32	219 772,77
14	Н.Челны	1 136 786,34	419 819,62	36,93	1,34	716 966,72
15	Альметьевский	354 083,01	130 771,65	36,93	2,56	223 311,36



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 14.09.2018

54

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 829 479,66	37,70	2,38	6 329 628,40
16	Актанышский	186 021,79	69 653,24	37,44	0,08	116 368,55
17	Высокогорский	218 335,24	83 915,25	38,43	2,25	134 419,99
18	Аксубаевский	92 322,02	36 460,50	39,49	0,00	55 861,52
19	Новошешминский	71 029,71	28 069,19	39,52	0,00	42 960,52
20	Атнинский	54 437,02	22 735,22	41,76	0,98	31 701,80
21	Тюлячинский	65 298,57	27 947,78	42,80	8,57	37 350,79
22	Агрызский	54 600,40	24 720,32	45,27	1,11	29 880,09
23	Мамадышский	104 660,52	52 004,11	49,69	3,96	52 656,41
24	Дрожжановский	44 730,50	22 400,39	50,08	0,06	22 330,10
25	Муслюмовский	71 370,43	35 762,97	50,11	0,00	35 607,47
26	Сармановский	207 206,03	108 381,95	52,31	0,35	98 824,08
27	Алексеевский	95 994,34	50 269,12	52,37	4,17	45 725,22
28	Азнакаевский	279 082,12	147 474,82	52,84	5,08	131 607,31
29	Балтасинский	173 341,32	92 203,96	53,19	4,07	81 137,35
30	Кайбицкий	60 501,70	32 596,29	53,88	2,68	27 905,41



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 14.09.2018

55

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 159 108,06	3 829 479,66	37,70	2,38	6 329 628,40
31	Спасский	95 183,47	51 519,44	54,13	0,27	43 664,03
32	Тетюшский	147 094,33	79 778,33	54,24	0,30	67 316,00
33	Черемшанский	186 362,70	101 692,52	54,57	0,76	84 670,17
34	Буинский	142 358,07	81 437,16	57,21	0,08	60 920,91
35	Апастовский	58 308,62	33 778,70	57,93	0,22	24 529,91
36	Верхнеуслонский	79 702,26	46 331,77	58,13	0,00	33 370,49
37	Ютазинский	74 688,22	43 784,70	58,62	5,49	30 903,52
38	Мензелинский	110 801,40	65 070,17	58,73	0,81	45 731,23
39	Лениногорский	445 889,24	264 279,77	59,27	2,99	181 609,47
40	Бугульминский	377 551,70	226 248,32	59,93	0,33	151 303,38
41	Алькеевский	49 759,80	29 849,08	59,99	1,53	19 910,72
42	Бавлинский	69 515,23	41 936,39	60,33	2,05	27 578,85
43	Лаишевский	218 216,56	134 175,09	61,49	2,59	84 041,47
44	Камско-Устьинский	44 198,66	33 126,07	74,95	3,67	11 072,59
45	Заинский	185 239,67	139 313,78	75,21	0,00	45 925,89



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 14.09.2018

56

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	749 546,23	56,25	2,42	583 056,77
1	Высокогорский	44 064,22	8 436,32	19,15	1,23	35 627,90
2	Верхнеуслонский	34 407,62	8 069,58	23,45	0,78	26 338,04
3	Балтасинский	65 947,64	23 692,96	35,93	0,00	42 254,68
4	Буинский	65 666,51	24 793,56	37,76	0,74	40 872,95
5	Сабинский	23 549,37	9 214,72	39,13	0,00	14 334,65
6	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
7	Дрожжановский	58 032,09	25 447,61	43,85	0,09	32 584,48
8	Тетюшский	42 219,48	18 708,01	44,31	0,58	23 511,47
9	Арский	32 566,62	15 318,18	47,04	6,17	17 248,45
10	Пестричинский	19 118,65	9 022,88	47,19	0,00	10 095,78
11	Менделеевский	14 958,11	7 333,66	49,03	0,00	7 624,45
12	Муслюмовский	30 571,58	15 399,01	50,37	2,01	15 172,57
13	Сармановский	29 382,65	14 817,88	50,43	0,20	14 564,77
14	Аксубаевский	27 882,77	15 488,70	55,55	0,60	12 394,07
15	Лаишевский	21 593,18	12 096,41	56,02	2,14	9 496,76



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 14.09.2018

57

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	749 546,23	56,25	2,42	583 056,77
16	Набережные Челны	39 800,00	22 597,20	56,78	0,00	17 202,80
17	Тюлячинский	12 366,69	7 199,07	58,21	0,00	5 167,62
18	Мамадышский	83 828,63	49 714,62	59,31	0,11	34 114,01
19	Спасский	26 640,72	15 844,74	59,48	2,20	10 795,98
20	Чистопольский	23 597,99	14 084,41	59,68	1,18	9 513,59
21	Агрызский	15 275,78	9 118,79	59,69	8,11	6 156,99
22	Лениногорский	29 146,70	17 448,78	59,87	7,76	11 697,92
23	Зеленодольский	35 332,34	21 396,04	60,56	1,77	13 936,31
24	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	0,00	7 824,67
25	Камско-Устьинский	15 646,36	9 634,98	61,58	0,70	6 011,38
26	Альметьевский	19 828,34	12 296,89	62,02	1,14	7 531,45
27	Алькеевский	12 588,08	7 820,62	62,13	0,51	4 767,46
28	Бавлинский	12 430,81	7 855,36	63,19	12,66	4 575,45
29	Рыбно-Слободский	36 359,81	23 128,16	63,61	2,49	13 231,65
30	Кайбицкий	13 443,92	8 701,76	64,73	1,91	4 742,15



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 14.09.2018

58

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	749 546,23	56,25	2,42	583 056,77
31	Азнакаевский	18 863,50	12 315,25	65,29	1,27	6 548,25
32	Атнинский	14 758,96	9 683,51	65,61	13,55	5 075,45
33	Черемшанский	34 252,06	22 746,57	66,41	0,19	11 505,49
34	Заинский	16 083,81	10 902,90	67,79	3,98	5 180,91
35	Нурлатский	21 220,43	14 528,99	68,47	1,18	6 691,45
36	Мензелинский	20 696,40	14 675,53	70,91	18,69	6 020,87
37	Алексеевский	17 176,36	12 429,84	72,37	0,41	4 746,52
38	Нижнекамский	23 417,68	17 092,39	72,99	1,89	6 325,29
39	Елабужский	33 120,83	24 762,84	74,77	0,30	8 358,00
40	Тукаевский	22 009,71	16 794,26	76,30	16,76	5 215,45
41	Актанышский	16 786,88	13 033,87	77,64	15,86	3 753,02
42	Бугульминский	30 196,06	23 943,01	79,29	19,44	6 253,05
43	Новошешминский	11 913,31	10 375,59	87,09	0,30	1 537,71
44	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	0,00	2 330,29
45	Ютазинский	57 174,75	51 763,35	90,54	0,35	5 411,40



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Кассовый расход на 13.09.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	578,2	424,0	154,2	324,4	253,8	56%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	37,0	89,4	29%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Кассовый расход на 13.09.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	12,6	7,9	61%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	4,8	4,9	49%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	0	583,4	0%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	-	4,5	0	4,5	0%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Кассовый расход на 13.09.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	91,9	155,1	37%
9.	Формирование современной городской среды	1129,5	655,1	474,4	0	1 129,5	0%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	2268,6	498,1	1770,5	35,7	2 232,9	2%



Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Кассовый расход на 13.09.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1090,4	518,2	572,2	1 090,1	0,3	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	9,9	13,9	42%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	1,2	7,3	14%
