



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 023,47	1 072,93	3 708,81	5 805,21



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
1	Агрызский	12	12	12
2	Азнакаевский	29	29	29
3	Аксубаевский	5	5	5
4	Актанышский	2	2	2
5	Алексеевский	5	5	5
6	Алькеевский	1	1	1
7	Альметьевский	63	63	64
8	Апастовский	5	5	5
9	Арский	6	6	6
10	Бавлинский	10	10	10
11	Балтасинский	2	2	2
12	Бугульминский	47	47	47
13	Буинский	9	9	9
14	Верхнеуслонский	2	2	2
	Итого по РТ	922	920	775



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
15	Высокогорский	18	18	18
16	г.Казань	227	225	225
17	г.Наб. Челны	123	123	0
18	Елабужский	20	20	20
19	Заинский	15	15	15
20	Зеленодольский	32	32	21
21	К.-Устьинский	5	5	3
22	Кукморский	6	6	6
23	Лаишевский	11	11	11
24	Лениногорский	21	21	21
25	Мамадышский	3	3	3
26	Менделеевский	17	17	17
27	Мензелинский	4	4	0
28	Муслюмовский	3	3	3
	Итого по РТ	922	920	775



МКД, по которым торги проведены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Торги состоялись	Договоры генподряда заключены	Договоры субподряда зарегистрированы в ГЖИ
29	Нижнекамский	125	125	125
30	Новошешминский	2	2	2
31	Нурлатский	12	12	12
32	Пестречинский	7	7	2
33	Р.-Слободский	5	5	5
34	Сабинский	2	2	2
35	Сармановский	14	14	14
36	Спасский	2	2	2
37	Тетюшский	4	4	4
38	Тукаевский	9	9	9
39	Тюлячинский	1	1	0
40	Черемшанский	1	1	1
41	Чистопольский	22	22	22
42	Ютазинский	13	13	13
	Итого по РТ	922	920	775



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Алькеевский	1	1 830,56	0,0	0,0	0,0
2	Верхнеуслонский	2	5 814,53	0,0	0,0	0,0
3	К.-Устьинский	5	7 838,76	0,0	0,0	0,0
4	Мензелинский	4	19 222,51	0,0	0,0	0,0
5	Новошешминский	2	4 521,99	0,0	0,0	0,0
6	Пестречинский	7	19 395,71	0,0	0,0	0,0
7	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	0,0	0,0	0,0
8	Спасский	2	7 277,18	0,0	0,0	0,0
9	Менделеевский	17	67 672,29	739,19	1,09	0,0
10	Апастовский	5	3 741,41	128,00	3,42	3,42
11	Арский	6	15 350,43	581,02	3,79	3,79
12	Зеленодольский	32	257 843,11	14 688,61	5,70	0,01
13	Бавлинский	10	37 414,29	2 344,87	6,27	2,62
14	Тетюшский	4	11 125,10	933,86	8,39	8,39
	Итого по РТ	933	5 805 213,32	1 084 989,11	18,5	11,5



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Муслюмовский	3	8 306,71	779,20	9,38	6,12
16	г. Казань	234	1 914 468,61	281 684,30	14,71	7,95
17	Черемшанский	1	2 342,54	360,40	15,38	7,36
18	Тукаевский	9	27 177,63	4 297,55	15,81	15,81
19	Бугульминский	47	206 892,12	34 101,97	16,48	4,06
20	Нурлатский	12	57 436,67	9 528,65	16,59	6,46
21	Лаишевский	11	22 498,28	3 749,39	16,67	16,67
22	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	222 314,02	17,15	16,49
23	Сармановский	14	41 594,88	7 485,25	18,00	9,14
	Итого по РТ	933	5 805 213,32	1 084 989,11	18,5	11,5
24	Нижнекамский	125	585 691,57	108 220,23	18,51	4,19
25	Елабужский	21	160 323,73	31 688,37	19,77	15,71
26	Азнакаевский	29	89 343,08	19 715,81	22,07	12,21
27	Буинский	9	24 773,39	5 608,58	22,64	22,64
28	Кукморский	6	16 971,13	3 929,79	23,16	9,05



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

ТАИССР

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Балтасинский	2	4 221,64	1 235,24	29,26	29,26
30	Заинский	15	75 556,39	22 206,03	29,39	6,04
31	Мамадышский	3	24 481,34	7 292,99	29,79	13,71
32	Тюлячинский	1	198,88	60,00	30,17	30,17
33	Лениногорский	21	144 829,21	45 744,88	31,59	8,76
34	Чистопольский	22	119 860,27	38 734,43	32,32	6,40
35	Высокогорский	19	39 540,04	12 845,79	32,49	32,49
36	Ютазинский	13	19 565,18	7 108,65	36,33	11,26
37	Альметьевский	63	438 169,83	160 440,82	36,62	15,78
38	Сабинский	2	13 606,70	5 232,10	38,45	14,90
39	Агрызский	12	27 102,27	12 354,45	45,58	17,89
40	Аксубаевский	5	6 865,61	4 425,72	64,46	15,25
41	Актанышский	2	9 344,56	6 197,87	66,33	35,74
42	Алексеевский	5	10 067,86	8 231,10	81,76	26,88
	Итого по РТ	933	5 805 213,32	1 084 989,11	18,5	11,5



Программы капитального ремонта

№	Наименование программы	Лимит, млн. руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
4	Капремонт объектов здравоохранения с дооснащением оборудованием	70,92	9	16.05.2019 (г/к ориентировочно 27.05.2019)
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	164,183	68	13.05.19 (г/к 24.05.2019)
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	368,341	129	
3	Капитальный ремонт коровников	657,738	155	



Капитальный ремонт зданий (помещений)

ТАИССР

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	31 – капитальный ремонт 11 – строительство	97,95:	2,05:
		48,73	0,61
		49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	41,0	12,0
1	Камско-Устьинский, с.Большие Кляри	3 000,0	0,0	0,0
2	Зеленодольский, с.Бишня	1 798,9	0,0	0,0
3	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 006,4	0,0	0,0
4	Нижнекамский, с.Сухарево	1 800,0	4,0	2,0
5	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 080,0	6,0	6,0
6	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 074,9	10,0	5,0
7	Кукморский, с.Каенсар	549,9	12,0	7,0
8	Мамадышский, с.Албай	904,0	18,0	3,0
9	Елабужский, с.Поспелово	1 550,6	22,0	10,0
10	Ютазинский, с.Абсалямово	1 458,3	25,0	10,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 800,0	27,0	9,0
12	Лениногорский, п.Подлесный	1 800,0	30,0	25,0
13	Заинский, с.Новоспасск	2 000,0	30,0	3,0
14	Верхнеуслонсий, с.Кильдеево	1 898,7	35,0	19,0
15	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 843,3	35,0	22,0
16	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 900,0	38,0	27,0
17	Черемшанский, с.Туйметкино	1 887,2	40,0	10,0
	Итого по РТ	48 732,2	41,0	12,0
18	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 539,4	44,0	7,0
19	Азнакаевский, с.Урсаево	1 809,0	45,0	30,0
20	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 679,2	50,0	50,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	41,0	12,0
21	Мамадышский, с.Никифорово	1 345,2	55,0	10,0
22	Лаишевский, д.Каипы	2 035,1	60,0	10,0
23	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	343,6	62,0	23,0
24	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 300,8	62,0	23,0
25	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 472,0	75,0	40,0
26	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	2 000,0	80,0	5,0
27	Балтасинский, д.Карадуван	1 887,9	82,0	5,0
28	Спасский, с.Три Озера	2 269,3	90,0	7,0
29	Нурлатский, с.Андреевка	800,0	100,0	0,0
30	Кайбицкий, с.Эбалаково	798,7	100,0	0,0
31	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 100,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	0,0	0,0
2	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	8 800,0	6,0	1,0
3	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	6,0	2,0
4	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	8,0	1,0
5	МБУ «Молодежный центр», Чистопольский	1 500,0	12,0	2,0
6	МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Веста», Мензелинский	8 400,0	15,0	4,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	16 000,0	18,0	3,0
	Итого по РТ	106 200,0	19,7	3,0
8	МБУ «Молодежный центр «Алан», Нижнекамский	9 500,0	89,0	6,0
9	МБУ «Молодежный центр», Заинский	5 000,0	90,0	22,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань,	4 550,0	12,0	11,0
2	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 400,0	13,0	4,0
3	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	21,0	6,0
4	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	31,0	4,0
5	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	35,0	3,0
6	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	175 700,0	35,0	15,0
7	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	42,0	5,0
	Итого по РТ	92 600,0	44,1	6,7
8	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	49,0	4,0
9	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	55,0	5,0
10	Подростковый клуб «Титан», Набережные Челны	1 400,0	56,0	4,0
11	Подростковый клуб «Арлекино», г. Казань	2 200,0	57,0	12,0
12	Подростковый клуб «Олимп», г. Казань	1 900,0	57,0	7,0
13	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	57,0	12,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ и укрепление материальной базы

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	44,1	6,7
14	Подростковый клуб «Алиса», г. Казань	1 900,0	60,0	5,0
15	Подростковый клуб «Орион», г. Казань	1 900,0	60,0	10,0
16	Подростковый клуб «Радость», г. Казань	2 200,0	62,0	12,0
17	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	65,0	20,0
18	Подростковый клуб «Алый парус», Набережные	1 400,0	71,0	4,0
19	Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны	1 400,0	71,0	4,0
20	Подростковый клуб «Орленок», Зеленодольский	2 350,0	80,0	10,0
21	Подростковый клуб «Импульс», Альметьевский	3 600,0	90,0	8,0
22	Подростковый клуб «Волна» Зеленодольский	1 500,0	93,0	4,0
23	Подростковый клуб «Клевер», Нижнекамский	1 400,0	96,0	1,0
24	Подростковый клуб «Энергия», Нижнекамский	2 150,0	96,0	1,0
25	Подростковый клуб «Азамат», Нижнекамский	2 050,0	96,0	1,0
26	Подростковый клуб «Ровесник» Нижнекамский	2 400,0	96,0	1,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	20,1	7,3
1	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 500,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	1 000,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 055,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 500,0	0,0	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР»	3 300,0	0,0	0,0
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 500,0	0,0	0,0
8	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	3 000,0	1,5	1,5



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	20,1	7,3
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 000,0	3,0	3,0
10	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	3,0	3,0
11	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	5,0	4,0
12	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	5 000,0	6,0	3,0
13	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	3 000,0	6,0	3,0
14	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 000,0	6,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	20,1	7,3
15	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 500,0	7,0	6,0
16	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	3 000,0	10,0	10,0
17	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 500,0	10,0	7,0
18	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 500,0	15,0	12,0
19	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР»	5 500,0	15,0	15,0
20	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 555,0	16,0	3,0
21	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 500,0	17,0	5,0
22	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском МР»	2 000,0	17,0	17,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
23	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	3 000,0	18,0	10,0
24	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 500,0	20,0	7,0
25	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 200,0	20,0	9,0
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 500,0	20,0	5,0
27	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	22 000,0	20,0	4,0
	Итого по РТ	118 410,0	20,1	7,3
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	22,0	12,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	20,1	7,3
29	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 500,0	27,0	7,0
30	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	3 000,0	35,0	20,0
31	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском муниципальном районе»	2 000,0	60,0	25,0
32	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 800,0	70,0	10,0
33	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	2 000,0	95,0	55,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 500,0	100,0	10,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	40 объектов	401,77	10,43

Утверждено РКМ РТ № 3709-р от 29.12.2018



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	44,0	6,6
1	Спасский, СДК, с.Три Озера	11 137,0	10,0	5,0
2	Чистопольский, СДК, с.Кубассы	17 998,2	10,0	3,0
3	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	12,0	7,0
4	Зеленодольский, СДК, с.Айша	16 533,7	12,0	4,0
5	Елабужский, СДК, с.Большие Армалы	8 149,7	12,0	4,0
6	Сабинский, СДК, с.Юлбат	12 203,5	14,0	4,0
7	Тетюшский, Районный дом культуры, г. Тетюши	27 717,0	15,0	5,0
8	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 449,0	18,0	6,0
9	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курнали	10 967,7	23,0	3,0
10	Бавлинский, СДК, с.Потапо-Тумбарла	15 210,7	24,0	3,0
11	Высокогорский, СДК, с.Ямашурма	3 696,0	25,0	8,0
12	Рыбно-Слободский, СДК, с.Юлсубино	6 609,5	26,0	17,0
13	Кукморский, СДК, с.Туембаш	4 062,5	28,0	3,0
14	Кукморский р, СДК, д.Асан-Елга	4 570,9	30,0	5,0
15	Черемшанский, СДК, с.Лашманка	9 381,3	30,0	2,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово	8 933,8	33,0	4,0
17	Верхнеуслонский, СДК, с.Набережные Моркваши	12 658,7	34,0	6,0
18	Тюлячинский, Сельский клуб, с.Казаклар	6 723,0	34,0	4,0
19	Бугульминский, СДК, п.Подгорный	11 333,4	35,0	3,0
20	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	35,0	5,0
21	Камско-Устьинский, СДК, с.Кирельское	5 350,5	36,0	13,0
22	Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово	18 653,7	38,0	3,0
23	Новошешминский, СДК, с.Ерыклы	6 602,6	43,0	8,0
	Итого по РТ	401 765,2	44,0	6,6
24	Сармановский, СДК, с.Большое Нуркеево	7 661,1	47,0	7,0
25	Новошешминский, СДК, с.Азеево	3 343,5	50,0	11,0
26	Мамадышский, СДК, с.Дюсьметьево	8 459,9	55,0	15,0
27	Буинский район, СДК, с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	55,0	10,0
28	Сармановский, СДК, с.Саклов-Баш	10 909,1	60,0	8,0
29	Балтасинский, СДК, д.Бурнак	12 779,4	64,0	9,0



Капитальный ремонт объектов культурного назначения ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	401 765,2	44,0	6,6
30	Лениногорский, СДК, с.Тимяшево	20 000,0	65,0	7,0
31	Нурлатский, СДК, с.Степное Озеро	7 170,6	65,0	3,0
32	Менделеевский, СДК, с.Старое Гришкино	12 557,9	70,0	8,0
33	Лаишевский, СДК, с.Кирби	13 863,3	73,0	11,0
34	Тукаевский, СДК, с.Новотроицкое	13 549,8	78,0	26,0
35	Дрожжановский, СДК, с.Новые Какерли	1 000,1	95,0	45,0
36	Дрожжановский, СДК, с.Старые Чукалы	2 000,3	95,0	45,0
37	Кайбицкий, СДК, с.Хозесаново	16 163,0	97,0	4,0
38	Арский, СДК, с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	3,0
39	Апастовский, СДК, с.Старый Юмралы	7 938,7	99,0	1,0
40	Алькеевский, Сельский клуб, с.Верхнее Алькеево	5 228,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	13 объектов	49,76 нераспределенный лимит – 0,33	0,24

Утверждено РКМ РТ № 3459-р от 17.12.2018
(с изм. от 19.03.2019 № 555-р)



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 863,4	0,0	0,0
2	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	240,6	0,0	0,0
3	пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52	2 213,3	0,0	0,0
4	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	931,1	0,0	0,0
5	г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 а	198,0	7,0	4,0
6	г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 157	792,2	7,0	4,0
8	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9	5 065,4	17,0	7,0
10	г. Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	17,0	1,0
7	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 21	2 679,0	20,0	15,0
9	п. ж/д ст.Высокая гора, ул. Профсоюзная, д.1а	7 109,7	23,0	13,0
	Итого по РТ	49 433,5	30,3	5,6
11	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 096,1	70,0	20,0
12	с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 1	9 444,0	87,0	7,0
13	с. Черемшан, ул. Советская, д. 32	1 349,9	96,0	6,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	17 объектов: капремонт - 15 рем.-реставрац. - 1 реконструкция - 1	657,52	23,86
		614,53	
		22,83	
		20,16	

Утверждено РКМ РТ № 431-р от 04.03.2019



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	614 531,2	13,9	4,7
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	116 380,0	0,0	0,0
2	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	20 000,0	0,0	0,0
3	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 500,0	0,0	0,0
4	ГБПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов"	14 926,0	0,0	0,0
5	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	5 000,0	0,0	0,0
6	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	54 027,2	1,0	1,0
7	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Деметьева"	10 000,0	5,0	5,0
8	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 500,0	5,0	5,0



Капитальный ремонт ресурсных центров РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 721,3	7,0	3,0
	Итого по РТ	614 531,2	13,9	4,7
10	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	72 179,5	16,0	6,0
11	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	5 000,0	25,0	25,0
12	ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"	4 344,8	25,0	15,0
13	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	137 377,5	28,0	11,0
14	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 891,9	35,0	1,0
15	ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"	15 683,0	78,0	18,0



Капитальный ремонт объектов образования на 2019 год

33

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	39 общеобразовательных организаций	788,52	103,18:
	113 ДОО	2 147,31	- 26,28
	115 функциональных зон	91,52	- 76,91

Утверждено РКМ РТ № 399-р от 27.02.2019



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	30,5	3,7
1	МАОУ «Нурлатская СОШ № 1», Нурлатский	1 058,4	0,0	0,0
2	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкой", Высокогорский	11 171,5	0,0	0,0
3	МБОУ «Кугарчинская СОШ», Рыбно-Слободский	7 221,0	1,0	1,0
4	МБОУ «Гимназия №22», г.Нижнекамск	3 850,0	3,0	1,0
5	МБОУ «Гимназия №2» имени Баки Урманче, г.Нижнекамск	9 389,3	3,0	1,0
6	МБОУ «Гимназия №25», г.Нижнекамск	9 383,5	3,0	1,0
7	МАОУ «Лицей-интернат № 2», г.Казань	30 001,7	3,0	1,0
8	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	2 558,0	3,0	1,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	30,5	3,7
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», г.Нижнекамск	5 626,4	3,0	1,0
10	МБОУ «Гимназия №32», г.Нижнекамск	9 580,4	3,0	1,0
11	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», г.Нижнекамск	6 748,6	3,0	1,0
12	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г.Нижнекамск	1 718,0	3,0	1,0
13	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижнекамск	10 372,2	3,0	1,0
14	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», г.Нижнекамск	3 825,1	3,0	1,0
15	МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа», Тюлячинский	20 873,9	10,5	1,5
16	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа», Атнинский	40 243,1	11,0	1,1



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
17	МБОУ «Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа», Алексеевский	14 991,9	21,0	6,0
18	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули», Алькеевский	44 700,0	24,0	3,0
19	МБОУ «Верхнесиметская СОШ» с размещением МБДОУ «Верхнесиметский детский сад «Ромашка», Сабинский	11 510,4	24,0	1,0
20	МБОУ «Верхнеуслонская гимназия», Верхнеуслонский	37 063,5	28,0	3,0
21	МБОУ для детей дошкольного и младшего возраста «Стародувановская начальная школа-детский сад», Дрожжановский	1 209,5	30,0	20,0
	Итого по РТ	539 824,5	30,5	3,7
22	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», г.Набережные Челны	55 000,0	31,1	8,1
23	МБОУ «Яна Булякская основная общеобразовательная школа», Тукаевский	31 505,8	35,0	8,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	539 824,5	30,5	3,7
24	МБОУ «Емелькинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	8 000,0	45,0	0,0
25	МБОУ «Нуринерская средняя общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Нуринерский детский сад», Балтасинский	45 000,0	47,0	6,0
26	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова», Лаишевский	67 424,3	54,6	4,6
27	МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа», Тетюшский	5 000,0	70,0	10,0
28	МБОУ «Рудницкая средняя общеобразовательная школа», Камско-Устьинский	15 294,2	78,0	5,0
29	МБОУ «Кайбицкая основная общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Кайбицкий детский сад», Буинский	29 503,6	80,0	5,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	248 696,7	26,0	1,8
1	ГБОУ «Елабужская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Елабужский муниципальный район	20 764,6	0,0	0,0
2	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» Зеленодольский муниципальный район	47 705,7	3,0	2,2
3	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова» г.Казань	30 144,0	6,0	0,0
4	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича Мензелинский муниципальный район, с.Старое Мазино, ул.Ленина, д.10 А	29 353,1	11,0	1,2
5	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича Мензелинский муниципальный район, с.Старое Мазино, ул.Ленина, д.32	7 000,0	12,0	2,0



Капитальный ремонт объектов образования (школы-интернаты) ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГБОУ «Заинская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Заинский	13 100,0	14,0	2,0
	Итого по РТ	248 696,7	26,0	1,8
7	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Лаишевский	20 867,8	30,0	10,0
8	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	20 714,0	34,0	0,0
9	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича», Тетюшский	18 380,0	39,0	0,0
10	ГБОУ «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Набережные Челны	40 667,5	87,0	2,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2019 год

40

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	12 – капремонт 7 – строительство 2 – реконструкция	1 089,6:	4,05:
		- 697,9 - 343,1 - 24,1 ПИР – 24,5	- 1,65 - 2,40

Утверждено РКМ РТ № 524-р от 14.03.2019,
№ 525-р от 14.03.2019



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Солнышко», Чистопольский	4 000,0	0,0	0,0
2	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», г.Казань	24 300,0	0,0	0,0
3	Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	41 000,0	1,5	1,0
4	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	117 596,0	3,0	0,0
5	МБУ «ДОЛ «Кама», Нижнекамский	141 816,0	14,0	2,0
6	ДОЛ «Факел» МБКУ «Подростковый клуб «Ажаган», Новошешминский	12 500,0	17,0	2,0
	Итого по РТ	580 336,0	17,4	4,3
7	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	170 000,0	18,0	4,0
8	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	102 270,0	27,0	4,0
9	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	53 000,0	35,0	17,0
10	ДОЛ «Балкыш», Тукаевский	20 450,0	58,0	28,0
11	Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	5 000,0	85,0	10,0
12	ДОЛ «Приазовец», г.Анапа	6 000,0	99,0	11,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

Наименование Программы	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий, подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ	33 объекта	49,46	0,54

Утверждено РКМ РТ № 2985-р от 16.11.2018



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	89,2	10,9
1	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	43	11
2	Агрызский, г.Агрыз	1 000	60	5
3	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	68	23
4	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	70	29
5	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	78	18
6	Актанышский, с.Актаныш	3 900	85	21
7	Буинский, г.Буинск	3 900	90	20
8	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	96	6
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	97	5
10	Мензелинский, г.Мензелинск	500	97	7
11	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	97	22
12	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	99	9
13	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	99	4



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	89,2	10,9
14	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	0
15	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	0
16	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	0
17	Арский, г.Арск	500	100	0
18	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	4
19	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	0
20	Заинский, г.Заинск	1 000	100	0
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	0
22	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	0



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	51,6	14,8
1	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	13	3
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	27	13
3	Актанышский, с.Актаныш	1 800	28	14
4	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	34	2
5	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	35	20
6	Кукморский, г.Кукмор	3 000	40	3
7	г.Казань	2 000	41	21
8	Буинский, г.Буинск	1 500	65	35
9	Агрызский, г.Агрыз	2 300	66	4
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	30
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-



Программа «Доступная среда» на 2019 год

ТАИССР

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	в т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Принадлежность объектов	в т.ч.:	Всего объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	Министерство образования РТ - 12	- 5 школ, - 5 ДОУ - 2 ДО	12



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	235 км - водопроводной сети 50 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	Разработаны проекты – 87,2%	Построено 24,8 км трубопроводов, изготовлено 27 ВНБ, пробурено 9 скважин, 3 скважины на стадии бурения
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Дефектные ведомости - 100%	Согласно графика установлено 613 светильников, проложено 6,4 км СИП



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 43 МО	Получены тех.условия – 100% Разработаны проекты – 100%	Закуплено 90 котлов, работы ведутся согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получены: - паспорта БТИ – 100% - тех.условия – 92,1%	Получено 572 заявления от собственников квартир, работы ведутся на 25 МКД
5	Модернизация систем водоотведения	Определяется перечень объектов		Май 2019



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	8 437,58	90,32
1	Аксубаевский район	80,52	13,38	16,62
2	Апастовский район	55,52	15,27	27,50
3	Атнинский район	36,61	14,05	38,38
4	Тетюшский район	61,43	24,75	40,30
5	Камско-Устьинский район	40,97	18,58	45,34
6	Арский район	143,21	65,56	45,78
7	Буинский район	115,58	55,06	47,63
8	Дрожжановский район	63,24	40,64	64,27
9	Тюлячинский район	38,58	24,90	64,55
10	Алькеевский район	53,59	34,73	64,80
11	Мамадышский район	115,72	77,15	66,67
12	Новошешминский район	36,39	24,64	67,71
13	Спасский район	53,06	36,35	68,51
14	Алексеевский район	69,54	48,19	69,30
15	Черемшанский район	53,58	37,17	69,37



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	8 437,58	90,32
16	Мензелинский район	75,59	55,39	73,27
17	Альметьевский район	492,17	361,42	73,43
18	Бавлинский район	90,28	67,06	74,28
19	Рыбно-Слободский район	70,21	52,31	74,50
20	Пестриченский район	90,28	68,10	75,43
21	Муслюмовский район	54,32	42,70	78,61
22	Нурлатский район	148,94	117,75	79,06
23	Высокогорский район	126,29	101,11	80,06
24	Лаишевский район	110,18	88,33	80,17
25	Агрызский район	91,45	74,57	81,54
26	Балтасинский район	92,26	75,65	82,00
27	Актанышский район	82,97	68,20	82,19
28	Чистопольский район	194,01	159,95	82,44
29	Заинский район	138,43	115,69	83,58
30	Сармановский район	90,00	75,34	83,71



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с населением

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	9 342,38	8 437,58	90,32
31	Кайбицкий район	39,13	33,76	86,28
32	Бугульминский район	254,39	228,42	89,79
33	Елабужский район	207,19	186,30	89,92
34	Сабинский район	83,94	76,02	90,57
35	Менделеевский район	72,80	66,70	91,63
36	Ютазинский район	52,73	48,34	91,67
37	Кукморский район	136,13	125,51	92,19
38	Азнакаевский район	154,12	142,83	92,68
39	Тукаевский район	104,78	97,59	93,14
40	Верхнеуслонский район	44,50	41,55	93,36
41	Зеленодольский район	391,46	369,54	94,40
42	Лениногорский район	200,05	189,74	94,84
43	Нижнекамский район	618,52	613,84	99,24
44	г.Казань	2 833,94	2 906,18	102,55
45	г. Набережные Челны	1 183,79	1 257,28	106,21



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

ТАССР

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 727,12	55,70
1	Апастовский район	12,97	0,66	5,09
2	Камско-Устьинский район	10,81	1,16	10,74
3	Спасский район	12,36	1,95	15,77
4	Алькеевский район	11,86	2,09	17,62
5	Муслюмовский район	12,95	2,44	18,85
6	Бавлинский район	29,61	5,75	19,43
7	Черемшанский район	12,56	2,45	19,47
8	Азнакаевский район	44,70	10,39	23,25
9	Елабужский район	52,65	13,94	26,47
10	Аксубаевский район	18,06	4,83	26,72
11	Ютазинский район	12,75	4,01	31,45
12	Нурлатский район	46,25	14,63	31,63
13	Мамадышский район	31,65	10,07	31,83
14	Новошешминский район	9,18	3,13	34,11
15	Сабинский район	20,50	7,55	36,85



Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 727,12	55,70
16	Бугульминский район	71,42	27,55	38,57
17	Сармановский район	21,71	8,43	38,84
18	Тукаевский район	24,97	9,76	39,09
19	Менделеевский район	18,62	7,40	39,76
20	Чистопольский район	48,02	19,32	40,24
21	Альметьевский район	126,48	51,51	40,73
22	Заинский район	34,26	14,04	40,99
23	Агрызский район	21,88	9,17	41,91
24	Верхнеуслонский район	10,11	4,30	42,56
25	Рыбно-Слободский район	15,84	7,21	45,52
26	Актанышский район	19,88	9,12	45,84
27	Лениногорский район	51,49	23,75	46,13
28	Мензелинский район	17,64	8,47	48,00
29	Зеленодольский район	150,43	77,82	51,73
30	Дрожжановский район	14,03	7,31	52,08




Информация о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с прочими потребителями

№	Муниципальное образование	План, тыс.куб.м	Факт, тыс.куб.м	доля, %
	Общий итог	3 100,79	1 727,12	55,70
31	Нижнекамский район	169,02	92,41	54,67
32	г.Казань	1 444,92	853,17	59,05
33	Тюлячинский район	8,57	5,73	66,83
34	Кайбицкий район	8,63	6,11	70,84
35	Кукморский район	31,43	22,29	70,92
36	Арский район	45,62	33,01	72,36
37	Атнинский район	8,08	5,94	73,48
38	Высокогорский район	29,73	22,04	74,13
39	Буинский район	26,78	21,86	81,65
40	Лаишевский район	25,40	21,30	83,87
41	г. Набережные Челны	245,42	207,95	84,73
42	Тетюшский район	14,03	12,49	89,03
43	Балтасинский район	20,62	18,74	90,88
44	Алексеевский район	15,84	14,46	91,30
45	Пестриченский район	21,08	19,41	92,09



Сравнение платежной дисциплины населения за ЖКУ в 2019 г. (на 01.05.2019)

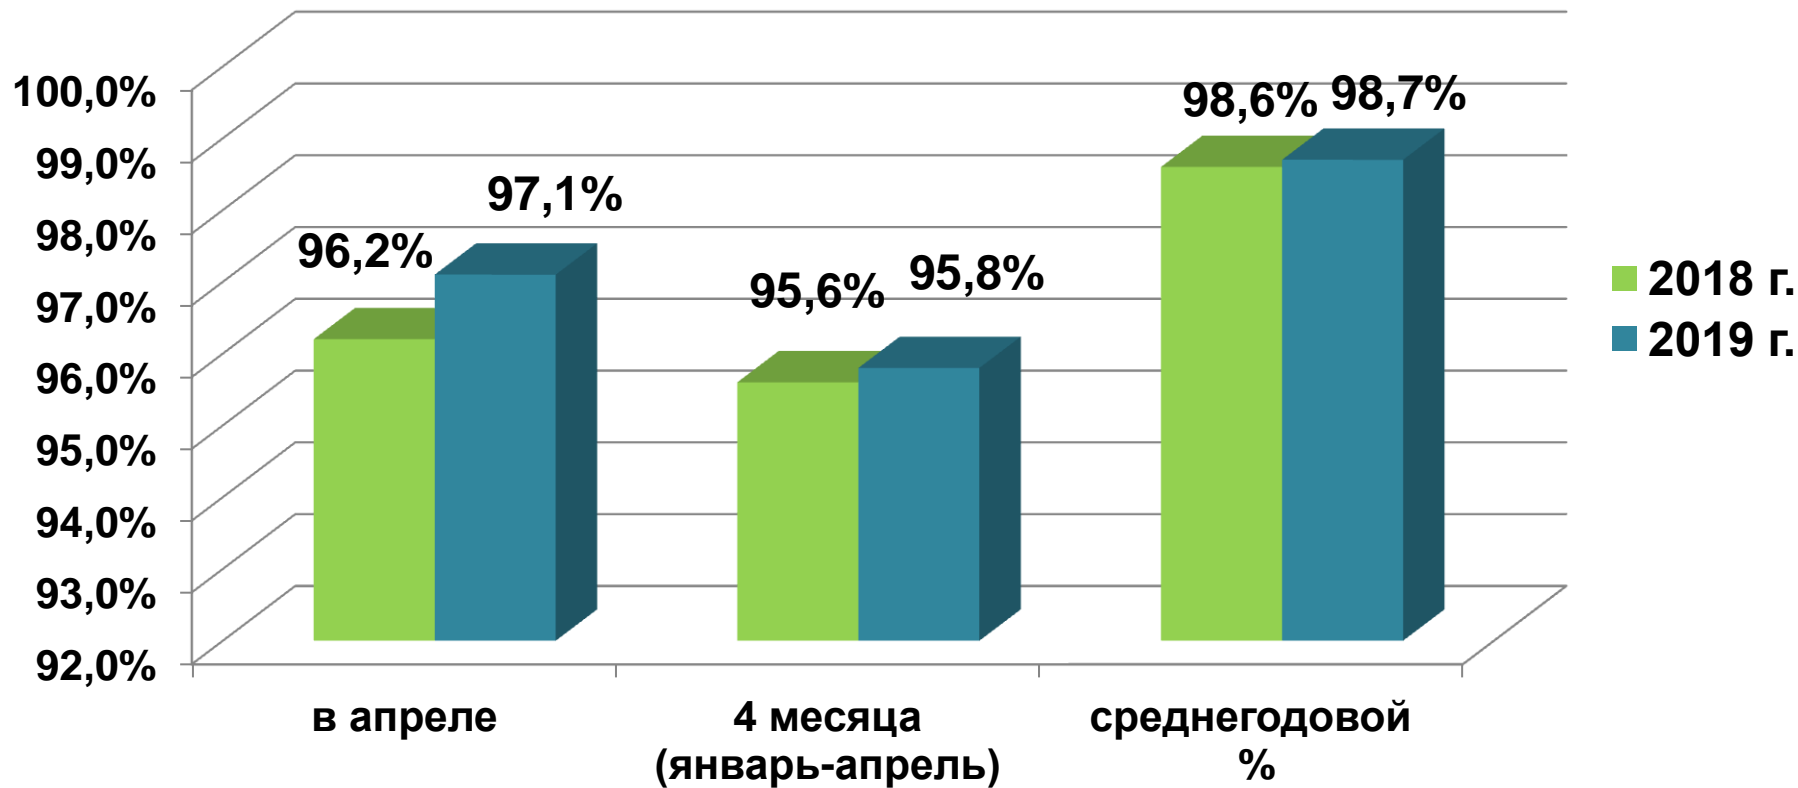



Информация по собираемости платежей на 01.05.2019

МО	в апреле 2019		итого на 01.05.2019	
	всего за ЖКУ	обращение с ТКО	всего за ЖКУ	обращение с ТКО
Всего по РТ	97,1%	91,9%	95,8%	88,3%


Всего по РТ	в апреле 2019	итого на 01.05.2019
Восточная зона (Гринта)	92,6%	89,4%
Западная зона (ПЖКХ)	91,1%	87,0%



Задолженность платежей населения за ЖКУ

на 01.05.2019 (млн. рублей, %)

6 млрд. 967 млн. рублей

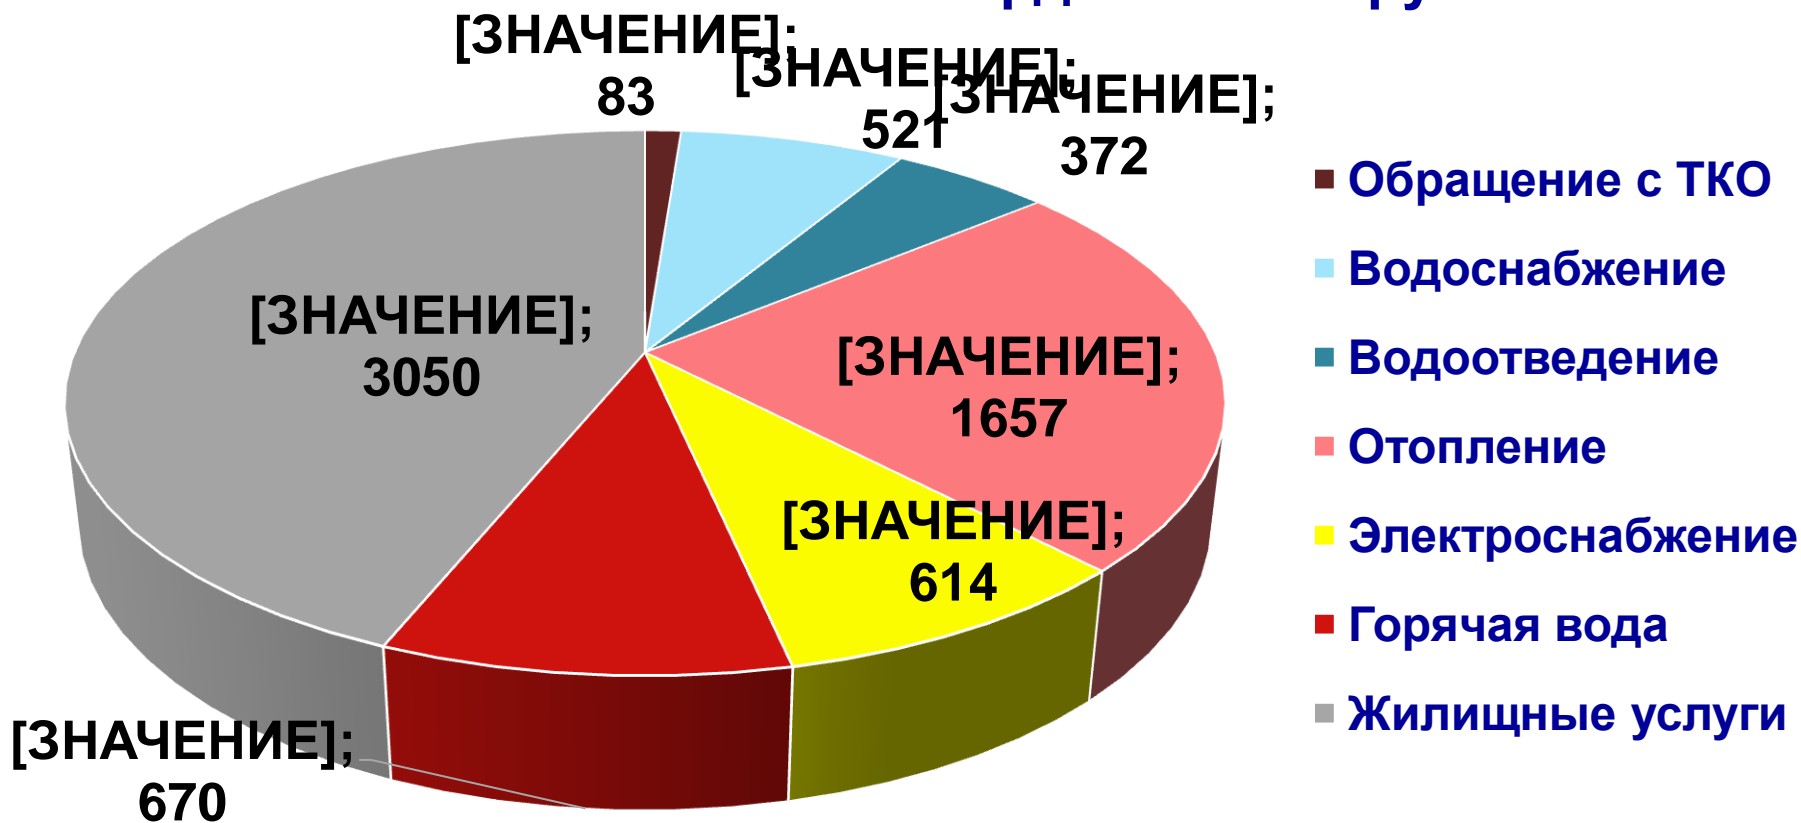



Собираемость платежей населения на 01.05.2019

№	МО	в апреле 2019		Итого на 01.05.2019	
		всего за ЖКУ	обращение с ТКО	всего за ЖКУ	обращение с ТКО
	Всего по РТ	97,1%	91,9%	95,8%	88,3%
1	Дрожжановский	63,9%	46,8%	80,4%	55,8%
2	В.Услонский	86,4%	74,9%	84,5%	66,5%
3	Муслюмовский	93,0%	106,8%	83,8%	73,6%
4	Аксубаевский	93,4%	62,9%	93,0%	73,8%
5	Пестречинский	92,6%	75,8%	91,6%	74,1%
6	Алексеевский	96,5%	89,5%	93,0%	74,3%
7	Буинский	109,6%	98,8%	94,0%	74,3%
8	Атнинский	87,8%	77,4%	89,0%	78,9%
9	Кайбицкий	94,8%	94,7%	81,6%	79,5%
10	Бавлинский	96,2%	85,0%	94,5%	81,2%
11	Спасский	97,2%	86,9%	94,9%	82,1%



Собираемость платежей населения на 01.05.2019

№	МО	в апреле 2019		Итого на 01.05.2019	
		всего за ЖКУ	обращение с ТКО	всего за ЖКУ	обращение с ТКО
	Всего по РТ	97,1%	91,9%	95,8%	88,3%
12	Агрызский	97,4%	86,2%	94,1%	82,7%
13	Альметьевский	104,3%	89,0%	96,0%	82,8%
14	Мамадышский	83,5%	75,7%	87,3%	83,3%
15	Ютазинский	97,5%	88,4%	95,1%	84,4%
16	Актанышский	96,0%	90,3%	94,3%	86,0%
17	Елабужский	100,4%	88,1%	97,3%	86,1%
18	Кукморский	94,0%	84,2%	96,4%	86,2%
19	Мензелинский	103,5%	88,4%	96,6%	86,4%
20	Высокогорский	100,2%	91,1%	98,3%	86,6%
21	Лаишевский	93,8%	89,3%	91,7%	86,9%
22	Азнакаевский	98,1%	89,5%	94,9%	87,2%



Собираемость платежей населения на 01.05.2019

№	МО	в апреле 2019		Итого на 01.05.2019	
		всего за ЖКУ	обращение с ТКО	всего за ЖКУ	обращение с ТКО
	Всего по РТ	97,1%	91,9%	95,8%	88,3%
23	Нурлатский	97,9%	89,4%	98,3%	87,3%
24	Менделеевский	99,1%	88,3%	96,1%	87,4%
25	Бугульминский	89,8%	90,2%	93,9%	87,8%
26	Казань	92,9%	92,3%	95,2%	87,8%
27	Сармановский	100,0%	90,1%	96,7%	87,8%
28	Тетюшский	101,8%	92,3%	94,4%	87,9%
29	Р.-Слободский	102,5%	91,2%	96,2%	88,0%
30	Зеленодольский	98,7%	90,8%	94,7%	88,5%
31	Чистопольский	100,4%	93,4%	96,6%	88,6%
32	Апастовский	99,3%	95,1%	95,2%	88,9%
33	Заинский	98,4%	91,5%	95,2%	89,2%



Собираемость платежей населения на 01.05.2019

№	МО	в апреле 2019		Итого на 01.05.2019	
		всего за ЖКУ	обращение с ТКО	всего за ЖКУ	обращение с ТКО
	Всего по РТ	97,1%	91,9%	95,8%	88,3%
34	Лениногорский	98,4%	92,5%	96,1%	89,5%
35	Тукаевский	101,2%	93,3%	97,4%	89,7%
36	К.-Устьинский	99,2%	95,3%	94,9%	91,2%
37	Алькеевский	104,4%	102,3%	93,8%	92,1%
38	Нижнекамский	100,1%	96,2%	97,2%	92,2%
39	Черемшанский	98,0%	94,4%	96,5%	92,2%
40	Арский	99,3%	95,1%	97,9%	92,2%
41	Сабинский	100,1%	98,3%	99,2%	93,0%
42	Новошешминский	102,0%	96,3%	96,1%	93,1%
43	Тюлячинский	93,3%	94,8%	92,2%	93,2%
44	Наб.Челны	100,6%	96,5%	96,6%	93,7%
45	Балтасинский	99,1%	97,6%	96,9%	94,0%



Информация по наличию/отсутствию административных регламентов по согласованию переустройства(перепланировки) в муниципальных образованиях ТАССР

№	МО
1	Альметьевский
2	Черемшанский
3	Азнакаевский
4	Бугульминский
5	Агрызский
6	Мамадышский
7	Менделеевский
8	Заинский
9	Чистопольский
10	Пестречинский
11	Сабинский
12	Тюлячинский
13	Нижнекамский
14	Апастовский
15	Бавлинский
16	Ютазинский

№	МО
17	Сармановский
18	Лениногорский
19	Елабужский
20	Актанышский
21	Мензелинский
22	Тукаевский
23	Наб.Челны
24	Рыбно-Слободский
25	Казань
26	Муслюмовский
27	Новошешминский
28	Аксубаевский
29	Алексеевский
30	Алькеевский
31	Нурлатский

№	МО
32	Спасский
33	Арский
34	Атнинский
35	Балтасинский
36	Буинский
37	Высокогорский
38	Верхнеуслонский
39	Дрожжановский
40	Зеленодольский
41	Камско-Устьинский
42	Кайбицкий
43	Кукморский
44	Лаишевский
45	Тетюшский



уполномоченные на открытие счетов эскроу

№	Наименование банка
1	АО "АБ "РОССИЯ"
2	Банк ГПБ (АО)
3	ООО Банк "Аверс"
4	ПАО "Запсибкомбанк"
5	Банк ВТБ (ПАО)
6	АО "АЛЬФА-БАНК"
7	ПАО АКБ "Связь-Банк"
8	ПАО Сбербанк

№	Наименование банка
9	ПАО Банк "ФК Открытие"
10	ПАО РОСБАНК
11	АО "Банк ДОМ.РФ"
12	АО «Райфайзенбанк»
13	ПАО "АК БАРС" БАНК
14	ПАО "Промсвязьбанк"
15	ПАО Банк ЗЕНИТ
16	АО "Россельхозбанк"



Банки, приступившие к работе с застройщиками

№	Наименование банка	Подано заявок всего	Из них (этапы рассмотрения):					
			Анализ документов	Банком даны замечания	Завершение анализа документов	Отказ банка	Одобрение банка	Заключен договор
1	АО "Банк ДОМ.РФ"	36	35	0	0	1	0	0
2	ПАО Сбербанк	35	11	12	5	0	1	6
3	Банк ГПБ (АО)	13	13	0	0	0	0	0
4	Банк ВТБ (ПАО)	16	6	6	4	0	0	0
5	ПАО Банк "ФК Открытие"	10	1	0	9	0	0	0
6	ПАО "Промсвязьбанк"	8	7	0	0	0	1	0
7	АО "АЛЬФА-БАНК"	6	1	3	2	0	0	0
8	ПАО "АК БАРС" БАНК	4	3	0	0	1	0	0
9	ООО Банк «Аверс»	1	1	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	129	78	21	20	2	2	6
