



2016
январь - ноябрь

2017
январь - ноябрь


2018
январь - ноябрь

2019
январь - ноябрь

Со смертельным
исходом

С тяжелым
исходом

ВСЕГО
по РТ

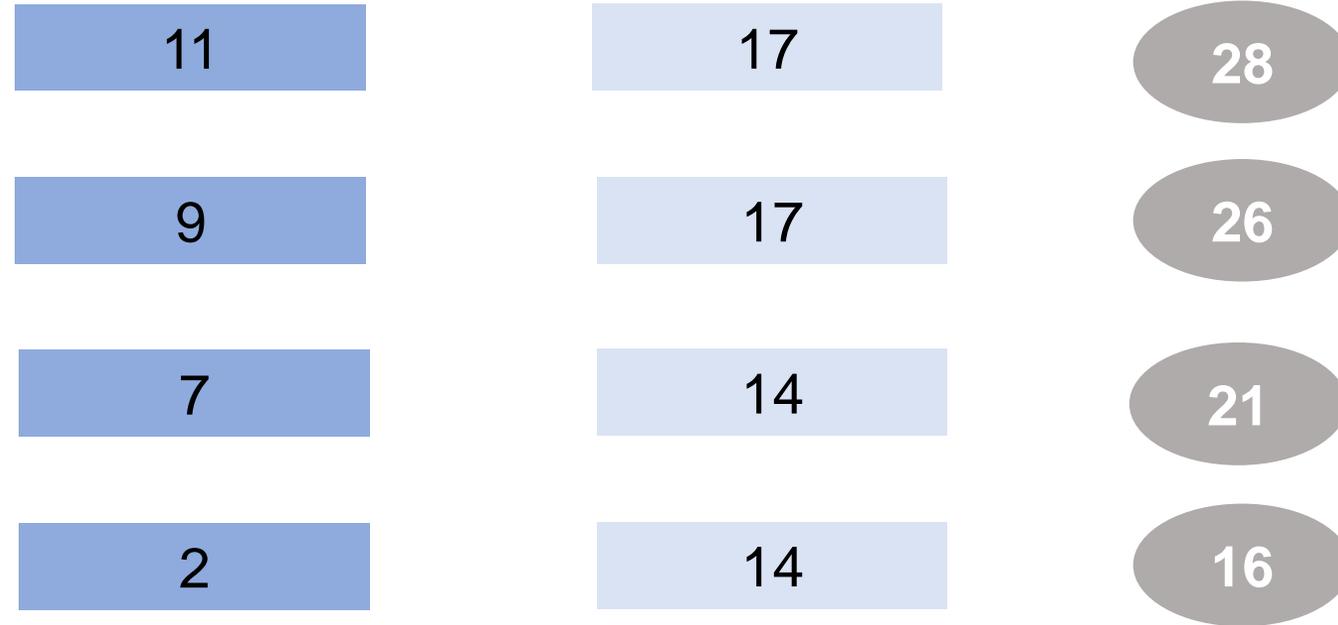



Рабочие настилы лесов имеют зазор между досками более 5 мм

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: АО «Стройсервис»
Подрядчик: АО «Стройсервис»



Рабочие места и проходы к ним,
расположенные на высоте
более 1,3 м, не имеют
защитных или страховочных
ограждений

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ГКУ «Главинвестстрой РТ»
Подрядчик: ООО «Гарант Строй»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 371	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	333 107	14 194,0 -
Взыскано всего	169	10 469,0
Не истек срок оплаты	55	3 605,0
Обжалуются в суде	2	120,0



Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 170
- с выездом на объекты строительства	382
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	855
- выдано предписаний	350
- приостановлено право осуществлять строительство	171
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	57
- выдано предупреждений	277

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 29 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
1	Нижнекамский	100 000	27 188	27,2	72 812
2	г.Наб.Челны	310 000	178 810	57,7	131 190
3	Апастовский	10 000	6 124	61,2	3 876
4	Зеленодольский	110 000	70 325	63,9	39 675
5	Альметьевский	130 000	84 362	64,9	45 638
6	Атнинский	4 500	3 436	76,4	1 064
7	Буинский	15 000	11 582	77,2	3 418
8	Лениногорский	26 000	20 390	78,4	5 610
9	Дрожжановский	6 000	4 745	79,1	1 255
10	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
11	Кайбицкий	5 000	4 057	81,1	943
12	г.Казань	850 000	698 699	82,2	151 301
13	Мензелинский	14 000	11 512	82,2	2 488
14	Чистопольский	28 000	23 358	83,4	4 642
15	Бугульминский	35 000	29 972	85,6	5 028

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 29 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
16	Менделеевский	14 000	12 123	86,6	1 877
17	Муслюмовский	9 000	7 849	87,2	1 151
18	Сабинский	20 000	17 604	88,0	2 396
19	В-Услонский	40 000	35 209	88,0	4 791
20	Бавлинский	12 000	10 761	89,7	1 239
21	Азнакаевский	20 000	17 984	89,9	2 016
22	Черемшанский	5 000	4 574	91,5	426
23	Нурлатский	16 000	14 745	92,2	1 255
24	Ютазинский	11 000	10 164	92,4	836
25	Тюлячинский	8 000	7 491	93,6	509
26	Алексеевский	14 000	13 138	93,8	862
27	Алькеевский	7 000	6 623	94,6	377
28	Аксубаевский	7 000	6 634	94,8	366
29	Актанышский	14 000	13 346	95,3	654
30	Спасский	6 500	6 335	97,5	165

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 29 ноября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
31	Р-Слободский	13 500	13 390	99,2	110
32	Агрызский	15 000	15 007	100,0	-
33	Заинский	17 000	17 017	100,1	-
34	Тетюшский	10 000	10 011	100,1	-
35	К-Устьинский	8 000	8 037	100,5	-
36	Высокогорский	80 000	80 402	100,5	-
37	Балтасинский	14 000	14 084	100,6	-
38	Сармановский	10 000	10 077	100,8	-
39	Елабужский	50 000	50 765	101,5	-
40	Новошешминский	5 000	5 111	102,2	-
41	Лаишевский	100 000	102 299	102,3	-
42	Тукаевский	90 000	93 261	103,6	-
43	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
44	Арский	25 000	30 376	121,5	-
45	Кукморский	20 000	25 740	128,7	-



МО РТ, которые вносят весомый вклад в выполнение плановых обязательств ввода жилья

г.Казань

г.Набережные Челны

Пестречинский

Высокогорский

Лайшевский

Тукаевский

Зеленодольский



438 302 кв.м.

100%

199 787 кв.м.

45,6%





на 29.11.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	96	2	69	36	24	9
Количество квартир	7 838	3 557	110	4 281	3 601	630	50
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	199,8	6,88	238,5	201,2	35,1	2,2



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	16 363 771	14 807 540	440 253	12 068 216	314 148	14 746 703	118 615
введены в эксплуатацию	7 460 824	7 460 824	11 728	7 159 902	6 814	7 366 309	3 048
высокая 70-100%	7 442 673	6 764 644	329 244	4 621 857	307 140	6 563 292	96 851
средняя 30-70%	1 391 453	578 340	98 995	283 726	195	810 814	18 715
низкая 0-30%	68 820	3 731	286	2 731	-	6 288	-



	Количество объектов	Количество квартир	Степень готовности Высокая (70-100%)
Итого по РТ	3	7	3
1. г.Казань	1	2	1
2. г.Наб.Челны	1	2	1
3. г.Альметьевск	1	3	1



	План	Финансирование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	142	46
многодетные семьи	33	155,9	31	94
молодые семьи	54	57,4	49	91

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений, из них:			
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров	
1	Агрызский	6	6	6	6	
2	Алексеевский	2	0	0	0	
3	Арский	1	0	0	0	
4	Высокогорский	3	0	0	0	
5	Елабужский	2	0	0	0	
6	Зеленодольский	54	0	0	0	
7	Лаишевский	21	15	15	15	
8	Лениногорский	1	0	0	0	
9	Мамадышский	8	0	0	0	
10	г.Наб.Челны	50	50	50	50	
11	Нижнекамский	40	3	2	2	
12	Сармановский	2	0	0	0	
13	Спасский	2	0	0	0	
14	Чистопольский	37	21	15	14	
15	г. Казань	80	50	50	50	
ИТОГО		309	164	145	3	142



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещ.		Оплачено	
				29.11.19	Дин-ка	29.11.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-
3	Альметьевский	5	5	5	-	5	-
4	Бугульминский	1	1	1	-	1	-
5	Буинский	3	3	3	-	3	-
6	Лениногорский	1	1	1	-	1	-
7	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-
8	Сабинский	1	1	1	-	1	-
9	г.Казань	4	4	4	-	4	-
10	Зеленодольский	1	1	1	-	1	-
11	Мамадышский	2	2	2	-	2	-
12	Муслюмовский	1	1	1	-	1	-
13	Высокогорский	2	2	2	+1	1	+1
14	Кукморский	3	3	2	0	2	0
ИТОГО		33	33	32	+1	31	+1



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	1	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	10
4	Сабинский	1	1	1
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	28	24
ИТОГО		54	54	49



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			Открыт счет	Заявка на оплату		Оплачено	
				29.11.19	Дин-ка	29.11.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	2	-	2	-
8	Наб.Челны	4	4	4	-	4	-
9	Азнакаевский	1	1	1	-	1	-
10	Менделеевский	1	1	1	+1	1	+1
11	г.Казань	7	7	3	+1	3	+1
ИТОГО по РТ		25	25	21	+2	21	+2



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			29.11.19	Дин-ка	29.11.19	Дин-ка	29.11.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	-	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	-	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	-	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	-	1	-	1	-
5	Ютазинский	1	1	-	1	-	1	-
6	Сармановский	1	1	-	1	+1	1	+1
7	г.Наб.Челны	2	2	+1	1	+1	1	+1
8	г.Казань	15	15	+1	10	0	10	0
ИТОГО		25	25	+2	19	+2	19	+2



Всего по РТ	
1.	Агрызский
2.	Альметьевский
3.	Буинский
4.	Высокогорский
5.	Елабужский
6.	Зеленодольский
7.	г.Наб.Челны
8.	г.Казань

Количество объектов	Степень готовности Высокая (70-100%)
32	32
1	1
1	1
2	2
2	2
2	2
2	2
15	15
7	7



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

ТАССР



г. Набережные Челны, ж.д. № 21-25
Застройщик – ООО «Камаинвестстрой»



7 638 домов

104,2%





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	88,67	3,50
1	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	50,0	5,0
2	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	14 500,00	85,0	6,0
3	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	88,0	18,0
4	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	90,0	10,0
5	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	92,0	12,0
6	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	92,0	5,0
7	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	92,0	19,0
8	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	93,0	9,0
9	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	93,0	10,0
10	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	95,0	6,0
11	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	95,0	6,0
12	Агрызский район	парк «Орешник»	17 500,00	96,0	2,0
13	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	96,0	3,0
14	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	96,0	2,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	88,67	3,50
15	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	98,0	1,0
16	Тетюшский район	городской пруд	11 200,00	98,0	8,0
17	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	99,0	1,0
18	Бугульминский район	Активация городского центра	52 000,00	99,0	2,0
19	Лениногорский район	парк им.Горького	50 000,00	99,0	3,0
20	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	100,0	0,0
21	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	100,0	0,0
22	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	100,0	2,0
23	Альметьевский район	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0
24	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	100,0	0,0
25	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	100,0	0,0
26	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	100,0	0,0
27	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	100,0	0,0
28	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	100,0	0,0
29	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	88,67	3,50
30	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	100,0	3,0
31	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	0,0
32	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0
33	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	100,0	0,0
34	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	100,0	2,0
35	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	100,0	0,0
36	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
37	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
38	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	100,0	0,0
39	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	100,0	0,0
40	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
41	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	100,0	0,0
42	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	100,0	2,0
43	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
			3 175 906,41	88,67	3,50
44	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
45	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	100,0	0,0
46	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	100,0	0,0
47	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	100,0	0,0
48	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	100,0	0,0
49	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	100,0	18,0
50	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	0,0
51	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	100,0	2,0
52	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	100,0	0,0
53	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0
54	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	100,0	5,0



14 объектов победителей конкурса малых городов и исторических поселений



905,0 млн.руб.
из федерального бюджета



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	905 000,00	94,32	8,42
1	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	36,0	8,0
2	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	80,0	2,0
3	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	69 500,00	85,0	6,0
4	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	90,0	9,0
5	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	95,0	4,0
6	Агрызский	парк «Орешник»	72 400,00	96,0	2,0
7	Тетюшский	городской пруд	66 200,00	98,0	8,0
8	Бугульминский	Активация городского центра	152 000,00	99,0	2,0
9	Лениногорский	парк им.Горького	150 000,00	99,0	3,0
10	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	99,0	12,0
11	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	100,0	3,0
12	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	100,0	5,0
13	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	100,0	0,0
14	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	100,0	1,0



№	МО РТ	Наименование объекта	План согласно Концепции объекта, тыс. руб.	Факт исполнения, тыс. руб.	% выполнения
Всего по РТ		14 объектов	650 620,00	313 348,00	48,17
1	Елабужский	Площадь Ленина	20 000,00	Не представлен	0
2	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	22 000,00	Не представлен	0
3	Тетюшский	городской пруд	10 000,00	Не представлен	0
4	Лениногорский	парк им.Горького	75 000,00	Не представлен	0
5	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	18 500,00	Не представлен	0
6	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	22 500,00	Не представлен	0
7	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	163 500,00	43 500,00	26,6
8	Алексеевский	Билляр – древняя столица Татарстана	20 000,00	11 500,00	57,5
9	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	65 500,00	39 540,00	60
10	Бугульминский	Активация городского центра	103 000,00	78 000,00	75,7
11	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	6 200,00	4 898,00	79
12	Агрызский	парк «Орешник»	24 400,00	24 400,00	100
13	Мензелинский	набережная р.Мензеля	53 500,00	54 490,00	Более 100
14	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса	51 000,00	57 020,00	Более 100



№	МО РТ	Комментарии
1	Азнакаевский	г.Азнакаево, ул. Сююмбеки 2 земельных участка, по участку с кад.№ 16:44:010116:105 ул. М. Султангалиева; парк Тарсус - участок соответствует
2	Алексеевский	земельные участки соответствуют
3	Альметьевский	необходимо уточнить адрес объекта (во вх. 34224 указание на объект по адресу ул. Ленина)
4	Апастовский	земельные участки соответствуют
5	Арский	земельный участок с кад. № 16:09:010120:475 соответствует, земельный участок с кад. № 16:09:000000:1386 необходимо присвоение адреса (отсутствует указание на улицу в выписке из ЕГРН)
6	Высокогорский	земельный участок не сформирован
7	Елабужский	площадь Ленина, необходимо присвоение адреса (отсутствует указание на улицу в выписке из ЕГРН), сквер по ул. Автомобилистов - необходимо уточнить адрес объекта (вх. 34003 указание на другой объект)
8	Камско-Устьинский	необходимо присвоение адреса (отсутствует указание на улицу в выписке из ЕГРН)
9	Пестречинский	Яблоневый сад, с.Богородское земельный участок 16:33:020104:41 необходимо присвоение адреса (отсутствует указание на улицу в выписке из ЕГРН), парк отдыха с. Шали и прибрежная зона, д. Званка - земельные участки не сформированы
10	Рыбно-Слободский	по выписке из ЕГРН указан адрес пгт. Рыбная Слобода, сквер Ленина - необходимо уточнить адрес согласно выписке
11	Сабинский	3 земельных участка, по участку с кад.№ 16:35:140103:785 ВРИ спортплощадка, по участку с кад. № 16:35:140103:280 в выписке улица Кирова, необходимо уточнить адрес
12	Спасский	соответствует
13	Ютазинский	2 земельных участка, по участку с кад.№ 16:43:070901:950 в выписке из ЕГРН с. Старые Уруссу, необходимо уточнить адрес, 2й участок соответствует

По г. Казани объекты не определены – отсутствует возможность проверить.



Запланированы 7 видов работ:

- ✓ ремонт дорог
- ✓ ремонт тротуаров;
- ✓ наружное освещение;
- ✓ установка скамеек и урн;
- ✓ установка площадок ТКО;
- ✓ установка детского оборудования с покрытием из песчано-гравийной смеси;
- ✓ частичное озеленение.



Не представили итоговые протоколы общественных комиссий по письму от 10.10.2019 № 01-09-12388

	МО		МО		МО
1	Актанышский	7	Верхнеуслонский	13	Балтасинский
2	Алькеевский	8	Елабужский	14	Мамадышский
3	Апастовский	9	Заинский	15	Муслюмовский
4	Арский	10	Кукморский	16	Пестречинский
5	Атнинский	11	Лаишевский	17	Сармановский
6	Бавлинский	12	Лениногорский	18	Тюлячинский



Представили итоговые протоколы общественных комиссий с участием граждан **менее 9%**

	МО		МО
1	Бугульминский	4	Чистопольский
2	Зеленодольский	5	Ютазинский
3	Камско-Устьинский		



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	100%
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	100 %



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	100 %
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	100 %
5	Модернизация систем водоотведения	40 объектов в 20 МО	84%



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (15 объектов)	391,32	97,7	3,7%
Строительство силосно-сенажных траншей (94 объекта)	192,50	Работы завершены	
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	Работы завершены	
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	Работы завершены	
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	Работы завершены	

Строительство коровников и
овцеводческих ферм

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	15	391 322,80	97,73	3,73
1	Высокогорский	1	73 291,00	88,00	18,00
2	Актанышский	6	76 277,00	100,00	-
3	Альметьевский	1	7 125,00	100,00	-
4	Кукморский	1	62 743,00	100,00	-
5	Лаишевский	1	15 172,00	100,00	-
6	Нурлатский	1	77 960,00	100,00	-
7	Тетюшский	1	13 114,00	100,00	-
8	Тукаевский	2	31 907,00	100,00	-
9	Ютазинский	1	30 015,00	100,00	-



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 635 852,84	20 366 004,64	73,69	2,55	7 269 848,20
1	Нурлатский	205 901,74	114 859,65	55,78	6,70	91 042,09
2	Казань	10 986 467,46	6 416 309,73	58,40	2,13	4 570 157,73
3	Мамадышский	343 614,55	216 885,52	63,12	0,87	126 729,04
4	Высокогорский	314 476,47	202 147,21	64,28	4,95	112 329,26
5	Сабинский	233 714,45	154 137,97	65,95	3,24	79 576,48
6	Елабужский	641 753,49	446 610,20	69,59	11,90	195 143,29
7	Зеленодольский	1 166 865,59	817 621,34	70,07	2,04	349 244,25
8	Кукморский	197 553,96	141 840,92	71,80	9,07	55 713,04
9	Арский	208 287,06	150 159,20	72,09	11,96	58 127,86
10	Р.-Слободский	69 704,52	50 697,11	72,73	4,53	19 007,41
11	Актанышский	172 839,24	126 541,38	73,21	8,44	46 297,86
12	Спасский	90 668,00	66 700,36	73,57	3,18	23 967,64
13	Лаишевский	605 769,80	459 113,01	75,79	6,84	146 656,79
14	Пестречинский	102 328,81	77 777,77	76,01	3,60	24 551,04
15	Тюлячинский	75 264,85	57 901,32	76,93	4,36	17 363,53



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 22.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	27 635 852,84	20 366 004,64	73,69	2,55	7 269 848,20
16	Муслюмовский	81 200,88	63 284,86	77,94	5,33	17 916,02
17	Алексеевский	250 259,13	195 215,14	78,01	11,14	55 043,98
18	Агрызский	190 190,23	154 374,59	81,17	0,00	35 815,64
19	Мензелинский	204 421,52	167 069,45	81,73	4,08	37 352,07
20	Черемшанский	145 041,84	119 118,25	82,13	0,25	25 923,58
21	Новошешминский	99 874,46	82 137,90	82,24	2,93	17 736,55
22	Тетюшский	234 034,38	193 587,32	82,72	2,23	40 447,06
23	Буинский	294 305,68	244 328,18	83,02	4,60	49 977,49
24	Кайбицкий	91 973,34	77 294,67	84,04	0,00	14 678,67
25	Балтасинский	156 325,40	132 421,31	84,71	0,70	23 904,09
26	Альметьевский	1 223 125,63	1 041 444,90	85,15	0,16	181 680,73
27	Нижнекамский	1 211 929,58	1 046 071,41	86,31	2,71	165 858,17
28	Сармановский	170 908,87	148 737,01	87,03	5,96	22 171,86
29	Бугульминский	515 719,46	448 907,89	87,04	3,61	66 811,58
30	Тукаевский	150 611,52	132 652,92	88,08	1,91	17 958,59



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	27 635 852,84	20 366 004,64	73,69	2,55	7 269 848,20
31	Алькеевский	161 348,81	142 113,87	88,08	0,63	19 234,95
32	Азнакаевский	204 275,31	182 474,86	89,33	1,56	21 800,45
33	Наб.Челны	3 573 630,97	3 198 712,79	89,51	0,79	374 918,19
34	Аксубаевский	89 758,37	80 406,61	89,58	0,75	9 351,76
35	Атнинский	88 431,80	79 281,99	89,65	0,85	9 149,81
36	Апастовский	84 003,25	75 312,26	89,65	0,68	8 690,99
37	Чистопольский	413 950,92	371 987,14	89,86	3,52	41 963,78
38	Менделеевский	136 832,33	123 949,95	90,59	1,00	12 882,38
39	Лениногорский	528 576,11	498 059,25	94,23	3,26	30 516,86
40	Бавлинский	161 183,44	152 109,25	94,37	3,08	9 074,19
41	Камско-Устьинский	123 226,65	116 970,41	94,92	0,15	6 256,24
42	Заинский	172 278,17	165 838,81	96,26	7,13	6 439,36
43	Дрожжановский	152 198,19	147 109,56	96,66	0,00	5 088,63
44	Ютазинский	68 710,48	66 924,50	97,40	0,55	1 785,98
45	Верхнеуслонский	1 242 316,15	1 218 804,92	98,11	0,20	23 511,23



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 508 641,57	73,50	5,41	2 707 668,38
1	Казань	2 318 642,36	1 078 395,82	46,51	7,07	1 240 246,54
2	Мамадышский	197 217,05	100 614,97	51,02	1,52	96 602,08
3	Нурлатский	154 187,64	88 811,51	57,60	8,94	65 376,13
4	Елабужский	302 149,04	193 209,90	63,95	11,91	108 939,15
5	Арский	159 415,94	103 574,07	64,97	15,56	55 841,86
6	Лаишевский	399 130,75	270 117,47	67,68	10,38	129 013,29
7	Высокогорский	234 292,47	164 311,84	70,13	6,64	69 980,63
8	Спасский	77 669,32	57 062,01	73,47	3,71	20 607,31
9	Кукморский	139 958,62	103 025,16	73,61	12,79	36 933,46
10	Р.-Слободский	52 762,76	38 870,51	73,67	3,05	13 892,26
11	Пестречинский	87 380,57	65 197,41	74,61	4,22	22 183,17
12	Сабинский	121 021,40	91 237,48	75,39	6,27	29 783,92
13	Актанышский	133 353,21	100 674,61	75,49	10,94	32 678,60
14	Наб.Челны	805 608,32	616 578,57	76,54	3,45	189 029,75
15	Нижнекамский	712 782,55	554 189,89	77,75	4,60	158 592,66



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 508 641,57	73,50	5,41	2 707 668,38
16	Верхнеуслонский	96 273,63	76 288,87	79,24	0,00	19 984,75
17	Чистопольский	192 814,16	154 593,87	80,18	7,44	38 220,29
18	Агрызский	116 848,25	94 745,11	81,08	0,00	22 103,14
19	Алексеевский	188 999,67	154 572,95	81,78	14,68	34 426,72
20	Мензелинский	171 253,87	143 459,44	83,77	4,87	27 794,44
21	Зеленодольский	403 496,57	338 708,16	83,94	0,09	64 788,41
22	Тюлячинский	51 869,01	43 982,27	84,79	6,33	7 886,74
23	Новошешминский	73 362,47	63 338,97	86,34	1,00	10 023,50
24	Аксубаевский	76 226,31	66 911,15	87,78	0,88	9 315,15
25	Азнакаевский	153 908,70	135 753,46	88,20	1,44	18 155,25
26	Кайбицкий	56 836,63	50 451,58	88,77	0,00	6 385,05
27	Тетюшский	199 569,71	178 782,42	89,58	1,37	20 787,29
28	Лениногорский	258 603,67	234 584,01	90,71	6,66	24 019,66
29	Балтасинский	114 278,27	103 780,14	90,81	0,96	10 498,13
30	Бугульминский	456 750,33	414 913,46	90,84	4,03	41 836,87



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 508 641,57	73,50	5,41	2 707 668,38
31	Атнинский	75 727,38	69 480,25	91,75	1,00	6 247,13
32	Апастовский	58 431,84	53 749,15	91,99	0,96	4 682,70
33	Камско-Устьинский	55 860,60	51 690,12	92,53	0,33	4 170,48
34	Тукаевский	120 222,67	112 015,34	93,17	2,39	8 207,33
35	Менделеевский	125 376,41	116 895,27	93,24	1,09	8 481,14
36	Сармановский	85 862,52	80 304,68	93,53	6,91	5 557,83
37	Бавлинский	142 751,64	134 038,84	93,90	2,07	8 712,79
38	Дрожжановский	87 729,32	83 003,76	94,61	0,00	4 725,57
39	Алькеевский	134 288,55	128 009,36	95,32	0,76	6 279,19
40	Муслюмовский	56 280,41	53 752,36	95,51	7,70	2 528,05
41	Заинский	157 591,25	151 732,39	96,28	7,80	5 858,87
42	Буинский	176 656,66	170 345,43	96,43	7,67	6 311,23
43	Черемшанский	58 265,15	56 370,41	96,75	0,63	1 894,74
44	Ютазинский	56 180,68	54 607,26	97,20	0,67	1 573,42
45	Альметьевский	318 421,61	311 909,89	97,95	0,52	6 511,73



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 363 771,31	12 068 216,45	73,75	0,86	4 295 554,86
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
4	Нурлатский	31 625,33	12 316,53	38,95	0,00	19 308,80
5	Кукморский	27 522,83	11 216,73	40,75	0,03	16 306,10
6	Р.-Слободский	3 406,59	1 432,16	42,04	0,00	1 974,43
7	Бугульминский	41 870,40	21 364,28	51,02	0,47	20 506,12
8	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
9	Сабинский	99 216,52	52 154,32	52,57	0,00	47 062,20
10	Казань	8 603 225,96	5 295 217,47	61,55	0,81	3 308 008,49
11	Черемшанский	63 309,02	39 508,01	62,41	0,00	23 801,01
12	Зеленодольский	735 568,02	461 809,98	62,78	3,18	273 758,04



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	16 363 771,31	12 068 216,45	73,75	0,86	4 295 554,86
13	Алексеевский	48 050,41	33 372,35	69,45	0,27	14 678,06
14	Кайбицкий	20 536,72	14 891,82	72,51	0,00	5 644,90
15	Елабужский	324 842,01	238 878,32	73,54	12,44	85 963,69
16	Новошешминский	12 263,93	9 178,44	74,84	0,00	3 085,49
17	Высокогорский	28 168,37	21 104,89	74,92	0,00	7 063,48
18	Агрызский	54 916,05	41 777,23	76,07	0,00	13 138,82
19	Альметьевский	884 420,41	714 384,49	80,77	0,00	170 035,92
20	Сармановский	69 812,94	58 495,19	83,79	6,10	11 317,75
21	Мамадышский	119 545,34	103 577,92	86,64	0,00	15 967,42
22	Наб.Челны	2 740 900,25	2 565 054,41	93,58	0,00	175 845,84
23	Бавлинский	3 558,81	3 354,33	94,25	56,51	204,48
24	Лаишевский	194 027,83	184 303,77	94,99	0,00	9 724,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 363 771,31	12 068 216,45	73,75	0,86	4 295 554,86
25	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
26	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
27	Нижнекамский	475 090,52	470 009,86	98,93	0,00	5 080,66
28	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
29	Чистопольский	194 378,84	194 312,43	99,97	0,12	66,41
30	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	789 146,62	74,75	0,89	266 624,96
1	Высокогорский	52 015,63	16 730,48	32,16	0,00	35 285,15
2	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
3	Тетюшский	34 464,67	14 804,90	42,96	6,03	19 659,76
4	Мамадышский	26 852,17	12 692,63	47,27	0,00	14 159,54
5	Алькеевский	27 060,26	14 104,50	52,12	0,00	12 955,76
6	Алексеевский	13 209,05	7 269,85	55,04	0,00	5 939,20
7	Актанышский	31 907,27	18 288,06	57,32	0,00	13 619,22
8	Зеленодольский	27 801,00	17 103,20	61,52	0,00	10 697,80
9	Менделеевский	11 455,92	7 054,68	61,58	0,00	4 401,24
10	Наб.Челны	27 122,41	17 079,81	62,97	0,00	10 042,60
11	Сармановский	15 233,41	9 937,14	65,23	0,00	5 296,28
12	Муслюмовский	14 318,36	9 396,61	65,63	0,00	4 921,74
13	Казань	64 599,14	42 696,44	66,09	0,00	21 902,70
14	Новошешминский	14 248,05	9 620,49	67,52	15,44	4 627,56
15	Тукаевский	30 388,85	20 637,59	67,91	0,00	9 751,26



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	789 146,62	74,75	0,89	266 624,96
16	Балтасинский	42 047,13	28 641,17	68,12	0,00	13 405,96
17	Нурлатский	20 088,77	13 731,61	68,35	0,00	6 357,16
18	Верхнеуслонский	12 636,71	9 115,23	72,13	19,73	3 521,48
19	Бугульминский	17 098,74	12 630,15	73,87	0,00	4 468,59
20	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
21	Альметьевский	20 283,60	15 150,52	74,69	0,00	5 133,08
22	Р.-Слободский	13 535,17	10 394,44	76,80	11,43	3 140,73
23	Атнинский	12 704,42	9 801,74	77,15	0,00	2 902,68
24	Тюлячинский	12 823,19	10 061,02	78,46	0,00	2 762,17
25	Сабинский	13 476,53	10 746,17	79,74	0,00	2 730,36
26	Лениногорский	21 245,68	17 179,48	80,86	0,00	4 066,20
27	Кайбицкий	14 599,99	11 951,27	81,86	0,00	2 648,72
28	Пестречинский	14 948,24	12 580,36	84,16	0,00	2 367,88
29	Апастовский	25 571,40	21 563,11	84,33	0,04	4 008,29
30	Арский	15 686,98	13 400,99	85,43	0,64	2 285,99



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 29.11.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	789 146,62	74,75	0,89	266 624,96
31	Чистопольский	26 757,92	23 080,84	86,26	0,00	3 677,07
32	Азнакаевский	14 871,15	12 864,84	86,51	6,58	2 006,31
33	Буинский	82 545,01	73 580,80	89,14	0,00	8 964,21
34	Нижнекамский	24 056,51	21 871,66	90,92	0,00	2 184,85
35	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	0,00	2 473,48
36	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,00	580,49
37	Агрызский	18 425,93	17 852,25	96,89	0,00	573,68
38	Камско-Устьинский	13 959,72	13 576,51	97,25	0,00	383,22
39	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
40	Елабужский	14 762,44	14 521,98	98,37	0,00	240,46
41	Мензелинский	13 729,46	13 524,13	98,50	0,00	205,32
42	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,00	156,91
43	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
44	Дрожжановский	64 468,87	64 105,81	99,44	0,00	363,06
45	Аксубаевский	13 532,06	13 495,45	99,73	0,00	36,61



		Подрядчик		ООО «УКС»			
		Заказчик		ГКУ Фонд газификации РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		122,73			
				ПИР- 12,41		СМР-110,32	
		Начало работ		Август 2018г.			
		Завершение работ		Ноябрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 23.11.2019 по 29.11.2019)	110,32	0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 29.11.2019)		0	0	0	0	0	0
СМР		0	0	0	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.11.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 23.11.2019 по 29.11.2019)	139,95	5,03	7,65	152,09	24,27	0,00	0,00
СМР		5,03	7,65	152,09	24,27	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 29.11.2019)		20,12	22,97	114,07	24,27	41,04	52,41
СМР		20,12	22,97	114,17	24,27	41,04	52,41
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.11.2019)		124,32	132,53	106,60	127,76	129,12	130,08
СМР		124,32	132,53	106,60	127,76	129,12	130,08

Работает 10 чел.



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 23.11.2019 по 29.11.2019)	141,55	4,86	4,73	97,32	13,25	0,00	0,00
СМР		4,86	4,73	97,32	13,25	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 29.11.2019)		22,76	20,67	90,81	13,25	84,18	84,96
СМР		22,76	20,67	90,81	13,25	84,18	84,96
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.11.2019)		123,76	120,62	97,46	84,96	84,18	84,96
СМР		123,76	120,62	97,46	84,96	84,18	84,96

Работает 16 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 23.11.2019 по 29.11.2019)	307,10	24,32	24,57	101,03	72,49	72,00	72,49
СМР		24,32	24,57	101,03	72,49	72,00	72,49
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (с 01.11.2019 по 29.11.2019)		66,18	60,13	90,86	96,75	96,25	96,75
СМР		66,18	60,13	90,86	96,75	96,25	96,75
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.11.2019)		238,30	229,29	96,22	157,86	156,75	157,86
СМР		238,30	229,29	96,22	157,86	156,75	157,86

Работает 68 чел.
