



2016
январь - декабрь

2017
январь - декабрь


2018
январь - декабрь

2019
январь - декабрь

**Со смертельным
исходом**

**С тяжелым
исходом**

**ВСЕГО
по РТ**

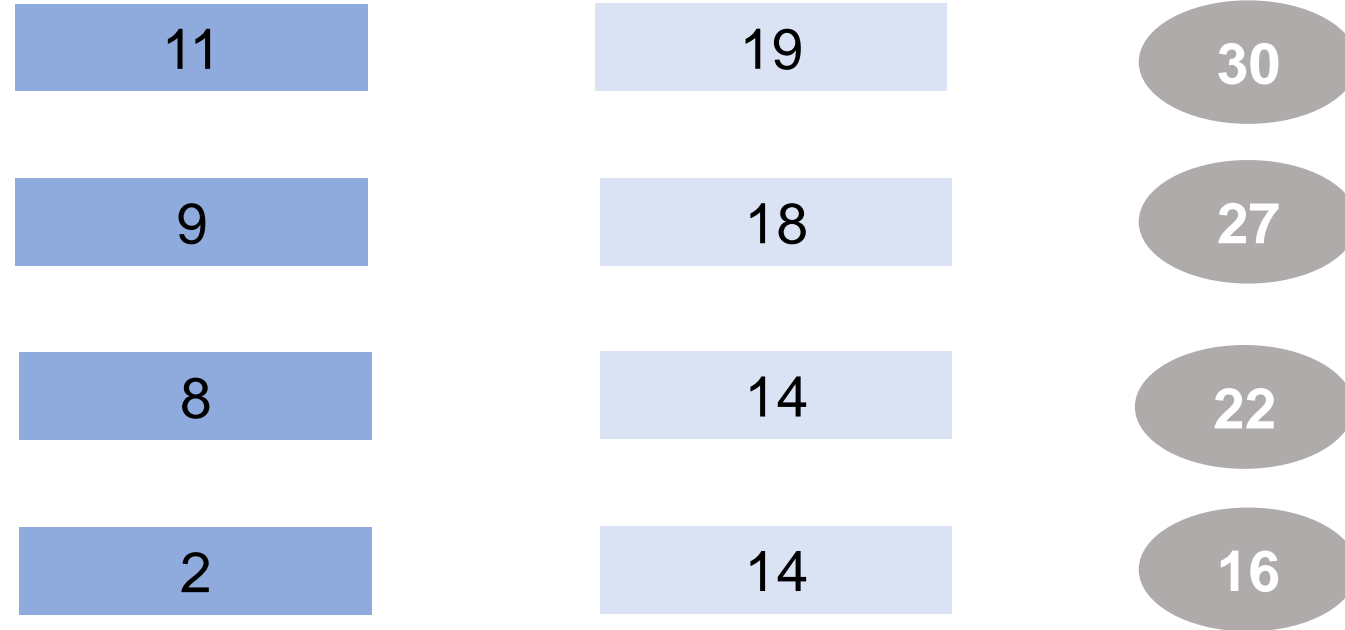



Организация проходов
к рабочим местам
не соответствует
СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве»

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
Подрядчик: ООО «СМУ №7»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 407	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	349 111	15 064,0 -
Взыскано всего	176	10 859,0
Не истек срок оплаты	60	4 085,0
Обжалуются в суде	2	120,0



Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 180
- с выездом на объекты строительства	382
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	875
- выдано предписаний	359
- приостановлено право осуществлять строительство	175
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	58
- выдано предупреждений	282



Ключевой показатель объема ввода жилья по
Национальному проекту «Жилье и городская среда»
по РТ до 2024 года

ТЫС.КВ.М.

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель	2 675,0	2 979,0	2 857,0	3 161,0	3 404,0	3 648,0



Выполнение ключевого показателя объема ввода жилья
по Национальному проекту «Жилье и городская среда»
по РТ на 2019 год

ТЫС.КВ.М.

Показатель	Введено на 13.12.2019	% от планового показателя	Остаток
2 675,0	2 189,2	81,8	485,8



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 декабря 2019 года

№	МО РТ	Введено
1	Нижнекамский	28 091
2	Зеленодольский	76 034
3	Апастовский	7 012
4	Альметьевский	95 229
5	Атнинский	3 607
6	Чистопольский	23 358
7	г.Наб.Челны	224 157
8	Лениногорский	22 542
9	В-Услонский	35 209
10	Мамадышский	15 393
11	г.Казань	774 233
12	Бавлинский	11 197
13	Сабинский	18 941
14	Дрожжановский	5 683
15	Мензелинский	13 281

№	МО РТ	Введено
16	Аксубаевский	6 692
17	Азнакаевский	19 562
18	Р-Слободский	13 390
19	Буинский	15 003
20	Алексеевский	14 004
21	Спасский	6 502
22	Агрызский	15 007
23	Нурлатский	16 009
24	Заинский	17 017
25	Тетюшский	10 011
26	Алькеевский	7 013
27	Ютазинский	11 038
28	Кайбицкий	5 018
29	Тюлячинский	8 031
30	Бугульминский	35 136

№	МО РТ	Введено
31	Менделеевский	14 055
32	К-Устьинский	8 037
33	Актанышский	14 073
34	Балтасинский	14 084
35	Сармановский	10 077
36	Черемшанский	5 048
37	Муслюмовский	9 106
38	Елабужский	50 765
39	Новошешминский	5 111
40	Тукаевский	93 261
41	Лаишевский	105 658
42	Пестречинский	157 637
43	Высокогорский	90 574
44	Арский	31 892
45	Кукморский	26 437



МО РТ, по которым имеются резервы для дополнительного объема ввода жилья в 2019 году

г.Казань

Пестречинский

Высокогорский

Лайшевский

Тукаевский

Арский



438 302 кв.м.

100%

200 471 кв.м.

45,7%





на 13.12.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности	
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	165	98	2	67	46	21
Количество квартир	7 838	3 574	17	4 264	3 694	570
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	200,5	0,7	237,8	205,1	32,7



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	16 361 546	15 157 054	349 514	13 250 981	1 182 764	15 066 884	320 113
введены в эксплуатацию	7 480 166	7 480 166	1 790	7 179 611	4 818	7 386 389	4 538
высокая 70-100%	7 557 616	7 075 287	279 470	5 726 038	1 086 239	6 831 963	247 746
средняя 30-70%	1 323 764	601 601	68 254	345 332	91 708	848 531	67 829



	Количество объектов	Количество квартир	Степень готовности Высокая (70-100%)
Итого по РТ	3	8	3
1. г.Казань	1	3	1
2. г.Наб.Челны	1	2	1
3. г.Альметьевск	1	3	1



	План	Финансирование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	145	46
многодетные семьи	33	155,9	33	100
молодые семьи	54	57,4	49	91

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений, из них:			
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров	
1	Агрызский	6	6	6	6	
2	Алексеевский	2	0	0	0	
3	Арский	1	1	0	0	
4	Высокогорский	3	0	0	0	
5	Елабужский	2	0	0	0	
6	Зеленодольский	54	1	0	0	
7	Лаишевский	21	15	15	15	
8	Лениногорский	1	0	0	0	
9	Мамадышский	8	1	0	0	
10	г.Наб.Челны	50	50	50	50	
11	Нижнекамский	40	40	3	3	
12	Сармановский	2	2	0	0	
13	Спасский	2	2	0	0	
14	Чистопольский	37	37	21	21	
15	г. Казань	80	50	50	50	
ИТОГО		309	104	205	60	145



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещ.		Оплачено	
				13.12.19	Дин-ка	13.12.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-
3	Альметьевский	5	5	5	-	5	-
4	Бугульминский	1	1	1	-	1	-
5	Буинский	3	3	3	-	3	-
6	Лениногорский	1	1	1	-	1	-
7	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-
8	Сабинский	1	1	1	-	1	-
9	г.Казань	4	4	4	-	4	-
10	Зеленодольский	1	1	1	-	1	-
11	Мамадышский	2	2	2	-	2	-
12	Муслюмовский	1	1	1	-	1	-
13	Высокогорский	2	2	2	-	2	+1
14	Кукморский	3	3	3	+1	3	+1
ИТОГО		33	33	33	+1	33	+2



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	1	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	10
4	Сабинский	1	1	1
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	28	24
ИТОГО		54	54	49



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			Открыт счет	Заявка на оплату		Оплачено	
				13.12.19	Дин-ка	13.12.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	2	-	2	-
8	Наб.Челны	4	4	4	-	4	-
9	Азнакаевский	1	1	1	-	1	-
10	Менделеевский	1	1	1	-	1	-
11	г.Казань	7	7	3	0	3	0
ИТОГО по РТ		25	25	21	0	21	0



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			Открыт счет	Заявка на оплату		Оплачено	
				13.12.19	Дин-ка	13.12.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	1	-	1	-
5	Ютазинский	1	1	1	-	1	-
6	Сармановский	1	1	1	-	1	-
7	г.Наб.Челны	2	2	1	0	1	0
8	г.Казань	15	15	10	0	10	0
ИТОГО		25	25	19	0	19	0



- Всего по РТ**
1. Агрызский
 2. Буинский
 3. Высокогорский
 4. Елабужский
 5. Зеленодольский
 6. г.Наб.Челны
 7. г.Казань

Количество объектов	Степень готовности Высокая (70-100%)
19	19
1	1
1	1
1	1
2	2
2	2
7	7
5	5



Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

ТАССР



г. Альметьевск, ул.Рината Галеева, д.22
Застройщик – ООО «Домкор»



8 022 дома

109,5%





№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	100%
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	100 %



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	100 %
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	100 %
5	Модернизация систем водоотведения	40 объектов в 20 МО	86%



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников и овцеводческих ферм (15 объектов)	387,60	Работы завершены	2,3%
Строительство силосно-сенажных траншей (94 объекта)	200,00	Работы завершены	
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	Работы завершены	
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	Работы завершены	
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	Работы завершены	



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	92,36	3,65
1	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	57,0	7,0
2	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	90,0	0,0
3	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	90,0	2,0
4	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	95,0	3,0
5	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	95,0	2,0
6	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	96,0	4,0
7	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	14 500,00	96,0	11,0
8	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	97,0	4,0
9	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	97,0	5,0
10	Агрызский район	парк «Орешник»	17 500,00	98,0	2,0
11	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	98,0	2,0
12	Бугульминский район	Активация городского центра	52 000,00	99,0	0,0
13	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	99,0	3,0
14	Тетюшский район	городской пруд	11 200,00	99,0	1,0
15	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	99,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	92,36	3,65
16	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	100,0	0,0
17	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	100,0	0,0
18	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	100,0	0,0
19	Альметьевский район	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0
20	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	100,0	0,0
21	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	100,0	0,0
22	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	100,0	0,0
23	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	100,0	0,0
24	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	100,0	5,0
25	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	100,0	0,0
26	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	100,0	0,0
27	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	100,0	0,0
28	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	100,0	5,0
29	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	92,36	3,65
30	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0
31	Лениногорский район	парк им.Горького	50 000,00	100,0	1,0
32	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	100,0	2,0
33	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	100,0	0,0
34	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	100,0	0,0
35	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	100,0	0,0
36	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
37	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	100,0	0,0
38	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	100,0	0,0
39	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	100,0	0,0
40	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
41	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	100,0	0,0
42	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	100,0	0,0
43	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	100,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
			3 175 906,41	92,36	3,65
44	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
45	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	100,0	0,0
46	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	100,0	0,0
47	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	100,0	0,0
48	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	100,0	0,0
49	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	100,0	0,0
50	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	0,0
51	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	100,0	0,0
52	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	100,0	0,0
53	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0
54	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	100,0	0,0



14 объектов победителей конкурса малых городов и исторических поселений



905,0 млн.руб.
из федерального бюджета



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	905 000,00	95,71	6,99
1	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	38,0	2,0
2	Мензелинский	набережная р.Мензеля	69 500,00	96,0	11,0
3	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	97,0	2,0
4	Агрызский	парк «Орешник»	72 400,00	98,0	2,0
5	Бугульминский	Активация городского центра	152 000,00	99,0	0,0
6	Тетюшский	городской пруд	66 200,00	99,0	1,0
7	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	100,0	0,0
8	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	100,0	20,0
9	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	100,0	0,0
10	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	100,0	10,0
11	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	100,0	0,0
12	Лениногорский	парк им.Горького	150 000,00	100,0	1,0
13	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	100,0	1,0
14	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	100,0	0,0

Конкурс малых городов Площадь Ленина г.Елабуга

Подрядчик ГУП РТ «Татлизинг» (субподрядчик ООО «Реставратор»)

Стоимость СМР по г/к, тыс.рублей	Факт СМР на 11.12.19, %	Стоимость МАФ по г/к, тыс.рублей	Поставлено МАФ, тыс.рублей	% МАФ	Срок поставки МАФ по г/к	Принято КС-2, %
41 057,86	38,0	8 107,07	0,00	0	15.12.19	18,9





Конкурс малых городов «Природно-спортивный комплекс», г. Мамадыш

Подрядчик ГУП РТ "Татлизинг» (субподрядчик ООО "СтройСити»)

Стоимость СМР по г/к, тыс.рублей	Факт СМР на 11.12.19, %	Стоимость МАФ, тыс.рублей	Поставлено МАФ, тыс.рублей	% МАФ	Принято КС-2, %
57 714,62	30	0,0	0,0	0,0	30





№	МО РТ	Наименование объекта	План согласно Концепции объекта, тыс. руб.	Факт исполнения, тыс. руб.	% выполнения
Всего по РТ		14 объектов	650 620,00	401 587,00	61,70
1	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	22 000,00	Не представлен	0
2	Тетюшский	городской пруд	10 000,00	1 450,00	14,5
3	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	22 500,00	6 000,00	26,6
4	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	163 500,00	43 500,00	26,6
5	Лениногорский	парк им.Горького	75 000,00	25 000,00	33,3
6	Алексеевский	Бильярд – древняя столица Татарстана	20 000,00	11 500,00	57,5
7	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	18 500,00	13 300,00	71,9
8	Бугульминский	Активация городского центра	103 000,00	78 000,00	75,7
9	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	6 200,00	4 898,00	79,0
10	Елабужский	Площадь Ленина	20 000,00	17 029,00	85,1
11	Агрызский	парк «Орешник»	24 400,00	24 400,00	100
12	Мензелинский	набережная р.Мензеля	53 500,00	54 490,00	Более 100
13	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса	51 000,00	57 020,00	Более 100
14	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	62 500,00	65 000,00	Более 100



Формирование программы «Комфортной городской среды» на 2020 год

№	МО РТ	Формирование земельных участков
1	Казань	документы не представлены/объекты не утверждены
2	Алькеевский	документы не представлены
3	Бугульминский	документы не представлены
4	Лаишевский	замечания
5	Н.Челны	замечания
6	Агрызский	замечания
7	Азнакаевский	замечания
8	Актанышский	замечания
9	Альметьевский	замечания
10	Арский	замечания
11	Бавлинский	замечания
12	Балтасинский	замечания
13	Высокогорский	замечания
14	Елабужский	замечания



№	МО РТ	Формирование земельных участков
15	Зеленодольский	замечания
16	Кайбицкий	замечания
17	Камско-Устьинский	замечания
18	Мамадышский	замечания
19	Муслюмовский	замечания
20	Нижнекамский	замечания
21	Новошешминский	замечания
22	Пестречинский	замечания
23	Рыбно-Слободский	замечания
24	Сабинский	замечания
25	Тетюшский	замечания
26	Тукаевский	замечания
27	Тюлячинский	замечания
28	Ютазинский	замечания



№	МО РТ	Формирование земельных участков
29	Аксубаевский	соответствует/принято ГИСУ
30	Алексеевский	соответствует/принято ГИСУ
31	Апастовский	соответствует/принято ГИСУ
32	Атнинский	соответствует/принято ГИСУ
33	Буинский	соответствует/принято ГИСУ
34	Верхнеуслонский	соответствует/принято ГИСУ
35	Дрожжановский	соответствует/принято ГИСУ
36	Заинский	соответствует/принято ГИСУ
37	Кукморский	соответствует/принято ГИСУ
38	Лениногорский	соответствует/принято ГИСУ
39	Менделеевский	соответствует/принято ГИСУ
40	Мензелинский	соответствует/принято ГИСУ
41	Нурлатский	соответствует/принято ГИСУ
42	Сармановский	соответствует/принято ГИСУ
43	Спасский	соответствует/принято ГИСУ
44	Черемшанский	соответствует/принято ГИСУ
45	Чистопольский	соответствует/принято ГИСУ



Количество дворов на 06.12.2019	Площадь дворов, ТЫС.КВ.М.	Количество дворов с плохим асфальтом (требуют комплексного ремонта)	Площадь дворов с плохим асфальтом, ТЫС.КВ.М.
9 546	70 248,3	6 772	49 598,65



№	Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
			%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Итого по РТ		1 621 821,52	58,9	6,4	472 628,9	29,1
1	Строительство биологических очистных сооружений в пгт.Васильево	173 977,59	5,0	2,0	0,00	0,0
2	Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское Алексеевского МР	148 042,99	85,0	3,0	0,00	0,0
3	Строительство БОС в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского МР	178 401,19	2,0	1,0	0,00	0,0
4	Строительство БОС в с.Красный Бор Агрызского МР	52 981,93	85,0	10,0	14 691,07	27,7
5	Строительство очистных сооружений в г.Казани в районе Ветеринарной академии	90 081,51	80,0	13,2	32 591,33	36,2
6	Реконструкция районных очистных сооружений в ОЭЗ ППТ "Алабуга" г.Елабуга. I этап.	783 787,99	80,0	2,0	308 179,77	39,3
7	Строительство очистных сооружений г.Заинск, Поповское сельское поселение	87 000,61	72,0	8,0	34 736,05	40,0
8	Устройство ливневой канализации в г.Тетюши	107 548,28	80,0	20,0	82 430,66	76,6



Генеральный подрядчик: АО «УКС»
Субподрядная организация СК «Поволжье»

ТАССР

Проектная организация: ООО «ТЭКО»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство биологических очистных сооружений в пгт. Васильево	173 977,59	5,0	2,0	0,0	0,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «Юнион Строй»

ТАССР

Проектная организация: ООО АСТП «Линда»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское Алексеевского МР	148 042,99	85,0	3,0	0,0	0,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»
Субподрядная организация СК «Стафит»

Проектная организация: ООО АСПТ «Линда»

ТАССР

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство БОС в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского МР	178 401,19	2,0	1,0	0,0	0,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «СтройМетис»

Проектная организация: ООО «НПК «Биотехинжиниринг»

ТАИССР

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство БОС в с. Красный Бор Агрызского МР	52 981,92	85,0	10,0	14 691,07	27,7





Генеральный подрядчик: АО «УКС»
Субподрядная организация: ООО «Сигм

Проектная организация ООО «Альтернатива»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений в г.Казани в районе Ветеринарной академии	90 081,51	80,0	13,2	32 591,33	36,2





Генеральный подрядчик : ООО «Алабуга Девелопмент»
Проектная организация: ООО «ВТС Проект»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция районных очистных сооружений в ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга. I этап.	783 787,42	80,0	2,0	308 179,77	39,3





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «ГазСервисСтрой» Проектная организация: ООО «Евро Акцент Саба»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений г.Зайнск, Поповское сельское поселение	87 000,61	72,0	8,0	34 736,05	40,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»
Субподрядная организация СК «Поволжье»

ТАССР

Проектная организация: ООО «ТЭКО»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Устройство ливневой канализации в г.Тетюши	107 548,27	80,0	20,0	69 595,02	64,7





Федеральный проект «Чистая вода»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция ВЗС г. Болгар на 5 тыс.куб.м в сутки Спасского МР	28 074,504	85,0	18,0	16 161,003	57,6



Генеральный подрядчик: АО «УКС»
Субподрядная организация ООО «PCY»

ТАССР

Проектная организация: ООО АСПТ «Линда»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция ВЗС г.Болгар на 5 тыс.куб.м в сутки Спасского МР	28 074,504	85,0	18,0	16 161,003	57,6





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 633 627,65	22 074 148,57	79,88	3,81	5 559 479,08
1	Нурлатский	205 901,74	128 583,34	62,45	2,24	77 318,40
2	Казань	10 986 467,46	7 304 046,57	66,48	6,94	3 682 420,89
3	Мамадышский	343 614,55	242 254,15	70,50	5,12	101 360,40
4	Елабужский	639 396,48	474 643,81	74,23	3,22	164 752,67
5	Кукморский	197 553,96	149 334,18	75,59	0,53	48 219,79
6	Высокогорский	314 476,47	237 806,20	75,62	1,07	76 670,27
7	Сабинский	233 714,45	178 198,77	76,25	3,56	55 515,67
8	Лаишевский	605 769,80	463 652,26	76,54	0,33	142 117,54
9	Арский	208 287,06	164 736,76	79,09	2,25	43 550,30
10	Р.-Слободский	69 704,52	56 337,28	80,82	0,85	13 367,25
11	Пестречинский	102 328,81	83 636,60	81,73	2,40	18 692,21
12	Алексеевский	250 259,13	205 442,99	82,09	2,44	44 816,13
13	Муслюмовский	81 200,88	67 125,75	82,67	0,00	14 075,13
14	Актанышский	172 839,24	143 198,74	82,85	6,82	29 640,50
15	Спасский	90 668,00	75 861,70	83,67	8,67	14 806,30



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	27 633 627,65	22 074 148,57	79,88	3,81	5 559 479,08
16	Агрызский	190 190,23	159 387,93	83,80	2,64	30 802,30
17	Буинский	294 305,68	246 751,48	83,84	0,11	47 554,19
18	Черемшанский	145 041,84	121 822,97	83,99	1,66	23 218,86
19	Зеленодольский	1 166 865,59	1 009 116,33	86,48	3,16	157 749,26
20	Тюлячинский	75 264,85	65 578,94	87,13	2,11	9 685,91
21	Мензелинский	204 421,52	180 151,93	88,13	5,66	24 269,59
22	Тукаевский	150 611,52	132 864,84	88,22	0,00	17 746,67
23	Нижнекамский	1 211 929,58	1 072 295,33	88,48	1,05	139 634,26
24	Тетюшский	234 034,38	207 897,41	88,83	5,60	26 136,97
25	Азнакаевский	204 275,31	183 965,47	90,06	0,10	20 309,84
26	Балтасинский	156 325,40	141 474,84	90,50	5,69	14 850,56
27	Альметьевский	1 223 125,63	1 120 189,55	91,58	1,34	102 936,07
28	Атнинский	88 431,80	81 012,84	91,61	1,96	7 418,97
29	Чистопольский	413 950,92	380 941,57	92,03	0,59	33 009,36
30	Апастовский	84 003,25	77 872,79	92,70	0,00	6 130,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 633 627,65	22 074 148,57	79,88	3,81	5 559 479,08
31	Сармановский	170 908,87	158 502,41	92,74	0,00	12 406,46
32	Аксубаевский	89 758,37	83 394,76	92,91	0,00	6 363,61
33	Наб.Челны	3 573 630,97	3 321 379,26	92,94	0,45	252 251,72
34	Новошешминский	99 874,46	92 963,82	93,08	6,60	6 910,64
35	Менделеевский	136 832,33	128 314,47	93,77	0,00	8 517,86
36	Кайбицкий	91 973,34	86 830,78	94,41	4,90	5 142,56
37	Бугульминский	515 851,28	492 823,20	95,54	7,97	23 028,08
38	Лениногорский	528 576,11	505 195,74	95,58	0,40	23 380,37
39	Камско-Устьинский	123 226,65	119 016,37	96,58	0,00	4 210,28
40	Алькеевский	161 348,81	157 785,57	97,79	4,31	3 563,24
41	Бавлинский	161 183,44	157 635,53	97,80	3,32	3 547,91
42	Ютазинский	68 710,48	67 225,36	97,84	0,28	1 485,12
43	Заинский	172 278,17	169 265,51	98,25	1,99	3 012,66
44	Верхнеуслонский	1 242 316,15	1 227 235,04	98,79	0,00	15 081,11
45	Дрожжановский	152 198,19	150 397,42	98,82	0,00	1 800,77



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 941 470,35	77,73	2,58	2 274 839,61
1	Казань	2 318 642,36	1 181 085,55	50,94	3,06	1 137 556,81
2	Мамадышский	197 217,05	115 762,25	58,70	3,74	81 454,80
3	Нурлатский	154 187,64	100 993,26	65,50	2,99	53 194,39
4	Лаишевский	399 130,75	272 134,02	68,18	0,51	126 996,74
5	Елабужский	302 149,04	211 830,43	70,11	3,70	90 318,61
6	Арский	159 415,94	117 451,63	73,68	2,94	41 964,30
7	Высокогорский	234 292,47	179 171,30	76,47	1,43	55 121,17
8	Р.-Слободский	52 762,76	41 193,38	78,07	0,97	11 569,38
9	Кукморский	139 958,62	110 518,42	78,97	0,75	29 440,20
10	Наб.Челны	805 608,32	636 210,39	78,97	1,51	169 397,92
11	Пестречинский	87 380,57	69 738,93	79,81	2,81	17 641,64
12	Нижнекамский	712 782,55	573 663,23	80,48	1,75	139 119,32
13	Агрызский	116 848,25	94 745,11	81,08	0,00	22 103,14
14	Сабинский	121 021,40	100 704,07	83,21	6,87	20 317,33
15	Чистопольский	192 814,16	163 291,14	84,69	1,27	29 523,02



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	10 216 309,95	7 941 470,35	77,73	2,58	2 274 839,61
16	Спасский	77 669,32	66 223,35	85,26	10,12	11 445,97
17	Алексеевский	188 999,67	162 784,25	86,13	3,23	26 215,42
18	Верхнеуслонский	96 273,63	83 219,00	86,44	0,01	13 054,63
19	Зеленодольский	403 496,57	352 536,73	87,37	1,13	50 959,85
20	Актанышский	133 353,21	117 143,87	87,84	8,84	16 209,34
21	Азнакаевский	153 908,70	135 754,79	88,20	0,00	18 153,91
22	Мензелинский	171 253,87	156 517,57	91,40	6,76	14 736,31
23	Аксубаевский	76 226,31	69 899,31	91,70	0,00	6 327,00
24	Лениногорский	258 603,67	238 620,29	92,27	0,83	19 983,38
25	Менделеевский	125 376,41	116 895,26	93,24	0,00	8 481,15
26	Тукаевский	120 222,67	112 227,25	93,35	0,00	7 995,41
27	Атнинский	75 727,38	71 211,10	94,04	2,29	4 516,28
28	Балтасинский	114 278,27	108 676,80	95,10	4,27	5 601,47
29	Кайбицкий	56 836,63	54 251,62	95,45	0,00	2 585,02
30	Тюлячинский	51 869,01	49 572,89	95,57	0,57	2 296,12



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 216 309,95	7 941 470,35	77,73	2,58	2 274 839,61
31	Камско-Устьинский	55 860,60	53 421,37	95,63	0,00	2 439,22
32	Апастовский	58 431,84	56 102,34	96,01	0,00	2 329,50
33	Тетюшский	199 569,71	192 984,27	96,70	6,56	6 585,44
34	Сармановский	85 862,52	83 267,36	96,98	0,00	2 595,16
35	Новошешминский	73 362,47	71 195,81	97,05	8,99	2 166,66
36	Черемшанский	58 265,15	56 675,89	97,27	0,01	1 589,26
37	Алькеевский	134 288,55	130 954,35	97,52	1,08	3 334,20
38	Буинский	176 656,66	172 419,44	97,60	0,19	4 237,22
39	Муслюмовский	56 280,41	54 942,60	97,62	0,00	1 337,81
40	Бавлинский	142 751,64	139 360,64	97,62	3,73	3 391,00
41	Ютазинский	56 180,68	54 908,12	97,73	0,34	1 272,56
42	Дрожжановский	87 729,32	86 138,46	98,19	0,00	1 590,87
43	Заинский	157 591,25	155 159,09	98,46	2,17	2 432,16
44	Альметьевский	318 421,61	315 376,37	99,04	0,73	3 045,25
45	Бугульминский	456 750,33	454 537,07	99,52	8,06	2 213,26



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 361 546,12	13 250 980,59	80,99	4,69	3 110 565,53
1	Буинский	35 104,00	401,95	1,15	0,00	34 702,05
2	Муслюмовский	10 602,12	135,89	1,28	0,00	10 466,23
3	Тюлячинский	10 572,65	3 858,03	36,49	0,00	6 714,62
4	Кукморский	27 522,83	11 216,73	40,75	0,00	16 306,10
5	Нурлатский	31 625,33	13 713,17	43,36	0,00	17 912,16
6	Бугульминский	42 002,22	21 364,28	50,86	0,00	20 637,94
7	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
8	Черемшанский	63 309,02	41 907,25	66,19	3,79	21 401,77
9	Сабинский	99 216,52	66 728,45	67,26	0,00	32 488,07
10	Алексеевский	48 050,41	33 372,35	69,45	0,00	14 678,06
11	Казань	8 603 225,96	6 070 284,58	70,56	8,04	2 532 941,38
12	Новошешминский	12 263,93	9 178,44	74,84	0,00	3 085,49



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	Итого по РТ	16 361 546,12	13 250 980,59	80,99	4,69	3 110 565,53
13	Елабужский	322 485,00	248 291,40	76,99	2,92	74 193,60
14	Высокогорский	28 168,37	22 558,20	80,08	0,00	5 610,17
15	Агрызский	54 916,05	46 790,57	85,20	9,13	8 125,48
16	Зеленодольский	735 568,02	638 725,29	86,83	4,39	96 842,73
17	Сармановский	69 812,94	61 469,42	88,05	0,00	8 343,52
18	Альметьевский	884 420,41	785 997,74	88,87	1,28	98 422,67
19	Кайбицкий	20 536,72	19 396,14	94,45	21,93	1 140,58
20	Мамадышский	119 545,34	113 799,28	95,19	8,55	5 746,06
21	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
22	Лаишевский	194 027,83	186 826,47	96,29	0,00	7 201,36
23	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
24	Наб.Челны	2 740 900,25	2 662 513,78	97,14	0,00	78 386,47



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		16 361 546,12	13 250 980,59	80,99	4,69	3 110 565,53
25	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
26	Р.-Слободский	3 406,59	3 392,08	99,57	2,29	14,51
27	Чистопольский	194 378,84	194 312,43	99,97	0,00	66,41
28	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
29	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00
30	Бавлинский	3 558,81	3 558,81	100,00	0,83	0,00
31	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
32	Нижнекамский	475 090,52	475 082,21	100,00	0,03	8,31

**В остальных 13 районах строительство по программе
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	881 697,63	83,51	2,09	174 073,95
1	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
2	Тетюшский	34 464,67	14 913,13	43,27	0,00	19 551,53
3	Мамадышский	26 852,17	12 692,63	47,27	0,00	14 159,54
4	Актанышский	31 907,27	18 476,16	57,91	0,00	13 431,11
5	Зеленодольский	27 801,00	17 854,31	64,22	0,00	9 946,69
6	Тукаевский	30 388,85	20 637,59	67,91	0,00	9 751,26
7	Нурлатский	20 088,77	13 876,91	69,08	0,00	6 211,85
8	Высокогорский	52 015,63	36 076,70	69,36	0,00	15 938,93
9	Алексеевский	13 209,05	9 286,39	70,30	0,00	3 922,66
10	Спасский	12 998,68	9 638,35	74,15	0,00	3 360,33
11	Атнинский	12 704,42	9 801,74	77,15	0,00	2 902,68
12	Балтасинский	42 047,13	32 798,04	78,00	9,53	9 249,09
13	Сабинский	13 476,53	10 766,26	79,89	0,00	2 710,27
14	Казань	64 599,14	52 676,44	81,54	0,00	11 922,70
15	Наб.Челны	27 122,41	22 655,09	83,53	14,58	4 467,32



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	881 697,63	83,51	2,09	174 073,95
16	Верхнеуслонский	12 636,71	10 615,23	84,00	0,00	2 021,48
17	Муслюмовский	14 318,36	12 047,27	84,14	0,00	2 271,09
18	Апастовский	25 571,40	21 770,45	85,14	0,00	3 800,96
19	Р.-Слободский	13 535,17	11 751,81	86,82	0,00	1 783,36
20	Чистопольский	26 757,92	23 337,99	87,22	0,00	3 419,92
21	Новошешминский	14 248,05	12 589,57	88,36	0,00	1 658,49
22	Буинский	82 545,01	73 930,09	89,56	0,00	8 614,92
23	Арский	15 686,98	14 100,99	89,89	0,00	1 585,99
24	Кайбицкий	14 599,99	13 183,03	90,29	0,00	1 416,96
25	Сармановский	15 233,41	13 765,63	90,36	0,00	1 467,78
26	Кукморский	30 072,51	27 599,03	91,77	0,00	2 473,48
27	Альметьевский	20 283,60	18 815,45	92,76	13,81	1 468,15
28	Пестречинский	14 948,24	13 897,67	92,97	0,00	1 050,57
29	Тюлячинский	12 823,19	12 148,02	94,73	10,04	675,17
30	Лениногорский	21 245,68	20 279,69	95,45	0,00	965,99



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации)
на 13.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 055 771,58	881 697,63	83,51	2,09	174 073,95
31	Заинский	14 686,92	14 106,42	96,05	0,00	580,49
32	Азнакаевский	14 871,15	14 354,12	96,52	1,33	517,03
33	Агрызский	18 425,93	17 852,25	96,89	0,00	573,68
34	Нижнекамский	24 056,51	23 549,88	97,89	0,00	506,63
35	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
36	Елабужский	14 762,44	14 521,98	98,37	0,00	240,46
37	Мензелинский	13 729,46	13 548,48	98,68	0,00	180,97
38	Бавлинский	14 873,00	14 716,08	98,94	0,00	156,91
39	Бугульминский	17 098,74	16 921,85	98,97	25,31	176,88
40	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
41	Алькеевский	27 060,26	26 831,22	99,15	20,33	229,04
42	Камско-Устьинский	13 959,72	13 891,20	99,51	0,00	68,52
43	Дрожжановский	64 468,87	64 258,96	99,67	0,00	209,90
44	Менделеевский	11 455,92	11 419,21	99,68	0,00	36,71
45	Аксубаевский	13 532,06	13 495,45	99,73	0,00	36,61



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		152,53			
				ПИР- 12,13		СМР-140,40	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 07.12.2019 по 13.12.2019)	139,95	4,18	4,18	100,0	12,19	9,87	9,87
СМР		4,18	4,18	100,0	12,19	9,87	9,87
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 13.12.2019)		6,95	6,95	100,0	12,19	9,87	9,87
СМР		6,95	6,95	100,0	12,19	9,87	9,87
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.12.2019)		139,95	139,95	100,0	139,95	139,95	139,95
СМР		139,95	139,95	100,0	139,95	139,95	139,95



		Подрядчик		ООО «Стройсервис»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		142,02			
				АН - 0,13		СМР-141,89	
		Начало работ		Октябрь 2018г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 07.12.2019 по 13.12.2019)	141,55	10,68	10,34	96,82	10,90	10,00	10,09
СМР		10,68	10,34	96,82	10,90	10,00	10,09
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 13.12.2019)		19,20	18,20	94,79	24,15	20,87	20,99
СМР		19,20	18,20	94,79	24,15	20,87	20,99
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.12.2019)		140,95	140,80	99,89	95,86	105,05	105,95
СМР		140,95	140,80	99,89	95,86	105,05	105,95



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
млн.руб.							
НЕДЕЛЯ (с 07.12.2019 по 13.12.2019)	307,10	31,50	31,20	99,08	0,00	0,00	0,00
СМР		31,50	31,20	99,08	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (с 01.12.2019 по 13.12.2019)		48,51	46,51	95,88	0,00	0,00	0,00
СМР		48,51	46,51	95,88	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.12.2019)		289,64	275,62	95,16	157,86	156,75	157,86
СМР		289,64	275,62	95,16	157,86	156,75	157,86

Работает 68 чел.
