



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура

2 программы

Иные социальные программы

5 программ



№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Акты КС-2		
				сумма (тыс.руб)	% принятых НО «Фонд ЖКХ» от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
1	Черемшанский	1	2 055,66	888,60	45,21	0,00
2	Высокогорский	19	38 816,90	17 874,20	48,28	0,48
3	Лаишевский	11	20 486,83	15 466,27	75,49	3,34
4	Новошешминский	2	4 187,11	3 083,27	78,91	0,00
5	Нурлатский	12	53 957,48	44 089,41	81,71	0,00
6	Пестречинский	7	19 102,36	14 949,46	83,43	11,28
7	г. Наб-Челны	123	1 218 988,85	1 024 597,26	84,05	5,51
8	Менделеевский	17	65 737,52	57 551,02	91,29	2,92
9	г. Казань	239	1 797 101,62	1 528 693,40	91,56	16,99
	<b>Итого по РТ</b>	<b>935</b>	<b>5 318 440,67</b>	<b>4 853 097,87</b>	<b>92,54</b>	<b>8,68</b>
10	Верхнеуслонский	2	5 220,23	4 618,39	92,82	0,00
11	Р.-Слободский	5	6 335,25	5 706,60	92,74	6,34



№	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Акты КС-2		
				сумма (тыс.руб)	% принятых НО «Фонд ЖКХ» от лимита СМР	динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>935</b>	<b>5 318 440,67</b>	<b>4 853 097,87</b>	<b>92,54</b>	<b>8,68</b>
12	Альметьевский	63	410 046,13	383 533,04	97,69	8,19
13	Сармановский	14	41 478,11	39 346,56	98,16	0,00
14	К.-Устьинский	5	7 838,76	7 329,17	98,60	0,00
15	Мензелинский	4	18 584,66	17 645,66	99,18	0,00
16	Елабужский	20	141 680,81	136 874,24	99,56	14,58
17	Актанышский	2	7 445,92	6 999,82	99,72	0,00
18	Азнакаевский	29	88 572,58	83 831,57	99,96	0,33



МО, по которым **не в полном объеме**  
**перечислены** средства Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г.Казань	291 672,31	290 740,55	99,68
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 082 235,99</b>	<b>1 081 304,24</b>	<b>99,91</b>



# Образование

Строительство дошкольных образовательных организаций  
(30 объектов)

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций  
(29 объектов)

Капитальный ремонт коррекционных школ  
(9 объектов)

Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах  
(115 организаций)

Капитальный ремонт детских садов  
(112 объектов)

Капитальный ремонт ресурсных центров  
(15 объектов)

Общий лимит,  
тыс. рублей  
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,  
%

Динамика за  
2 недели, %

5 451 205,68

Работы завершены

0,3%

537 125,3

Работы завершены

226 792,4

Работы завершены

91,5

Работы завершены

2 147 313,2

99,8

0,2%

657 519,2

Работы завершены

1,3%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 130</b>	<b>3 110</b>	<b>5 451 205,68</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	100,0	7,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,20	95,0	2,0
2	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,80	97,5	0,5
3	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	27 031,00	98,0	0,0
4	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,00	99,0	3,0
5	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,50	99,0	0,5
<b>Итого по РТ</b>		<b>2 130 158,40</b>	<b>99,8</b>	<b>0,2</b>



# Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок  
*(105 объектов)*

Общий лимит,  
тыс. рублей  
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,  
%

Работы завершены

Динамика за  
2 недели, %

-

Строительство блочно-модульных лыжных баз  
*(8 объектов)*


61 450,9

Работы завершены

-



# Молодежная политика

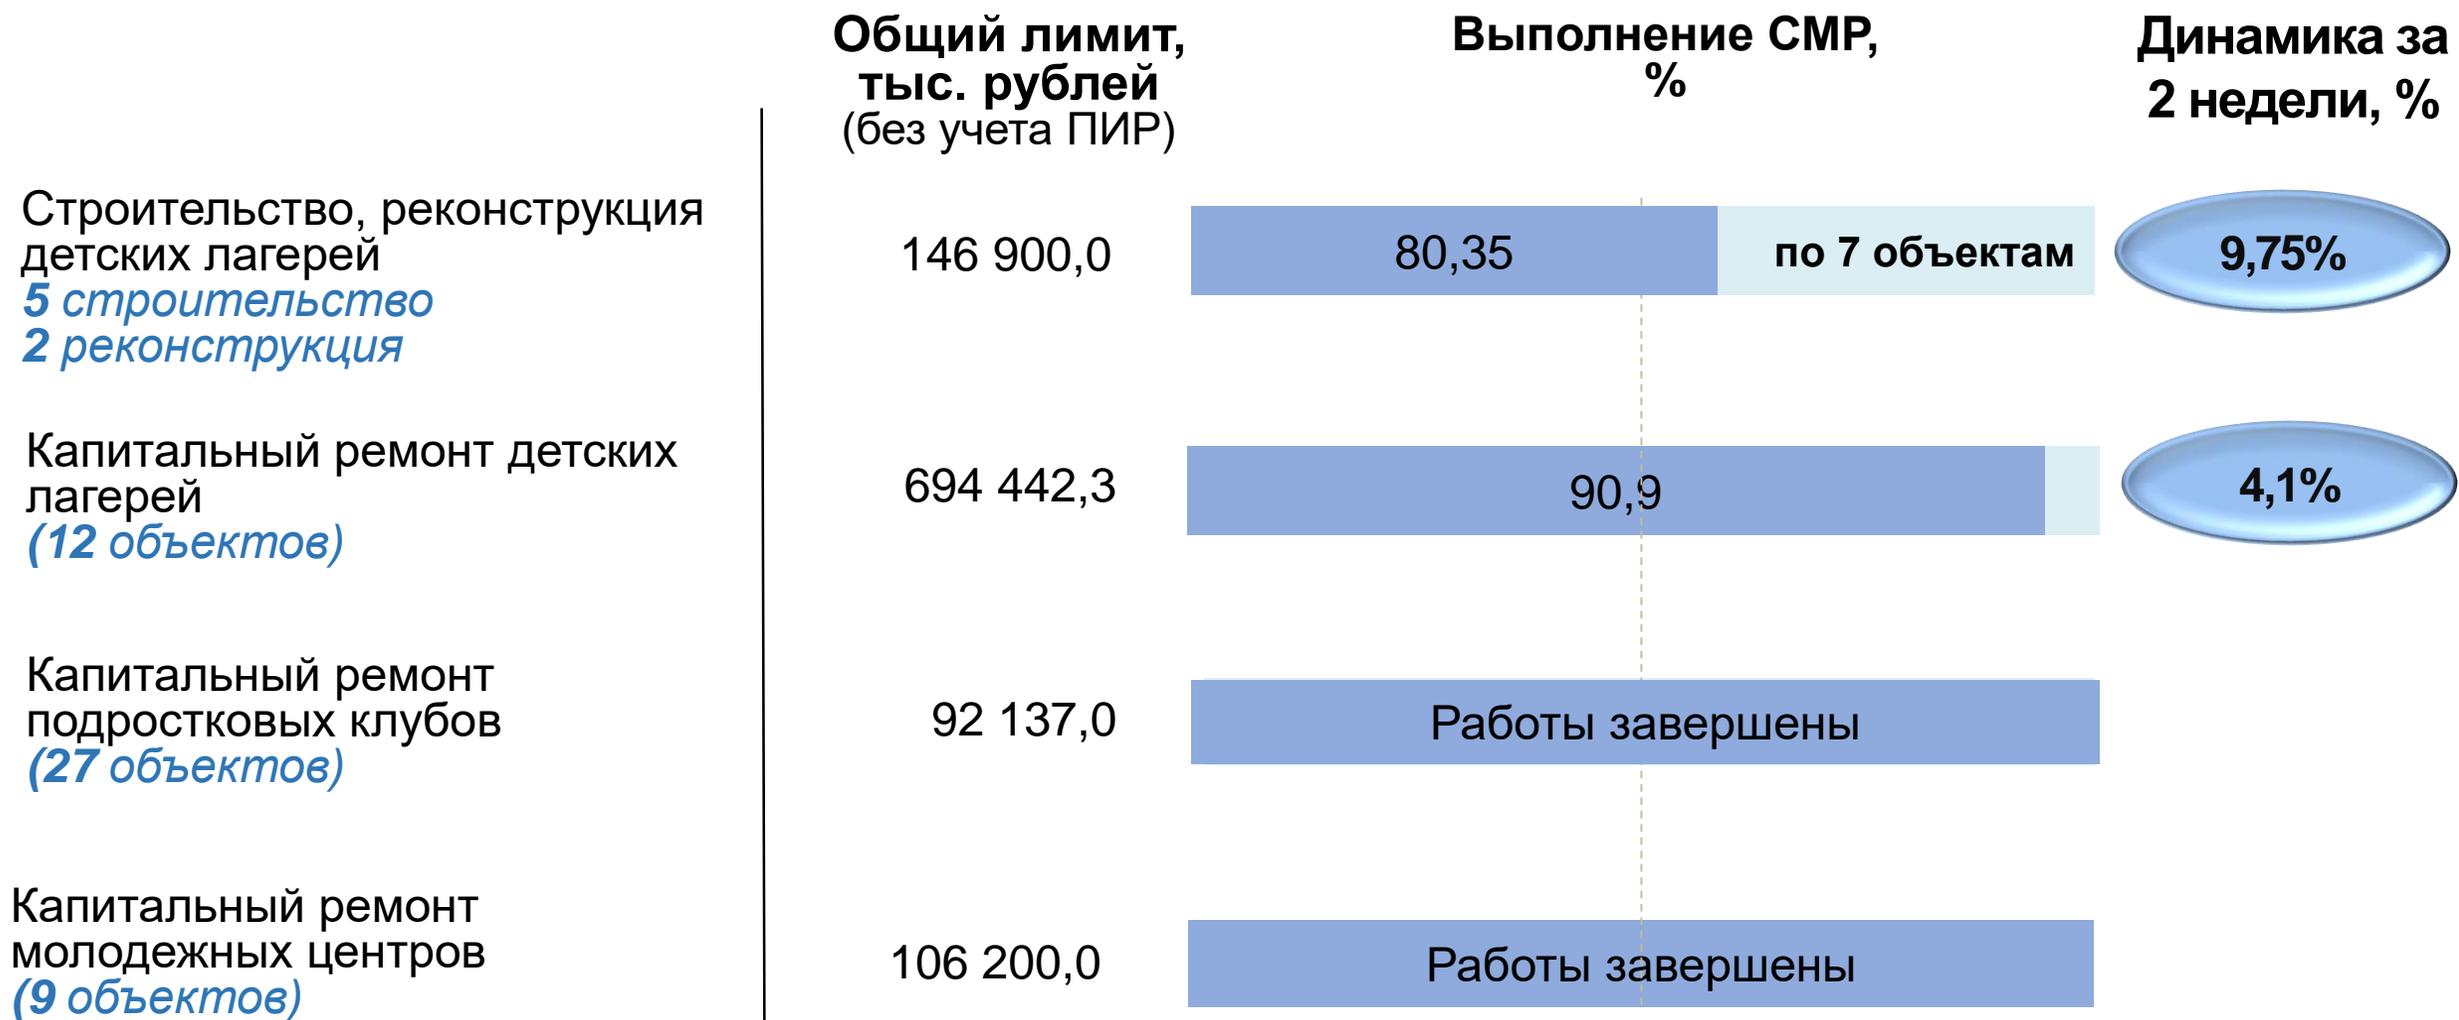



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
<b>Строительство</b>				
1	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский	81 300,0	57,0	4,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>343 067,3</b>	<b>60,7</b>	<b>2,4</b>
2	Крытая площадка со сценой спортивно-оздоровительного лагеря «Искра» ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва», г.Казань	3 700,0	71,0	11,0
3	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	20 500,0	78,0	3,0
4	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	13 300,0	100,0	2,0
5	Медицинский пункт МБОУ детского оздоровительно-образовательного лагеря «Липки», Лаишевский	4 000,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский	117 008,0	46,0	5,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>694 442,30</b>	<b>90,9</b>	<b>4,1</b>



# Здравоохранение

Общий лимит,  
тыс. рублей  
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,  
%

Динамика за  
2 недели, %

Строительство ФАПов  
(45 объектов)

135 775,9

Работы завершены



Строительство  
врачебных амбулаторий  
(9 объектов)

95 250,1

Работы завершены



Капитальный ремонт  
объектов  
здравоохранения  
(9 объектов)

70 924,2

Работы завершены





# Культура

Строительство  
многофункциональных  
комплексов (сельские клубы)  
*(21 объект)*

Капитальный ремонт  
объектов культурного  
назначения  
*(40 объектов)*

Общий лимит,  
тыс. рублей  
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,  
%

Динамика за  
2 недели, %

216 987,59

97,3

1,4%

392 929,2

Работы завершены

0,1%



№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 850</b>	<b>216 987,59</b>	<b>97,3</b>	<b>1,4</b>
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	78,0	5,2
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	94,6	1,6



# Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	Работы завершены	
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	Работы завершены	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	84,7	4,5%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Нурлатский, д.Абляскино				
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
3	Апастовский, с.Шонгуты				
4	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
5	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
6	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
7	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
8	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
9	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
10	Камско-Устьинский, д.Челны				
11	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
12	Сабинский, д.Елышево				
13	Сабинский, с.Кренни				
14	Тукаевский, д.Новый Мусабай				



№	МО РТ	Завершены работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
15	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
16	Атнинский, с.Кшклово				
17	Мензелинский, с.Деуково				
18	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
19	Нижнекамский, д.Байданкино				
20	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
21	Пестречинский, с.Тагашево				
22	Пестречинский, с.Богородское				



№	Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
			%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 621 821,52</b>	<b>61,6</b>	<b>2,5</b>	<b>836 541,39</b>	<b>51,58</b>
1	Строительство биологических очистных сооружений в пгт.Васильево	173 977,59	5,0	0,0	0,00	0,0
2	Строительство БОС в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского МР	178 401,19	3,0	1,0	0,00	0,0
3	Строительство БОС в с.Красный Бор Агрызского МР	52 981,93	90,0	5,0	14 691,07	27,7
4	Строительство очистных сооружений в г.Казани в районе Ветеринарной академии	90 081,51	82,0	2,0	38 564,35	42,8
5	Реконструкция районных очистных сооружений в ОЭЗ ППТ "Алабуга" г.Елабуга. I этап.	783 787,99	82,0	2,0	514 480,93	65,6
6	Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское Алексеевского МР	148 042,99	86,0	1,0	99 793,55	67,4
7	Устройство ливневой канализации в г.Тетюши	107 548,28	82,0	2,0	92 840,03	86,3
8	Строительство очистных сооружений г.Заинск, Поповское сельское поселение	87 000,61	92,0	20,0	76 171,46	87,6



Генеральный подрядчик: АО «УКС»  
Субподрядная организация СК «Поволжье»

ТАССР

Проектная организация: ООО «ТЭКО»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство биологических очистных сооружений в пгт. Васильево	173 977,59	5,0	0,0	0,0	0,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»  
Субподрядная организация СК «Стафит»

ТАССР

Проектная организация: ООО АСПТ «Линда»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство БОС в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского МР	178 401,19	3,0	1,0	0,0	0,0





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «СтройМетис»

Проектная организация: ООО «НПК «Биотехинжиниринг»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство БОС в с. Красный Бор Агрызского МР	52 981,92	90,0	5,0	14 691,07	27,7





Генеральный подрядчик: АО «УКС»  
Субподрядная организация: ООО «Сигм

Проектная организация ООО «Альтернатива»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений в г.Казани в районе Ветеринарной академии	90 081,51	82,0	2,0	38 564,35	42,8



Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция районных очистных сооружений в ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга. I этап.	783 787,42	82,0	2,0	514 480,93	65,6





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «Юнион Строй»

ТАССР

Проектная организация: ООО АСТП «Линда»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское Алексеевского МР	148 042,99	86,0	1,0	99 793,55	67,4





Генеральный подрядчик: АО «УКС»  
Субподрядная организация СК «Поволжье»

ТАССР

Проектная организация: ООО «ТЭКО»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Устройство ливневой канализации в г.Тетюши	107 548,27	82,0	2,0	92 840,03	86,3





Генеральный подрядчик: АО «УКС»

Субподрядная организация: ООО «ГазСервисСтрой» Проектная организация: ООО «Евро Акцент Саба»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Строительство очистных сооружений г.Зайнск, Поповское сельское поселение	87 000,61	92,0	20,0	76 171,45	87,6





## Федеральный проект «Чистая вода»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция ВЗС г. Болгар на 5 тыс.куб.м в сутки Спасского МР	28 074,504	97,0	12,0	16 161,003	57,6



Генеральный подрядчик: АО «УКС»  
Субподрядная организация ООО «PCY»

ТАССР

Проектная организация: ООО АСПТ «Линда»

Наименование объекта	Лимит по ГК тыс. рублей	Общая готовность СМР		Принято КС-2	
		%	динамика за неделю	тыс. рублей	%
Реконструкция ВЗС г.Болгар на 5 тыс.куб.м в сутки Спасского МР	28 074,504	97,0	12,0	16 161,003	57,6





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>27 461 365,49</b>	<b>23 576 564,12</b>	<b>85,85</b>	<b>5,97</b>	<b>3 884 801,38</b>
1	Мамадышский	340 447,68	240 397,88	70,61	0,11	100 049,80
2	Нурлатский	174 276,41	131 800,74	75,63	13,18	42 475,67
3	Казань	9 748 185,83	7 481 168,21	76,74	10,26	2 267 017,61
4	Елабужский	481 576,72	384 275,90	79,80	5,56	97 300,82
5	Лаишевский	605 769,80	492 624,99	81,32	4,78	113 144,81
6	Р.-Слободский	69 704,52	57 956,14	83,15	2,32	11 748,39
7	Высокогорский	313 862,07	264 744,47	84,35	8,73	49 117,60
8	Кукморский	197 553,96	167 223,61	84,65	9,06	30 330,35
9	Нижнекамский	1 946 922,29	1 653 288,81	84,92	0,00	293 633,47
10	Спасский	90 668,00	78 734,26	86,84	3,17	11 933,73
11	Актанышский	173 297,58	150 663,12	86,94	4,09	22 634,46
12	Зеленодольский	1 167 225,17	1 020 990,10	87,47	0,99	146 235,07
13	Алексеевский	234 331,65	205 131,97	87,54	5,45	29 199,68
14	Черемшанский	133 913,71	119 196,27	89,01	5,02	14 717,44
15	Агрызский	190 190,23	170 404,53	89,60	5,79	19 785,70



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>27 461 365,49</b>	<b>23 576 564,12</b>	<b>85,85</b>	<b>5,97</b>	<b>3 884 801,38</b>
16	Альметьевский	1 916 425,68	1 721 754,64	89,84	0,00	194 671,04
17	Тукаевский	150 611,52	136 255,66	90,47	2,25	14 355,85
18	Пестречинский	103 391,92	94 710,98	91,60	9,87	8 680,94
19	Атнинский	88 431,80	81 303,00	91,94	0,33	7 128,80
20	Чистопольский	413 950,92	385 518,83	93,13	1,11	28 432,09
21	Азнакаевский	204 275,31	190 526,46	93,27	3,21	13 748,85
22	Наб.Челны	3 571 963,01	3 340 049,46	93,51	0,57	231 913,55
23	Арский	208 287,06	195 116,75	93,68	14,59	13 170,31
24	Мензелинский	204 725,80	192 140,64	93,85	5,73	12 585,16
25	Аксубаевский	90 296,88	85 236,82	94,40	1,49	5 060,06
26	Менделеевский	136 832,33	129 173,02	94,40	0,63	7 659,31
27	Балтасинский	156 325,40	147 910,95	94,62	4,12	8 414,45
28	Муслюмовский	70 598,76	66 989,87	94,89	12,22	3 608,89
29	Новошешминский	98 781,76	93 952,02	95,11	2,03	4 829,75
30	Сармановский	171 062,90	163 147,04	95,37	2,63	7 915,86



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>27 461 365,49</b>	<b>23 576 564,12</b>	<b>85,85</b>	<b>5,97</b>	<b>3 884 801,38</b>
31	Апастовский	87 611,42	83 606,54	95,43	2,73	4 004,88
32	Тюлячинский	64 921,20	62 104,75	95,66	8,53	2 816,45
33	Сабинский	187 032,57	179 791,18	96,13	19,88	7 241,39
34	Тетюшский	233 687,74	225 406,81	96,46	7,62	8 280,93
35	Камско-Устьинский	123 226,65	119 212,81	96,74	0,16	4 013,84
36	Лениногорский	528 576,11	512 524,22	96,96	1,39	16 051,89
37	Кайбицкий	90 793,64	88 247,98	97,20	2,79	2 545,66
38	Алькеевский	161 348,81	157 612,17	97,68	0,00	3 736,64
39	Бавлинский	161 183,44	157 548,74	97,74	0,00	3 634,71
40	Ютазинский	68 710,48	67 225,37	97,84	0,00	1 485,11
41	Заинский	172 386,22	170 283,95	98,78	0,53	2 102,27
42	Дрожжановский	152 208,04	150 584,12	98,93	0,12	1 623,92
43	Верхнеуслонский	1 242 741,77	1 230 924,91	99,05	0,26	11 816,86
44	Буинский	259 201,68	257 271,42	99,26	15,41	1 930,26
45	Бугульминский	473 849,06	471 832,02	99,57	4,04	2 017,05



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 216 309,95</b>	<b>8 512 409,14</b>	<b>83,32</b>	<b>5,59</b>	<b>1 703 900,82</b>
1	Мамадышский	197 217,05	116 361,19	59,00	0,30	80 855,86
2	Казань	2 318 642,36	1 464 699,84	63,17	12,23	853 942,52
3	Нурлатский	154 187,64	113 086,22	73,34	7,84	41 101,42
4	Лаишевский	399 130,75	295 278,27	73,98	5,80	103 852,48
5	Р.-Слободский	52 762,76	42 804,42	81,13	3,05	9 958,34
6	Наб.Челны	805 608,32	654 879,42	81,29	2,32	150 728,90
7	Нижнекамский	712 782,55	593 857,16	83,32	2,83	118 925,39
8	Высокогорский	234 292,47	196 103,08	83,70	7,23	38 189,39
9	Елабужский	302 149,04	252 928,88	83,71	13,60	49 220,16
10	Алексеевский	188 999,67	163 472,69	86,49	0,36	25 526,98
11	Чистопольский	192 814,16	167 222,93	86,73	2,04	25 591,24
12	Спасский	77 669,32	67 383,36	86,76	1,49	10 285,96
13	Верхнеуслонский	96 273,63	85 328,31	88,63	2,19	10 945,31
14	Зеленодольский	403 496,57	358 641,66	88,88	1,51	44 854,91
15	Агрызский	116 848,25	105 765,90	90,52	9,43	11 082,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>10 216 309,95</b>	<b>8 512 409,14</b>	<b>83,32</b>	<b>5,59</b>	<b>1 703 900,82</b>
16	Пестречинский	87 380,57	79 900,48	91,44	11,63	7 480,09
17	Азнакаевский	153 908,70	142 315,78	92,47	4,26	11 592,93
18	Арский	159 415,94	147 831,62	92,73	19,06	11 584,32
19	Кукморский	139 958,62	129 864,31	92,79	13,82	10 094,30
20	Актанышский	133 353,21	123 823,17	92,85	5,01	9 530,05
21	Аксубаевский	76 226,31	71 202,85	93,41	1,71	5 023,45
22	Менделеевский	125 376,41	117 726,43	93,90	0,66	7 649,98
23	Атнинский	75 727,38	71 501,26	94,42	0,38	4 226,12
24	Тукаевский	120 222,67	113 613,26	94,50	1,15	6 609,41
25	Лениногорский	258 603,67	245 826,71	95,06	2,79	12 776,97
26	Балтасинский	114 278,27	108 707,44	95,13	0,03	5 570,83
27	Кайбицкий	56 836,63	54 251,62	95,45	0,00	2 585,01
28	Сабинский	121 021,40	115 692,34	95,60	12,38	5 329,05
29	Тюлячинский	51 869,01	49 718,31	95,85	0,28	2 150,70
30	Камско-Устьинский	55 860,60	54 238,12	97,10	1,46	1 622,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 216 309,95</b>	<b>8 512 409,14</b>	<b>83,32</b>	<b>5,59</b>	<b>1 703 900,82</b>
31	Новошешминский	73 362,47	71 301,60	97,19	0,14	2 060,88
32	Муслюмовский	56 280,41	54 942,61	97,62	0,00	1 337,80
33	Бавлинский	142 751,64	139 360,64	97,62	0,00	3 391,00
34	Ютазинский	56 180,68	54 908,13	97,73	0,00	1 272,55
35	Апастовский	58 431,84	57 278,47	98,03	2,01	1 153,38
36	Черемшанский	58 265,15	57 123,63	98,04	0,77	1 141,52
37	Мензелинский	171 253,87	168 236,75	98,24	6,84	3 017,13
38	Сармановский	85 862,52	84 416,68	98,32	1,34	1 445,83
39	Дрожжановский	87 729,32	86 287,34	98,36	0,17	1 441,98
40	Алькеевский	134 288,55	132 305,93	98,52	1,01	1 982,62
41	Заинский	157 591,25	155 986,98	98,98	0,53	1 604,27
42	Альметьевский	318 421,61	316 052,99	99,26	0,21	2 368,62
43	Бугульминский	456 750,33	454 910,16	99,60	0,08	1 840,17
44	Буинский	176 656,66	175 951,28	99,60	2,00	705,39
45	Тетюшский	199 569,71	199 318,94	99,87	3,17	250,78



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 189 283,96</b>	<b>14 127 019,35</b>	<b>87,26</b>	<b>6,27</b>	<b>2 062 264,61</b>
1	Кукморский	27 522,83	11 216,73	40,75	0,00	16 306,10
2	Мензелинский	19 438,19	10 085,88	51,89	0,00	9 352,31
3	Елабужский	164 585,65	116 857,13	71,00	0,00	47 728,52
4	Черемшанский	52 180,89	38 832,80	74,42	8,22	13 348,09
5	Новошешминский	12 263,93	9 675,01	78,89	4,05	2 588,92
6	Казань	7 364 857,84	5 963 791,93	80,98	10,42	1 401 065,91
7	Высокогорский	28 168,37	23 321,45	82,79	2,71	4 846,92
8	Агрызский	54 916,05	46 790,57	85,20	0,00	8 125,48
9	Зеленодольский	735 568,02	638 725,29	86,83	0,00	96 842,73
10	Альметьевский	1 577 720,46	1 386 886,20	87,90	0,00	190 834,26
11	Сармановский	69 812,94	64 775,29	92,78	4,74	5 037,65
12	Мамадышский	116 832,76	111 393,60	95,34	0,15	5 439,16



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 189 283,96</b>	<b>14 127 019,35</b>	<b>87,26</b>	<b>6,27</b>	<b>2 062 264,61</b>
13	Азнакаевский	35 495,46	33 856,56	95,38	0,00	1 638,90
14	Камско-Устьинский	53 406,33	51 703,79	96,81	0,00	1 702,54
15	Алексеевский	32 122,93	31 188,84	97,09	27,64	934,09
16	Наб.Челны	2 740 900,25	2 662 513,78	97,14	0,00	78 386,47
17	Лениногорский	248 726,76	246 295,76	99,02	0,00	2 431,00
18	Апастовский	3 525,20	3 495,49	99,16	99,16	29,71
19	Лаишевский	194 027,83	192 654,95	99,29	3,00	1 372,88
20	Р.-Слободский	3 406,59	3 392,08	99,57	0,00	14,51
21	Чистопольский	194 378,84	194 312,43	99,97	0,00	66,41
22	Актанышский	7 578,75	7 578,71	100,00	0,00	0,04
23	Арский	33 184,14	33 184,14	100,00	0,00	0,00
24	Бавлинский	3 558,81	3 558,81	100,00	0,00	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГЖФ)  
на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>16 189 283,96</b>	<b>14 127 019,35</b>	<b>87,26</b>	<b>6,27</b>	<b>2 062 264,61</b>
25	Верхнеуслонский	1 133 405,81	1 133 400,81	100,00	0,00	5,00
26	Нижнекамский	1 209 909,97	1 035 526,00	100,00	0,00	174 383,97
27	Сабинский	51 251,64	51 251,64	100,00	32,74	0,00
28	Кайбицкий	20 536,72	20 753,68	101,06	6,61	-216,96

**В остальных 17 районах строительство по программе  
ГЖФ не ведется**



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>937 135,63</b>	<b>88,76</b>	<b>5,25</b>	<b>118 635,95</b>
1	Лаишевский	12 611,22	4 691,77	37,20	0,00	7 919,45
2	Мамадышский	26 397,87	12 643,09	47,89	0,63	13 754,79
3	Актанышский	32 365,62	19 261,24	59,51	1,61	13 104,38
4	Тукаевский	30 388,85	22 642,41	74,51	6,60	7 746,44
5	Тетюшский	34 118,02	26 087,87	76,46	33,19	8 030,15
6	Атнинский	12 704,42	9 801,74	77,15	0,00	2 902,68
7	Алексеевский	13 209,05	10 470,44	79,27	8,96	2 738,61
8	Казань	64 685,62	52 676,44	81,43	0,00	12 009,18
9	Зеленодольский	28 160,57	23 623,15	83,89	19,67	4 537,43
10	Муслюмовский	14 318,36	12 047,27	84,14	0,00	2 271,09
11	Р.-Слободский	13 535,17	11 759,63	86,88	0,06	1 775,54
12	Кукморский	30 072,51	26 142,56	86,93	0,00	3 929,95
13	Сабинский	14 759,54	12 847,20	87,04	7,15	1 912,34
14	Спасский	12 998,68	11 350,90	87,32	13,17	1 647,78
15	Высокогорский	51 401,23	45 319,94	88,17	18,81	6 081,29



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>937 135,63</b>	<b>88,76</b>	<b>5,25</b>	<b>118 635,95</b>
16	Апастовский	25 654,38	22 832,58	89,00	3,86	2 821,80
17	Наб.Челны	25 454,44	22 656,26	89,01	5,48	2 798,18
18	Чистопольский	26 757,92	23 983,48	89,63	2,41	2 774,44
19	Арский	15 686,98	14 100,99	89,89	0,00	1 585,99
20	Сармановский	15 387,44	13 955,07	90,69	0,33	1 432,38
21	Пестречинский	16 011,35	14 810,50	92,50	0,00	1 200,85
22	Альметьевский	20 283,60	18 815,45	92,76	0,00	1 468,15
23	Нурлатский	20 088,77	18 714,52	93,16	24,08	1 374,25
24	Балтасинский	42 047,13	39 203,52	93,24	15,23	2 843,61
25	Верхнеуслонский	13 062,33	12 195,79	93,37	9,36	866,54
26	Алькеевский	27 060,26	25 306,24	93,52	0,00	1 754,02
27	Тюлячинский	13 052,19	12 386,44	94,90	0,16	665,75
28	Камско-Устьинский	13 959,72	13 270,90	95,07	0,00	688,82
29	Лениногорский	21 245,68	20 401,75	96,03	0,57	843,92
30	Азнакаевский	14 871,15	14 354,12	96,52	0,00	517,03



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (Фонд газификации) на 20.12.2019

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 055 771,58</b>	<b>937 135,63</b>	<b>88,76</b>	<b>5,25</b>	<b>118 635,95</b>
31	Заинский	14 794,97	14 296,97	96,63	0,59	498,00
32	Агрызский	18 425,93	17 848,05	96,86	0,00	577,88
33	Елабужский	14 842,03	14 489,89	97,63	0,00	352,14
34	Ютазинский	12 529,80	12 317,24	98,30	0,00	212,56
35	Бавлинский	14 873,00	14 629,29	98,36	0,00	243,71
36	Мензелинский	14 033,74	13 818,02	98,46	0,00	215,72
37	Буинский	82 545,01	81 320,15	98,52	8,95	1 224,87
38	Новошешминский	13 155,36	12 975,41	98,63	10,27	179,95
39	Нижнекамский	24 229,77	23 905,66	98,66	0,77	324,11
40	Кайбицкий	13 420,29	13 242,68	98,68	8,38	177,61
41	Бугульминский	17 098,74	16 921,85	98,97	0,00	176,88
42	Черемшанский	23 467,67	23 239,84	99,03	0,00	227,83
43	Дрожжановский	64 478,72	64 296,78	99,72	0,04	181,94
44	Аксубаевский	14 070,58	14 033,97	99,74	0,01	36,61
45	Менделеевский	11 455,92	11 446,59	99,92	0,24	9,33



<b>Количество дворов на 06.12.2019</b>	<b>Площадь дворов, ТЫС.КВ.М.</b>	<b>Количество дворов с плохим асфальтом (требуют комплексного ремонта)</b>	<b>Площадь дворов с плохим асфальтом, ТЫС.КВ.М.</b>
<b>9 546</b>	<b>70 248,30</b>	<b>6 775</b>	<b>49 601,03</b>



		<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Стройсервис»</b>			
		<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>			
		<b>Лимит финансирования, млн.руб.</b>		<b>142,02</b>			
				<b>АН - 0,13</b>	<b>СМР-141,89</b>		
		<b>Начало работ</b>		<b>Октябрь 2018г.</b>			
		<b>Завершение работ</b>		<b>Декабрь 2019г.</b>			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
<b>НЕДЕЛЯ</b> (с 14.12.2019 по 20.12.2019)	<b>141,55</b>	<b>0,60</b>	<b>0,75</b>	<b>125,00</b>	<b>34,50</b>	<b>31,60</b>	<b>31,61</b>
<b>СМР</b>		0,60	0,75	125,00	34,50	31,60	31,61
<b>МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ</b> (с 01.12.2019 по 20.12.2019)		<b>19,80</b>	<b>18,95</b>	<b>95,71</b>	<b>58,65</b>	<b>52,47</b>	<b>52,60</b>
<b>СМР</b>		19,80	18,95	95,71	58,65	52,47	52,60
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> (НА 20.12.2019)		<b>141,55</b>	<b>141,55</b>	<b>100,00</b>	<b>130,36</b>	<b>136,65</b>	<b>137,56</b>
<b>СМР</b>		141,55	141,55	100,00	130,36	136,65	137,56



# Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

		Подрядчик		ООО «Ак таш»			
		Заказчик		ГКУ ГИСУ РТ			
		Лимит финансирования, млн.руб.		324,31			
				ПИР - 15,67		СМР-308,64	
		Начало работ		Август 2019г.			
		Завершение работ		Декабрь 2019г.			
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	%	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						выполнения	млн.руб.
<b>НЕДЕЛЯ</b> (с 14.12.2019 по 20.12.2019)	307,10	14,01	12,74	<b>90,94</b>	0,00	0,00	0,00
СМР		14,01	12,74	90,94	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ</b> (с 01.12.2019 по 20.12.2019)		62,52	59,29	<b>94,83</b>	0,00	0,00	0,00
СМР		62,52	59,29	94,83	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> (НА 20.12.2019)		303,65	288,36	<b>94,96</b>	157,86	156,75	157,86
СМР		303,65	288,36	94,96	157,86	156,75	157,86

Работает 68 чел.
