

Охрана труда



2017

январь - апрель

Со смертельным
исходом

2

С тяжелым
исходом

1

ВСЕГО
по РТ

3

2018

январь - апрель

1

2

3

2019

январь - апрель

-

1

1

2020

январь - апрель

4


2

6



Ввод жилья в Республике Татарстан по состоянию на 10.04.2020

Ввод жилья

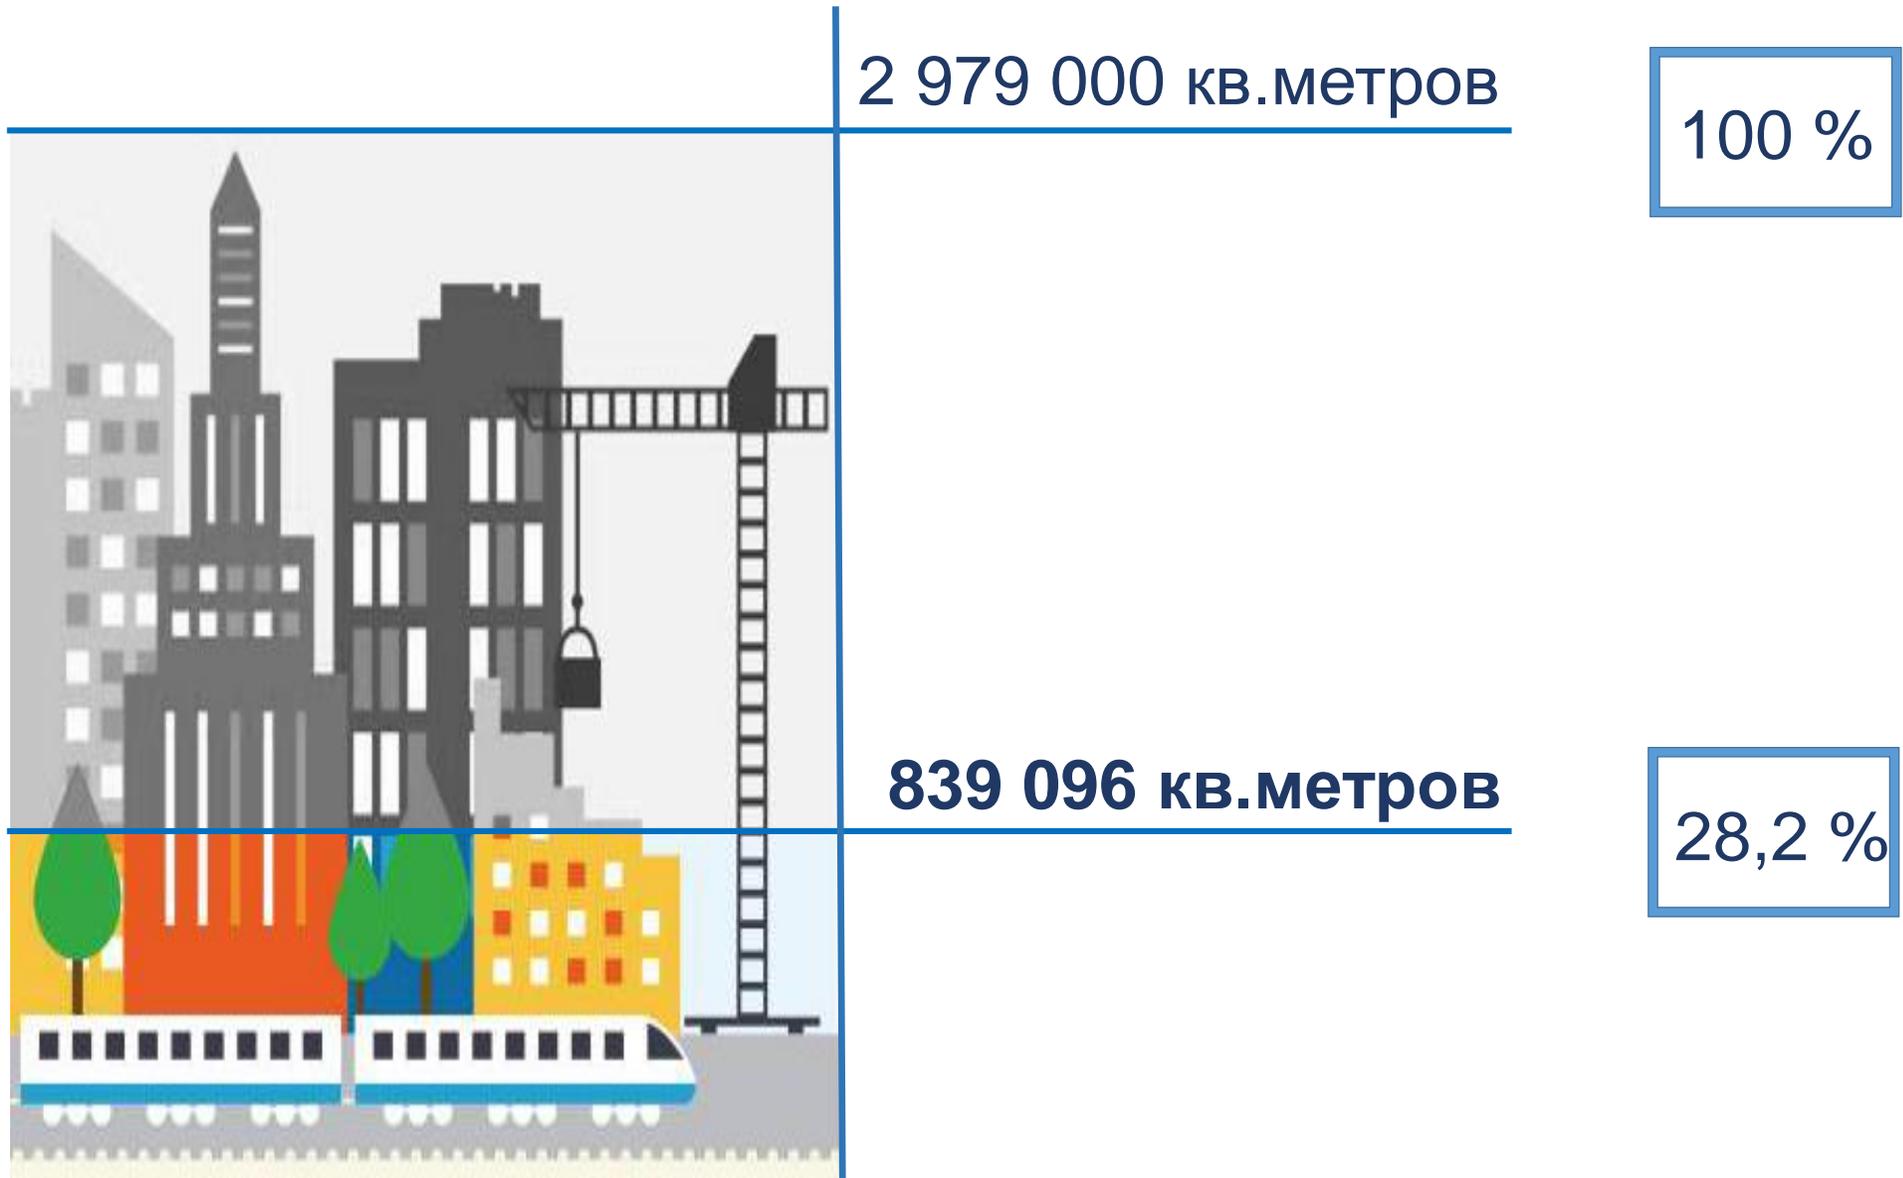



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10.04.2020

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	3 383	3,1	106 617
2	Новошешминский	6 000	271	4,5	5 729
3	Лениногорский	32 000	2 242	7,0	29 758
4	г.Набережные Челны	350 000	31 637	9,0	318 363
5	Сабинский	26 000	2 748	10,6	23 252
6	Атнинский	6 000	651	10,9	5 349
7	Менделеевский	15 000	1 802	12,0	13 198
8	Арский	30 000	3 757	12,5	26 243
9	Тетюшский	14 000	1 937	13,8	12 063
10	Чистопольский	35 000	5 012	14,3	29 988
11	Альметьевский	140 000	20 609	14,7	119 391
12	Актанышский	18 000	2 972	16,5	15 028
13	Кайбицкий	7 000	1 217	17,4	5 783
14	Апастовский	12 000	2 109	17,6	9 891
15	Муслюмовский	12 000	2 263	18,9	9 737
ВСЕГО по РТ		2 979 000	839 096	28,2	2 139 904



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10.04.2020

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Зеленодольский	110 000	20 985	19,1	89 015
17	Рыбно-Слободский	18 000	3 460	19,2	14 540
18	Дрожжановский	9 000	1 804	20,0	7 196
19	Спасский	9 000	1 806	20,1	7 194
20	Бавлинский	18 000	3 617	20,1	14 383
21	Верхнеуслонский	50 000	10 064	20,1	39 936
22	Бугульминский	45 000	9 282	20,6	35 718
23	Азнакаевский	26 000	5 459	21,0	20 541
24	Буинский	20 000	4 294	21,5	15 706
25	Аксубаевский	10 000	2 479	24,8	7 521
26	Алексеевский	19 000	4 773	25,1	14 227
27	Агрызский	21 000	5 281	25,1	15 719
28	Камско-Устьинский	12 000	3 061	25,5	8 939
29	Мензелинский	18 000	4 681	26,0	13 319
30	Сармановский	12 000	3 199	26,7	8 801
ВСЕГО по РТ		2 979 000	839 096	28,2	2 139 904



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10.04.2020

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Заинский	21 000	6 008	28,6	14 992
32	Тукаевский	120 000	35 492	29,6	84 508
33	Балтасинский	18 000	5 545	30,8	12 455
34	Мамадышский	23 000	7 216	31,4	15 784
35	Алькеевский	10 000	3 148	31,5	6 852
36	Нурлатский	20 000	6 488	32,4	13 512
37	Черемшанский	7 000	2 302	32,9	4 698
38	Ютазинский	15 000	5 044	33,6	9 956
39	Высокогорский	110 000	37 971	34,5	72 029
40	г.Казань	960 000	332 873	34,7	627 127
41	Тюлячинский	12 000	4 422	36,9	7 578
42	Кукморский	29 000	10 906	37,6	18 094
43	Лаишевский	160 000	65 066	40,7	94 934
44	Елабужский	65 000	27 684	42,6	37 316
45	Пестречинский	200 000	122 076	61,0	77 924
ВСЕГО по РТ		2 979 000	839 096	28,2	2 139 904

Ввод жилья



273 568 кв.метров

100%

20 531 кв.метров

7,5%



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

Ввод жилья



	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за неделю		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
Количество объектов	130	11	0	119	61	31	27
Количество квартир	4 970	363	0	4 607	1 705	2 043	859
Общая площадь (тыс кв.метров)	273,6	20,5	0	253,1	98,8	104,3	50,0

Ввод жилья

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2 / КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за неделю	Всего	в т.ч. за неделю	Всего	в т.ч. за неделю
введены в эксплуатацию	771 747	771 747	0	718 409	0	736 577	0
высокая 70-100%	3 745 012	3 421 971	29 405	3 049 506	210 226	3 408 349	6 516
средняя 30-70%	3 955 237	2 037 068	117 310	1 281 634	172 814	2 202 294	449 241
низкая 0-30%	1 790 308	444 524	25 050	313 237	53 500	743 997	59 304
ИТОГО	10 262 304	6 675 311	171 765	5 362 786	436 540	7 091 218	515 060

Ввод жилья



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	3	1	2	-
3	Арский	2	-	-	2
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	2	-	-	2
6	Верхнеуслонский	2	1	1	-
7	Высокогорский	6	2	4	-
8	Елабужский	2	1	1	-
9	Зеленодольский	6	4	2	-
10	Лаишевский	5	1	4	-
11	Пестречинский	23	2	16	5
12	г.Набережные Челны	30	16	14	-
13	г.Казань	45	37	8	-
ВСЕГО по РТ		128	67	52	9



Индивидуальное жилищное строительство по состоянию на 13.03.2020г.

Ввод жилья



10 680 домов

100%

3 620 домов

33,9 %

Обеспечение жильем



	План	Финансирование, млн руб.	Бюджет РФ, млн руб.	Бюджет РТ, млн руб.
дети-сироты	600	840,71	46,52	794,19
многодетные семьи	46	211,89	-	211,89
молодые семьи	47	62,84	13,34	49,5

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в том числе по категориям	35	78,24	78,24	-
чернобыльцы	12	28,00	28,00	-
вынужденные переселенцы	21	46,07	46,07	-
переселенцы с РКС	2	4,17	4,17	-

Обеспечение жильем



№	МО РТ	План	Выдано сертификатов	№	МО РТ	План	Выдано сертификатов
1	Азнакаевский	1	1	12	Кайбицкий	1	1
2	Аксубаевский	2	2	13	Кукморский	4	4
3	Алькеевский	1	1	14	Лениногорский	2	2
4	Альметьевский	2	2	15	Мамадышский	3	3
5	Бавлинский	2	2	16	Муслюмовский	2	2
6	Балтасинский	1	1	17	Новошешминский	1	1
7	Бугульминский	1	1	18	Нурлатский	4	4
8	Высокогорский	3	3	19	Сармановский	1	1
9	Елабужский	1	1	20	Тюлячинский	4	4
10	Заинский	1	1	21	г.Набережные Челны	3	3
11	Зеленодольский	2	2	22	г.Казань	4	4
ИТОГО						46	46



Молодые семьи

Обеспечение жильем



№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Арский	1	7	Нижнекамский	5
2	Альметьевский	1	8	Нурлатский	1
3	Бугульминский	1	9	Сабинский	1
4	Высокогорский	1	10	Ютазинский	1
5	Елабужский	1	11	г.Набережные Челны	10
6	Лаишевский	1	12	г.Казань	23
ИТОГО					47

Обеспечение жильем



№	МО РТ	Оформлено сертификатов		
		чернобыльцы	вынужденные переселенцы	переселенцы с РКС
1	Алькеевский	1	-	-
2	Буинский	1	-	-
3	Верхнеуслонский	-	-	1
4	Зеленодольский	1	1	-
5	Кукморский	-	1	-
6	Мамадышский	2	-	1
7	Мензелинский	-	1	-
8	Сабинский	1	-	-
9	Ютазинский	-	2	-
10	г.Набережные Челны	1	1	-
11	г.Казань	1	3	-
ИТОГО		8	9	2




Проведения аукционов на разработку ПИР по программам строительства 2020 года

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Дата аукциона на ПИР	Формирование лота
1	Строительство зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	11	11	-	-
2	Строительство ФАП, врачебных амбулаторий	51	51	-	-
3	Строительство дошкольных образовательных организаций	22	15	15 апреля (7)	-
4	Строительство детских оздоровительных лагерей (в том числе реконструкция)	21	20	17 апреля (1)	-
5	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	12	12	-	-
6	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	91	0	17 апреля (90)	1
7	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	21	-	-	21
8	Строительство силосно-сенажных траншей	90	ПИР не предусмотрены		
9	Строительство коровников и овцеводческих ферм	7	ПИР не предусмотрены		
ИТОГО		326	109	98	22

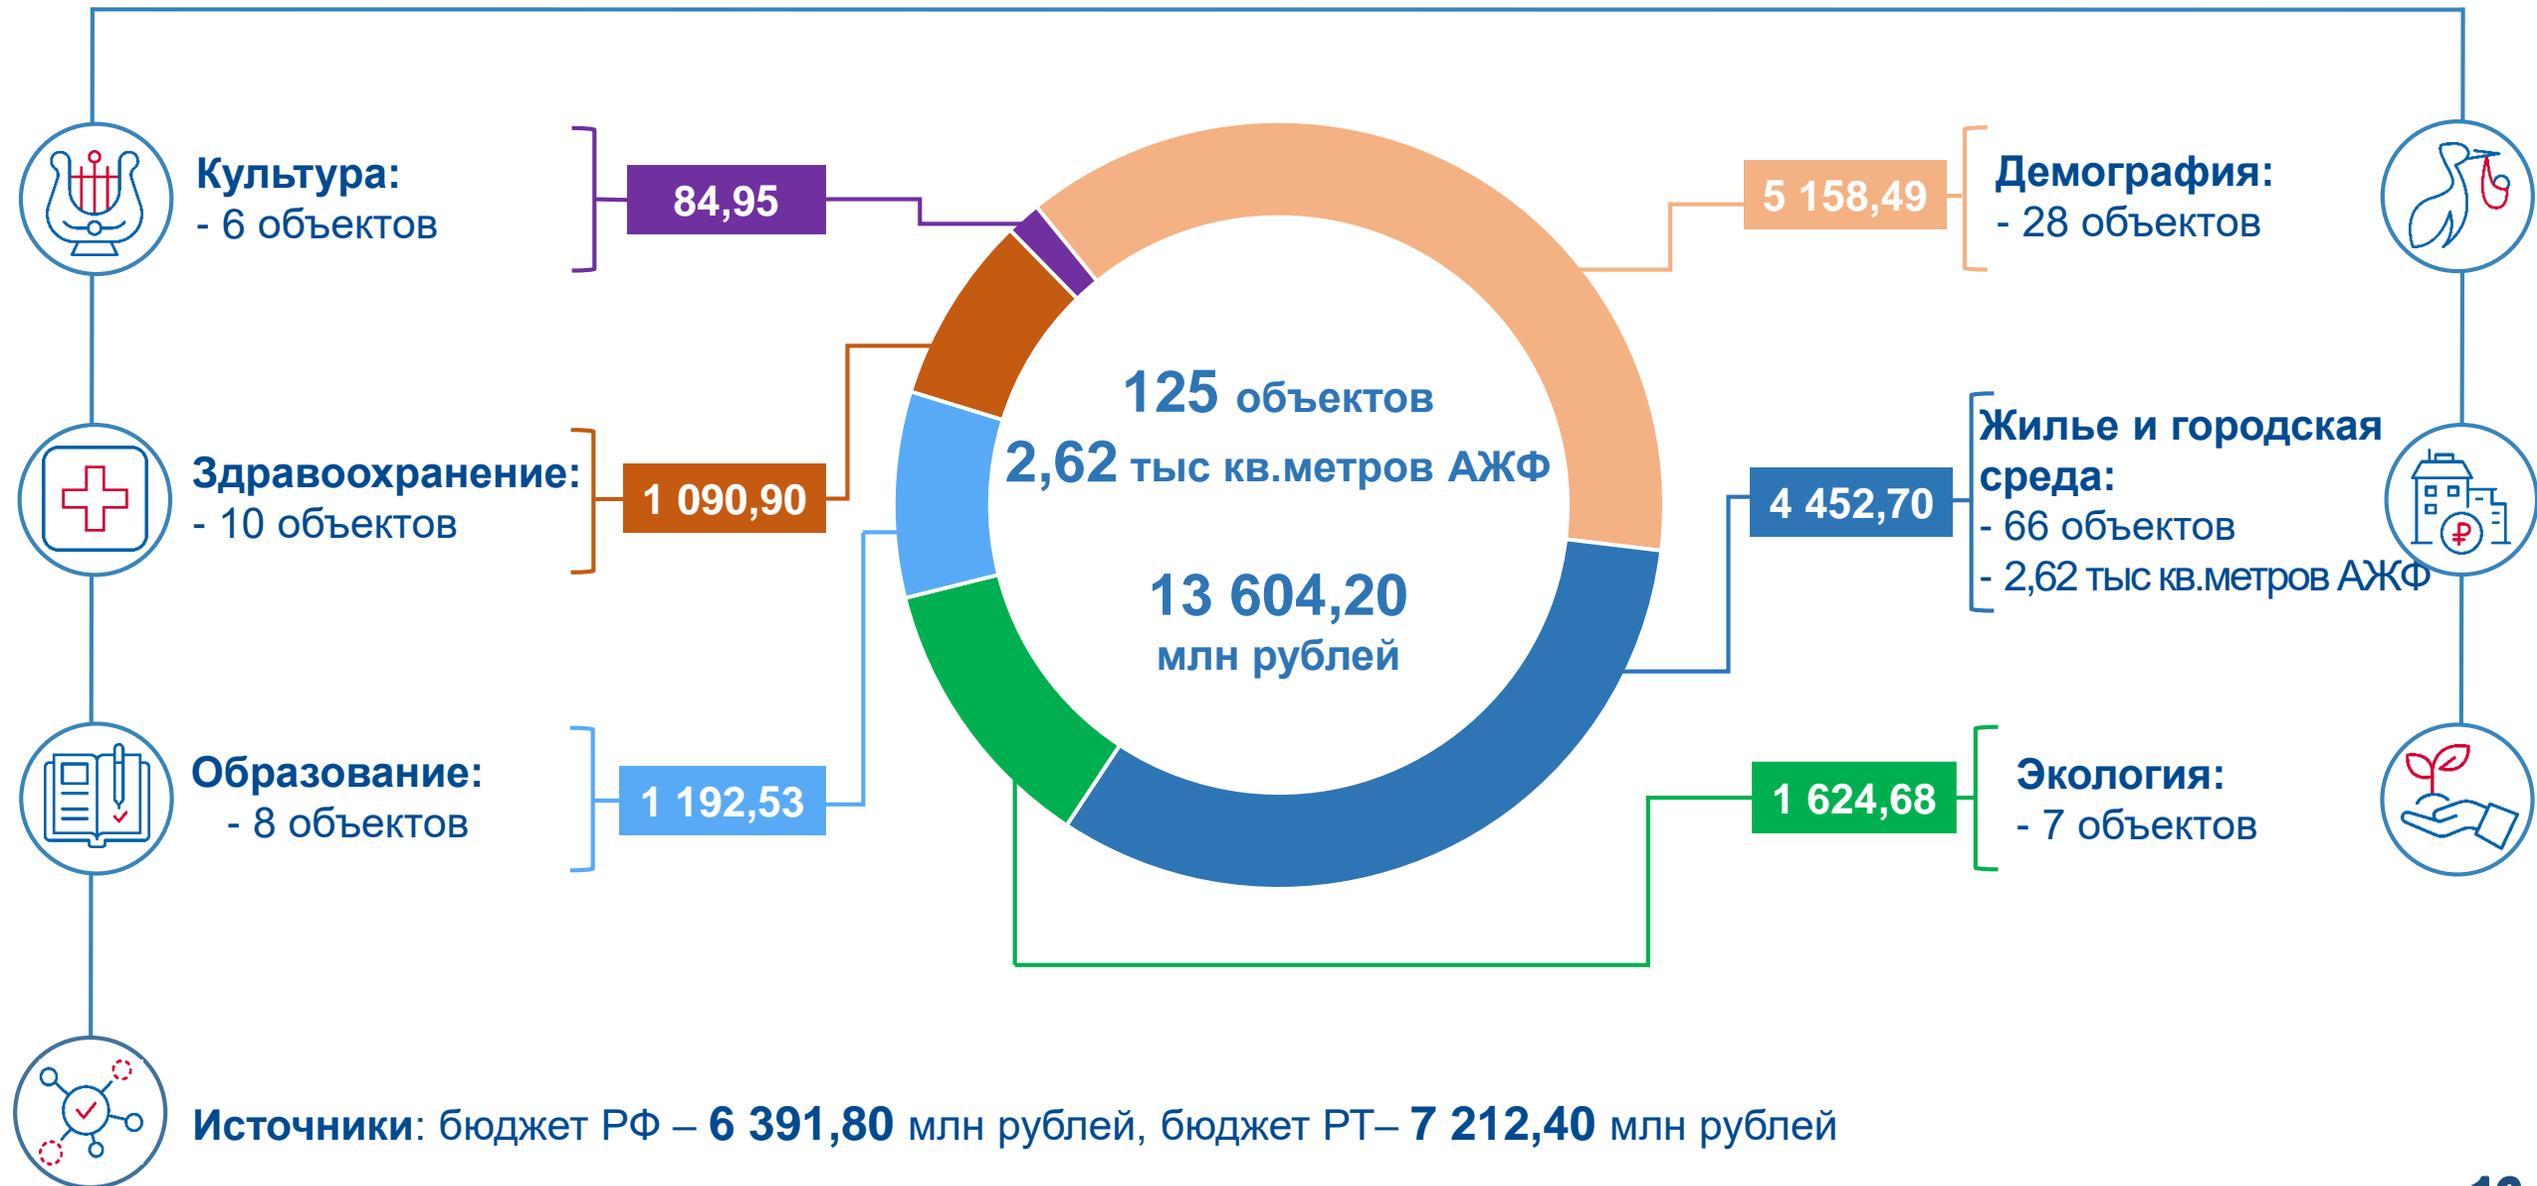



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

22 объекта

4 679,60



Спорт — норма жизни

5 объектов

449,44



Старшее поколение

1 объект

29,44

Бюджет национального проекта



ГК на СМР /
поставку
оборудования



ОПТИМИЗАЦИЯ
ПО СТОИМОСТИ

назначены даты аукционов на СМР



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



Формирование комфортной городской среды

63 объекта

3 076,05



Жилье

3 объекта

1 231,59




Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

2,62 тыс кв.м АЖФ

145,06

Бюджет национального проекта

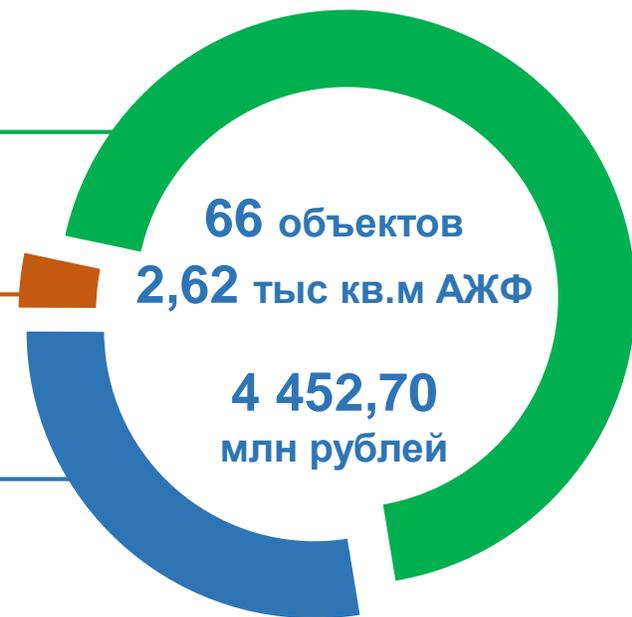

ГК на СМР

ТЗ на проектирование требуют корректировки



повторная экспертиза ПД и ПДОСС




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта



Оздоровление Волги

5 объектов

884,23




Чистая страна

2 объекта

740,45



ГК на СМР



назначены даты аукционов на СМР



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта

Современная школа

2 объекта

1 183,89

Успех каждого ребенка

6 объектов

8,63

8
объектов
1 192,53
млн рублей



назначены даты аукционов на СМР





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям




Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи



назначена дата аукциона на СМР



Бюджет национального проекта

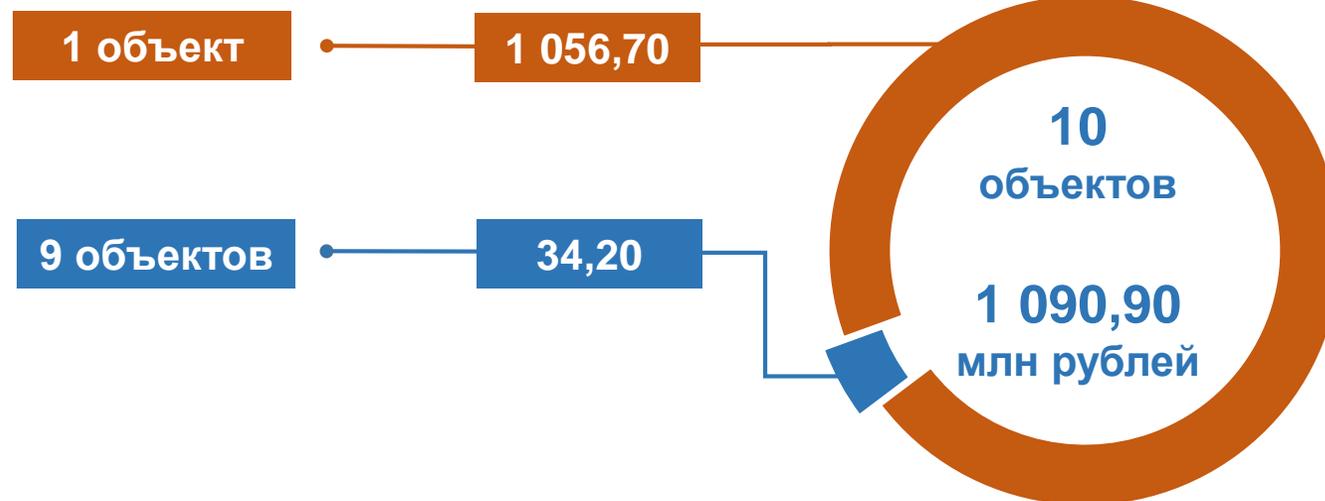



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта



Культурная среда

6 объектов

84,95



аукцион на СМР проведен



назначены даты аукционов на СМР



Формирование комфортной городской среды



Елабужский

Кукморский

Лениногорский

Менделеевский

Пестречинский

Сармановский

Тетюшский

Ютазинский



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года

Формирование программ



№	МО РТ
1	Агрызский
2	Азнакаевский
3	Аксубаевский
4	Алексеевский
5	Арский
6	Бавлинский
7	Бугульминский
8	Верхнеуслонский
9	Дрожжановский
10	Заинский
11	Камско-Устьинский
12	Лаишевский
13	Лениногорский
14	Менделеевский
15	Мензелинский

№	МО РТ
16	Муслюмовский
17	Новошешминский
18	Тюлячинский
19	Черемшанский
20	г.Набережные Челны
21	г.Казань
22	Актанышский
23	Алькеевский
24	Альметьевский
25	Апастовский
26	Атнинский
27	Балтасинский
28	Буинский
29	Высокогорский
30	Елабужский

№	МО РТ
31	Зеленодольский
32	Кайбицкий
33	Кукморский
34	Мамадышский
35	Нижнекамский
36	Нурлатский
37	Пестречинский
38	Рыбно-Слободский
39	Сабинский
40	Сармановский
41	Спасский
42	Тетюшский
43	Тукаевский
44	Чистопольский
45	Ютазинский
