

Капитальный ремонт МКД



Финансирование программы на 2020 год



Всего: **1 064 МКД**
6 658,58 млн рублей



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД



№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
1	Апастовский	3	3	0	0	0	0
2	Бавлинский	10	10	0	0	0	0
3	Балтасинский	3	3	0	0	0	0
4	Буинский	6	6	0	0	0	0
5	Верхнеуслонский	3	3	0	0	0	0
6	Камско-Устьинский	4	4	0	0	0	0
7	Мамадышский	3	3	0	0	0	0
8	Менделеевский	16	16	0	0	0	0
9	Муслюмовский	2	2	0	0	0	0
10	Рыбно-Слободский	3	3	0	0	0	0
11	Тетюшский	5	5	0	0	0	0
12	Черемшанский	5	5	0	0	0	0
13	Елабужский	18	14	4	0	0	0
14	Агрызский	12	9	3	0	0	0
Итого по РТ		1 064	277	787	108	0	0



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД



№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
15	Альметьевский	52	35	17	0	0	0
16	Заинский	53	32	21	2	0	0
17	Сабинский	6	3	3	0	0	0
18	Зеленодольский	42	12	30	0	0	0
19	Нижнекамский	103	29	74	1	0	0
Итого по РТ		1 064	277	787	108	0	0
20	г.Набережные Челны	213	35	178	0	0	0
21	г.Казань	278	41	237	20	0	0
22	Пестречинский	9	1	8	0	0	0
23	Бугульминский	46	2	44	31	0	0
24	Азнакаевский	31	1	30	0	0	0
25	Аксубаевский	3	0	3	0	0	0
26	Актанышский	3	0	3	3	0	0
27	Алексеевский	6	0	6	6	0	0
28	Арский	9	0	9	0	0	0



Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Капитальный ремонт МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
29	Высокогорский	17	0	17	0	0	0
30	Кукморский	5	0	5	0	0	0
31	Лаишевский	6	0	6	0	0	0
32	Лениногорский	21	0	21	21	0	0
33	Мензелинский	5	0	5	0	0	0
34	Новошешминский	5	0	5	5	0	0
35	Нурлатский	13	0	13	2	0	0
36	Сармановский	15	0	15	0	0	0
37	Спасский	4	0	4	2	0	0
38	Тукаевский	7	0	7	7	0	0
39	Тюлячинский	1	0	1	0	0	0
40	Чистопольский	8	0	8	8	0	0
41	Ютазинский	10	0	10	0	0	0
Итого по РТ		1064	277	787	108	0	0



Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Формирование лота	Дата размещения извещения о проведении торгов на ПИР
1	Капитальный ремонт спортивных объектов РТ	11	1	10	-
2	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	12	0	-	аукцион состоялся ГК ориент. 27.04.2020
3	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	25	0	-	аукцион состоялся ГК ориент. 27.04.2020
4	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	2	0	-	аукцион состоялся ГК ориент. 27.04.2020
5	Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	1	0	-	аукцион состоялся ГК ориент. 27.04.2020
6	Капитальный ремонт ресурсных центров	11	0	-	30 апреля
Итого		163	6	10	-



Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на ПИР заключен	Формирование лота	Дата размещения извещения о проведении торгов на ПИР
7	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	3	0	-	30 апреля
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	1	1	-	-
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	1	1	-	-
10	Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ	11	0	-	аукцион состоялся ГК ориент. 27.04.2020
11	Капитальный ремонт объектов образования	85	3	-	30 апреля (51 объект)
Итого		163	6	10	-



Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС
1	Капремонт спортивных объектов РТ	10	5
2	Капремонт объектов культурного назначения	12	9
3	Капремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	1	1
4	Капремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	13	4
5	Капремонт ресурсных центров	6	2
6	Капремонт образовательных учреждений отрасли культуры	7	3
7	Капремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	13	8
8	Капремонт зданий подростковых клубов РТ	6	5
9	Капремонт объектов образования	87	36
10	Капремонт зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	21	14
11	Капремонт объектов здравоохранения	8	4
Итого		278	144



Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	Получено ПДОСС
12	Капремонт и укрепление материальной базы молодежных центров	2	2
13	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	7	2
14	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	37	23
15	Капремонт зданий Военного комиссариата РТ, военных комиссариатов в МО РТ	7	5
16	Капремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства	41	21
Итого		278	144



План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

ЖКХ



№	Наименование программы	План	Подготовительные работы	Завершение проектирования	Дата размещения извещения о проведении торгов
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	- 220 км сетей водопровода - 30 скважин - 35 водонапорных башен	ПСД 100% (на 120 объектов)	20 апреля	30 апреля
2	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	замена 113 котлов на 65 объектах	ПСД 58% (по 65 котлам)	12 мая	15 мая
3	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ	- перевод на инд. системы отопления 1 547 квартир - установка 24 котла на объектах СКБ - строительство 18 км газопроводов	ПСД 56% (на установку котлов в 866 квартирах)	12 мая	15 мая
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	- 12 177 светильников - 252 км СИП	оформлены дефектные ведомости по всем объектам	не требуется	30 апреля
5	Модернизация систем водоотведения	Распоряжение Кабинета Министров РТ не утверждено			



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года

Формирование программ



№	МО РТ
1	Агрызский
2	Азнакаевский
3	Алексеевский
4	Арский
5	Бавлинский
6	Верхнеуслонский
7	Дрожжановский
8	Заинский
9	Камско-Устьинский
10	Лаишевский
11	Лениногорский
12	Менделеевский
13	Мензелинский
14	Муслюмовский
15	Новошешминский


№	МО РТ
16	Тюлячинский
17	Черемшанский
18	г.Казань
19	Аксубаевский
20	Актанышский
21	Алькеевский
22	Альметьевский
23	Апастовский
24	Атнинский
25	Балтасинский
26	Бугульминский
27	Буинский
28	Высокогорский
29	Елабужский
30	Зеленодольский

№	МО РТ
31	Кайбицкий
32	Кукморский
33	Мамадышский
34	Нижнекамский
35	Нурлатский
36	Пестречинский
37	Рыбно-Слободский
38	Сабинский
39	Сармановский
40	Спасский
41	Тетюшский
42	Тукаевский
43	Чистопольский
44	Ютазинский
45	г.Набережные Челны




Динамика собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за период 2016-2020 гг.

Платежи населения за ЖКУ

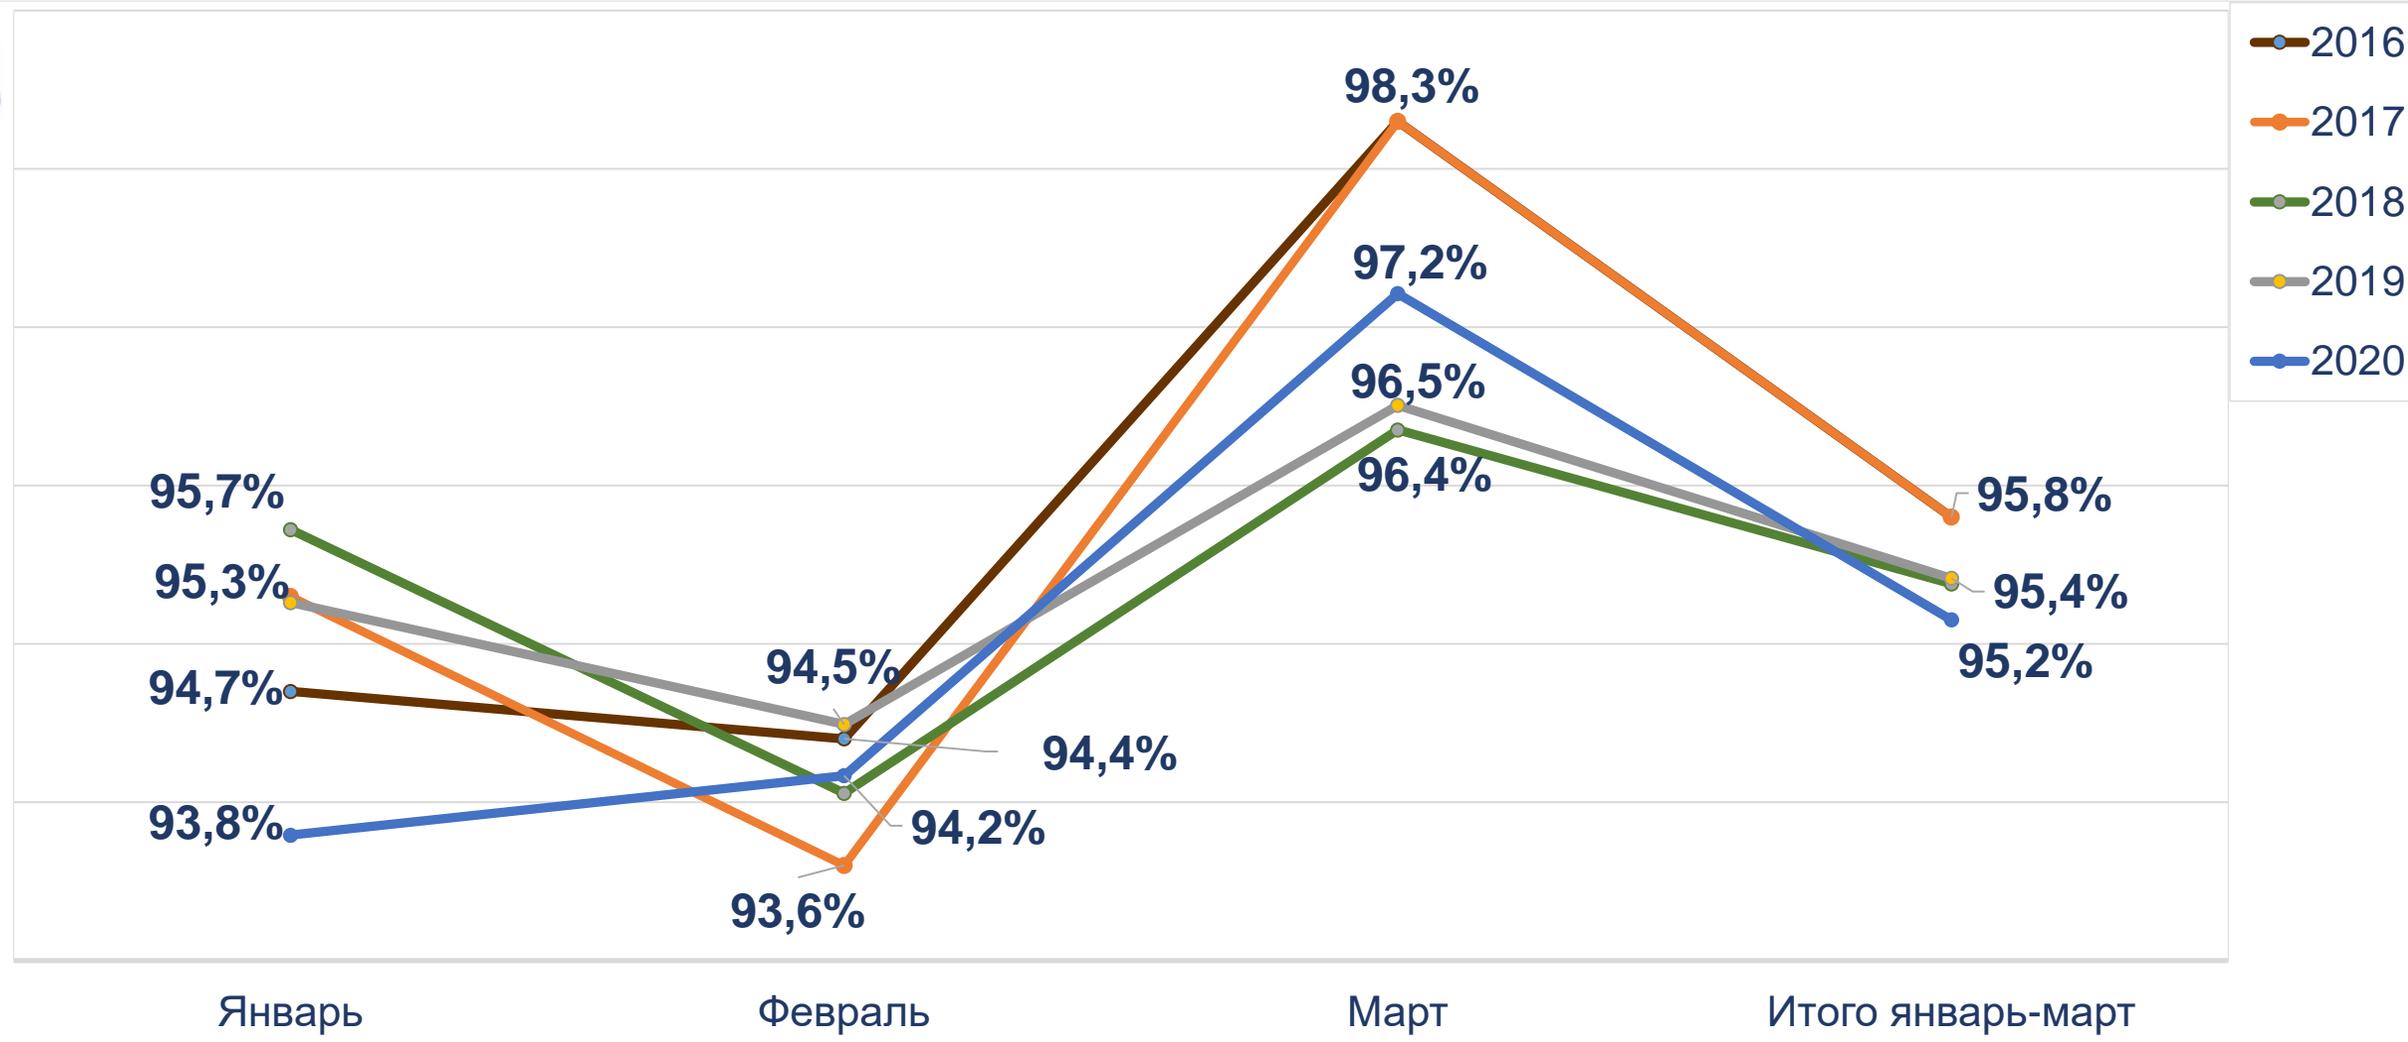




Динамика просроченной задолженности организаций ЖКК за потребленный газ (млн рублей)

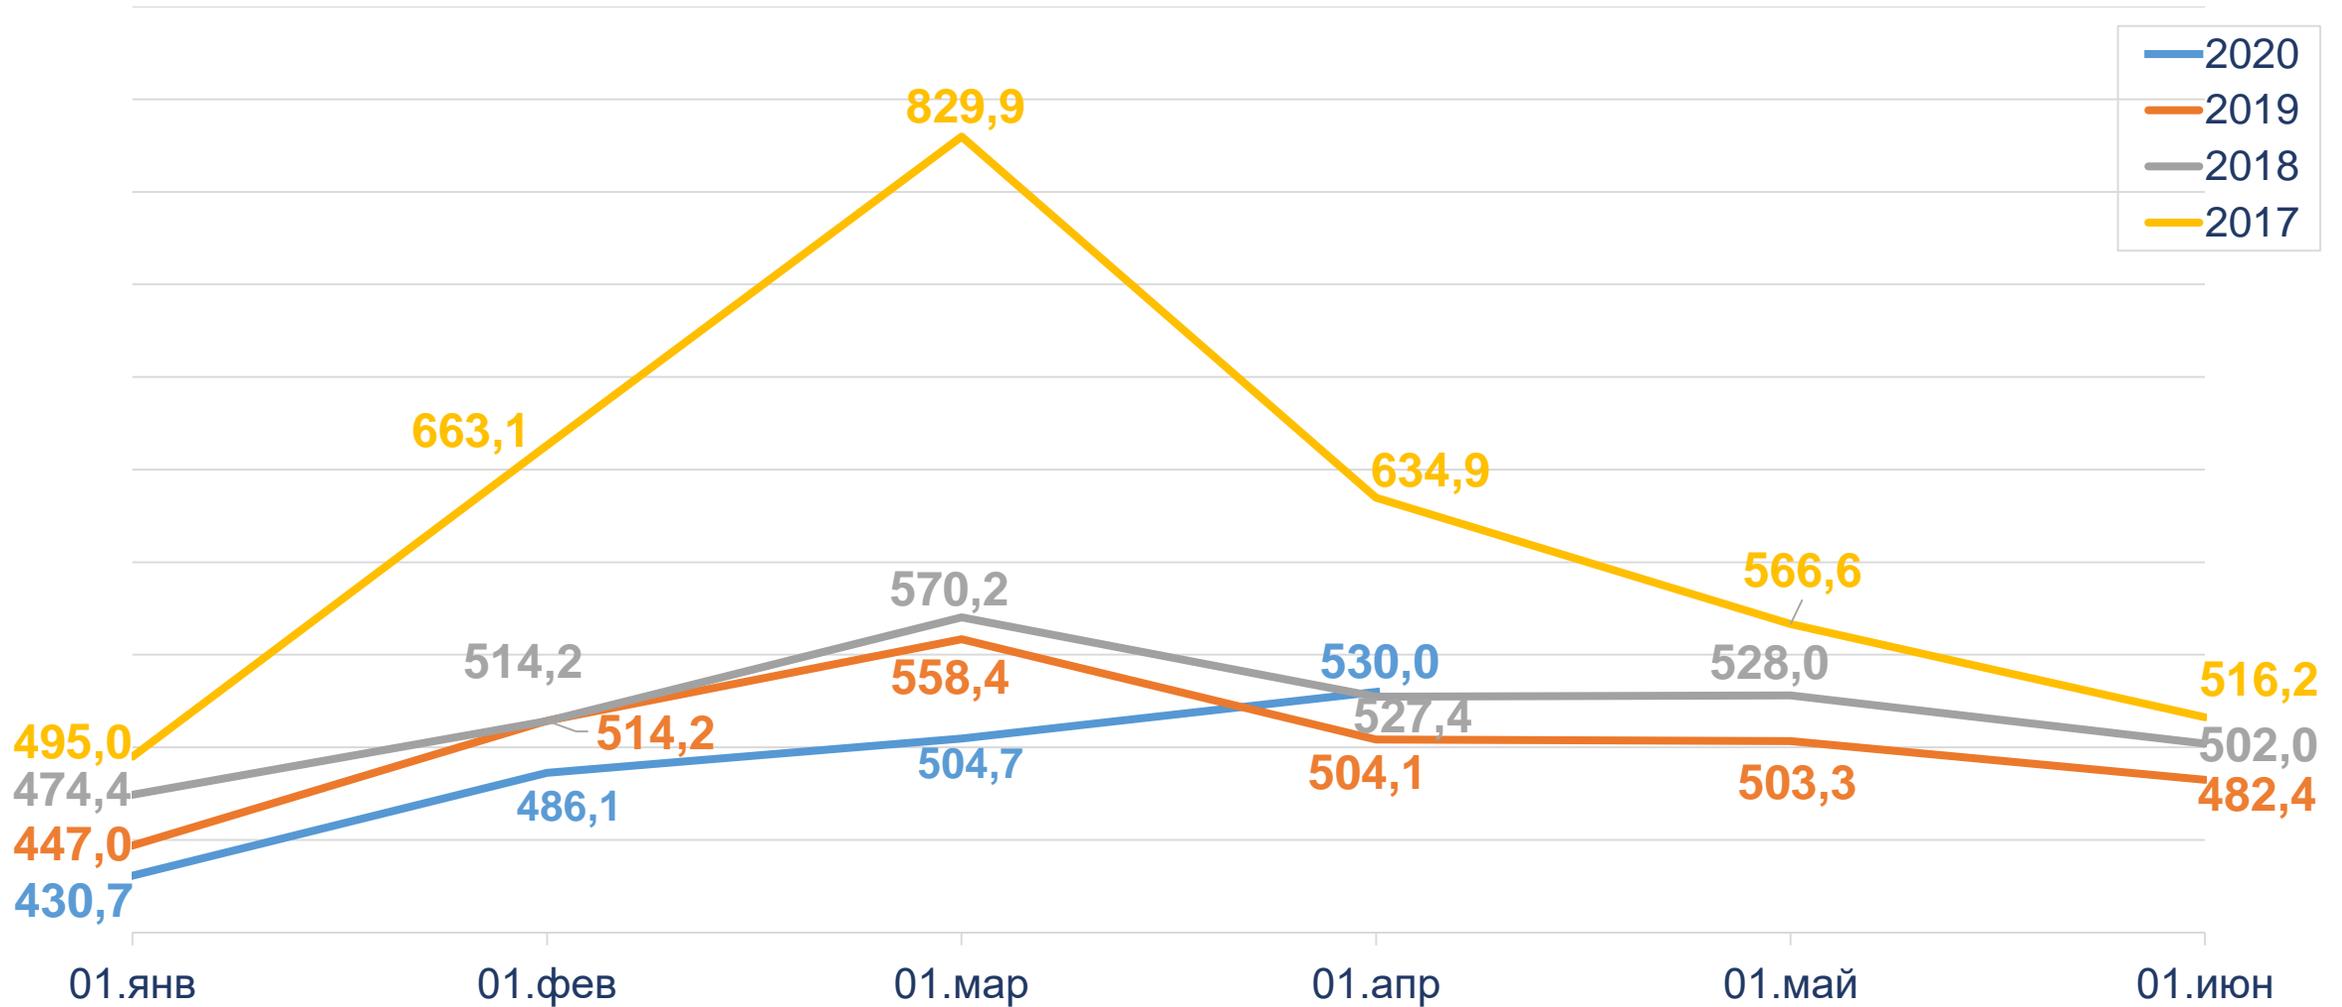




Динамика просроченной задолженности организаций ЖКК за потребленную электроэнергию (млн рублей)

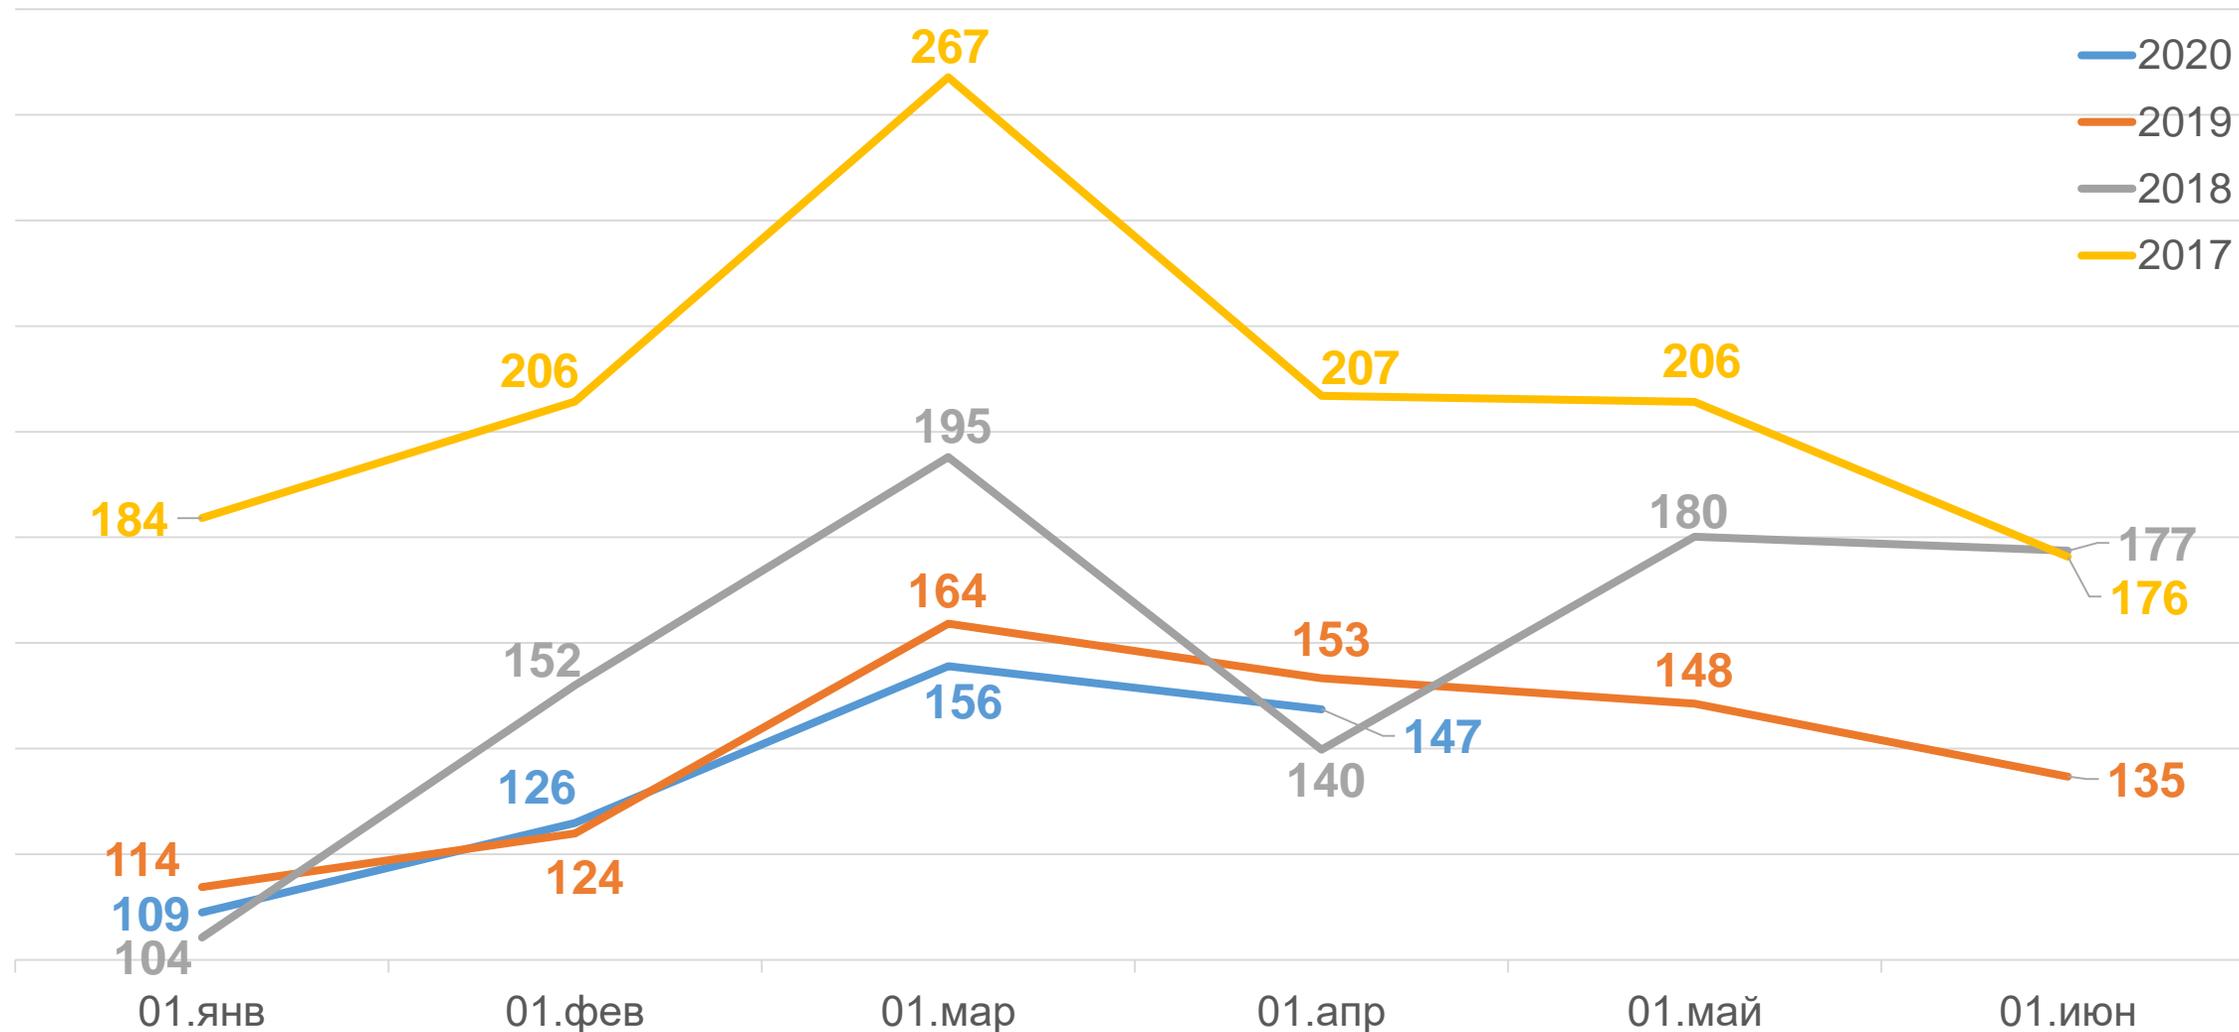



Динамика просроченной задолженности исполнителей коммунальных услуг за потребленную тепловую энергию (млн рублей)

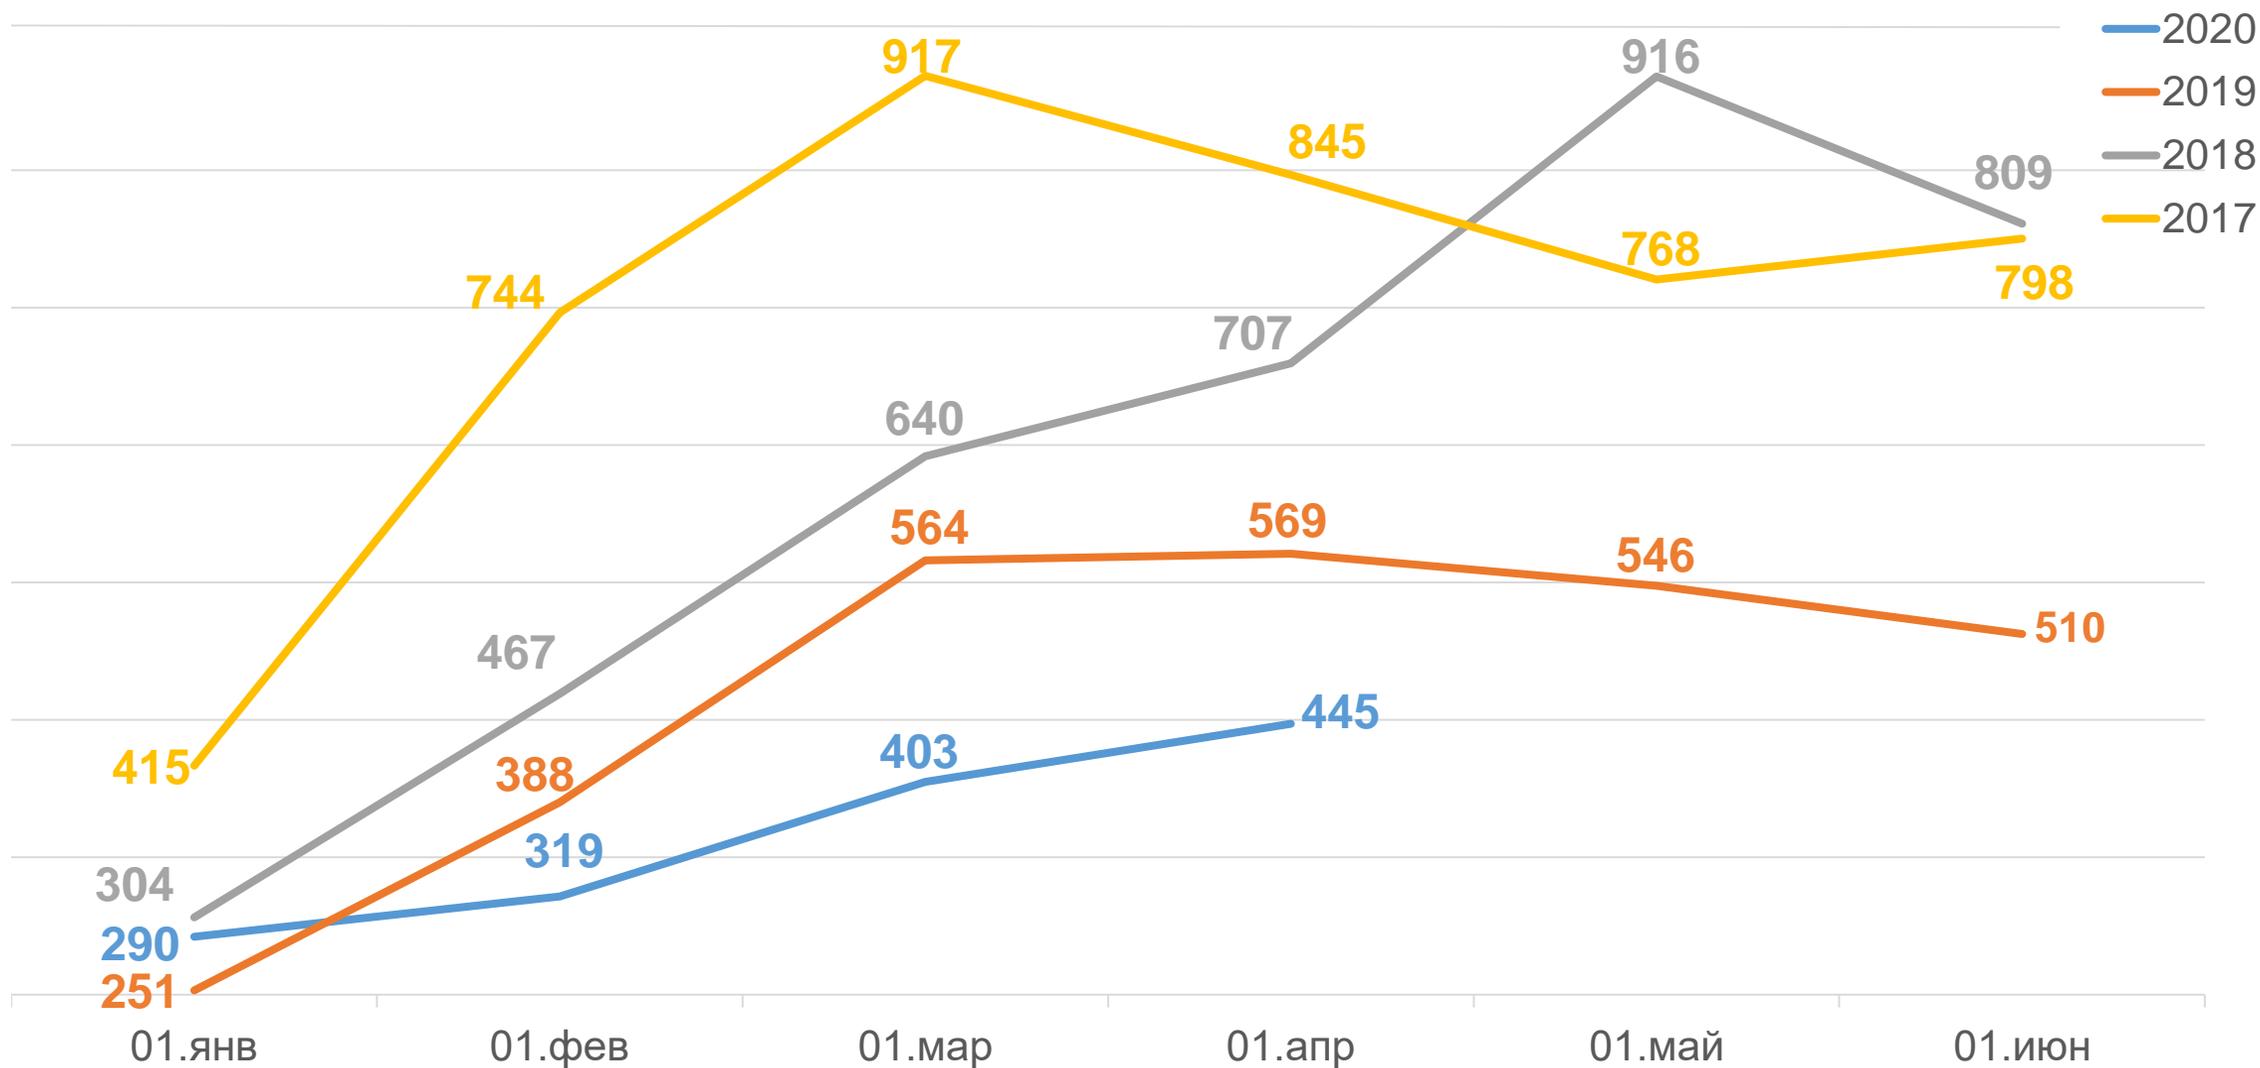



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
