

Охрана труда



2017
январь - апрель

Со смертельным
исходом

2

С тяжелым
исходом

1

ВСЕГО
по РТ

3

2018
январь - апрель

2

3

5

2019
январь - апрель

-

1

1

2020
январь - апрель

4


2

6

Охрана труда



Ввод жилья

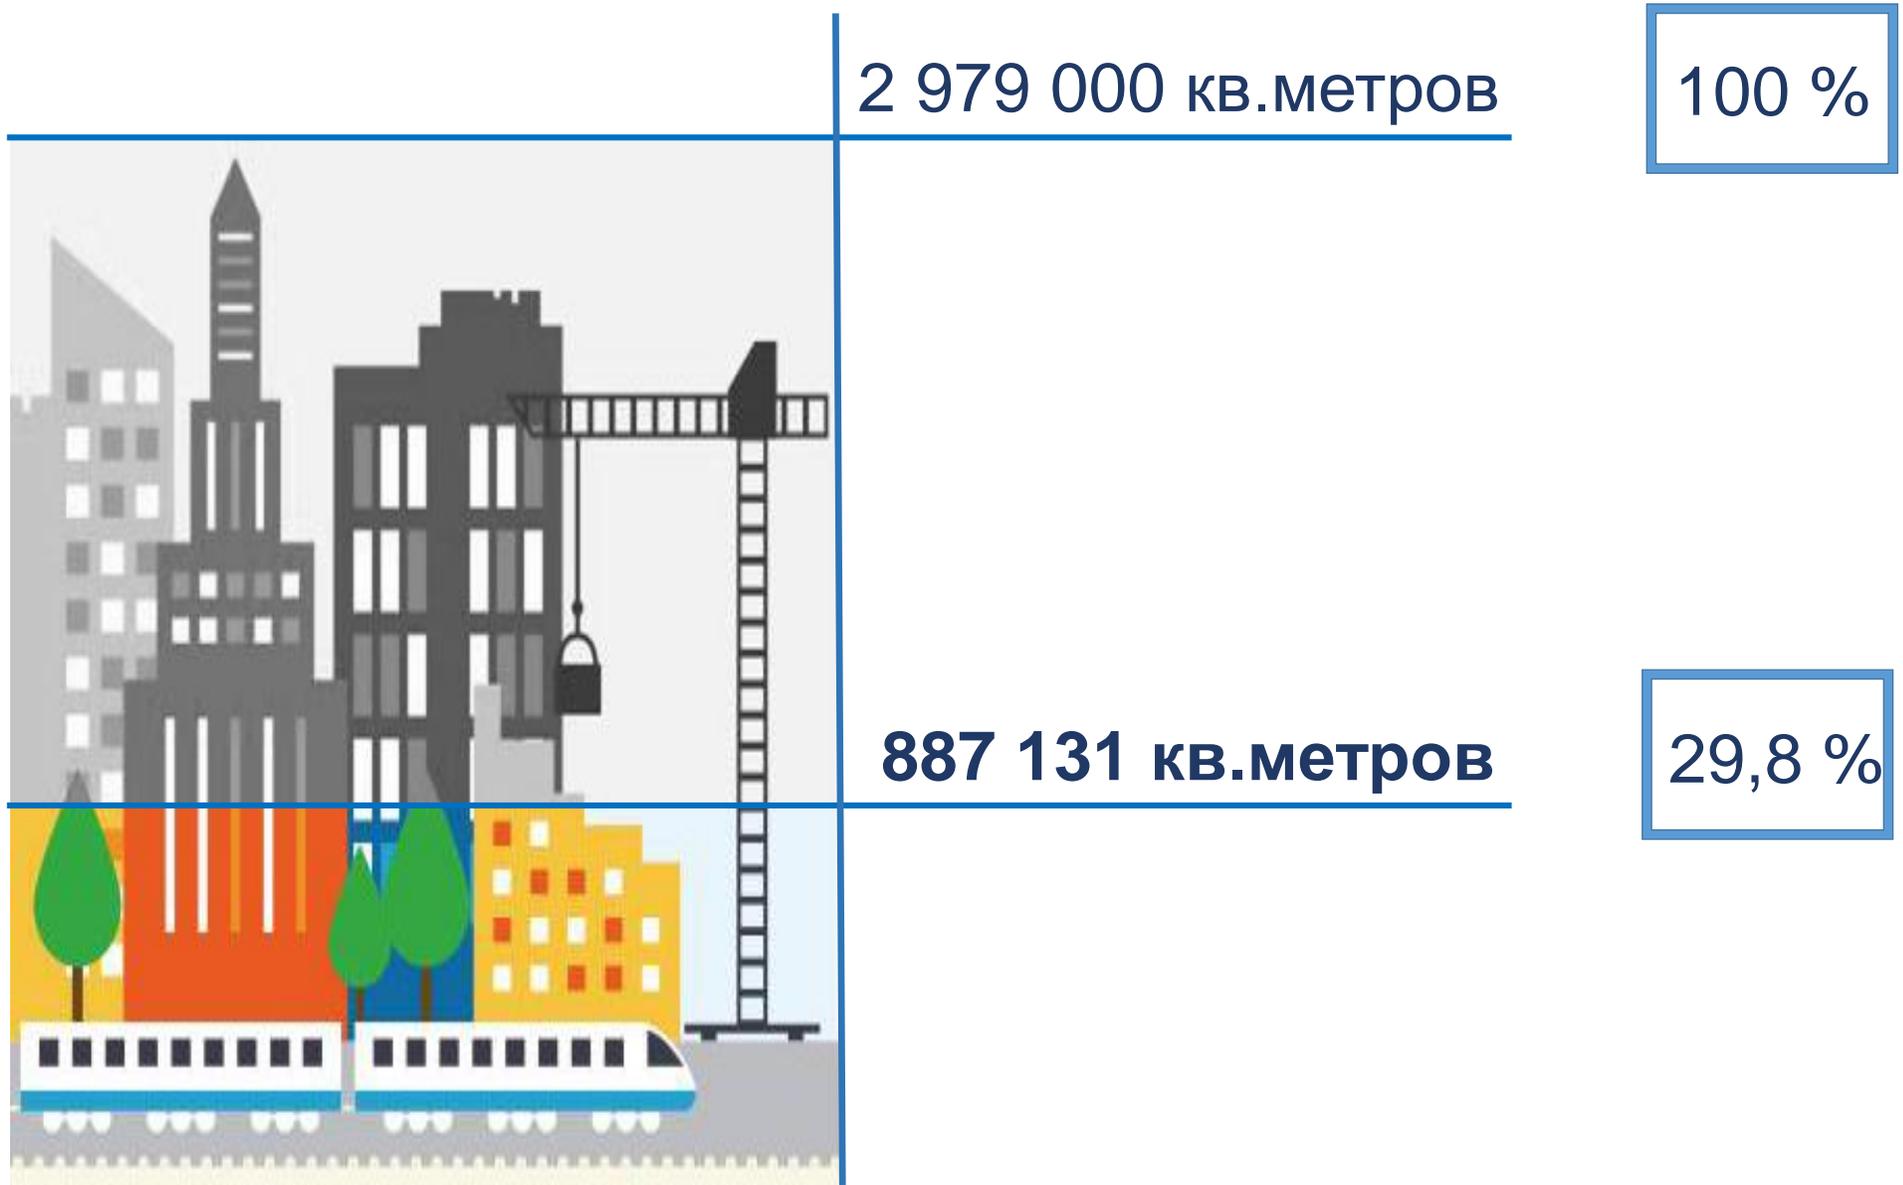



Ввод жилья по МО РТ

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	4 404	4,0	105 596
2	Лениногорский	32 000	2 242	7,0	29 758
3	г.Наб.Челны	350 000	31 637	9,0	318 363
4	Сабинский	26 000	3 001	11,5	22 999
5	Менделеевский	15 000	1 802	12,0	13 198
6	Новошешминский	6 000	742	12,4	5 258
7	Арский	30 000	4 048	13,5	25 952
8	Тетюшский	14 000	1 937	13,8	12 063
9	Актанышский	18 000	2 972	16,5	15 028
10	Чистопольский	35 000	5 855	16,7	29 145
11	Муслюмовский	12 000	2 263	18,9	9 737
12	Зеленодольский	110 000	20 985	19,1	89 015
13	Атнинский	6 000	1 151	19,2	4 849
14	Альметьевский	140 000	27 130	19,4	112 870
15	В-Услонский	50 000	10 064	20,1	39 936
ВСЕГО по РТ		2 979 000	887 131	29,8	2 091 869



Ввод жилья по МО РТ

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Азнакаевский	26 000	5 459	21,0	20 541
17	Дрожжановский	9 000	1 951	21,7	7 049
18	Буинский	20 000	4 481	22,4	15 519
19	Бугульминский	45 000	10 150	22,6	34 850
20	Апастовский	12 000	2 847	23,7	9 153
21	Алексеевский	19 000	4 773	25,1	14 227
22	К-Устьинский	12 000	3 061	25,5	8 939
23	Аксубаевский	10 000	2 718	27,2	7 282
24	Р-Слободский	18 000	5 316	29,5	12 684
25	Сармановский	12 000	3 632	30,3	8 368
26	Спасский	9 000	2 728	30,3	6 272
27	Бавлинский	18 000	5 760	32,0	12 240
28	Тукаевский	120 000	39 014	32,5	80 986
29	Кайбицкий	7 000	2 325	33,2	4 675
30	Агрызский	21 000	7 058	33,6	13 942
ВСЕГО по РТ		2 979 000	887 131	29,8	2 091 869

Ввод жилья

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Ютазинский	15 000	5 044	33,6	9 956
32	Мензелинский	18 000	6 122	34,0	11 878
33	г.Казань	960 000	332 873	34,7	627 127
34	Нурлатский	20 000	7 163	35,8	12 837
35	Черемшанский	7 000	2 512	35,9	4 488
36	Алькеевский	10 000	3 739	37,4	6 261
37	Высокогорский	110 000	41 728	37,9	68 272
38	Заинский	21 000	8 030	38,2	12 970
39	Кукморский	29 000	12 100	41,7	16 900
40	Мамадышский	23 000	9 660	42,0	13 340
41	Елабужский	65 000	27 684	42,6	37 316
42	Балтасинский	18 000	7 775	43,2	10 225
43	Тюлячинский	12 000	5 437	45,3	6 563
44	Лаишевский	160 000	73 682	46,1	86 318
45	Пестречинский	200 000	122 076	61,0	77 924
ВСЕГО по РТ		2 979 000	887 131	29,8	2 091 869

Ввод жилья



273 568 кв.метров

100%

20 531 кв.метров

7,5%

Ввод жилья



	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за неделю		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
Количество объектов	130	11	0	119	70	23	26
Количество квартир	4 970	363	0	4 607	2 175	1 585	847
Общая площадь (тыс кв.метров)	273,6	20,5	0	253,1	120,7	83,2	49,2

Ввод жилья

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2 / КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
введены в эксплуатацию	771 747	771 747	0	721 666	3 257	736 577	0
высокая 70-100%	4 566 618	4 052 233	62 986	3 461 194	80 452	3 993 504	40 283
средняя 30-70%	3 158 923	1 609 371	134 520	987 802	36 341	1 709 720	51 233
низкая 0-30%	1 804 558	490 560	51 133	315 191	3 018	748 587	5 654
ИТОГО	10 301 845	6 923 951	248 640	5 485 854	123 068	7 188 389	97 171



Многоквартирное инвестиционное жилье

Ввод жилья



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	3	1	2	-
3	Арский	2	-	-	2
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	2	-	-	2
6	Верхнеуслонский	2	1	1	-
7	Высокогорский	6	2	4	-
8	Елабужский	2	1	1	-
9	Зеленодольский	6	4	2	-
10	Лаишевский	5	1	4	-
11	Пестречинский	23	3	15	5
12	г.Набережные Челны	30	16	14	-
13	г.Казань	45	37	8	-
ВСЕГО по РТ		128	68	51	9

Ввод жилья



10 680 домов

100%

3 990 домов

37,4 %

Обеспечение жильем



	План	Финансирование, млн руб.	Бюджет РФ, млн руб.	Бюджет РТ, млн руб.
дети-сироты	600	840,71	46,52	794,19
многодетные семьи	46	211,89	-	211,89
молодые семьи	47	62,84	13,34	49,5

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в том числе по категориям	35	78,24	78,24	-
чернобыльцы	12	28,00	28,00	-
вынужденные переселенцы	21	46,07	46,07	-
переселенцы с РКС	2	4,17	4,17	-

Обеспечение жильем



№	МО РТ	Количество жилых помещений	№	МО РТ	Количество жилых помещений
1	Агрызский	4	9	Лаишевский	5
2	Альметьевский	79	10	Мензелинский	4
3	Бугульминский	9	11	Нижнекамский	90
4	Высокогорский	2	12	Нурлатский	6
5	Елабужский	26	13	Сармановский	4
6	Зеленодольский	2	14	г. Наб. Челны	13
7	Кайбицкий	1	15	г. Казань	99
8	Кукморский	5			
ИТОГО					349

Обеспечение жильем




№	МО РТ	План	Выдано сертификатов	№	МО РТ	План	Выдано сертификатов
1	Азнакаевский	1	1	12	Кайбицкий	1	1
2	Аксубаевский	2	2	13	Кукморский	4	4
3	Алькеевский	1	1	14	Лениногорский	2	2
4	Альметьевский	2	2	15	Мамадышский	3	3
5	Бавлинский	2	2	16	Муслюмовский	2	2
6	Балтасинский	1	1	17	Новошешминский	1	1
7	Бугульминский	1	1	18	Нурлатский	4	4
8	Высокогорский	3	3	19	Сармановский	1	1
9	Елабужский	1	1	20	Тюлячинский	4	4
10	Заинский	1	1	21	г.Набережные Челны	3	3
11	Зеленодольский	2	2	22	г.Казань	4	4
ИТОГО						46	46

Обеспечение жильем



№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Арский	1	7	Нижнекамский	5
2	Альметьевский	1	8	Нурлатский	1
3	Бугульминский	1	9	Сабинский	1
4	Высокогорский	1	10	Ютазинский	1
5	Елабужский	1	11	г.Набережные Челны	10
6	Лаишевский	1	12	г.Казань	23
ИТОГО					47

Обеспечение жильем



№	МО РТ	Оформлено сертификатов		
		чернобыльцы	вынужденные переселенцы	переселенцы с РКС
1	Алькеевский	1	-	-
2	Буинский	1	-	-
3	Верхнеуслонский	-	-	1
4	Зеленодольский	1	1	-
5	Кукморский	-	1	-
6	Мамадышский	2	-	1
7	Мензелинский	-	1	-
8	Сабинский	1	-	-
9	Ютазинский	-	2	-
10	г.Набережные Челны	1	1	-
11	г.Казань	1	3	-
ИТОГО		8	9	2



Проведение аукционов на разработку ПИР по программам строительства 2020 года

Проведение торгов



№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК заключен	Дата заключения ГК	Дата аукциона
1	Строительство зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	11	11	-	-
2	Строительство ФАП, врачебных амбулаторий	51	51	-	-
3	Строительство дошкольных образовательных организаций	22	15	27 апреля (7 объектов)	-
4	Строительство детских оздоровительных лагерей (в том числе реконструкция)	21	20	28 апреля (1 объект)	-
5	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	12	12	-	-
6	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	91*	0	28 апреля (90 объектов)	-
7	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	21	0	-	8 мая 2020 (21 объект)
8	Строительство силосно-сенажных траншей	90	ПИР не предусмотрены		
9	Строительство коровников и овцеводческих ферм	7			
ИТОГО		326	109	98	21

* По 1 объекту ведется формирование лота

Другие социальные программы

12 объектов Министерства образования РТ:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

16 584,8 тыс рублей, в том числе:

- 9 619,2 тыс рублей из бюджета РФ;
- 6 965,6 тыс рублей из бюджета РТ.

Аукцион на выполнение СМР – 30.04.2020





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

169 объектов, 2,62 тыс кв.метров АЖФ

15 023,3 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 7 250,3 млн рублей, бюджет РТ– 7 773,0 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ДЕМОГРАФИЯ

31 объект

5 864,2 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

69 объектов

2,62 тыс кв.метров АЖФ

4 337,7 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЭКОЛОГИЯ

14 объектов

2 346,4 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

8 объектов

1 192,53 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

41 объект

1 158,1 млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КУЛЬТУРА

6 объектов

124,5 млн рублей

31 объект
5 864,2 млн рублей


Источники: бюджет РФ – 1 667,5 млн рублей, бюджет РТ – 4 186,7 млн рублей



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- 1 Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
- 2 Спорт — норма жизни
- 3 Старшее поколение

Бюджет национального проекта

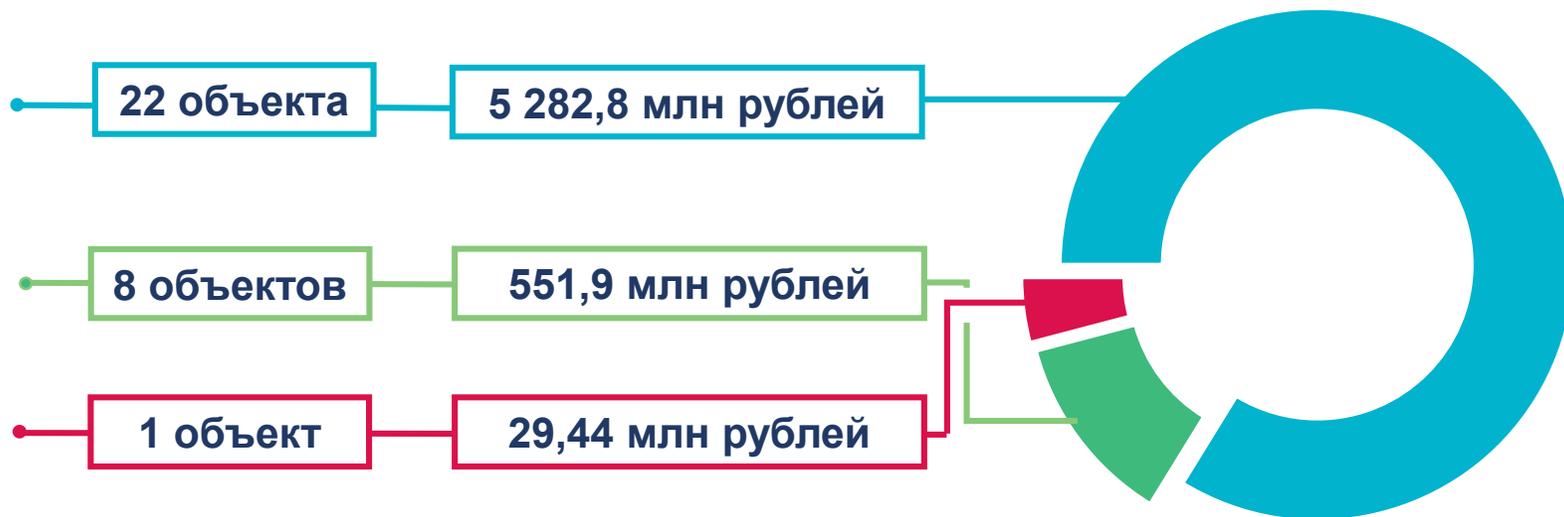

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:



69 объектов, 2,62 тыс кв.метров АЖФ
4 337,7 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 2 492,2 млн рублей, бюджет РТ– 1 845,5 млн рублей



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- 1 Формирование комфортной городской среды
- 2 Жилье
- 3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:




14 объектов
2 346,4 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 1 730,3 млн рублей, бюджет РТ – 616,1 млн рублей



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Бюджет национального проекта

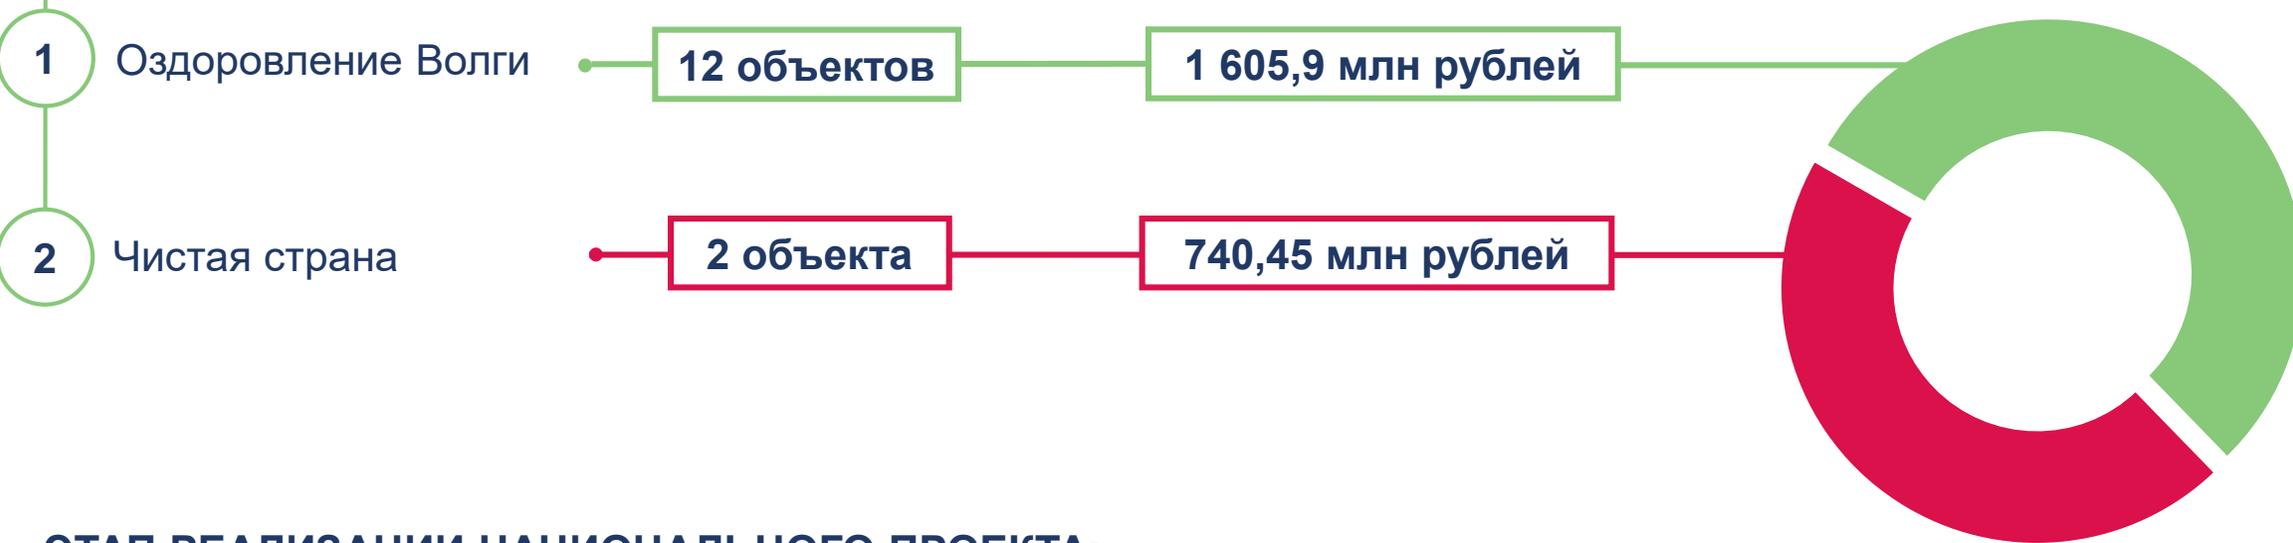

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:



8 объектов
1 192,53 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 636,5 млн рублей, бюджет РТ – 556,1 млн рублей



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Бюджет национального проекта

1 Современная школа


2 объекта

1 183,89 млн рублей


2 Успех каждого ребенка

6 объектов

8,63 млн рублей



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

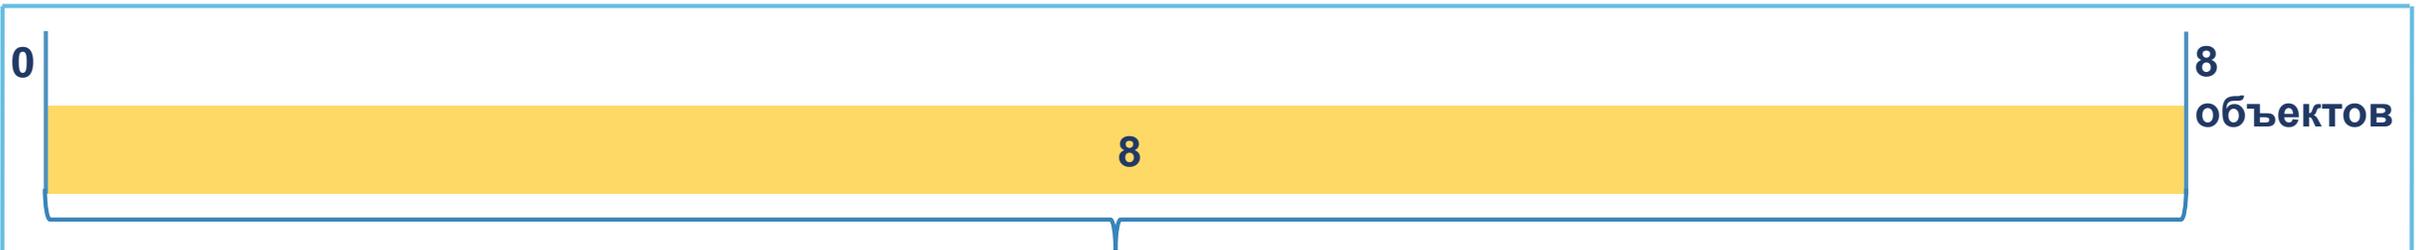

назначены даты аукционов на СМР

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:


- 1 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
- 2 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Бюджет национального проекта



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

назначена дата
ГК на СМР

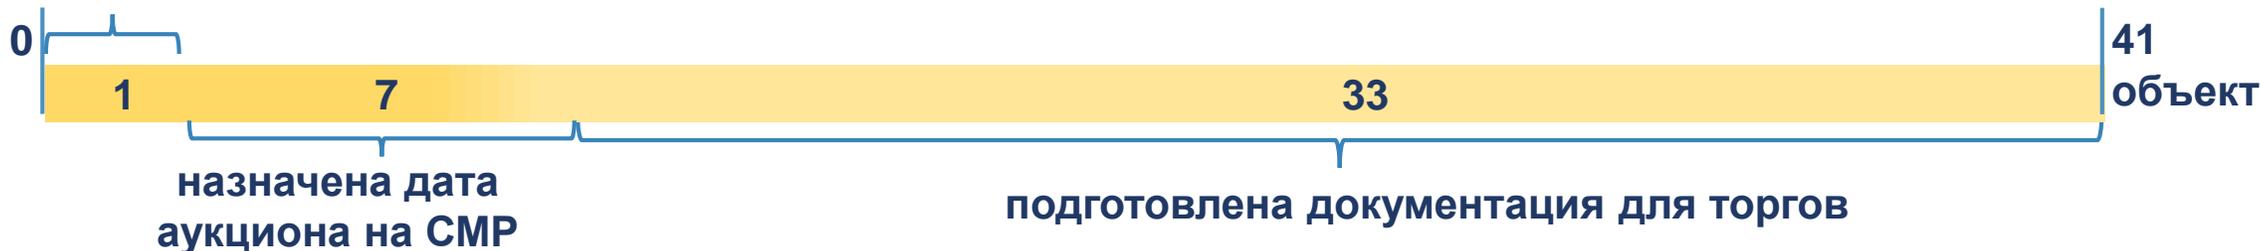

6 объектов
124,5 млн рублей

Источники: бюджет РФ – 55,5 млн рублей, бюджет РТ – 69,0 млн рублей




РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

1 Культурная среда

6 объектов

124,5 млн рублей

Бюджет национального проекта



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

заклучен ГК на СМР



назначена дата ГК на СМР



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года

Формирование программ



№	МО РТ
1	Агрызский
2	Алексеевский
3	Арский
4	Бавлинский
5	Верхнеуслонский
6	Дрожжановский
7	Камско-Устьинский
8	Лениногорский
9	Менделеевский
10	Мензелинский
11	Муслюмовский
12	Новошешминский
13	Тюлячинский
14	Черемшанский
15	Азнакаевский


№	МО РТ
16	Аксубаевский
17	Актанышский
18	Алькеевский
19	Альметьевский
20	Апастовский
21	Атнинский
22	Балтасинский
23	Бугульминский
24	Буинский
25	Высокогорский
26	Елабужский
27	Заинский
28	Зеленодольский
29	Кайбицкий
30	Кукморский

№	МО РТ
31	Лаишевский
32	Мамадышский
33	Нижнекамский
34	Нурлатский
35	Пестречинский
36	Рыбно-Слободский
37	Сабинский
38	Сармановский
39	Спасский
40	Тетюшский
41	Тукаевский
42	Чистопольский
43	Ютазинский
44	г.Набережные Челны
45	г.Казань



Прогноз среднесуточной температуры

ЖКХ



Дата	Дневная температура, °С	Ночная температура, °С	Среднесуточная температура за сутки, °С
25 апреля	+ 9	0	4,5
26 апреля	+14	+ 5	9,5
27 апреля	+ 13	+ 3	8
28 апреля	+13	+ 5	9
29 апреля	+ 6	+ 3	4,5
30 апреля	+ 6	+ 3	4,5
1 мая	+ 11	+ 4	7,5
2 мая	+ 12	+ 5	8,5
3 мая	+ 17	+7	12
Прогнозные данные (из электронных СМИ)			
