



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах




Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
1 полугодие 2013 года	43	21	22
1 полугодие 2014 года	34	13	21
	↓ 21%	↓ 38%	↓ 5%




Несчастные случаи в МО РТ

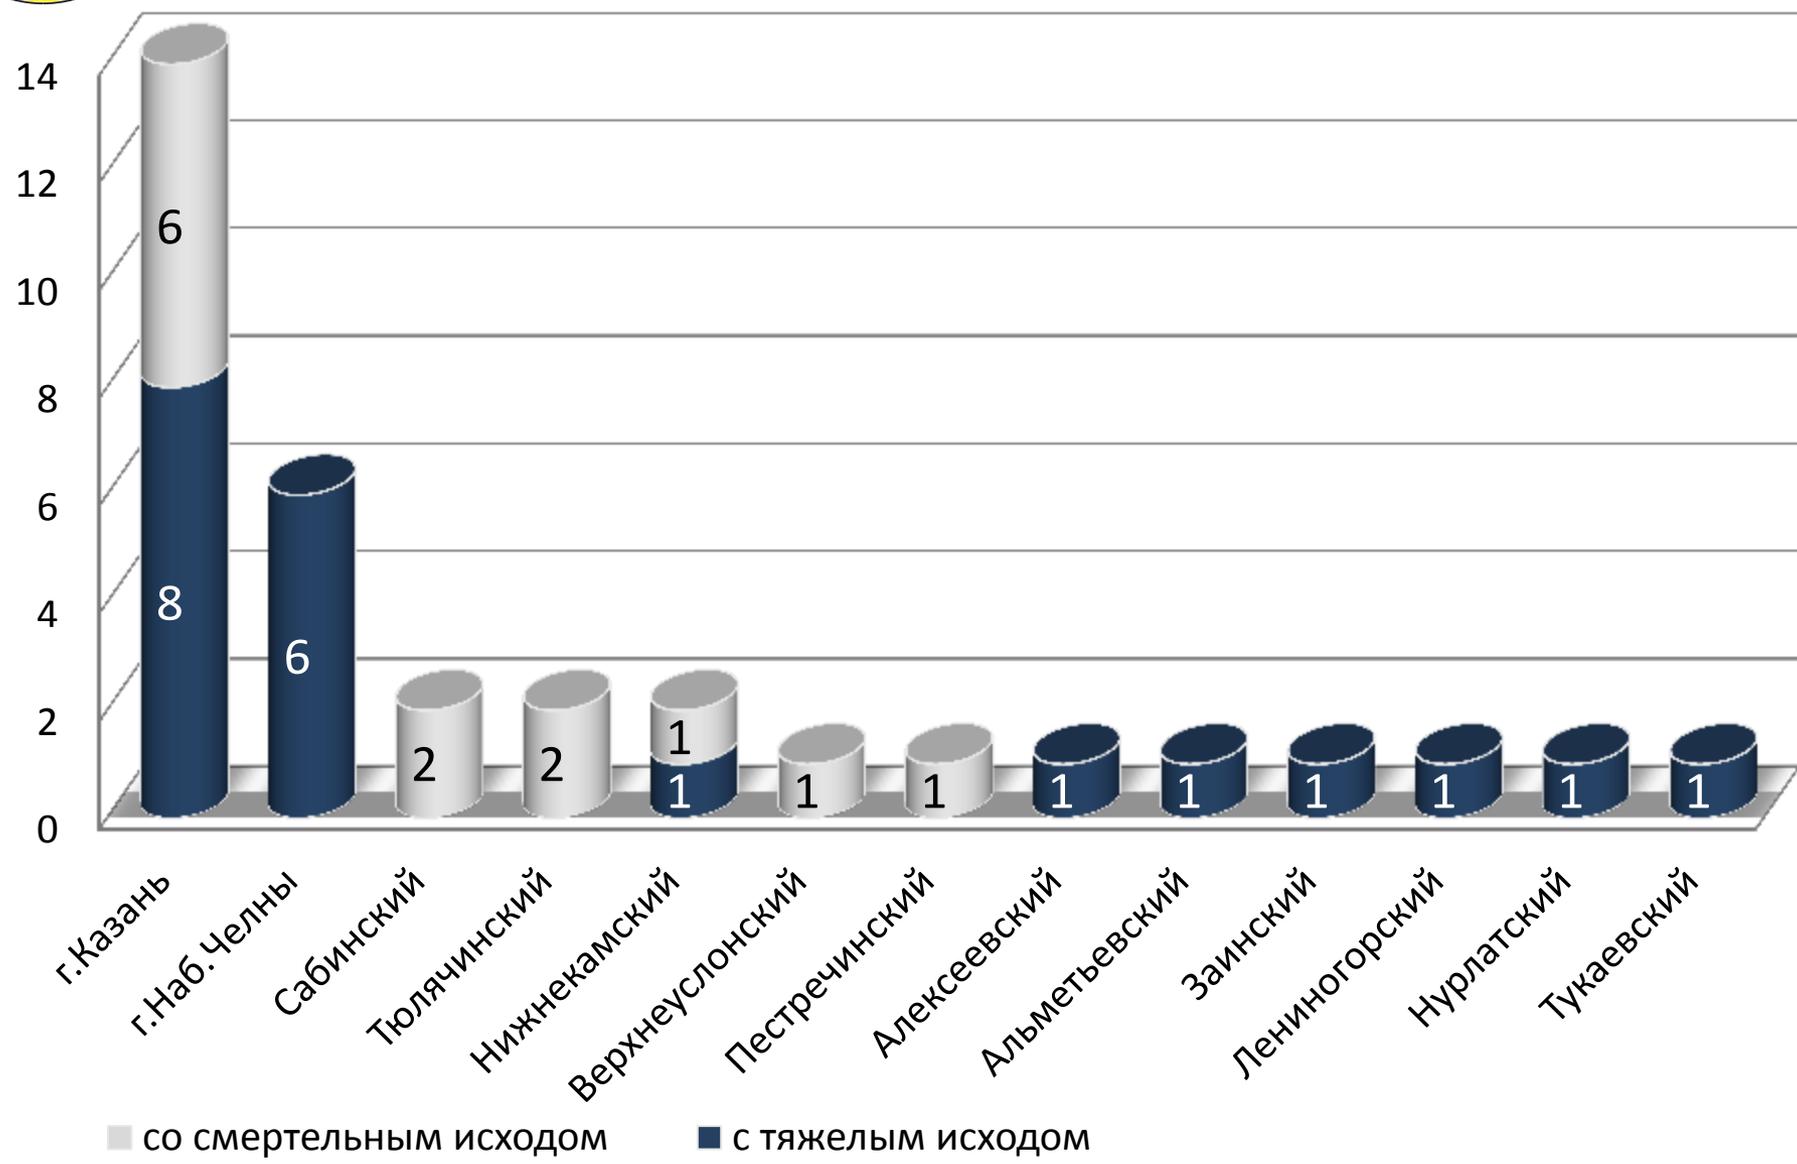



Несчастные случаи в разрезе программ

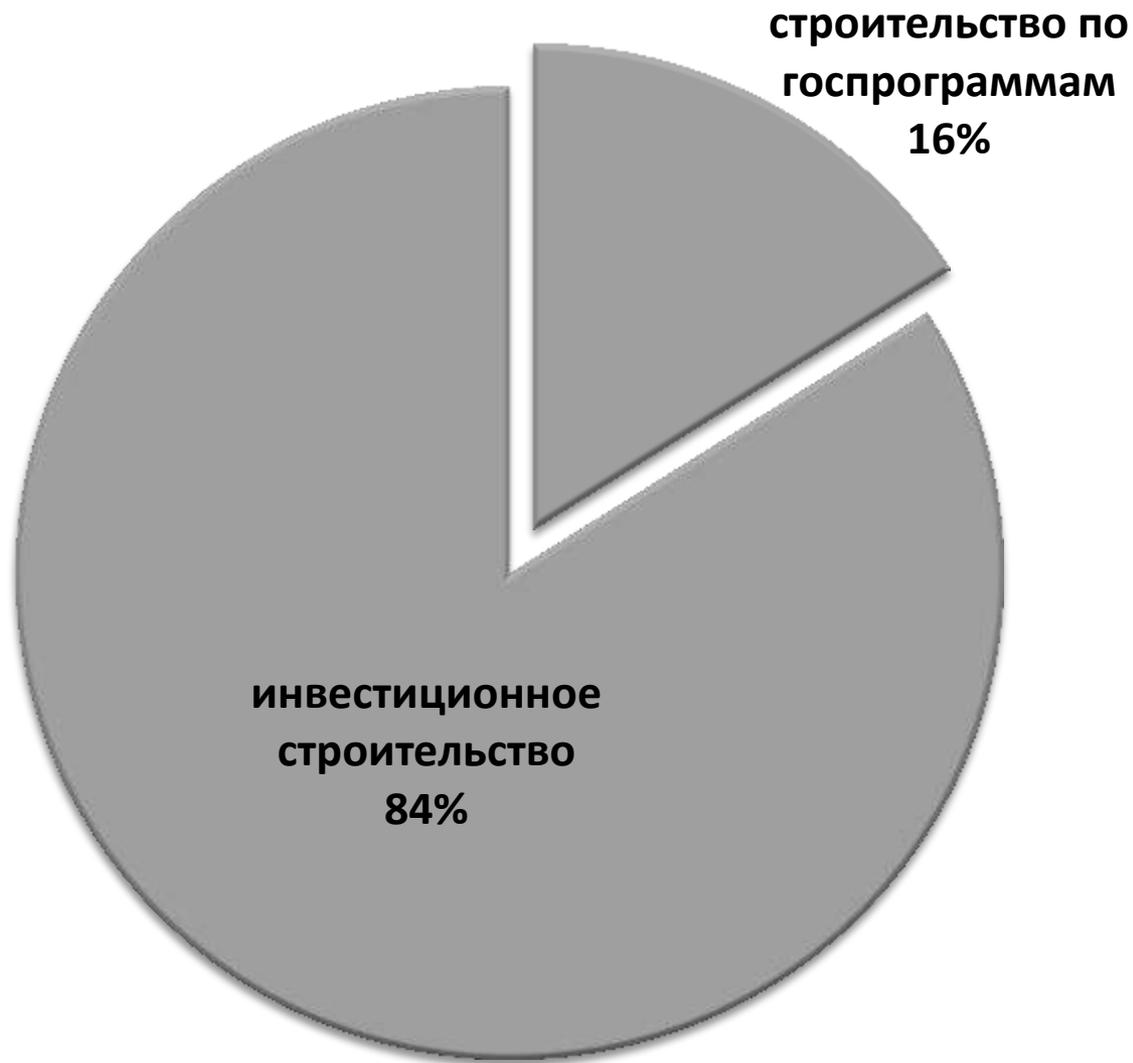



Обстоятельства несчастных случаев



Приостановленные объекты строительства

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Примечание
1	Жилой комплекс «Светлый», ж/д № 3А/2	Пестречинский район, с.Куюки	ООО «Спецстрой»	Замечания устранены
2	Много-функциональный жилой комплекс	г.Казань, ул. Павлюхина, 112Б	ООО «Лира»	Замечания устранены
3	Дилерский центр «Porsche»	г.Казань, ул.Декабристов, 83	ООО «Лира»	Замечания устранены
4	Жилой дом	г.Казань, ул. Рабочая	ООО «Монолитстрой-мастер»	Замечания устранены
5	Детский сад	г.Казань, ул.Мавлютова, 35	ООО «СК «Магистраль»	Замечания устранены



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

7

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	496	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	247	8 794,0
Взыскано всего	75	3 432,0
Не истек срок оплаты	96	4 662,0
Направлено в службу судебных приставов	6	280,0
Обжалуются в суде	5	420,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

С 01.01.2014

Наименование	Количество
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	123
Выдано предписаний	52
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	60
Прекращено действие Свидетельств	11



Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

9

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа, шт.	Расселяемая площадь по заключенным договорам выкупа, кв.м
Алексеевский	3 +3	86,10 +86,10
Арский	5 +3	238,10 +134,10
Балтасинский	2 +2	85,90 +85,90
Кукморский	1 +1	39,2 +39,2
Мамадышский	66 +31	2 875,94 +1 289,63
Мензелинский	43	1 597,01
Сабинский	12	711,81
Итого	132 +40	5 634,06 +1 634,93



**Потребность в жилых помещениях
по программе переселения из аварийного фонда.** Тыс. кв.м

№	МО	Этап 2013г.	Этап 2014г.	Итого
Всего по РТ		250,89	337,29	588,18
1	Агрызский	3,68	5,05	8,73
2	Азнакаевский	7,60	10,74	18,34
3	Актанышский	1,53	4,00	5,53
4	Алексеевский	1,89	2,66	4,55
5	Алькеевский	0,18	0,54	0,72
6	Альметьевский	6,55	8,19	14,73
7	Апастовский	0,90	0,62	1,51
8	Арский	6,33	10,07	16,41
9	Бавлинский	2,47	1,95	4,42
10	Балтасинский	2,27	3,04	5,31
11	Буинский	5,17	7,14	12,31
12	Бугульминский	2,67	3,60	6,28
13	Верхнеуслонский		0,53	0,53
14	Высокогорский	7,46	6,32	13,78
15	Дрожжановский	0,49		0,49
16	Елабужский	2,98	4,25	7,23
17	Заинский	0,36	0,77	1,13
18	Зеленодольский	71,49	97,61	169,10
19	Кайбицкий	0,00	0,06	0,06
20	Камско-Устьинский	1,53	2,15	3,68



Потребность в жилых помещениях по программе переселения из аварийного фонда.

ТЫС. КВ.М

№	МО	Этап 2013г.	Этап 2014г.	Итого
Всего по РТ		250,89	337,29	588,18
21	Кукморский	8,17	10,28	18,46
22	Лаишевский	1,67	2,72	4,39
23	Лениногорский	2,06	2,55	4,62
24	Мамадышский	15,05	20,51	35,56
25	Менделеевский	1,49	2,05	3,54
26	Мензелинский	3,59	4,36	7,95
27	Муслюмовский	4,24	0,73	4,97
28	Нижнекамский	0,26	0,56	0,82
29	Новошешминский	0,18	0,38	0,56
30	Нурлатский	6,00	7,15	13,15
31	Пестречинский	3,66	4,82	8,48
32	Рыбно-Слободский	0,95	3,32	4,27
33	Сабинский	1,64		1,64
34	Спасский	4,50	6,17	10,67
35	Тукаевский	0,48		0,48
36	Тетюшский	0,89	6,04	6,93
37	Тюлячинский	0,48		0,48
38	Чистопольский	30,02	43,62	73,64
39	Ютазинский	1,09	5,78	6,87
40	г.Казань	38,93	46,94	85,87



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

12

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья , кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	Всего по РТ	179 207,5	127 636,8	93 883,1	33 753,7
1	Агрызский	2 625,3	-	-	-
2	Азнакаевский	5 427,7	4 442,4	1 629,9	2 812,5
3	Актанышский	1 094,2	1 676,2	1 676,2	-
4	Алексеевский	1 349,1	1 399,0	1 399,0	-
5	Алькеевский	132,0	-	-	-
6	Альметьевский	4 676,9	11 764,6	6 364,6	5 400,0
7	Апастовский	639,8	-	-	-
8	Арский	4 524,6	4 215,3	-	4 215,3
9	Бавлинский	1 764,9	1 425,4	-	1 425,4
10	Балтасинский	1 619,1	296,0	296,0	-
11	Буинский	3 692,5	4 411,6	-	4 411,6
12	Бугульминский	1 910,6	-	-	-



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

13

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья, кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	Всего по РТ	179 207,53	127 636,8	93 883,1	33 753,7
13	Высокогорский	5 329,5	8 020,0	-	8 020,0
14	Дрожжановский	348,9	12 97,2	-	12 97,2
15	Елабужский	2 129,0	10 669,0	10 669,0	-
16	Заинский	256,7	-	-	-
17	Зеленодольский	51 061,9	24 895,5	24 895,5	-
18	Камско-Устьинский	1 092,1	-	-	-
19	Кукморский	5 836,9	6 089,0	6 089,0	-
20	Лаишевский	1 193,8	1 915,3	-	1 915,3
21	Лениногорский	1 471,7	900,0	-	900,0
22	Мамадышский	10 747,9	25 991,0	25 991,0	-
23	Менделеевский	1 064,7	1 853,0	-	1 853,0
24	Мензелинский	2 562,0	3 845,3	3 845,3	-
25	Муслюмовский	3 026,4	702,0	-	702,0



Реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда **этапа 2013г.**

14

№	МО РТ	Количество расселяемого жилья, кв.м.	Количество строящегося (введенного) нового жилья , кв.м.		
			Всего, в т.ч.	ГЖФ	Инвест. жилье
	Всего по РТ	179 207,5	127 636,8	93 883,1	33 753,7
26	Нижнекамский	186,9	801,4	-	801,4
27	Новошешминский	128,9	-	-	-
28	Нурлатский	4 288,7	5 336,6	5 336,6	-
29	Пестречинский	2 612,9	-	-	-
30	Рыбно-Слободский	676,0	-	-	-
31	Сабинский	1 171,6	2 998,0	2 998,0	-
32	Спасский	3 215,3	-	-	-
33	Тукаевский	341,7	-	-	-
34	Тетюшский	634,7	1 893,0	1 893,0	-
35	Тюлячинский	343,7	800,0	800,0	-
36	Чистопольский	21 441,9	-	-	-
37	Ютазинский	780,1	-	-	-
38	г.Казань	27 806,8	-	-	-



Площадь жилых помещений, необходимая для приобретения собственниками аварийного жилищного фонда

ТЫС.КВ.М

№	МО	Этап 2013 года		Этап 2014 года		Всего	
		Расселяемая	Потребность	Расселяемая	Потребность	Расселяемая	Потребность
Итого по РТ		113,28	158,60	163,62	229,07	276,90	387,67
1	Агрызский	1,86	2,61	2,72	3,81	4,59	6,42
2	Азнакаевский	5,10	7,14	7,38	10,34	12,48	17,48
3	Актанышский	0,31	0,43	1,84	2,58	2,15	3,01
4	Алексеевский	0,44	0,62	1,25	1,75	1,70	2,37
5	Алькеевский	0,00	0,00	0,21	0,29	0,21	0,29
6	Альметьевский	3,37	4,71	5,05	7,07	8,42	11,78
7	Апастовский	0,54	0,75	0,25	0,35	0,79	1,11
8	Арский	3,44	4,81	4,90	6,86	8,34	11,67
9	Бавлинский	1,23	1,73	0,96	1,35	2,20	3,08
10	Балтасинский	0,39	0,55	2,14	3,00	2,54	3,55
11	Буинский	3,26	4,56	4,60	6,45	7,86	11,01
12	Бугульминский	0,91	1,28	1,63	2,28	2,54	3,56
13	Верхнеуслонский			0,29	0,41	0,29	0,41
14	Высокогорский	5,01	7,01	1,74	2,44	6,75	9,45
15	Дрожжановский	0,35	0,49			0,35	0,49
16	Елабужский	1,66	2,32	1,94	2,72	3,60	5,04
17	Заинский	0,26	0,36	0,05	0,07	0,31	0,43
18	Зеленодольский	32,66	45,72	49,43	69,20	82,09	114,93
19	Кайбицкий			0,04	0,06	0,04	0,06
20	Камско-Устьинский	0,74	1,04	1,23	1,72	1,97	2,76



Площадь жилых помещений, необходимая для приобретения собственниками аварийного жилищного фонда

16

Тыс.кв.м

№	МО	Этап 2013 года		Этап 2014 года		Всего	
		Расселяемая	Потребность	Расселяемая	Потребность	Расселяемая	Потребность
Итого по РТ		113,28	158,60	163,62	229,07	276,90	387,67
21	Кукморский	3,43	4,80	3,65	5,11	7,08	9,91
22	Лаишевский	0,49	0,69	0,67	0,94	1,16	1,63
23	Лениногорский	1,05	1,47	1,59	2,23	2,64	3,70
24	Мамадышский	10,75	15,05	14,65	20,51	25,40	35,56
25	Менделеевский	0,92	1,29	1,46	2,05	2,38	3,34
26	Мензелинский	1,08	1,52	0,68	0,95	1,77	2,47
27	Муслюмовский	1,25	1,76	0,22	0,31	1,48	2,07
28	Нижнекамский	0,07	0,10	0,00	0,00	0,07	0,10
29	Новошешминский	0,06	0,09	0,14	0,19	0,20	0,28
30	Нурлатский	2,30	3,22	4,41	6,17	6,71	9,39
31	Пестречинский	0,93	1,30	2,97	4,16	3,90	5,46
32	Рыбно-Слободский	0,64	0,90	1,94	2,71	2,58	3,62
33	Сабинский	0,98	1,37			0,98	1,37
34	Спасский	2,69	3,77	3,28	4,60	5,98	8,37
35	Тукаевский	0,00	0,00			0,00	0,00
36	Тетюшский	0,44	0,61	2,47	3,46	2,91	4,07
37	Тюлячинский	0,34	0,48			0,34	0,48
38	Чистопольский	11,08	15,51	16,50	23,10	27,58	38,61
39	Ютазинский	0,12	0,17	3,56	4,99	3,68	5,15
40	г.Казань	13,12	18,37	17,74	24,83	30,86	43,21



Показатели программы

2014 года

17

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

18

Наименование МО	Количество заключенных договоров выкупа, шт.	Расселяемая площадь по заключенным договорам выкупа, кв.м
Арский	4 +4	164,7 +164,7
Кайбицкий	3 +3	43,5 +43,5
Мензелинский	22	813,90
Итого	29 +7	1 022,10 +208,20



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 4 июля 2014 года

19

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 215 465	50,7	+3,8	1 183 535
1	Буинский	19 000	2 761	14,5	3,6	16 239
2	Нижнекамский	130 000	20 240	15,6	0	109 760
3	Атнинский	6 000	1 347	22,5	0	4 653
4	Бугульминский	40 000	12 503	31,3	1,2	27 497
5	Чистопольский	32 500	11 004	33,9	1,0	21 496
6	В-Услонский	40 000	13 758	34,4	0	26 242
7	К.Устьинский	10 000	3 470	34,7	4,6	6 530
8	Нурлатский	26 000	9 647	37,1	0,9	16 353
9	Спасский	9 000	3 408	37,9	7,5	5 592
10	Кайбицкий	4 800	1 843	38,4	4,1	2 957
11	Азнакаевский	25 000	9 653	38,6	0,8	15 347
12	Черемшанский	10 300	4 242	41,2	0,7	6 058
13	Лениногорский	26 000	10 714	41,2	1,8	15 286
14	г.Наб.Челны	340 000	144 814	42,6	7,2	195 186
15	Муслюмовский	8 000	3 486	43,6	4,6	4 514



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 4 июля 2014 года

20

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
16	Арский	27 000	12 036	44,6	1,4	14 964
17	Новошешминский	5 000	2 334	46,7	0	2 666
18	Тюлячинский	6 500	3 093	47,6	2,7	3 407
19	г.Казань	850 000	411 861	48,5	2,2	438 139
20	Мензелинский	16 000	7 862	49,1	4,4	8 138
	Всего по РТ	2 399 000	1 215 465	50,7	+3,8	1 183 535
21	Р-Слободский	13 000	6 589	50,7	1,4	6 411
22	Менделеевский	10 000	5 149	51,5	3,1	4 851
23	Дрожжановский	7 500	3 900	52,0	3,7	3 600
24	Кукморский	32 000	17 113	53,5	2,8	14 887
25	Елабужский	65 000	35 542	54,7	1,9	29 458
26	Тетюшский	9 400	5 160	54,9	5,5	4 240
27	Мамадышский	25 000	13 990	56,0	0,8	11 010
28	Аксубаевский	11 000	6 194	56,3	0,8	4 806
29	Заинский	20 000	11 344	56,7	2,7	8 656
30	Альметьевский	155 000	89 594	57,8	13,1	65 406



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 4 июля 2014 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	1 215 465	50,7	+3,8	1 183 535
31	Бавлинский	17 000	9 879	58,1	41,8	7 121
32	Зеленодольский	130 000	76 475	58,8	0,9	53 525
33	Сармановский	9 000	5 364	59,6	1,5	3 636
34	Алексеевский	14 000	8 889	63,5	3,9	5 111
35	Актанышский	17 000	10 893	64,1	0	6 107
36	Алькеевский	6 500	4 600	70,8	4,7	1 900
37	Балтасинский	14 000	10 006	71,5	0	3 994
38	Сабинский	18 000	12 959	72,0	0	5 041
39	Высокогорский	46 000	33 599	73,0	3,3	12 401
40	Ютазинский	6 300	5 362	85,1	4,5	938
41	Апастовский	10 000	10 020	100,2	-	-
42	Лаишевский	52 000	52 345	100,7	-	-
43	Агрызский	20 000	20 845	104,2	4,7	-
44	Тукаевский	36 000	37 995	105,5	-	-
45	Пестречинский	28 000	31 583	112,8	-	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

22

на 04.07.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	40	88	73	+4%	9	+12%	6	+3%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	96,2	287,2	224,5		43,9		18,8	
Кол-во квартир	6 569	1 664	4 905	3 940		644		321	



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Спасский р-н, 1 кв. ж/д №16 п.Приволжский, ул. Спасская, 6	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО СК РОСЬ	100	86	6	-14	30.06.2014
Спасский р-н, 1 кв ж/д №4 п.Приволжский, ул.Приволжская,26	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО Стройкомп лекс	40	25	6	-15	30.09.2014
Спасский р-н, 1 кв ж/д №1 п.Приволжский, ул.Приволжская,20	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО Стройкомп лекс	40	21	3	-19	30.09.2014
Спасский р-н, 1 кв ж/д №2 п.Приволжский, ул.Приволжская,22	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО Стройкомп лекс	40	21	3	-19	30.09.2014
Спасский р-н, 1 кв ж/д №3 п.Приволжский, ул.Приволжская,24	СК ГлавИнвест ПроектСтрой	ООО Стройкомп лекс	40	21	3	-19	30.09.2014



Арендное жилье 2014 года

№	Месторасположение	Кол-во домов, шт.	Кол-во квартир, шт.	Общая площадь, кв.м	Степень готовности			
					Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
	ВСЕГО:	52	843	52 913,0	47		5	
	Через ГЖФ	11	739	41 492,0	7	+6%	4	+16%
1	Верхнеуслонский район	8	420	26 552,0	5	+5%	3	+7%
2	г. Наб.Челны	1	119	5 472,0	-	-	1	+25%
3	г. Елабуга	1	156	7 619,0	1	+7%	-	-
4	г. Казань	1	44	1 849,0	1	+1%	-	-
	Промышленные предприятия	41	104	11 421,0	40	-	1	-
5	г. Елабуга	41	104	11 421,0	40	+1%	1	+1%



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

25

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		37	132	25	2%	6	8%	6	3%
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Альметьевский	1	19	1	0%	-	-	-	-
3	Алькеевский	2	2	-	-	2	30%	-	-
4	Арский	2	3	2	1%	-	-	-	-
5	Балтасинский	10	10	9	10%	1	15%	-	-
6	Высокогорский	1	16	-	-	1	3%	-	-
7	Зеленодольский	2	6	2	1%	-	-	-	-
8	Кукморский	1	8	1	3%	-	-	-	-
9	Лаишевский	2	6	2	2%	-	-	-	-
10	Менделеевский	1	10	1	5%	-	-	-	-
11	Мензелинский	2	2	-	-	-	-	2	5%
12	Нижнекамский	1	10	-	-	1	7%	-	-
13	Пестречинский	1	1	1	11%	-	-	-	-
14	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
15	Тюлячинский	3	7	-	-	1	23 %	2	10%
16	Наб. Челны	5	23	3	3%	-	-	2	2%
17	г.Казань	1	1	1	0%	-	-	-	-



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

26

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

27

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
ИТОГО			309



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	8 +2	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на **2014** год

29

Район	Количество оформленных сертификатов	Район	Количество оформленных сертификатов
Алькеевский	1	Заинский	1
Альметьевский	1	Зеленодольский	1
Арский	7	г. Казань	5
Бавлинский	2	Камско-Устьинский	5
Балтасинский	1	Лаишевский	2
Бугульминский	1	Менделеевский	1
Высокогорский	1	Мензелинский	1
Елабужский	1	г. Наб. Челны	5
		Чистопольский	1
ИТОГО			37

Многоквартирное инвестиционное жилье



	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	54	71
Площадь, кв.м.	1 017,1	564,2	452,9

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		71	45	+3%	20	+3%	6	+2%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	1	+2%	1	+2%	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	-	-	4	+2%
4	Высокогорский	4	4	+2%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+5%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	4	2	+2%	2	+6%	-	-
7	Лаишевский	2	1	+2%	-	-	1	+2%
8	Лениногорский	1	1	+2%	-	-	-	-
9	Муслюмовский	1	1	+5%	-	-	-	-
10	Нижнекамский	6	-	-	5	+3%	1	+3%
11	г. Наб. Челны	22	14	+7%	8	+3%	-	-
12	г. Казань	22	18	+2%	4	+2%	-	-



Многоквартирное инвестиционное жилье (ведется строительство)

32



г.Набережные Челны, пр.Вахитова д.54 В
Застройщик – ООО «Риэлт К»



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

33

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	5 046	4 026



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

34

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		4 046	1 806	1 329	911
1	Азнакаевский	115	25	60	30
2	Аксубаевский	102	26	40	36
3	Актанышский	100	74	23	3
4	Алексеевский	57	42	15	-
5	Алькеевский	15	5	10	-
6	Альметьевский	192	70	57	65
7	Арский	100	27	41	32
8	Атнинский	30	17	13	-
9	Бавлинский	62	30	32	-
10	Балтасинский	47	27	20	-
11	Бугульминский	118	55	33	30
12	Буинский	170	80	90	-
13	В-Услонский	48	17	16	15
14	Высокогорский	50	32	18	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

35

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		4 046	1 806	1 329	911
15	Дрожжановский	28	10	12	6
16	Елабужский	133	66	67	-
17	Заинский	157	101	56	-
18	Зеленодольский	231	92	83	56
19	Кайбицкий	22	10	-	12
20	К.Устьинский	32	15	13	4
21	Кукморский	144	63	81	-
22	Лениногорский	73	20	30	23
23	Мамадышский	30	30	-	-
24	Менделеевский	56	36	19	-
25	Мензелинский	114	78	36	-
26	Муслюмовский	17	17	-	-
27	Нижнекамский	74	42	32	-

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		4 046	1 806	1 329	911
28	Новошешминский	44	10	5	29
29	Нурлатский	145	57	88	-
30	Р-Слободский	71	30	41	-
31	Сабинский	20	5	9	6
32	Сармановский	55	33	17	5
33	Спасский	16	16	-	-
34	Тетюшский	47	30	11	6
35	Тюлячинский	27	3	12	12
36	Черемшанский	46	6	39	1
37	Чистопольский	158	23	107	28
38	Ютазинский	10	3	4	3
39	г.Наб.Челны	224	44	42	138
40	г.Казань	1 252	439	442	371



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

37

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Тукаевский район, с.Тлянче-Тамак	2 500,0	81,0	4,0%	1 316,5	921,5
Елабужский район, с.Татарский Дюм-Дюм	2 500,0	86,0	2,0%	1 665,7	398,7
Альметьевский район, с. Маметьево	2 500,0	88,0	3,0%	0,0	0,0
Бавлинский район, с.Кзыл-Яр	2 500,0	89,0	1,0%	1 424,6	678,4
Мензелинский район, д.Кадряково	2 500,0	92,0	15,0%	817,6	0,0
Муслюмовский район, с.Муслюмово	2 500,0	94,0	8,0%	1 833,7	285,3
Алексеевский район с.Большие Полянки	2 500,0	95,0	11,0%	946,9	506,2
Итого по РТ	50 000,0	95,6	5%	25 617,0	10 953,1
Рыбно-Слободский район, с.Большой Машляк	2 500,0	96,0	7,0%	0,0	0,0
Бугульминский район, п.Подгорный	2 500,0	96,0	2,0%	1 405,6	659,4



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

38

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	50 000,0	95,6	5%	25 617,0	10 953,1
Лениногорский район, с.Старая Письмянка	2 500,0	97,0	3,0%	1 344,1	597,9
Сабинский район, с.Старая Икшурма	2 500,0	99,0	2,0%	1 247,5	873,3
Арский район, с.Сикертан	2 500,0	100,0	0,0%	1 860,3	1 114,0
Буинский район, с.Альшеево	2 500,0	100,0	0,0%	2 299,5	1 065,7
Высокогорский район, с.Айбаш	2 500,0	100,0	0,0%	1 573,0	811,1
Высокогорский район, с.Березка	2 500,0	100,0	0,0%	1 562,6	800,7
Заинский район, с.Бухарай	2 500,0	100,0	0,0%	1 289,4	0,0
Куморский район, с. Асан-Елга	2 500,0	100,0	4,0%	1 342,0	595,8
Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма	2 500,0	100,0	1,0%	2 015,4	185,1
Нурлатский район, с.Мамыково	2 500,0	100,0	0,0%	0,0	0,0
Тюлячинский район, с.Максабаш	2 500,0	100,0	0,0%	1 672,6	917,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2014 году (Бюджет РТ)

39



Арский район, с.Сикертан, ул.Школьная, д.75
Подрядчик - ООО «Билдгрупп»



Программа детских садов 2013 года

40

Финансирование

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	2 234,4	1 272,1	1 799,8
Строительство	1 994,07	1 089,0	1 622,4
Капитальный ремонт (Реконструкция)	214,8	181,7	164,4
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	25,3	11,0	12,9



Программа детских садов 2013

Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	динамика
1	Нижнекамский, 44 мкр.	260	ООО «Домкор Строй»	92	3
2	Лениногорский с.Шугурово	100	ООО «Сарет»	97	1
3	Актанышский, 12 квартал	140	ООО «ТМСИБ»	98	1



Программа детских садов 2013

42

Открытие состоялось 27.06.2014



г.Альметьевск, мкр. Западные ворота, п.24
Подрядчик ООО "Стройкомплекс"



Программа детских садов 2014

Финансирование

43

Млн.рублей

Наименование	Лимит	Принято КС	Оплата
Всего	5 083,9	813,5	2 131,3
Строительство	4 661,1	676,6	2 069,0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	393,2	129,4	59,1
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	29,4	7,5	3,2



Программа детских садов 2014

44

Млн.рублей

	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	27	1 110
Строительство	56	8 570	1	120
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	6	590
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

45

Строительство

№	ЗМО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	динамика
1	Чистопольский, г.Чистополь	220	ООО Стройкомплекс	31	5
2	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	260	ООО «Домкор строй»	33	5
3	г.Елабуга, мкр. Танайка	260	ООО «Евроальянс»	35	4
4	г.Казань, жм. Залесный	220	ООО «ГрейтСтрой»	35	6
5	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	80	ООО «КамГЭС»	37	5
6	г.Казань, ул.Чапаева-Максимова	220	ООО «Ак Таш»	38	8
7	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	260	ООО «Ак Таш»	39	5
8	г.Казань, Горьковское шоссе	120	ООО «ГрейтСтрой»	40	5
9	г.Казань, ул.Читаева	220	ООО «Ак Таш»	40	9
10	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	220	ООО «Керамика-маркет»	41	8
11	г.Казань, п.Кадышево	80	ООО «ТрансСтрой»	42	5
12	г.Казань, ул.Роторная	140	ООО «СК Магистраль»	42	12
13	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	260	ООО «Восход»	43	6



Программа детских садов 2014

46

Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	Динамика
14	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	140	ОАО «ФСК Кама»	43	6
15	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	340	ООО Евростиль	43	6
16	г.Н.Челны, жр.Замелекесье, 21 мкр	220	ООО «Евростиль»	47	7
17	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	260	ООО Стройкомплекс	47	10
18	Менделеевский, с.Брюшли	50	ООО МенделеевскСтрой	47	4
19	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	260	ООО «Евростиль»	50	6
20	Кукморский, д.Аш-Бузи	50	ИП Шарипов И.З.	53	4
21	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	140	ЗАО «Стройсервис»	55	2
22	г.Казань, ул.Мавлютова-Сыртлановой	120	ООО «СК Магистраль»	59	12
23	Балтасинский, мкр. Западный	120	ООО «Строймонтаж»	59	7
24	Арский, г.Арск	260	ООО «Билдгруп»	60	11
25	г.Казань, пр.Победы, ул.Р.Зорге	120	ООО «СтройКарт»	60	2
26	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	120	ООО «ГрейтСрой»	60	13
27	Тетюшский, мкр.Людоговка	80	ООО «ПМК №6»	63	10
28	г.Казань, ул.Крутая	260	ООО «Ак Таш»	64	20



Программа детских садов 2014

47

Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	Динамика
29	г.Казань, ул.Чэчэк	140	ООО «Ак Таш»	65	5
30	Мамадышский, г.Мамадыш	140	ЗАО МамадышСтрой	65	4
31	г.Казань, жм. Вознесенский	140	ООО «Ак Таш»	66	10
32	Бавлинский, Кзыл-Яр	50	ООО «Ак Строй»	67	20
33	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	50	ООО «Кама»	68	8
34	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	120	ООО «Ак Таш»	69	4
35	г.Казань, ул.Симонова	120	ООО «Грейт Строй»	72	21
36	Высокогорский, д.Ямашурма	80	ООО «Инвест»	72	3
37	г.Казань, пос. Отары	120	ООО «СК Панорама»	74	31
38	Высокогорский, с.Высокая Гора	260	ООО Барсэлитстрой	74	3
39	Камско-Устьинский, с. Теньки	50	ООО «Фарад»	74	10
40	Лаишевский, с.Усады	120	ООО «Ак Таш»	74	2
41	г.Казань, ул. Чкалова	120	ОАО Казаньцентрстрой	76	24



Программа детских садов 2014

48

Строительство

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	Динамика
42	г.Казань, ул.Ползунова	80	ООО «Бриз»	76	28
43	г.Казань, ул.Х.Такташа	120	ООО «Бриз»	78	22
44	г.Казань, ул.Амир.-Читаева	220	ОАО Казаньцентрстрой	79	23
45	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	120	ООО «Интерстрой»	79	33
46	Мензелинский, мкр. Садак	260	ООО «Гарант+»	79	7
47	Кукморский, с.Большой Сердек	50	ИП Шарипов И.З.	79	7
48	Нурлатский, с.Бурметьево	50	ООО «Город Строй»	79	3
49	г.Казань, ж.м.Петровский	80	ОАО Казаньцентрстрой	80	19
50	г.Казань, ул.Батыршина	120	ООО «Грейт Строй»	80	26
51	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	120	ООО «Казан»	86	6
52	Пестречинский, с.Шали	120	ООО «Строитель+»	88	7
53	г.Казань, ул.Тыныч	120	ООО «Ак Таш»	89	4
54	г.Казань, ул.Гаврилова	120	ООО «Казан»	93	3
55	Лаишевский, с.Столбище	260	ООО «Стройком»	93	15



Программа детских садов 2014

Строительство



Пестречинский район, с.Шали
Подрядчик ООО «Строитель+»



Программа детских садов 2014

50

Строительство



г.Казань, ул.Гаврилова
Подрядчик ООО «Казан»



Программа детских садов 2014

51

Реконструкция

№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	Готовность (%)	
				На 04.07.14	динамика
1	г.Казань, ул.Жуковка	120	ЗАО Ремстрой	77	2
2	Елабужский, г.Елабуга	120	ООО Евроальянсстрой	79	2
3	Рыбно-Слабодский, с.Урахча	25	ООО «Р.Слободской Универсалстрой»	85	11
4	Черемшанский, с.Черемшан	60	ООО «Техностройпром»	87	11
5	Буинский, г.Буинск	80	ООО «Созидатель»	88	16
6	Бугульминский, г.Бугульма	280	ООО «ПСБ-2»	88	6
7	Атнинский, с.Нижний Куюк	20	ООО «Атнинский МСО»	92	1
8	Атнинский, с.Каморгузя	20	ООО «Атнинский МСО»	96	2
9	Бавлнский, с.Крым Сарай	40	ООО «Лира»	97	13

Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год



Наименование	Количество объектов	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика
Строительство					
ФАП	60	28	32	53	+12
Капитальный ремонт					
Участковых больниц	3	2	1	85	+6
Врачебных амбулаторий	13	5	8	99	+5
Существующих ФАП	252	26	226	96	+9
ФАП размещенных в школах	13	5	8	82	+4
Поликлиник	3	3	0	85	+7



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность СМР (%)	
			На 04.07.14	Динамика (%)
1	Муслюмовский район, с.Мари-Буляр	ООО "Муслюмовская МСО"	40	5
2	Азнакаевский район, д.Мяндей	ООО «PCO»	44	2
3	г. Казань, с.Кадышево	Транстрой	44	1
4	Дрожжановский район, с.Новое Ильмово	ООО "Энки Групп"	46	4
5	Чистопольский район, с.Кутлушкино	ООО "Римарк"	46	6
6	Тюлячинский район, д.Нижние Савруши	ООО "Строй"	48	2
7	Спасский район, с.Иж-Борискино	ООО «Стройдорсервис»	49	4
8	Лениногорский район, с.Шугурово	ООО "ЛИС"	50	5
9	Тукаевский район, д.Биюрган	ООО "Евростиль"	50	5
10	г.Наб.Челны, ж.р. "Замелекесье"	ОАО "Камгэсгражданстрой"	50	4
11	Атнинский район, с.Кубян	ООО Атнинское МСО"	51	3
12	Ютазинский район, с.Малые Уруссу	ООО "Юлдыз"	52	3
13	Апастовский район, д.Азбаба	ООО СК "Свияжный"	53	6
14	Сабинский район, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	53	20
15	Сармановский район, д.Сулы-Саклово	ООО "Камстройфон"	53	8



Программа «Сельские клубы» 2014 года

54

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 04.07.14	Динамика (%)
16	Бавлинский район, с.Николашкино	ООО «Юлдыз»	55	8
17	Тетюшский район, с.Большое Шемякино	ООО «ПМК-6»	56	7
18	Черемшанский район, с.Казанка	ООО "Строитель"	56	10
19	Елабужский район, с.Яковлево	Стройинвес	57	7
20	Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек	ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»	58	9
21	Балтасинский район, д.Нижняя Кня	ООО «Сельхозтехника»	60	5
22	Бугульминский район, п.Березовка	ООО "БП" СМП-189"	60	8
23	Зеленодольский район, с.Большие Яки	ООО "Ремстройсервис"	60	20
24	Кукморский район, с.Большой Кукмор	ООО «Техстрой»;	60	4
25	Аксубаевский район, д.Караса	ООО "Максад"	61	5
26	Черемшанский район, с.Старое Серезкино	ООО «Строймастер»	61	6
27	Кайбицкий район, с.Старое Тябердино	ООО "Альтаир-1"	62	6
28	Менделеевский район, с.Камаево	ООО "Камспецстрой"	62	3
29	Мензелинский район, д.Новый Мелькен	ООО «Лига»	63	4
30	г. Казань, с.Красная Горка	ТПП Радуга	66	20
31	Новошешминский район, пос.совхоза "Красный Октябрь"	ООО «Строитель»	69	11



Программа «Сельские клубы» 2014 года

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 04.07.14	Динамика (%)
32	Алексеевский район, н.п.Сахаровка	ООО "Жилстройсервис"	70	11
33	Актанышский район, с.Тюково	ООО «ПМК-4»	71	9
34	Мамадышский район, с.Нижние Яки	ЗАО «Мамадышстрой»	73	6
35	Алькеевский район, с.Юхмачи	ООО "Строитель и К"	74	16
36	Альметьевский район, с.Чупаево	ООО "Основа С"	77	9
37	Заинский район, с.Сармабаш	ООО "Основа С"	77	2
38	Агрызский район, с.Пелемеш	ООО СК "СтройГрад	78	10
39	Нижнекамский район, с.Прости	ООО "Технология"	78	5
40	Верхнеуслонский район, с.Кильдеево	ООО «БарсЭлитСтрой»	90	5
41	Высокогорский район, пос.ж.- д.разъезда Куркачи	ООО «БарсЭлитСтрой»	93	6
42	Камско-Устьинский район, д.Баргузино	ООО «СФ «ВИКА»	93	8
43	Нурлатский район, д.Светлое Озеро	ООО «Перспектива»	100	14



Программа «Сельские клубы» 2014 года

Торжественное открытие состоялась 01.07.2014



Нурлатский район, д.Светлое Озеро

Подрядчик: ООО «Перспектива»



Универсальные спортивные площадки 2013г.

План, шт.	Завершены СМР, шт.	Введены актом, шт.	В работе, шт.	Лимит, млн.р.	Оплачено, млн.р.	Принято КС, млн.р.
156	125	76	31	300,0	176,0	194,0

МО, завершившие программу

Агрызский	Дрожжановский	Муслюмовский
Алексеевский	Заинский	Нижнекамский
Алькеевский	Зеленодольский	Новошешминский
Альметьевский	Кайбицкий	Нурлатский
Апастовский	Камско-Устьинский	Пестречинский
Балтасинский	Кукморский	Рыбно-Слободский
Бугульминский	Лаишевский	Сармановский
Буинский	Мамадышский	Спасский
Верхне-Услонский	Менделеевск	Тукаевский
Высокогорский	Мензелинск	Черемшанский
г.Наб. Челны		



Универсальные спортивные площадки 2014 год

58

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 04.07.2014г. %	Динамика	Примечание
1	Пестречинский	3	8,3	7,7	2 площадки – 10% , 1 площадка – 5%
2	Арский	6	10,3	5	1 площадка- 25%, 3 площадки – 8%, 2 площадки – 7%
3	Атнинский	2	12	7	2 площадки – 6%
4	г.Наб.Челны	11	15	10,3	11 площадок – 15%
5	Муслюмовский	3	16,6	11,6	1 площадка – 20%, 2 площадки – 15%
6	Мензелинск	3	16,6	1,6	1 площадка – 20%, 2 площадки - 15%
7	К.-Устьинский	3	17	16,4	1 площадка – 30%, 1 площадка– 16% , 1 площадка – 30%
8	Алексеевский	3	19,6	5,6	2 площадки-26%, 1 площадка – 7%
9	Нурлатский	3	20	3	3 площадки – 20%
10	Актанышский	2	20	7	1 площадка – 25%, 1 площадка- 15%
11	Агрызский	3	20,6	15,6	1 площадка – 30%, 1 площадка – 25%, 1 площадка - 7
12	Аксубаевский	3	21,3	6	1 площадка –26%, 2 площадки – 19%



Универсальные спортивные площадки 2014 год

59

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 04.07.2014г. %	Динамика	Примечание
13	Р.-Слободский	3	22,3	7	1 площадка –31%, 1 площадка –27%, 1 площадка- 9%
14	Заинский	4	23	8	2 площадки - 32%, 2 площадки – 30%
15	Азнакаевский	6	24,8	4,3	1 площадка - 35%, 1 площадка - 31%, 1 площадка – 26%, 2 площадки– 21%, 1 площадка -16%
16	Альметьевский	5	25,2	16,4	1 площадка-31%, 2 площадки – 25%, 2 площадки – 23%
17	Балтасинский	2	26	13,5	1 площадка - 40%, 1 площадка – 12%
18	Ютазинский	3	26	5	1 площадка – 32%, 1 площадка – 25%, 1 площадка – 21%
19	Дрожжановский	5	27,2	20,2	1 площадка – 36%, 4 площадки – 25%
20	Чистопольский	3	27,3	6,3	1 площадка – 35%, 1 площадка - 25%, 1 площадка – 22%
21	Тетюшский	2	27,5	26,5	1 площадка – 30%, 1 площадка – 25%
22	Кукморский	5	28,6	11,2	2 площадки – 35%, 2 площадки – 25%, 1 площадка– 23%
23	Апастовский	3	30	5	3 площадки – 30%



Универсальные спортивные площадки 2014 год

60

№	25МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 04.07.2014г. %	Динамика	Примечание
24	Тукаевский	3	30	5	3 площадки – 30%
25	Нижнекамский	3	30,3	10	1 площадка -31%, 2 площадки -30%
26	г.Казань	12	30,9	15,7	2 площадки – 86%, 1 площадка – 55%, 1 площадка – 43%, 2 площадки – 40%, 1 площадка - 28%, 3 площадки – 18%, 2 площадки – 9%
27	Буинский	3	31,3	4,7	1 площадка – 39%, 1 площадка – 32%, 1 площадка – 23%
28	Спасский	3	31,6	15	1 площадка – 45%, 2 площадки – 25%
29	Мамадышский	3	33	3	2 площадки – 40%, 1 площадка- 19%
30	Елабужский	3	35	7,4	1 площадка – 60%, 1 площадка – 25%, 1 площадка – 20%
31	Новошешминский	3	35	11,7	3 площадки – 35%
32	Кайбицкий	2	38	8	2 площадки - 38%
33	Сармановский	2	38	1	2 площадки - 38%
34	Верхнеуслонский	3	38,3	5	1 площадка – 45%, 2 площадки – 35%



Универсальные спортивные площадки

2014 год

61

№	МО РТ	Кол-во площадок	Общая готовность на 04.07.2014г. %	Динамика	Примечание
35	Лаишевский	3	39,3	19,3	1 площадка – 80%, 1 площадка – 20%, 1 площадка – 18%
36	Высокогорский	3	40	33,4	2 площадки - 50%, 1 площадка – 20%
37	Лениногорский	4	44,2	20	1 площадка – 50%, 2 площадки - 45%, 1 площадка - 37%
38	Черемшанский	2	45	10	2 площадки – 45%
39	Бугульминский	4	45,7	15,7	1 площадка -58%, 2 площадки – 45%, 1 площадки - 35%
40	Бавлинский	3	56,6	46,3	1 площадка -80%, 1 площадка – 50%, 1 площадка – 40%
41	Тюлячинский	3	60,6	32,6	2 площадки – 61%, 1 площадка – 60%
42	Алькеевский	3	62,6	44,6	2 площадки – 80%, 1 площадка - 28%
43	Сабинский	3	63,3	57,7	1 площадка – 70%, 2 площадки – 60%
44	Зеленодольский	6	67,5	44,4	3 площадки – 75%, 3 площадки -60%
45	Менделеевский	3	78,3	47,7	1 площадка – 95%, 2 площадки –70%
