



Программы, рассматриваемые на 1 неделе

1

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах




Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
2013	75	33	42
2014	59	22	37
	↓ 21%	↓ 33%	↓ 12%



Причины несчастных случаев

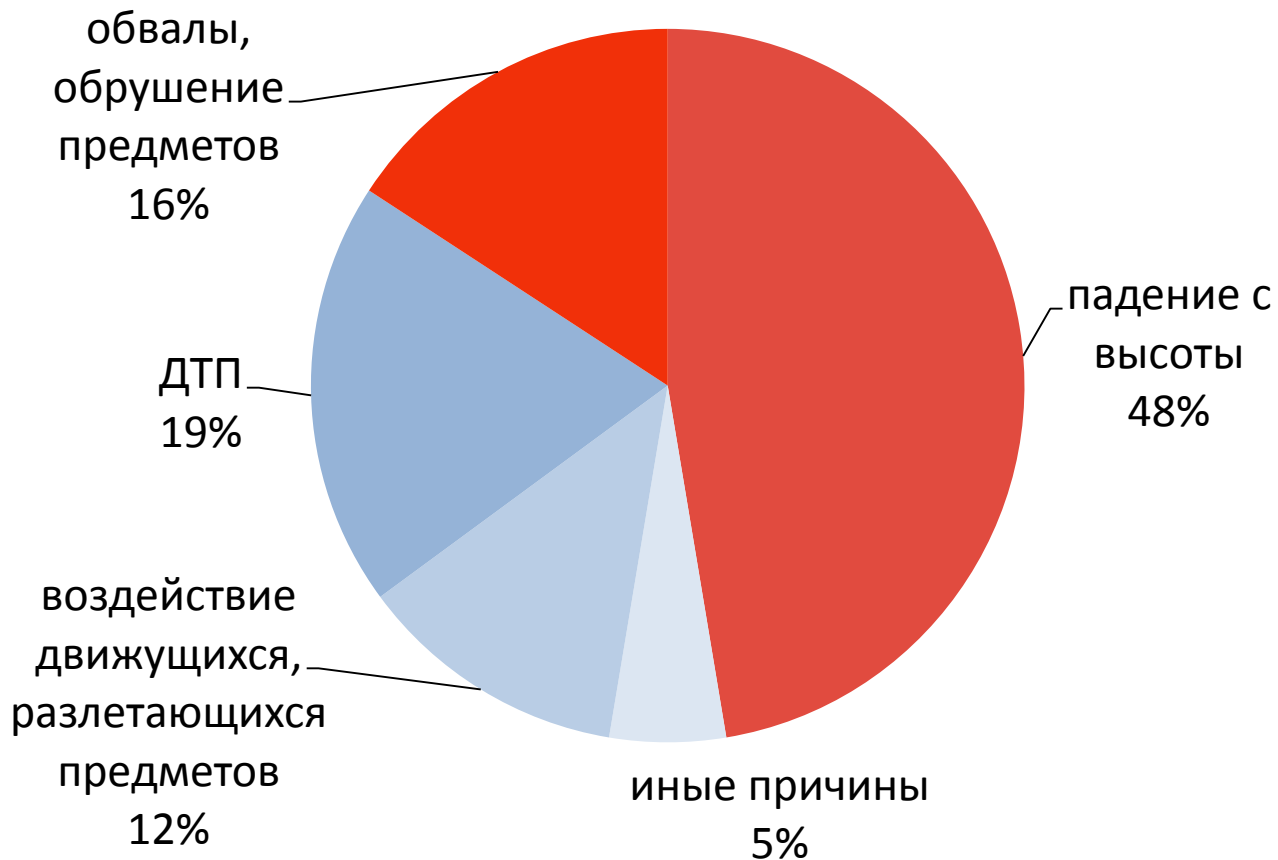

 - падение с высоты; обвалы и обрушение предметов (64%)



Отсутствует временное ограждение балконов

Жилой комплекс , г. Казань, ул. Павлюхина

Заказчик – ООО «Фон-Ривьера». Подрядчик – ООО «Казань»

Выдано предписание об устранении нарушений



Леса не имеют сплошных настилов

Спальный корпус санатория «Бакирово», Лениногорский район
Заказчик – ЛПУП «Бакирово». Подрядчик – ООО «КазаньСтройСимвол»

Составлен протокол об административном правонарушении



Леса установлены на случайные предметы

Усадский спиртзавод, Высокогорский район

Заказчик – ООО «Татспиртпром». Подрядчик – ООО «АлеКоСтрой»

Составлен протокол об административном правонарушении



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

7

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 029	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	559	21 188,0
Взыскано всего	315	14 093,0
Не истек срок оплаты	66	4 195,0
Направлено в службу судебных приставов	36	1 840,0
Обжалуются в суде	12	960,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 103
- с выездом на объекты строительства	320
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	915
Выдано предписаний	85
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	641
Прекращено действие Свидетельств	189



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 460	124	1 336	8	49 740,47	4 332,06	45 408,41	9
3	Зеленодольский	3 019	358	2 661	12	120 785,26	11 653,32	109 131,94	10
4	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
5	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
6	Азнакаевский	256	37	219	14	13 098,60	1 900,30	11 198,30	15
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Елабужский	101	29	72	29	3 072,15	770,10	2 302,05	25
9	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
10	Кукморский	426	132	294	31	13 182,90	4 109,10	9 073,80	31
11	Агрызский	156	51	105	33	6 089,30	2 140,50	3 948,80	35
12	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
13	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
14	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
15	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
16	Тетюшский	45	17	28	38	1 196,90	476,30	720,60	40



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	115	117	50	7 919,94	5 000,80	2 919,14	63
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Высокогорский	288	167	121	58	9 303,20	5 405,20	3 898,00	58
21	Ютазинский	134	79	55	59	4 908,30	2 597,25	2 311,05	53
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	Алексеевский	45	29	16	64	1 500,90	1 182,10	318,80	79
24	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Сабинский	23	20	3	87	1 073,51	985,61	87,90	92
29	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
30	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
31	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
32	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
33	Дрожжановский	6	6	0	100	201,90	202,20	-0,30	100
34	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
35	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
36	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Рекомендации

12

по выкупу у собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенным в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Письма отправлены **4 декабря** в адрес Глав и руководителей РИКов
№01-09-22-167, №01-09-22-255

1. МО **провести инвентаризацию направленных требований** о сносе и реконструкции дома на сегодняшний день. Поскольку МО должны были направить такое требование в октябре 2013г.
2. МО направляет **предложение** в письменной форме каждому собственнику о выкупе жилого помещения по выкупной цене в размере **11 022 руб. за 1 кв.м.**, которая должна подтверждаться отметкой о получении собственником данного предложения.
3. Если собственник жилого помещения **согласен** на предлагаемые условия, то между ним и МО **заключается соглашение о выкупе** жилого помещения.
4. Если собственник жилого помещения **не согласен** с условиями выкупа, то МО обращается **в суд с исковым заявлением** к собственнику об изъятии жилого помещения (и земельного участка).
5. При наличии **спора о размере выкупной цены** изымаемого жилого помещения МО заявляет в суде ходатайство о **назначении экспертизы** по определению рыночной **стоимости** жилого помещения (целесообразно проведение оценки РГУП «Бюро технической инвентаризации»).
6. После получения результатов экспертизы судом выносится решение.



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		258	148	0
1	Пестречинский	40	0	0
2	К-Устьинский	16	0	0
3	Нижекамский	13	0	0
4	Алексеевский	1	0	0
5	Агрызский	1	0	0
6	Кукморский	21	4	0
7	Заинский	9	5	0
8	Арский	45	30	0
9	Актанышский	25	22	0



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		258	148	0
10	Алькеевский	1	1	0
11	Дрожжановский	1	1	0
12	Зеленодольский	1	1	0
13	Елабужский	2	2	0
14	Сабинский	2	2	0
15	Апастовский	4	4	0
16	Тукаевский	10	10	0
17	Балтасинский	15	15	0
18	Лаишевский	18	18	0
19	Буинский	33	33	0

Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам МСАЖКХ в 2014г

№	МО	Лимит, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс. рублей	%
ГИСУ (программа детские сады)				
1	Казань	3 539 659,05	3 250 283,00	91,82
2	Алексеевский	156 138,15	148 079,64	94,84
3	Лаишевский	295 758,05	290 733,09	98,30
4	Чистопольский	202 777,69	200 818,35	99,03
ГЖФ (Социальная ипотека)				
1	Елабужский	559 748	523 401	93,5
2	г.Казань	2 098 224	2 060 600	98,2
3	г.Н.Челны	1 472 342	1 449 297	98,4
4	Спасский	80 635	79 564	98,7
5	Арский	238 529	235 816	98,9
6	Верхний Услон	28 350	28 237	99,6
7	Альметьевский	1 661 069	1 659 887	99,9
Фонд газификации - все 100%				



Программа детских садов 2014

16

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
1	г.Казань, ул.Крутая	76,2
2	Г.Казань, М.Клыки	80,0
3	г.Казань, ул. Чапаева-Максимова	81,4
4	г.Казань, ул. Чэчэк	81,5
5	г.Казань, жм. Вознесенский	84,2
6	г.Казань, ул. Тыныч	85,4
7	г.Казань, ул. Симонова	90,9
8	Г.Казань, Мавлют-Сыртланова	92,9
9	г.Казань, ул. Х.Такташа	93,0
10	п.г.т. Алексеевское	94,8
11	Г.Казань, Минская	95,7
12	Г.Казань, Зорге-Габишева	95,9
13	г.Казань, стр. №5-12, мкр. М5	98,0
14	Лаишевский, с. Усады	98,3
15	г.Казань, ул. 2-я Юго-Западная	98,6
16	г.Казань, пр. Победы-Зорге	98,8
17	Чистопольский, г. Чистополь	99,0

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
18	г.Казань, ул. Чкалова	100
19	г.Казань, ул. Четаева	100
20	г.Казань, Гор.шоссе	100
21	г.Казань, п.Кадышево	100
22	г.Казань, жм. Залесный	100
23	Сабинский, п.г.т. Бог. Сабы	100
24	Кукморский, п.г.т. Кукмор, ул. Гафиатуллина	100
25	г.Елабуга, мкр. Танайка	100
26	г.Казань, ул. Роторная	100
27	г.Казань, ул. Гаврилова	100
28	г.Казань, ул. Ноксинский спуск (ул. Ч.Айтматова)	100
29	К.-Устьинский, п.г.т. Кам-Устье	100
30	Нижекамский, г.Нижекамск, мкр.45	100
31	Бавлинский, Кзыл Яр	100
32	Высокогорский, д. Ямашурма	100
33	г.Казань, ул. Ползунова	100
34	Менделеевский, с. Брюшли	100



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
35	Балтасинский, мкр. Западный	100
36	г. Наб. Челны, жр. Прибрежный	100
37	Арский, г. Арск	100
38	г. Казань, ул. Батыршина	100
39	Аксубаевский, пгт. Аксубаево	100
40	г. Казань, пос. Отары	100
41	с. Высокая Гора Высокогорского	100
42	Мамадышский, г. Мамадыш	100
43	Пестречинский, с. Шали	100
44	Г. Зеленодольск, мкр. Мирный	100

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
45	г. Казань, М5-А, стр. №5а-9	100
46	г. Казань, ж. м. Петровский	100
47	Нурлатский, с. Бурметьево	100
48	К. Устьинский, с. Теньки	100
49	Мензелинский, Садак	100
50	Тетюшский, мкр. Людоговка	100
51	Кукморский, д. Аш-Бузи	100
52	Кукморский, с. Бол. Сардек	100
53	г. Н. Челны, Замелекесье	100
54	г. Казань, ул. Амир.-Четаева	100
55	Лаишевский, с. Столбище	100
56	г. Наб. Челны, пос. ЗЯБ	100



Реализация программы жилищного строительства 2014 года

№	МО РТ	Население, чел.	Общий объем введённого жилья, кв.м.	Ввод жилья на 1 чел., кв.м.
	Итого по РТ	3 838 230	2 411 064	0,628
1	Пестречинский	30 233	90 483	2,993
2	Лаишевский	37 999	72 371	1,905
3	Тукаевский	38 045	58 670	1,542
4	Высокогорский	45 174	46 837	1,037
5	В-Услонский	16 619	14 279	0,859
6	Елабужский	83 698	69 240	0,827
7	Зеленодольский	161 804	130 010	0,804
8	Альметьевский	201 423	155 163	0,770
9	г.Казань	1 190 850	800 994	0,673
10	Агрызский	36 244	23 326	0,644



МО, не выполнившие программу жилищного строительства 2014 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	2 411 064	100,5	-
1	Атнинский	6 000	3 974	66,2	2 026
2	Чистопольский	32 500	24 581	75,6	7 919
3	Нижнекамский	130 000	100 085	77,0	29 915
4	Нурлатский	23 000	21 024	91,4	1 976
5	Бугульминский	40 000	37 540	93,9	2 460
6	г.Казань	850 000	800 994	94,2	49 006
7	г.Наб.Челны	340 000	327 822	96,4	12 178

Программы 2015 года 1-ая неделя (строительство)

№	программа	РКМ	конкурс	контракт
1	ФАПы, ПАО капремонт оснащение	+	+	+
			+	+
			+	12.01.2015
			+	16.01.2015
2	Дома для участковых	+	+	+
3	Сельские клубы	+	+	16.01.2015
4	Детские сады (строительство)	+	+	30.01.2015
5	Спортивные площадки	+	Внесение изм. в РКМ с 31.12.2014 на согласовании)	
6	Аварийное жилье	программы 2013-2015		
7	Социальная ипотека	Решение попечительского совета		
8	Арендное жилье	Решение попечительского совета		
9	Жилье для детей - сирот	Список Минобразования		
10	Жилье для ветеранов ВОВ	363 ветерана		
11	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	38 семей		
12	Обеспечение жильем молодых семей	Лимит РФ. 2 квартал 2015		
13	Инвестиционное многоэтажное жилье			
14	Малоэтажное жилое строительство			
15	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ	Лимит РФ. 2 квартал 2015		



Программа жилищного строительства 2015 года

21

ТЫС.КВ.М.

План	Социальная ипотека	МКД инвестиционное	Малоэтажное строительство
2 400,0	420,9	897,8	1 081,3



Программа ГЖФ РТ 2015 года

План		
Количество домов	Площадь, тыс.кв.м.	Количество квартир
147	420,9	7 027



Дома по программе ГЖФ РТ в 2015 году, готовые к сдаче в январе

МО РТ, Наименование объекта	Общая площадь, кв.м.	Стадия строительства
г. Арск 6 кв. ж/д по ул. Победы, 62	269,5	Завершен строительством
г. Елабуга 156 кв. ж/д поз. 17 мкр. 4-5	7 618,5	Завершен строительством. Выдано заключение ИГСН РТ
г. Казань 44 кв. ж/д по ул. Журналистов	1 866,5	Завершен строительством. Выдано заключение ИГСН РТ
г. Лаишево 16 кв. ж/д поз. 8 по ул. Сайдашева-Юбилейная	731,4	Завершен строительством
г. Мензелинск 1 кв. ж/д № 1 по ул. Дружбы Народов	73,8	Завершен строительством
г. Мензелинск 1 кв. ж/д № 7 по ул. Интернационалистов	60	Завершен строительством
г. Нижнекамск 36 кв. ж/д № 6 в мкр. 29Б	2 736,5	Завершен строительством. Выдано заключение ИГСН РТ
г. Нижнекамск 36 кв. ж/д № 9 в мкр. 29Б	2 736,5	Завершен строительством. Выдано заключение ИГСН РТ
ИТОГО:	16 092,7	



Арендное жилье 2015 года

План		
Количество домов	Площадь, тыс.кв.м.	Количество квартир
16	46,8	789



Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ в 2015 году

План	Лимит
363 чел.	427 207 900 руб.





Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в **2014, 2015** годах

26

	2014 год	2015 год	
Предусмотрено средств	317,14	356,42	млн.руб.
в том числе:			
средств бюджета РТ	233,73	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	309 +0	X	помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами	309 +126	X	договоров



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на **2014, 2015** годы,

27

	2014	2015	
в Сводный список включено	824	800	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	128,101	млн. руб.
Оформлено	37		сертификатов
Реализовано	37 100%		сертификатов



Строительство жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015г.

28

Количество домов		
Всего по РТ	Бюджет РТ	Бюджет МО
38	20	18



Программа детских садов 2015

29

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	0	0
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	0	0
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	0	0



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы		
			Подготовит работы	Фундамент	Кладка стен
1	Агрызский, с. Шаршада	50			
2	Азнакаевский, г. Азнакаево	50			
3	Актанышский, с. Актаныш	140			
4	Алексеевский, с. Лебяжье	50			
5	Алькеевский, с. Базарные Матаки	80			
6	Альметьевский, г. Альметьевск	260			
7	Арский, д. Мендюш	50			
8	Арский, пос. Урняк	50			
9	Атнинский, с. Кошар	50			
10	Бавлинский, г. Бавлы	220			
11	Балтасинский, с. Ципья	120			
12	Буинский, г. Буинск	140			
13	Бугульминский, г. Бугульма	140			
14	Верхнеуслонский, с. Верхний Услон	120			
15	Верхнеуслонский, с.Тат. Бурнашево	50			
16	Высокогорский, ст. Высокая Гора	220			



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы		
			Подготовит работы	Фундамент	Кладка стен
17	Высокогорский, пос. Березовка	80			
18	Елабужский, г. Елабуга	240			
19	Заинский, г. Заинск	140			
20	Зеленодольский, г. Зеленодольск	260			
21	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	50			
22	К-Устьинский, п.г.т. Кубыш. Затон	50			
23	Кукморский, д. Туембаш	50			
24	Кукморский, пгт Кукмор	260			
25	Лаишевский, с. Сокуры	140			
26	Лаишевский, с. Большие Кабаны	140			
27	Лаишевский, г. Лаишево	140			
28	Лениногорский, с. Тимяшево	120			
29	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	220			
30	Менделеевский, с. Ижевка	80			
31	Муслюмовский, с. Муслюмово	140			
32	Нижнекамский, г. Нижнекамск, мкр. 31	260			



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы		
			Подготовит работы	Фундамент	Кладка стен
33	Нижнекамский, с. Городище	50			
34	Нижнекамский, с. Ташлык	80			
35	Новошешминский, с. Новошешминск	80			
36	Нурлатский, г. Нурлат	260			
37	Пестречинский, с. Пестрецы	120			
38	Рыбно-Слободский, п.г.т. ыб.Слобода	80			
39	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	80			
40	Сармановский, с. Сарманово	120			
41	Тетюшский, с. Урюм	50			
42	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	80			
43	Тюлячинский, д. Шадки	50			
44	Черемшанский, с. Ульяновка	50			
45	Черемшанский, с. Черемшан	80			
46	Чистопольский, г.Чистополь	140			



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы		
			Подготовит работы	Фундамент	Кладка стен
47	Ютазинский, пос. Уруссу	80			
48	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	240			
49	г. Н.Челны, Сармановский тракт	240			
50	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	240			
51	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	240			
52	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек" ул. Янтарная	240			
53	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	240			
54	г. Казань, п. Кояшлы	80			
55	г. Казань, ул. Фермское шоссе	140			
56	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	140			
57	г. Казань, ул. Павлюхина	140			
58	г. Казань, ул. Габишева	140			
59	г. Казань, ул. Ак. Павлова-Молодежная	80			
60	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	120			
61	г. Казань, ул. Тэцевская	220			
62	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар.10	260			



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы		
			Подготовит работы	Фундамент	Кладка стен
63	г. Казань, ул. Ю.Фучика	220			
64	г. Казань, п. Чебакса	120			
65	г. Казань, п. Константиновна	80			
66	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	260			
67	г. Казань, мкр. М-14	260			
68	г. Казань, ж.к. "Светлая долина»	340			
69	г. Казань, ул. Халезова	80			
70	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар. 11	260			
71	г. Казань, п. Сосновка	140			
72	г. Казань, ул. Р.Зорге	50			
73	г. Казань, ул. Гвардейская	80			



Программа «Сельские клубы» 2015

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы		
			Подготов. работы	Фундамент	Кладка стен
1	Агрызский, с.Ямурзино	300			
2	Аксубаевский, с.Ст. Ильдеряково	200			
3	Актанышский, с.Атясево	200			
4	Алексеевский, с.Ялкын	200			
5	Алькеевский, с.Ниж. Колчурино	100			
6	Альметьевский, с.Калейкино	300			
7	Апастовский, с.Кзыл-Тау	200			
8	Арский, с.Старый Яваш	100			
9	Атнинский, с.Кошар	200			
10	Бавлинский, с.Хагсверкино	100			
11	Балтасинский, с.Тюнтерь	200			
12	Бугульминский, с.Соколка	200			
13	Верх.-Услонский, с.Майдан	100			
14	Высокогорский, с.Айбаш	200			
15	Дрожжановский, с.Чуваш. Бездна	200			
16	Елабужский, с.Лекарево	100			
17	Заинский, с.Старый Токмак	100			



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы		
			Подготов. работы	Фундамент	Кладка стен
18	Зеленодольский, пгт. Васильево	300			
19	Кайбицкий, с.Надеждино	100			
20	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	200			
21	Кукморский, с.Мамашир	200			
22	Лаишевский, с.Каипы	200			
23	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	300			
24	Мамадышский, пос.Мамадышский	200			
25	Менделеевский, с.Тураево	100			
26	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	100			
27	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	200			
28	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	200			
29	Новошешминский, д.Нов.Иванаево	100			
30	Нурлатский, с.Караульная Гора	100			



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы		
			Подготов. работы	Фундамент	Кладка стен
31	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	200			
32	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	350			
33	Сабинский, с.Тимершик	200			
34	Сармановский, с.Ляки	100			
35	Спасский, с.Красная Слобода	100			
36	Тетюшский, с.Чинчурино	100			
37	Тукаевский, н.п.Комсомolec	200			
38	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	100			
39	Черемшанский, д.Сосновка	100			
40	Чистопольский, с.Каргали	300			
41	Ютазинский, с.Акбаш	100			
42	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	300			
Капитальный ремонт					
43	г.Казань, ДК "Полимер"	ЦКР			



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ	Строительство ФАП	Начаты работы	
		Фунд.	Инж.сети
Агрызский	Сарсак-Омгинский		
	Иж-Бобинский		
Азнакаевский	Асеевский		
	Нижне-Стярлинский		
Аксубаевский	Сунчелеевский		
Актанышский	Чуганаковский		
Алексеевский	Куркульский		
	Ромодановский		
Алькеевский	Алпаровский		
	Средне-Алькеевский		
Альметьевски	Тихоновский		
Апастовский	Булым-Булыхчинский		
Арский	Старо-Масринский		
Атнинский	Кошарский		
Бавлинский	Крым-Сарайский		



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ	Строительство ФАП	Начаты работы	
		Фунд.	Инж.сети
Балтасинский	Соснинский		
	Нормабашский		
Бугульминский	Староисаковский		
	Подстанция		
Буинский	Адав-Тулумбаевский		
	Камбродский		
Верхнеуслонский	Русско-Бурнашевский		
	Больше-Меминский		
Высокогорский	Татарско-Айшинский		
Дрожжановский	Убейский		
Елабужский	Котловский		
	Анзирский		
Заинский	Чубуклинский		
Зеленодольский	Карашамский		
	Татарско-Танаевский		



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ	Строительство ФАП	Начаты работы	
		Фунд.	Инж.сети
Кайбицкий	Бол.Русаковский		
Камско-Устьинский	Лабышкинский		
Кукморский	Кошкинский		
Лаишевский	Кирбиский		
	Мало-Кабанский		
Лениногорский	Ст.Писмянский		
Мамадышский	п.Фермы №2		
	Ишкеевский		
Менделеевский	Татарско-Челнинский		
Мензелинский	Ново-Мазинский		
	Деуковский		
Набережные Челны	Элеваторная гора		
Нижнекамский	Смыловский		
	Тетвельский		
Новошешминский	Петропавловски й		



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ	Строительство ФАП	Начаты работы	
		Фунд.	Инж.сети
Нурлатский	Криво-Озерский		
Пестречинский	Ново-Шигалеевский		
Рыбно-Слободский	Бетьковский		
	Малоошнякский		
Сабинский	Язлы-Арташский		
	Нижнешитцинский		
Сармановский	Ст.Мензелябашинский		
	Старокаширский		
Спасский	Тат.-Тахталинский		
Тетюшский	Малошемянский		
Тукаевский	Круглопольский		
Тюлячинский	Тактамышский		
Черемшанский	Ульяновский		
Чистопольский	Ишалкинский		
Ютазинский	пгт.Уруссу		

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	3,95	3,98	100,76
СМР	3,95	3,98	100,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	20,56	20,56	100,00
СМР	20,56	20,56	100,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	83,11	83,11	100,00

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 119,068
Обор-е 12,08			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	1,62	1,64	101,23
СМР	1,62	1,64	100,23
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	12,62	12,67	101,23
СМР	12,62	12,67	100,23
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	14,69	14,74	100,34

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	1,42	1,43	100,70
СМР	1,42	1,43	100,70
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	15,17	15,24	100,46
СМР	15,17	15,24	100,46
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	61,17	62,00	101,35

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149		
		ПИР 2,5	СМР 72,049	Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.		
Срок завершения строительства		Февраль 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	2,23	2,24	100,45	
СМР	2,23	2,24	100,45	
Оборудование				
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	15,05	15,12	100,46	
СМР	15,05	15,12	100,46	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	60,10	60,34	100,39	

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	3,86	3,88	100,52
СМР	3,86	3,88	100,52
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	29,81	30,01	100,67
СМР	29,81	30,01	100,67
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	87,56	87,62	100,07

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик	«КамГЭСэнергоСтрой»		
Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.	86,7		
	ПИР 5,37	СМР 63,7	Обор-е 17,6
Начало строительства	Январь 2015 г.		
Срок завершения строительства	Август 2015 г.		

№ пп	Наименование	Срок		Исполнитель
		План	Факт	
1	Разработка проектно-сметной документации	10.11.14	10.11.14	ГУП ТИГП
2	Проведение гос.экспертизы ПСД	12.12.14	12.12.14	Госэкспертиза
3	Утверждение РКМ РТ по объекту	18.12.14	18.12.14	Минфин РТ
5	Проведение аукциона	05.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ
6	Заключение договора на СМР	15.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5		
		ПИР 2,05	СМР 58,65	Обор-е 79,8
Начало строительства		Июль 2014г.		
Срок завершения строительства		Июль 2015г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	4,22	4,23	100,23	
СМР	4,22	4,23	100,23	
Оборудование				
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	19,22	19,30	100,41	
СМР	19,22	19,30	100,41	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	33,32	33,36	100,12	

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		177,8 млн.руб			
		ПИР 2,0	СМР 152,4	Обор-е 12,9	Проч 10,5
Начало строительства		Декабрь 2014 г.			
Срок завершения строительства		сентябрь 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	0,5%	0,5%		100,0	
СМР	0,5%	0,5%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 09.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	0,5%	0,5%		100,0	
СМР	0,5%	0,5%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	0,5%	0,5%		100	

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 31.12.2014г.	2,25	2,27		100,8	
СМР	2,25	2,27		100,8	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 19.12.2014 г. – 31.12.2014 г.	6,75	6,78		100,4	
СМР	6,75	6,78		100,4	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2014 г.	87,25	87,27		100	
