



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Год	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
2010	86	34	52
2011	72	28	44
2012	74	36	38
2013	75	33	42
2014	57	20	37
	↓ 24%	↓ 40%	↓ 12%


Несчастные случаи по месту происшествия

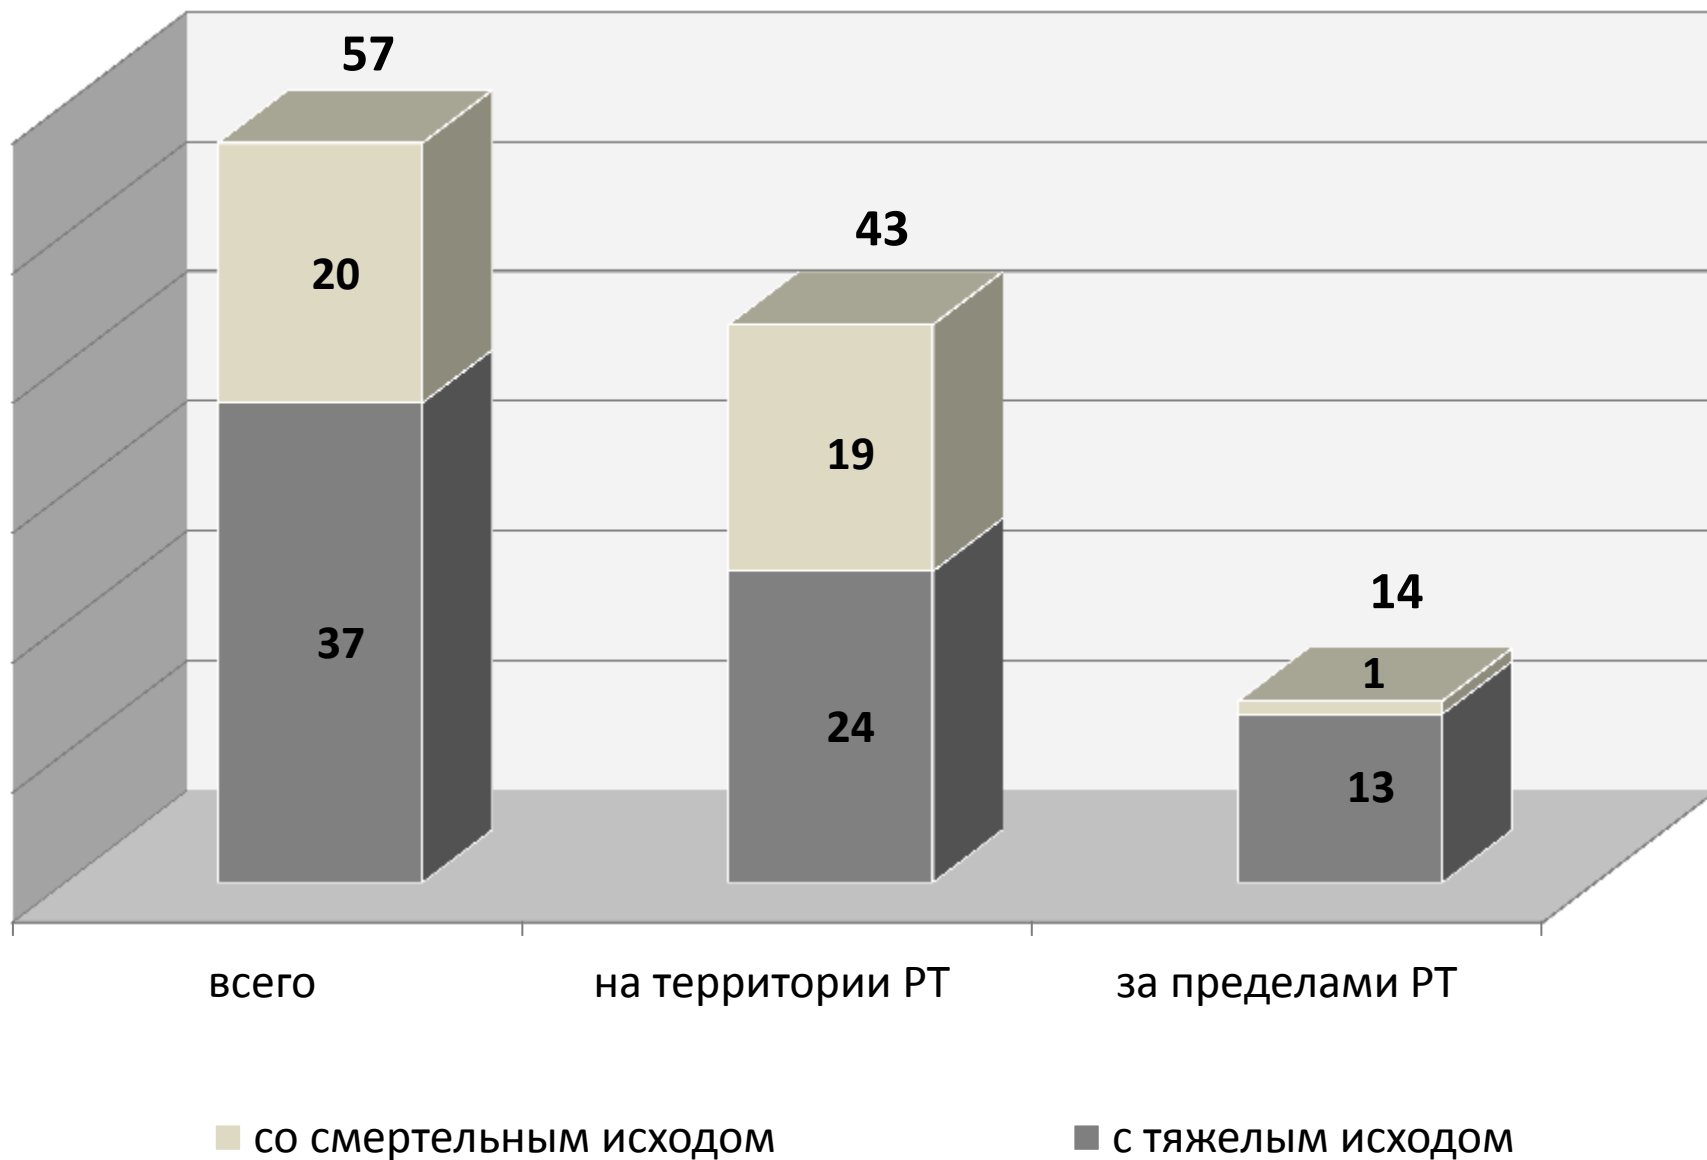


Несчастные случаи в разрезе МО РТ

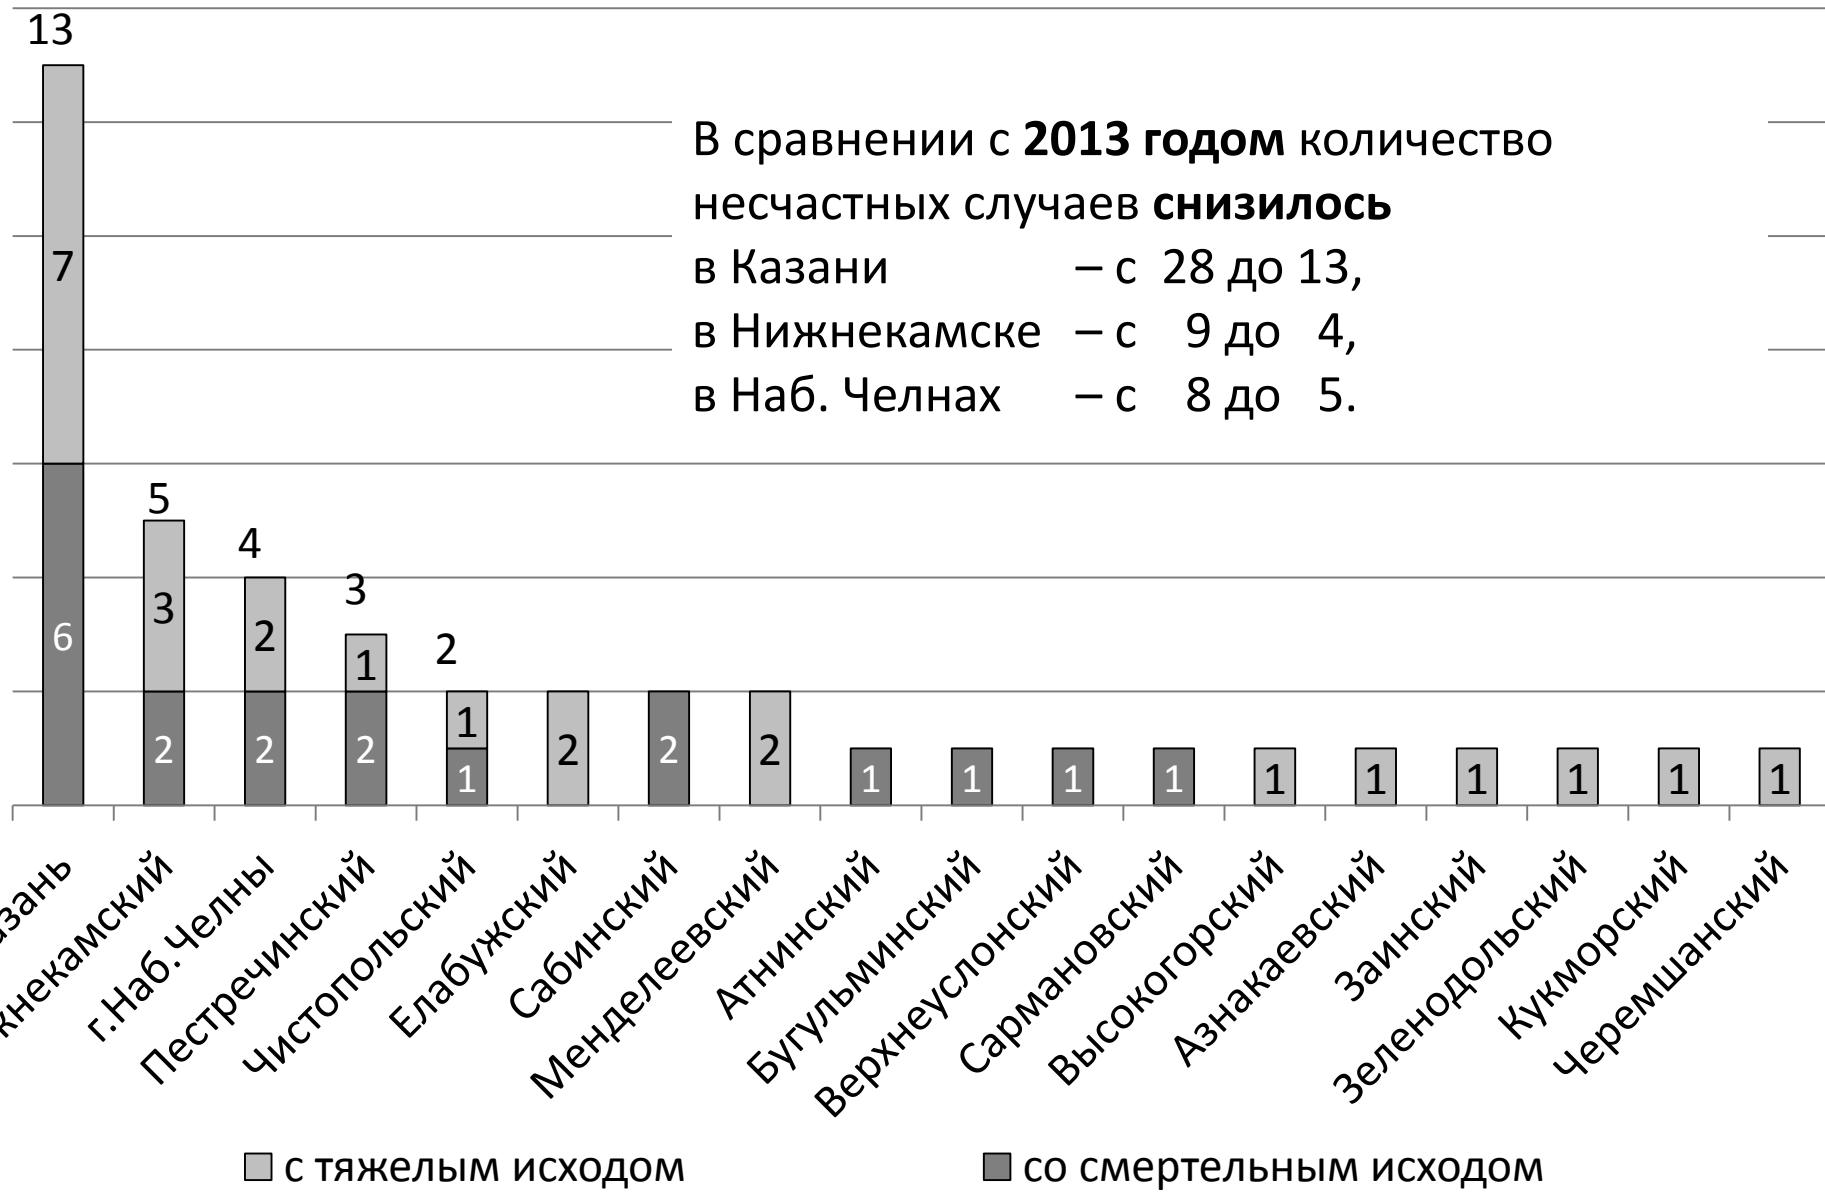

Распределение несчастных случаев по видам

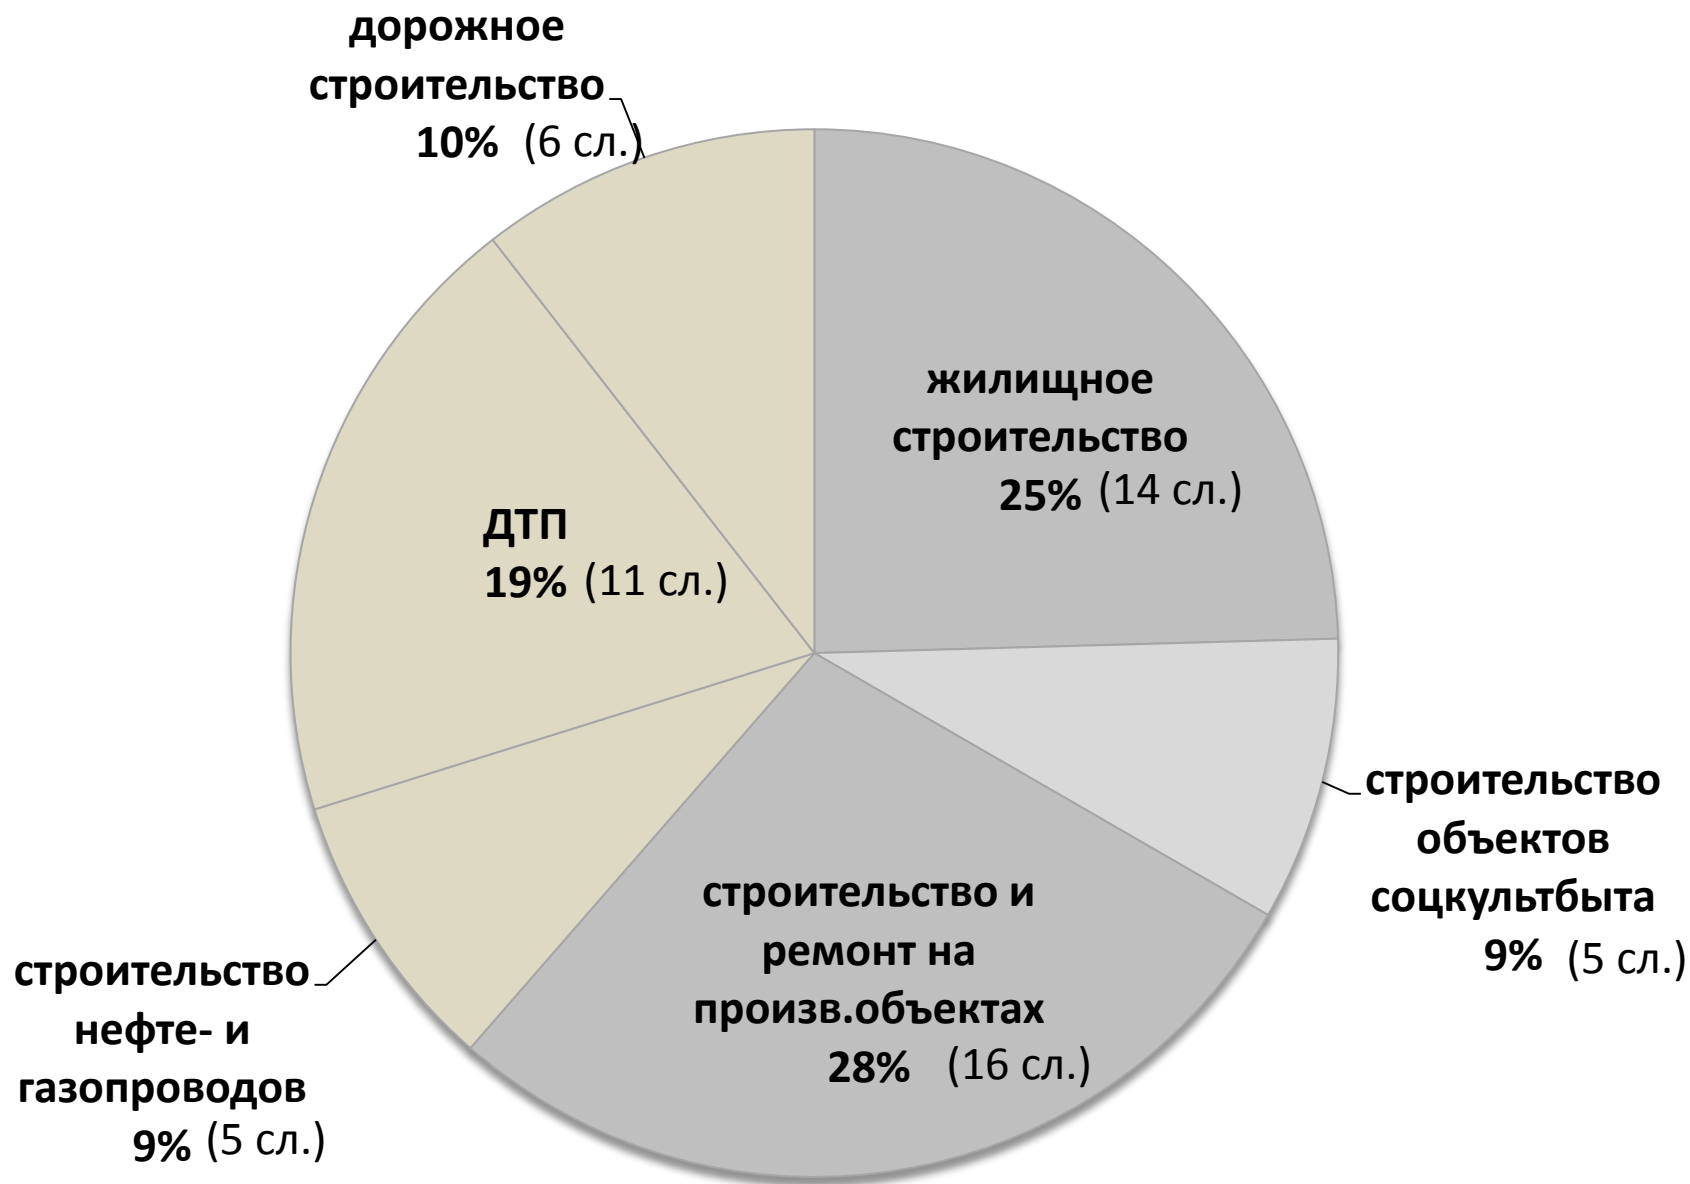

Причины несчастных случаев

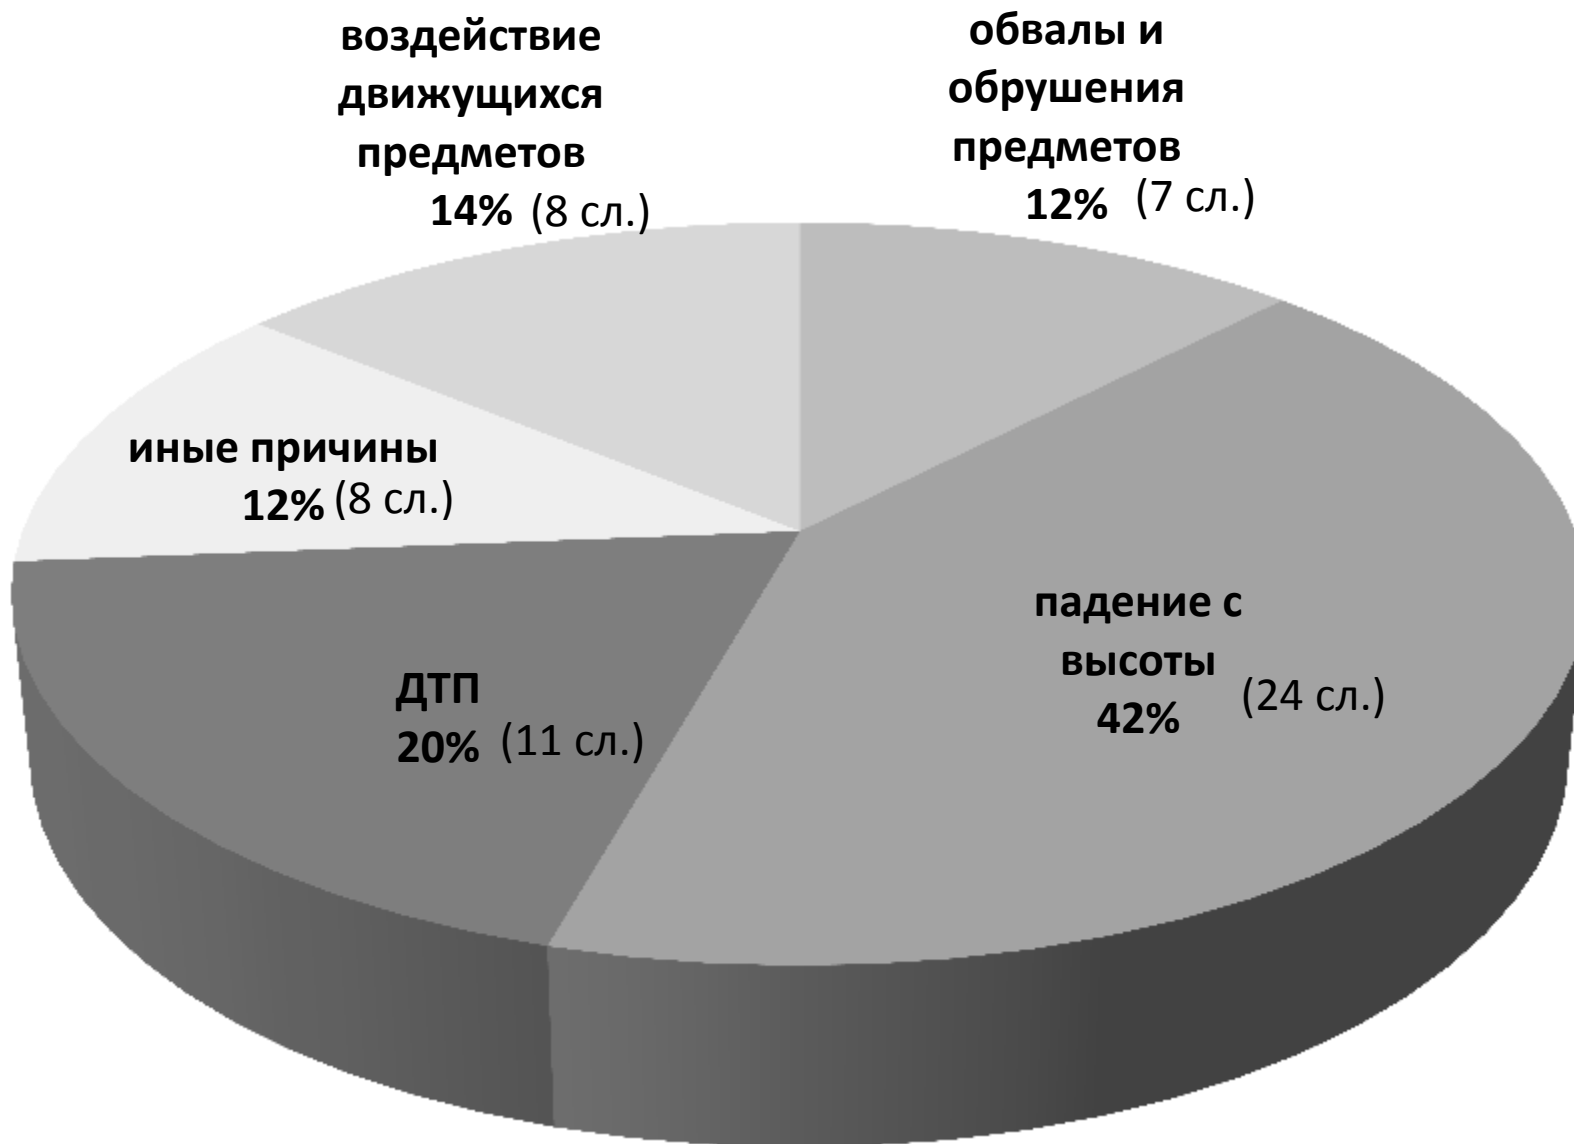

Подрядчики и заказчики объектов, где произошли несчастные случаи

№	Место происшествия, объект	Подрядчик	Заказчик
	г.Казань		
1	Ж/к на ул.Павлюхина	ООО «Лира»	ООО «НПО «Эталон»
2	Галеевская мечеть	ООО «СКД»	ГКУ «ГИСУ РТ»
3	Медучреждение по ул.Бутлерова	ООО «СО «Тойл»	КГМУ
4	Автодорога	ОАО «Татавтодор»	ГКУ «Главтатдортранс»
5	Ж/д в мкр. 6Б	ООО «ТСК «РУАЛ»	«АК БАРС Девелопмент»
6	Ж/д по ул. Четаева	ООО «Казаньстройтехника»	ООО «Маг-строй»
7	Ж/д по ул.Вербная	УС ОАО «Татэлектромонтаж»	ООО «Интеллектстрой»
8	Производственный цех ООО «Цементоторг- стройСервис»	ООО «Цементоторг- СтройСервис»	ООО «Стройинновация»
9	Д/с по ул. Роторная	ОАО «КазаньЦентрСтрой»	ГКУ «ГИСУ РТ»
10	Мкр.«Салават Купере»	ООО «Компания «Сивас»	МКУ «УКСиР ИК Казани»
11	Ж/к «Победа»	ООО «Стройтехника»	ООО «Интеллектстрой» ООО «ЖИКстрой»
12	Мкр. М14	ООО «СФ «Ак таш»	МКУ «УКСиР ИК Казани»
13	Ж/к по пр. Победы	ООО «Дикорс»	МВД РТ

Подрядчики и заказчики объектов, где произошли несчастные случаи

№	Место происшествия, объект	Подрядчик	Заказчик
	г.Набережные Челны		
1	Ж/д в мкр. «Солнечный»	ООО «Евростиль»	ООО «Риэлт К»
2	Ж/д в пос. ГЭС	ООО «СК «КамАвтоСтрой»	ООО «АПГ-Холдинг»
3	Ж/д	ООО «Вертикаль»	ООО «Вертикаль»
4	Логистический центр	ПК «Нижекамскгэсстрой»	ОАО «Булгарпиво»
	г. Нижнекамск		
1	Ж/д в мкр. 29-Б	ООО «Жилстрой»	ООО «Нижнекамскнефтехим»
2	а/д Казань-Оренбург	ОАО «Алексеевскдорстрой»	ФКУ «Волго- Вятскуправтодор»
3	Цех ОАО «ТАИФ-НК»	ОАО «Энергогентилизация»	ОАО «ТАИФ-НК»
4	ОАО «Центрмонтаж- автоматика»	ООО «Квадр»	ОАО «Центрмонтаж- автоматика»
5	Производственное здание	ООО «СУМР-2»	ЖИК г.Нижнекамска
	Чистопольский район		
1	ДТП	ООО «Инвэнт-Технострой»	Департамент строительства г.Москвы
2	ДТП	ОАО «Татэлектромонтаж»	ОАО «Мосинжпроект», г.Москва
	Сабинский		
1, 2	ДТП	ООО «Диляра-Строй»	ООО «Татмит Агро»

Подрядчики и заказчики объектов, где произошли несчастные случаи

№	Место происшествия, объект	Подрядчик	Заказчик
	Пестречинский район		
1, 2	Ж/к «Светлый»	ООО «Спецстрой»	ОАО «ДК «Антей»
3	ДТП	ОАО «Каздорстрой»	ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
	Елабужский район		
1	ДТП	ООО «Евроальянсстрой»	ГКУ «ГИСУ РТ»
2	Производственное здание	ООО «Ремонтно-строительная компания»	Kastamony Entegre
	Менделеевский район		
1	ОАО «Аммоний»	ООО «СпецТяжМонтаж»	ООО ГК «Стр-во объектов пром-ти и перевозок»
2	Насосная станция	ОАО «Татэлектромонтаж»	ОАО «Аммоний»
	Атнинский район		
1	Мост через р.Ашит	ООО «Базовый проект»	ГКУ «Главтатдортранс»
	Бугульминский район		
1	Комбикормовый завод	ООО «Ортекс»	ООО «Репродукт»
	Верхнеуслонский район		
1	Иннополис	ООО «СК «Тектикон»	ОАО «ОЭЗ «Иннополис»

Подрядчики и заказчики объектов, где произошли несчастные случаи

№	Место происшествия, объект	Подрядчик	Заказчик
	Высокогорский район		
1	ООО «Винербергер»	ОАО КСУ «Термостепс»	ООО «Винербергер Куркачи»
	Азнакаевский район		
1	Цех ООО «Татнефть-РемСервис-Транспорт»	ООО СТК «Стандарт»	ООО «Татнефть-РемСервис-Транспорт»
	Заинский район		
1	Заинская ГРЭС-Киндери	ОАО «Средневожжск-сельэлектросетьстрой»	ОАО «Сетевая компания»
	Зеленодольский район		
1	ДТП	ОАО «Каздорстрой»	ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
	Кукморский район		
1	База ДРСУ «Кукморский»	ОАО «Татавтодор»	ГКУ «Главтатдортранс»
	Черемшанский район		
1	Мост через р.Шешма	ООО «Мостовик»	ГКУ «Главтатдортранс»
	Сармановский район		
1	Петровский завод	ООО «Казаньэнергострой»	ОАО «Сетевая компания»

Подрядчики и заказчики объектов, где произошли несчастные случаи

10

№	Место происшествия, объект	Подрядчик	Заказчик
	За пределами РТ		
1	Псковская обл., цех «Транснефтемаш»	ООО «Спецстройсервис»	ОАО «Верхневолжск- нефтепровод»
2	Ставропольский край, насосная станция	ООО «Контакт-С»	ООО «Стройинновация»
3, 4	Республика Марий Эл, ДТП	ООО «Камэнергосервис»	ООО «Оптовик»
5	Амурская обл., автодорога	ООО «Брус»	ГКУ «Амуруправтодор»
6	Краснодарский край, казино	ООО «Роял Тайм Девелопмент»	ИК ООО «Роял Тайм Групп»
7	Тюменская обл., обустройство нефтяных месторождений	ОАО «Татнефтепроводстрой»	ОАО АНК «Башнефть»
8	Поезд Воркута-Н.Новгород	ОАО «Татнефтепроводстрой»	ОАО АНК «Башнефть»
9	Калужская обл., газопровод	ООО «Стройгазпроектплюс»	ООО «Газпром трансгаз Москва»
10	Самарская обл., ДТП	ООО «СК «Континент»	Ягудин Р.Р.
11	Саратовская обл., газопровод	ООО «Востокнефтеспецмонтаж»	ООО «Газпром трансгаз Саратов»
12	Самарская обл., капстрой	ООО «СМ-2»	ООО «БайТекс»
13	Тюменская обл., газопровод	ООО «Химмашмонтаж»	ООО «Ново-Уренгойский газохимический комплекс»
14	Свердловская обл., АЭС	ООО «Спецэнергомонтаж»	Корпорация «Росатом»

Информация Прокуратуры РТ о принятых мерах

Наименование	Количество, ед.
Всего возбуждено уголовных дел, в том числе за 2013-2014гг.	98 61
Закончено расследованием и направлено в суд	59



Программы 2015 года, рассматриваемые на **1 неделе**

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
5	Жилье для детей-сирот
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 640	2 386	7 254	25	356 255,49	87 633,07	268 622,42	25
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 532	129	1 403	8	52 600,47	4 521,66	48 078,81	9
3	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
4	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
5	Зеленодольский	3 019	409	2 610	14	120 785,26	13 429,50	107 355,76	11
6	Азнакаевский	256	38	218	15	13 098,60	1 947,90	11 150,70	15
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Елабужский	101	29	72	29	3 072,15	770,10	2 302,05	25
9	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
10	Кукморский	426	132	294	31	13 182,90	4 109,10	9 073,80	31
11	Агрызский	153	51	102	33	5 972,70	2 140,50	3 832,20	36
12	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
13	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
14	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
15	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
16	Тетюшский	45	17	28	38	1 196,90	476,30	720,60	40



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 640	2 386	7 254	25	356 255,49	87 633,07	268 622,42	25
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	117	115	50	7 919,94	5 089,10	2 830,84	64
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	79	55	59	4 908,30	2 597,25	2 311,05	53
21	Высокогорский	288	172	116	60	9 303,20	5 590,50	3 712,70	60
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	К.Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	31	13	70	1 464,30	1 259,60	204,70	86
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 640	2 386	7 254	25	356 255,49	87 633,07	268 622,42	25
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	0,00	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	0,00	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	0,00	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	0,00	104
37	Р.Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 января 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	94 708	3,9	2 305 292
1	Агрызский	20 000	0	0,0	20 000
2	Актанышский	17 000	0	0,0	17 000
3	Бавлинский	17 000	0	0,0	17 000
4	Балтасинский	14 000	0	0,0	14 000
5	Буинский	19 000	0	0,0	19 000
6	В-Услонский	40 000	0	0,0	40 000
7	Высокогорский	50 000	0	0,0	50 000
8	г.Казань	850 000	0	0,0	850 000
9	Дрожжановский	7 000	0	0,0	7 000
10	Зеленодольский	130 000	0	0,0	130 000
11	К-Устьинский	35 000	0	0,0	35 000
12	Менделеевский	10 000	0	0,0	10 000
13	Муслюмовский	8 000	0	0,0	8 000
14	Новошешминский	5 000	0	0,0	5 000
15	Нурлатский	26 000	0	0,0	26 000



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 января 2015 года

17

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	94 708	3,9	2 305 292
16	Р-Слободский	13 000	0	0,0	13 000
17	Спасский	8 000	0	0,0	8 000
18	Тетюшский	10 000	0	0,0	10 000
19	Тукаевский	52 000	0	0,0	52 000
20	Тюлячинский	6 500	0	0,0	6 500
21	Ютазинский	8 000	0	0,0	8 000
22	Арский	27 000	273	1,0	26 727
23	Сармановский	10 000	117	1,2	9 883
24	Сабинский	18 000	312	1,7	17 688
25	Лениногорский	30 000	654	2,2	29 346
26	Бугульминский	40 000	920	2,3	39 080
27	г.Наб.Челны	340 000	12 760	3,8	327 240
28	Атнинский	4 000	151	3,8	3 849
29	Заинский	20 000	1 008	5,0	18 992
30	Кайбицкий	4 800	285	5,9	4 515

Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 января 2015 года



№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	94 708	3,9	2 305 292
31	Черемшанский	10 000	613	6,1	9 387
32	Чистопольский	32 500	2 045	6,3	30 455
33	Нижнекамский	130 000	8 306	6,4	121 694
34	Альметьевский	155 000	10 361	6,7	144 639
35	Мамадышский	15 000	1 010	6,7	13 990
36	Азнакаевский	25 000	2 295	9,2	22 705
37	Мензелинский	16 000	1 761	11,0	14 239
38	Алькеевский	6 500	717	11,0	5 783
39	Алексеевский	14 000	1 692	12,1	12 308
40	Елабужский	45 000	7 611	16,9	37 389
41	Кукморский	10 000	2 050	20,5	7 950
42	Лаишевский	62 000	12 909	20,8	49 091
43	Аксубаевский	11 000	2 992	27,2	8 008
44	Апастовский	12 000	3 309	27,6	8 691
45	Пестречинский	42 000	20 557	48,9	21 443



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Лаишево, 24 кв. ж/д поз.8 по ул. Сайдашева-Юбилейная
подрядчик ООО «НовоСтрой»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Елабуга, 156 кв. ж/д 4-5-17
подрядчик ООО «ДомкорСтрой»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

на 16.01.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	145	8	137	62	37	38
Общая площадь (тыс.кв.м.)	420,9	9,0	411,9	103,4	108,9	199,6
Кол-во квартир	7 025	186	6 839	2 133	1 406	3 300

Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
123 кв. ж/дом ул.Айдарова Авиастроительного района г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	85	Февраль 2015
220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе Кировский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Февраль 2015
44(45) кв ул.Журналистов Советский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Январь 2015

Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
Перепрофилирование ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" по ул.Ленина, 92 в г.Бугульме	ООО «Строй Сервис»	ООО «Строй Сервис»	100	85	Июнь 2015
ж/д мкр 4-5 поз.17 с инженерными сетями г.Елабуга	ООО «Домкор»	ООО «Домкор строй»	100	100	Январь 2015
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	100 90	95 90	Июль 2015
Промышленные предприятия					
64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ "Алабуга"	ОАО «Камгэсэнерго строй»	100	75	Февраль 2015



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		11	66	2	7	2
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Арский	1	1	-	-	1
3	Бавлинский	1	13	-	1	-
4	Высокогорский	1	16	-	1	-
5	Зеленодольский	1	1	-	1	-
6	Кукморский	1	2	1	-	-
7	Лениногорский	1	8	-	1	-
8	Муслюмовский	1	6	-	1	-
9	Ютазинский	1	4	-	1	-
10	Наб. Челны	2	11	-	1	1



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
Сдаются до 9 мая 2015 года (25 квартир)					
1	Азнакаевский район 144 кв. ж.д. №9 в мкр. 9 г.Азнакаево	ООО «КСТ-2000»	ООО «КСТ-2000»	4	20.01.2015
2	Бавлинский район 30 кв. ж.д по ул.Зиновьева, д 16, г.Бавлы	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энерго- строй сервис"	1	30.04.2015
3	Кукморский район 40 кв. ж.д. по ул.Гафиатуллина, поз 3, п.г.т.Кукмор	МУП «Гарант»	ОАО "Строй сервис"	2	30.04.2014
4	Лениногорский район 24-ти кв.ж.д. ул. Садовая 8Б г.Лениногорск	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Сарет"	8	30.04.2014
5	Муслюмовский район 15 кв. ж.д. Молодежная д.3/1 с.Муслюмово	ГКУ "ГИСУ"	ЗАО "Муслю- мовская МСО"	6	30.04.2014
6	Ютазинский район 15-ти кв.ж.д. ул. Каримова, д.3 пгт Уруссу	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энерго- стройсервис"	4	30.04.2014



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

26

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
Сдаются <i>после 9 мая 2015 года (29 квартир)</i>					
1	Арский район 60 кв. ж.д. ул.Красная Слобода, д.70 г.Арск	МУ "ОКСИА"	ООО «Арское МСО»	1	30.08.2015
2	Высокогорский район 285 кв. ж.д. ул.Станционная Высокая гора	ООО "ГИПС+"	ООО "Инвест"	16	1 кв. 2016г.
3	Зеленодольский район 110 кв. ж.д. ул.Шустова г.Зеленодольск	ООО "Восход"	ООО "Восход"	1	30.07.2014
4	г.Наб.Челны 143 кв. ж/д № 21-30 ж/р "Замелекесье"	ООО "ДомКор"	ООО "Домкор строй"	2	1 кв. 2016г.
5	г.Наб.Челны 197 кв. ж/д № 21-32 ж/р "Замелекесье"	ООО "ДомКор"	ООО "Домкор строй"	9	30.06.2014



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

27

Предусмотрено средств	356,42	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ		помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами		договоров



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

в Сводный список включено	801	семья
выделено из бюджета РТ	128,101	млн. руб.
Оформлено		сертификатов
Реализовано		сертификатов



Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ПВГО ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на **2015** год

29

	ЧАЭС	Вынужденные переселенцы	Переселенцы с Крайнего Севера	
в Сводный список включено	74	177	142	семей
Контрольные цифры бюджета РФ	32,6	26,3	4,2	млн. руб.
Оформлено				Серти- фикатов
Реализовано				Серти- фикатов

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		127	38	39	50
1	Альметьевский	5	3	1	1
2	Арский	1	-	1	-
3	Бавлинский	1	-	-	1
4	Бугульминский	4	1	1	2
5	Высокогорский	2	2	-	-
6	Елабужский	8	1	4	3
7	Зеленодольский	12	6	2	4
8	Лаишевский	2	1	1	-
9	Лениногорский	3	-	1	2
10	Нижнекамский	11	1	1	9
11	Пестречинский	2	2	-	-
12	г. Наб. Челны	41	10	16	15
13	г. Казань	35	11	11	13



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

31

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 830	525	9 305



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	47 295,0	14,0	0,0	0,0
Алькеевский район, с. Салман	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Бавлинский район, с. Александровка	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Бугульминский район, с. Татарская Дымская	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Лаишевский район, д. Старая Пристань	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Лаишевский район, с. Малая Елга	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Пестречинский район, с.Тат Ходяшево	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Сабинский район, с. Измя	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Спасский район, д. Кожаевка	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Чистопольский район, с.Кубассы	2 627,5	0,0	0,0	0,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	47 295,0	14,0	0,0	0,0
Верхнеуслонский район, п. Октябрьское	2 627,5	1,0	0,0	0,0
Лениногорский район, с. Сугушла	2 627,5	8,0	0,0	0,0
Высокогорский район, д. Пановка	2 627,5	10,0	0,0	0,0
Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма	2 627,5	10,0	0,0	0,0
Сармановский район, с. Старый Кашир	2 627,5	20,0	0,0	0,0
Аксубаевский район, с. Старое Ибрайкино	2 627,5	35,0	0,0	0,0
Агрызский район, с. Кичкетан	2 627,5	45,0	0,0	0,0
Альметьевский район, мкр. "Урсала"	2 627,5	50,0	0,0	0,0
Мамадышский район, с. Рагозино	2 627,5	70,0	0,0	0,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

34



Мамадышский район, с.Рагозино
Подрядчик - ЗАО «Стройсервис»



Программа детских садов 2015

Строительство



**Лаишевский район, с.Сокуры
Подрядчик: ООО «Стройком»**



Программа детских садов 2015

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	0	0
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	0	0
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	0	0



Программа детских садов 2015

37

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
1	Агрызский, с. Шаршада	50				
2	Азнакаевский, г. Азнакаево	50				
3	Актанышский, с. Актаныш	140				
4	Алексеевский, с. Лебяжье	50				
5	Алькеевский, с. Базарные Матаки	80				
6	Альметьевский, г. Альметьевск	260				
7	Арский, д. Мендюш	50				
8	Арский, пос. Урняк	50				
9	Атнинский, с. Кошар	50				
10	Бавлинский, г. Бавлы	220				
11	Балтасинский, с. Ципья	120				
12	Буинский, г. Буинск	140				
13	Бугульминский, г. Бугульма	140				
14	Верхнеуслонский, с. Верхний Услон	120				
15	Верхнеуслонский, с.Тат. Бурнашево	50				
16	Высокогорский, ст. Высокая Гора	220				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
17	Высокогорский, пос. Березовка	80				
18	Елабужский, г. Елабуга	240				
19	Заинский, г. Заинск	140				
20	Зеленодольский, г. Зеленодольск	260				
21	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	50				
22	К-Устьинский, п.г.т. Кубыш. Затон	50				
23	Кукморский, д. Туембаш	50				
24	Кукморский, пгт Кукмор	260				
25	Лаишевский, с. Сокуры	140				
26	Лаишевский, с. Большие Кабаны	140				
27	Лаишевский, г. Лаишево	140				
28	Лениногорский, с. Тимяшево	120				
29	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	220				
30	Менделеевский, с. Ижевка	80				
31	Муслюмовский, с. Муслюмово	140				
32	Нижнекамский, г. Нижнекамск, мкр. 31	260				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
33	Нижнекамский, с. Городище	50				
34	Нижнекамский, с. Ташлык	80				
35	Новошешминский, с. Новошешминск	80				
36	Нурлатский, г. Нурлат	260				
37	Пестречинский, с. Пестрецы	120				
38	Рыбно- Слободский, п.г.т. ыб.Слобода	80				
39	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	80				
40	Сармановский, с. Сарманово	120				
41	Тетюшский, с. Урюм	50				
42	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	80				
43	Тюлячинский, д. Шадки	50				
44	Черемшанский, с. Ульяновка	50				
45	Черемшанский, с. Черемшан	80				
46	Чистопольский, г.Чистополь	140				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
47	Ютазинский, пос. Уруссу	80				
48	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	240				
49	г. Н.Челны, Сармановский тракт	240				
50	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	240				
51	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	240				
52	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек" ул. Янтарная	240				
53	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	240				
54	г. Казань, п. Кояшлы	80				
55	г. Казань, ул. Фермское шоссе	140				
56	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	140				
57	г. Казань, ул. Павлюхина	140				
58	г. Казань, ул. Габишева	140				
59	г. Казань, ул. Ак. Павлова-Молодежная	80				
60	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	120				
61	г. Казань, ул. Тэцевская	220				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начатые работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
62	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар.10	260				
63	г. Казань, ул. Ю.Фучика	220				
64	г. Казань, п. Чебакса	120				
65	г. Казань, п. Константиновна	80				
66	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	260				
67	г. Казань, мкр. М-14	260				
68	г. Казань, ж.к. "Светлая долина»	340				
69	г. Казань, ул. Халезова	80				
70	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар. 11	260				
71	г. Казань, п. Сосновка	140				
72	г. Казань, ул. Р.Зорге	50				
73	г. Казань, ул. Гвардейская	80				



Программа детских садов 2015

Капитальный ремонт-реконструкция

№	Место расположения	Начаты работы
1	Аксубаевский п.Мюд	
2	Арский г.Арск	
3	Актанышский с. Атясево	
4	Бугульминский г. Бугульма	
5	Мензелинский г.Мензелинск	
6	Менделеевский г.Менделеевск	
7	Пестречинский с.Ленино-Кокушкино	
8	Тетюшский с Большие Атряси	

№	Место расположения	Начаты работы
9	Тетюшский Тоншерма	
10	Черемшанский Сивашкино	
11	г.Казань ул. Годовикова, 8	
12	г.Казань ул. Толстого, 16	
13	г.Казань ул. 40 лет Октября, 22	
14	г.Казань Военный городок, 32, пос. Аракчино	
15	г.Казань ул. Агрызская, 61	
16	г.Казань ул. Жуковка, 2	



Программа детских садов 2015

43

Капитальный ремонт с открытием доп. групп

№	Место расположения	Начаты работы
1	Апастовский п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, д. 66	
2	Бавлинский МБДОУ №2, г. Бавлы	
3	Бугульминский МБДОУ "Прогрессский детский сад", пос. Прогресс	
4	Зеленодольский МБДОУ № 40, п.г.т. Васильево	
5	Заинский МБДОУ "Красная шапочка", г. Заинск	
6	Кайбицкий МБДОУ "Кушманский "Белочка", с. Кушманы	
7	Лениногорский МБДОУ "Детский сад № 26", г. Лениногорск	
8	Лениногорский МБДОУ "Детский сад №30", Лениногорск	
9	Рыбно- Слободский МБДОУ "Полянский детский сад "Радуга" п.г.т Рыбная Слобода	
10	Тукаевский МБДОУ "Тополек" с. Шильнебаш	

№	Место расположения	Начаты работы
11	г. Набережные Челны МБДОУ № 85	
12	г. Набережные Челны МБДОУ № 93	
13	г. Казань МБДОУ № 26	
14	г. Казань МАДОУ №111	
15	г. Казань МАДОУ №365	
16	г. Казань МБДОУ № 375	
17	г. Казань МАДОУ № 392	
18	г. Казань МАДОУ № 19	
19	г. Казань МАДОУ № 93	
20	г. Казань МАДОУ №129	



Программа детских садов 2015

Капитальный ремонт с открытием доп. групп

№	Место расположения	Начаты работы
21	г. Казань МАДОУ № 370	
22	г. Казань МАДОУ № 388	
23	г. Казань МАДОУ № 401	
24	г. Казань МАДОУ № 411	
25	г. Казань МАДОУ № 69	
26	г. Казань МБДОУ № 321	
27	г. Казань МБДОУ № 350	
28	г. Казань МАДОУ № 217	
29	г. Казань МАДОУ № 217	
30	г. Казань МАДОУ № 25	

№	Место расположения	Начаты работы
31	г. Казань МАДОУ № 171	
32	г. Казань МАДОУ № 298	
33	г. Казань МАДОУ № 206	
34	г. Казань МАДОУ № 224	
35	г. Казань МАДОУ № 259	
36	г. Казань МАДОУ № 284	
37	г. Казань МАДОУ № 11	
38	г. Казань МБДОУ № 76	



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство



14/01/2015 13:11

Ютазинский район, с.Акбаш
Подрядчик: ООО «Юлдыз»



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
1	Агрызский, с.Ямурзино	300				
2	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	200				
3	Актанышский, с.Атясево	200				
4	Алексеевский, с.Ялкын	200				
5	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	100				
6	Альметьевский, с.Калейкино	300				
7	Апастовский, с.Кзыл-Тау	200				
8	Арский, с.Старый Яваш	100				
9	Атнинский, с.Кошар	200				
10	Бавлинский, с.Хагсверкино	100				
11	Балтасинский, с.Тюнтерь	200				
12	Бугульминский, с.Соколка	200				
13	Верх.-Услонский, с.Майдан	100				
14	Высокогорский, с.Айбаш	200				
15	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	200				
16	Елабужский, с.Лекарево	100				
17	Заинский, с.Старый Токмак	100				



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
18	Зеленодольский, пгт. Васильево	300				
19	Кайбицкий, с.Надеждино	100				
20	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	200				
21	Кукморский, с.Мамашир	200				
22	Лаишевский, с.Каипы	200				
23	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	300				
24	Мамадышский, пос.Мамадышский	200				
25	Менделеевский, с.Тураево	100				
26	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	100				
27	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	200				
28	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	200				
29	Новошешминский, д.Новое Иванаево	100				
30	Нурлатский, с.Караульная Гора	100				
31	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	200				
32	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	350				
33	Сабинский, с.Тимершик	200				
34	Сармановский, с.Ляки	100				



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Начаты работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
35	Спасский, с.Красная Слобода	100				
36	Тетюшский, с.Чинчурино	100				
37	Тукаевский, н.п.Комсомолец	200				
38	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	100				
39	Черемшанский, д.Сосновка	100				
40	Чистопольский, с.Каргали	300				
41	Ютазинский, с.Акбаш	100				
42	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	300				
Капитальный ремонт						
43	г.Казань, ДК "Полимер"	200				



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Начаты работы		
		Фунд.	Инж.сети	Вывезен модуль на площадку
	Всего: 60 объектов	37	12	1
1	Агрызский, Сарсак-Омгинский			
2	Агрызский, Иж-Бобинский			
3	Азнакаевский, Асеевский			
4	Азнакаевский, Нижне-Стярлинский			
5	Аксубаевский, Сунчелеевский			
6	Актанышский, Чуганаковский			
7	Алексеевский, Куркульский			
8	Алексеевский, Ромодановский			
9	Алькеевский, Алпаровский			
10	Алькеевский, Средне-Алькеевский			
11	Альметьевский, Тихоновский			
12	Апастовский, Булым-Булыхчинский			
13	Арский, Старо-Масринский			
14	Атнинский, Кошарский			
15	Бавлинский, Крым-Сарайский			



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Начаты работы		
		Фунд.	Инж.сети	Вывезен модуль на площадку
16	Балтасинский, Соснинский			
17	Балтасинский, Нормабашский			
18	Бугульминский, Староисаковский			
19	Бугульминский, Подстанция			
20	Буинский, Адав-Тулумбаевский			
21	Буинский, Камбродский			
22	Верхнеуслонский, Русско-Бурнашевский			
23	Верхнеуслонский, Больше-Меминский			
24	Высокогорский, Татарско-Айшинский			
25	Дрожжановский, Убейский			
26	Елабужский, Котловский			
27	Елабужский, Анзирский			
28	Заинский, Чубуклинский			
29	Зеленодольский, Карашамский			
30	Зеленодольский, Татарско-Танаевский			



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Начаты работы		
		Фунд.	Инж.сети	Вывезен модуль на площадку
31	Кайбицкий, Бол.Русаковский			
32	Камско-Устьинский, Лабышкинский			
33	Кукморский, Кошкинский			
34	Лаишевский, Кирбиский			
35	Лаишевский, Мало-Кабанский			
36	Лениногорский, Ст.Писмянский			
37	Мамадышский, п.Фермы №2			
38	Мамадышский, Ишкеевский			
39	Менделеевский, Татарско-Челнинский			
40	Мензелинский, Ново-Мазинский			
41	Мензелинский, Деуковский			
42	Набережные Челны, Элеваторная гора			
43	Нижнекамский, Смыловский			
44	Нижнекамский, Тетвельский			
45	Новошешминский, Петропавловский			



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение	Начаты работы		
	Фунд.	Инж.сети	Вывезен модуль на площадку
46 Нурлатский, Криво-Озерский			
47 Пестречинский, Ново-Шигалеевский			
48 Рыбно-Слободский, Бетьковский			
49 Рыбно-Слободский, Малоошнякский			
50 Сабинский, Язлы-Арташский			
51 Сабинский, Нижнешитцинский			
52 Сармановский, Ст.Мензелябашинский			
53 Сармановский, Старокаширский			
54 Спасский, Тат.-Тахталинский			
55 Тетюшский, Малошемянский			
56 Тукаевский, Круглопольский			
57 Тюлячинский, Тактамышский			
58 Черемшанский, Ульяновский			
59 Чистопольский, Ишалкинский			
60 Ютазинский, пгт.Уруссу			

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	3,95	3,98	100,76
СМР	3,95	3,98	100,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	7,90	7,96	100,76
СМР	7,90	7,96	100,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	91,01	91,07	100,06

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028		
		ПИР 1,88	СМР 119,068	Обор-е 12,08
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	1,00	1,00	100,00	
СМР	1,00	1,00	100,00	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	2,00	2,00	100,00	
СМР	2,00	2,00	100,00	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	16,69	16,74	100,30	

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	1,42	1,36	100,74
СМР	1,42	1,36	100,74
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	2,87	2,89	100,69
СМР	2,87	2,89	100,69
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	64,04	64,89	101,33

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149		
		ПИР 2,5	СМР 72,049	Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.		
Срок завершения строительства		Февраль 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	2,10	2,11	101,48	
СМР	2,10	2,11	101,48	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	3,60	3,61	100,27	
СМР	3,60	3,61	100,27	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	63,70	63,95	100,39	

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	1,45	1,46	100,69
СМР	1,45	1,46	100,69
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	3,71	3,73	100,54
СМР	3,71	3,73	100,54
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	91,27	91,35	100,08

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик	«КамГЭСэнергоСтрой»		
Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.	86,7		
	ПИР 5,37	СМР 63,7	Обор-е 17,6
Начало строительства	Январь 2015 г.		
Срок завершения строительства	Август 2015 г.		

№ пп	Наименование	Срок		Исполнитель
		План	Факт	
1	Разработка проектно-сметной документации	10.11.14	10.11.14	ГУП ТИГП
2	Проведение гос.экспертизы ПСД	12.12.14	12.12.14	Госэкспертиза
3	Утверждение РКМ РТ по объекту	18.12.14	18.12.14	Минфин РТ
5	Проведение аукциона	05.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ
6	Заключение договора на СМР	15.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5		
		ПИР 2,05	СМР 58,65	Обор-е 79,8
Начало строительства		Июль 2014г.		
Срок завершения строительства		Июль 2015г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	4,20	4,22	100,48	
СМР	4,20	4,22	100,48	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	7,42	7,45	100,40	
СМР	3,22	3,23	100,40	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	36,54	36,59	100,17	

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		177,8 млн.руб			
		ПИР 2,0	СМР 152,4	Обор-е 12,9	Проч 10,5
Начало строительства		Декабрь 2014 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	1,0%	1,0%		100,0	
СМР	1,0%	1,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	2,0%	2,0%		100,0	
СМР	2,0%	2,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	2,5%	2,5%		100	

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	2,10	2,10	100		
СМР	2,10	2,10	100		
Оборудование	0	0	0		
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	8,85	8,85	100		
СМР	8,85	8,85	100		
Оборудование	0	0	0		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	90,85	90,85	100		



№	МО	№	МО
1	Альметьевский	24	Ютазинский
2	Казань	25	Апастовский
3	Мамадышский	26	Арский
4	Мензелинский	27	Атнинский
5	Наб. Челны	28	Бавлинский
6	Азнакаевский	29	Балтасинский
7	Елабужский	30	Бугульминский
8	Зеленодольский	31	Буинский
9	Менделеевский	32	Высокогорский
10	Пестречинский	33	Дрожжановский
11	Агрызский	34	Заинский
12	Аксубаевский	35	Кукморский
13	Актанышский	36	Лаишевский
14	Алексеевский	37	Лениногорский
15	Алькеевский	38	Муслюмовский
16	В.Услонский	39	Нижнекамский
17	Кайбицкий	40	Новошешминский
18	К.-Устьинский	41	Нурлатский
19	Сабинский	42	Р.-Слободский
20	Спасский	43	Сармановский
21	Тетюшский	44	Тукаевский
22	Тюлячинский	45	Чистопольский
23	Черемшанский		

**Информация
о заключении договоров
об информационно-
технологическом
взаимодействии
с ОАО "АК БАРС" банком,
в части приема платежей за
ЖКУ через Портал Госуслуг**

на 16.01.2015

Нет источников

Решают вопрос

Направлен в банк

Договор подписан
