



# Оперативные данные Государственной жилищной инспекции по РТ

Год	Количество обследований	Количество нарушений, виды нарушений					
		Всего	в том числе				
			отсутствие средств индивидуальной защиты	нарушения правил использования и хранения баллонов высокого давления	нарушения правил производства высотных работ	отсутствие ограждений в опасной зоне производства работ	прочие нарушения
<b>2013</b>	<b>2 519</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>2014</b>	<b>4077</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		↑	↑	↓	↑	↑	↑



# Основные показатели деятельности Государственной жилищной инспекции РТ по контролю за капитальным ремонтом МКД

Наименование показателя	2014 год
Количество обследований (ед.)	4 077
Площадь обследованных домов (тыс. кв.м.)	14 048,6
Количество выданных предписаний (ед.)	17
Количество составленных протоколов (ед.)	1
Направлено писем в органы Прокуратуры (ед.)	24



# Причины несчастных случаев


отсутствие средств индивидуальной защиты  
14

отсутствие ограждений в опасной зоне производства работ  
3

нарушения правил использования и хранения баллонов высокого давления  
2

иные причины  
4

нарушения правил производства высотных работ  
17

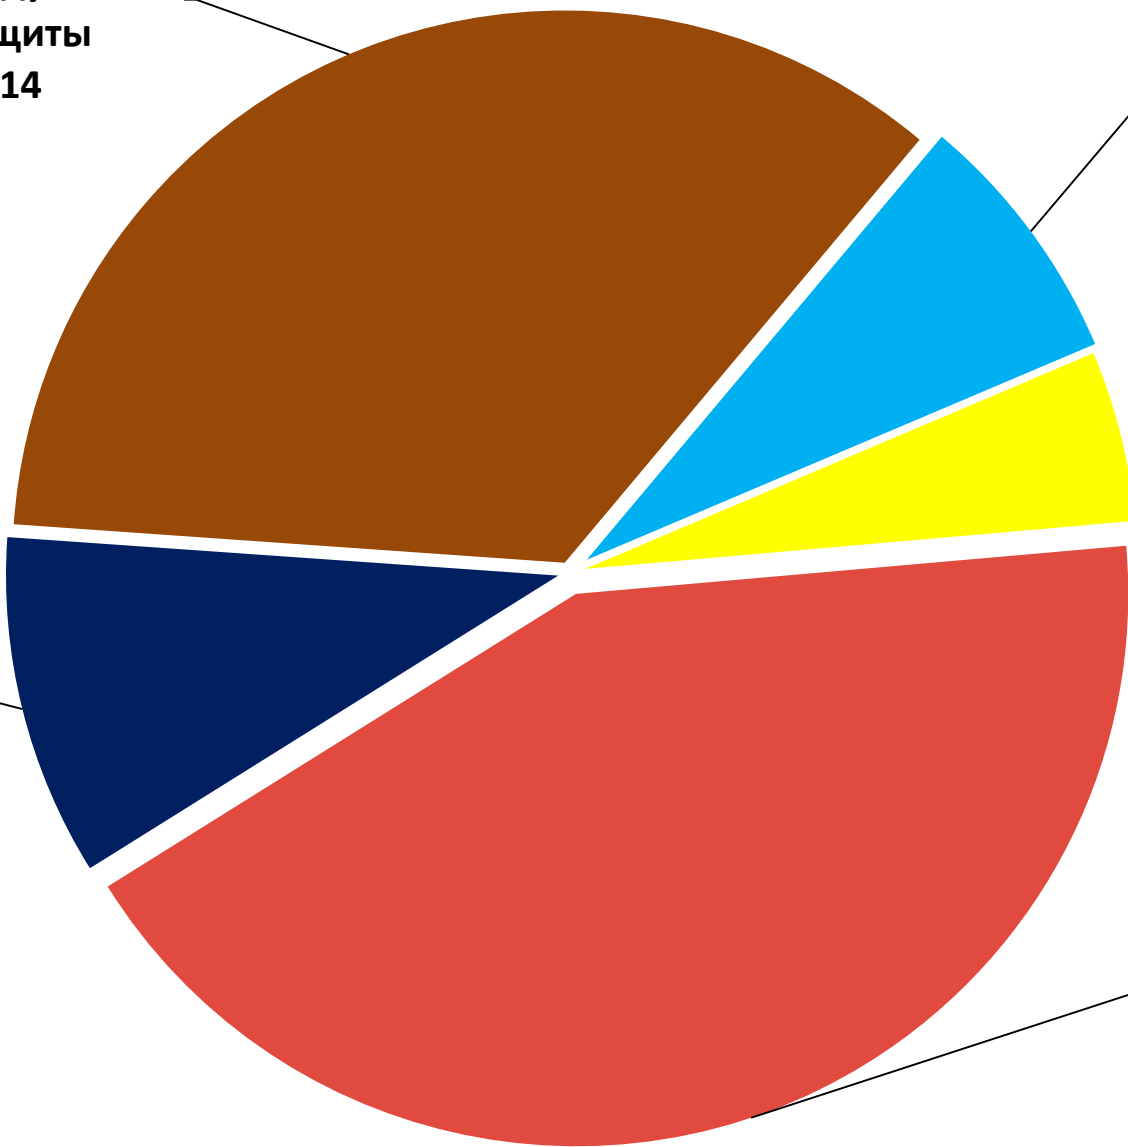



	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Энергосбережение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 годы
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Капремонт подростковых клубов
15	Капремонт сельских клубов
16	Капремонт ресурсных центров
17	Ликвидация аварийного жилья



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>110,88</b>	<b>1 373, 13</b>	<b>1 072, 93</b>	<b>2 153, 99</b>	<b>4 710,93</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

6

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Агрызский	8	5	16.01.2015	4	8
Азнакаевский	29	14	26.01.2015		
Аксубаевский	3	2	27.01.2015		
Актанышский	3	3	30.01.2015		
Алексеевский	6	2	21.01.2015	1	6
Алькеевский	2	1	23.01.2015		
Альметьевский	34	31	20.01.2015	18	34
Апастовский	1	2	20.01.2015	1	1
Арский	8	4	30.01.2015		
Бавлинский	7	5	16.01.2015	3	7
Балтасинский	2	2	02.02.2015		
Бугульминский	87	12	23.01.2015	9	87
Буинский	8	5	17.01.2015	5	8
Верхнеуслонский	1	2	22.01.2015	1	1
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>307</b>		<b>142</b>	<b>693</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

7

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Высокогорский	9	4	30.01.2015		
г. Казань	280	110	19.01.2015	55	275
г. Наб.Челны	144	15	24.01.2015		
Елабужский	44	6	15.01.2015	5	44
Заинский	14	6	12.01.2015	6	14
Зеленодольский	27	9	20.01.2015	5	27
К.-Устьинский	10		30.01.2015		
Кукморский	9	2	22.01.2015	2	
Лаишевский	6	3	23.01.2015	2	6
Лениногорский	15	13	23.01.2015	9	15
Мамадышский	11	2	16.01.2015	1	11
Менделеевский	6	3	19.01.2015	1	6
Мензелинский	6	3	23.01.2015	2	6
Муслимовский	4	3	22.01.2015		
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>307</b>		<b>142</b>	<b>693</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

8

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Нижнекамский	97	9	22.01.2015	6	97
Новошешминский	13	3	23.01.2015	1	13
Нурлатский	15	6	26.01.2015		
Пестречинский	7				
Р.-Слободский	2	2	17.01.2015	1	2
Сабинский	7	2	29.01.2015		
Сармановский	9	2	16.01.2015	2	9
Спасский	7	3	30.01.2015		
Тетюшский	7		22.01.2015		
Тукаевский	13	2	24.01.2015		
Тюлячинский	1	1			
Черемшанский	7	2	28.01.2015		
Чистопольский	16	4	16.01.2015	2	16
Ютазинский	14	2	28.01.2015		
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>307</b>		<b>142</b>	<b>693</b>





# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	7
Азнакаевский	29	87 403,53	
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	2
Алексеевский	6	9 143,81	2
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	15
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	2
Бавлинский	7	36 195,78	5
Балтасинский	2	4 437,28	
Бугульминский	87	196 981,06	20
Буинский	8	22 901,32	3
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>211</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	5
г. Казань	280	1 482 387,32	32
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	47
Елабужский	44	109 329,11	5
Заинский	14	62 977,49	
Зеленодольский	27	235 365,55	7
К.-Устьинский	10	7 246,88	
Кукморский	9	19 094,68	
Лаишевский	6	17 684,29	
Лениногорский	15	105 329,68	6
Мамадышский	11	13 897,90	
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	2
Муслюмовский	4	6 636,76	2
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>211</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	18
Новошешминский	13	4 864,22	
Нурлатский	15	48 849,58	4
Пестречинский	7	14 868,35	2
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	
Сармановский	9	33 119,83	1
Спасский	7	7 517,28	
Тетюшский	7	8 601,89	
Тукаевский	13	29 854,94	
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	6
Чистопольский	16	97 451,00	
Ютазинский	14	21 272,35	6
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>211</b>



# Программа по капитальному ремонту школ программы на 2015 год

12

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 общеобраз., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



# Капитальный ремонт

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

13

## общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>
1	Алексеевский	13 340,5	0,0	0,0	0,0
2	Атнинский	31 161,2	0,0	0,0	0,0
3	Новошешминский	9 457,0	0,0	0,0	0,0
4	Азнакаевский	65 270,2	0,0	0,0	0,0
5	Чистопольский	43 111,7	0,4	0,4	0,0
6	Кайбицкий	11 577,1	0,4	0,4	0,0
7	Сабинский	47 870,8	0,4	0,4	0,0
8	Балтасинский	27 728,9	0,8	0,8	0,0
9	Дрожжановский	29 477,6	0,8	0,8	0,0
10	Камско-Устьинский	16 267,4	0,8	0,8	0,0
11	Спасский	6 653,7	0,8	0,8	0,0
12	Ютазинский	8 544,4	0,8	0,8	0,0
13	Кукморский	36 822,7	0,9	0,9	0,0
14	Бавлинский	37 378,0	1,3	1,3	0,0
15	Альметьевский	75 918,2	1,3	1,3	0,0



# Капитальный ремонт

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

## общеобразовательных школ на 2015 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>
16	Актанышский	53 863,8	1,9	1,9	0,0
17	Черемшанский	22 374,4	1,9	1,9	0,0
18	Аксубаевский	7 810,1	2,3	2,3	0,0
19	Алькеевский	16 979,4	3,0	3,0	0,0
20	Тюлячинский	14 781,9	3,8	3,8	0,0
21	Нурлатский	35 851,6	3,9	3,9	0,0
22	Мензелинский	48 987,0	4,5	4,5	0,0
23	Зеленодольский	79 090,7	4,9	4,9	0,0
24	г.Казань	413 937,7	6,1	6,1	0,0
25	Мамадышский	62 479,2	6,3	6,3	0,0
26	Бугульминский	109 789,8	6,8	6,8	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>
27	Арский	76 384,0	7,5	7,5	0,0
28	Высокогорский	14 510,1	7,5	7,5	0,0
29	Сармановский	29 247,4	7,5	7,5	0,0
30	Лениногорский	33 112,6	8,8	8,8	0,0



# Капитальный ремонт

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

15

## общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>
31	Буинский	29 117,9	8,9	8,9	0,0
32	Менделеевский	25 563,7	9,8	9,8	0,0
33	г.Набережные Челны	310 059,3	11,8	11,8	0,0
34	Агрызский	16 830,8	14,0	14,0	0,0
35	Нижнекамский	88 762,3	15,4	15,4	0,0
36	Тукаевский	23 076,5	15,5	15,5	0,0
37	Пестречинский	24 054,6	17,6	17,6	0,0
38	Муслюмовский	28 224,2	18,4	18,4	0,0
39	Апастовский	24 789,4	21,6	21,6	0,0
40	Лаишевский	18 936,8	40,9	40,9	0,0
41	Заинский	25 569,6	47,5	47,5	0,0
42	Тетюшский	14 811,0	56,4	56,4	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

16

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	210 018,0	12,5	12,5	0,0
1	г.Казань "Специальная (коррекционная) ОШ №61 VIII вида"	28 507,4	0,0	0,0	0,0
2	Ютазинский, "Уруссинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	30 652,0	0,8	0,8	0,0
3	Арский, "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	27 100,0	1,1	1,1	0,0
4	Пестречинский, "Пестречинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	28 687,0	4,1	4,1	0,0
5	<b>Итого по РТ</b>	210 018,0	12,5	12,5	0,0
6	Менделеевский, "Менделеевская специальная (коррекционная) ОШ VIII вида"	22 116,0	12,6	12,6	0,0
7	Муслюмовский МР, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) ОШ-интернат "	15 633,0	24,5	24,5	0,0
8	Бугульминский МР, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) ОШ-интернат I, II вида	57 322,5	33,4	33,4	0,0





## Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>
1	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	0,0	0,0	0,0
2	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	0,0	0,0	0,0
3	г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	0,0	0,0	0,0
4	пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	0,0	0,0	0,0
5	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	0,0	0,0	0,0



# Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>
6	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	0,0	0,0	0,0
7	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	0,0	0,0	0,0
8	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	2,0	2,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>
9	г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	16,0	16,0	0,0
10	г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	17,0	17,0	0,0



# Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 72,100 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г. 20

Данные за 19 - 25 января 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>72 100,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>
1	Елабужский, "Юный строитель"	4 800,0	0,0	0,0	0,0
2	Сабинский, "Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 800,0	0,0	0,0	0,0
3	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм	15 000,0	0,0	0,0	0,0
4	Черемшанский, "ДОЛ "Солнечный"	2 950,0	0,0	0,0	0,0
5	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 200,0	0,0	0,0	0,0
6	г. Казань, Столовая спортивно-оздоровительного лагеря "Экран"	4 500,0	0,0	0,0	0,0
7	Атнинский, Пионерлагерь "Чулпан"	5 000,0	1,0	1,0	0,0
8	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь "Олимпиец"	4 800,0	1,0	1,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>67 600,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>
9	Бавлинский, оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 800,0	7,0	7,0	0,0
10	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 800,0	8,0	8,0	0,0
11	Лениногорский, ДОЛ "Дружба"	4 800,0	12,0	12,0	0,0
12	Нижнекамский, ДОЛ "Заря"	4 800,0	15,0	15,0	0,0
13	Мамадышский, ДОЛ "Кама"	3 850,0	66,0	66,0	0,0



# Реализация Программы перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	Перевод на <b>индивидуальные системы отопления</b> , квартир	4 349	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР	Ведется сбор исходных данных для проектирования с МО. Дата объявления конкурса на <b>ПИР 19.01.2015г.</b>



# Реализация Программы по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетной сферы: - количество объектов - количество котлов	<b>234</b> <b>432</b>	<b>69,9</b> в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР	Создана рабочая комиссия, в срок до 20.02.2015 необходимо подготовить перечень объектов по требованиям РТН, Газпрома для утверждения РКМ



# Реализация Программы «Водоснабжение на селе»

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	<b>Водоснабжение</b> на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	<b>309,4</b> <b>39</b> <b>61</b>	<b>650,0</b> в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР	Принято РКМ Дата объявления конкурса на <b>ПИР 28.01.2015г.</b>

## Программа по восстановлению освещения в 2015 году (РКМ РТ от 01.12.2014 № 2435-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередач, км.
45	1 017	225	11 702	641	390





# Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

МО РТ, месторасположение		Начаты работы			
		Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
<b>Всего по РТ: 42 УВП</b>		<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
1	Агрызский, Исенбаево				
2	Азнакаевский, Тумутук				
3	Аксубаевский, Старое Ибрайкино				
4	Актанышский, Татарские Суксы				
5	Алексеевский, Билярск				
6	Алькеевский, Юхмачи				
7	Альметьевский, Новое Каширово				
8	Апастовский, Старый Юрмалы				
9	Арский, Средняя Корса				
10	Атнинский, Коморгузя				
11	Бавлинский, Поповка				
12	Балтасинский, Алан				
13	Балтасинский, Карадуван				
14	Буинский, Аксу				



# Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

МО РТ		Начаты работы			
		Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
15	Верхнеуслонский, Коргуза				
16	Высокогорский, Чепчуги				
17	Дрожжановский, Новое Ильмово				
18	Елабужский, Яковлево				
19	Заинский, Чубуклы				
20	Зеленодольский, Кугушево				
21	Кайбицкий, Ульяновково				
22	Кукморский, Чишма-Баш				
23	Лаишевский, Державино				
24	Лениногорский, Сарабикулово				
25	Мамадышский, Нижняя Сунь				
26	Мензелинский, Кадряково				
27	Нижнекамский, Шеремтьевка				
28	Новошешминский, Шахмайкино				
29	Нурлатский, Новая Амзя				



# Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

МО РТ	Начаты работы			
	Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
30 Рыбно-Слободский, Кугарчино				
31 Сабинский, Сатышево				
32 Сабинский, Два Поля Арташ				
33 Сармановский, Саклав-Баш				
34 Спасский, Антоновка				
35 Тетюшский, Байрашево				
36 Тукаевский, Тлянче-Тамак				
37 Тюлячинский, Шадки				
38 Черемшанский, Черемшан				
39 Чистопольский, Муслюмкино				
40 Ютазинский, пгт.Уруссу				
41 г.Казань, ул.Малая Заречная				
42 г.Казань, ул.Сибирский тракт				



# Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

28



Мамадышский район, с. Нижняя Сунь  
Генподрядчик «Азнакаевский завод Нефтемаш»

## Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ в 2015 году.

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
<b>Всего по РТ: 18 объектов</b>		<b>9</b>
1	Аксубаевский	
2	Алексеевский	
3	Бавлинский	
4	Балтасинский	
5	Кайбицкий	
6	Лениногорский	
7	Новошешминский	
8	Нурлатский	
9	Рыбно-Слободский	

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
10	Сабинский	
11	Сармановский	
12	Спасский	
13	Тукаевский	
14	Тюлячинский	
15	Лаишевский	
16	Чистопольский	
17	г.Казань (Республиканская ветеринарная лаборатория)	
18	г.Казань	

## Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2015 году.

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
<b>Всего по РТ: 25 объектов</b>		<b>3</b>
1	Агрызский	
2	Актанышский	
3	Алькеевский	
4	Апастовский	
5	Бавлинский	
6	Балтасинский	
7	Бугульминский	
8	Буинский	
9	Высокогорский	
10	Дрожжановский	
11	Заинский	
12	Кайбицкий	

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
13	Камско-Устьинский	
14	Кукморский	
15	Лаишевский	
16	Лениногорский	
17	Мамадышский	
18	Муслюмовский	
19	Нижнекамский	
20	Пестречинский	
21	Рыбно-Слободский	
22	Сармановский	
23	Спасский	
24	Тетюшский	
25	Чистопольский	



# Капремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
Капитальный ремонт коровников – всего	244	1 670,5	470,7	1 199,8
в том числе:				
на 100 голов	102	545,9	148,6	397,3
на 200 голов	142	1 124,6	322,1	802,5
Строительство силосно-сенажных траншей	152	282,6	61,3	221,3



## Предложения по распределению бонусных 50 млн. рублей по программе «Парки и скверы»

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв. м.	Выполнение плана, %	Премиальный бонус, тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>100,5</b>	<b>50 000,0</b>
1	Пестречинский	28 000	323,2	10 875,6
2	Ютазинский	6300	168,4	5 666,5
3	Тукаевский	36 000	163,0	5 485,0
4	Лаишевский	52 000	139,2	4 684,1
5	Бавлинский	17 000	127,9	4 303,7
6	Агрызский	20 000	116,6	3 923,5
7	Менделеевский	10 000	114,6	3 856,3
8	Арский	27 000	111,9	3 765,4
9	Актанышский	17 000	110,6	3 721,6
10	Сабинский	18 000	110,5	3 718,3





# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб	МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб
Агрызский	1	4 574,1	Заинский	1	4 434,1
Аксубаевский	1	1 061,5	Кукморский	1	3 165,2
Актанышский	1	4 434,1	Лайшевский	1	6 683,5
Алексеевский	1	2 026,5	Мамадышский	1	4 434,1
Альметьевский	1	2 026,5	Мензелинский	1	1 954,1
Апастовский	1	4 434,1	Муслюмовский	1	4 436,1
Арский	1	2 026,5	Новошешминский	1	1 341,3
Атнинский	1	4 535,5	Р-Слободский	1	4 434,1
Балтасинский	1	4 434,1	Сабинский	1	8 294,1
Бугульминский	1	1 758,2	Сармановский	1	4 429,3
Высокогорский	1	2 991,5	Спасский	1	2 991,5
Дрожжановский	1	4 434,1	Тукаевский	1	4 434,1
Елабужский	1	3 165,2	Черемшанский	1	2 026,5
			<b>Итого</b>	<b>26</b>	<b>94 960,7</b>



## Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

МО	Количество клубов	Лимит финансирования, тыс. руб
Альметьевский	3	9 600,0
Балтасинский	1	4 000,0
Елабужский	2	5 250,0
Заинский	2	1 000,0
Зеленодольский	4	9 400,0
г.Казань	5	38 300,0
Мамадышский	1	4 000,0
Наб. Челны	5	9 900,0
Нижнекамский	5	9 000,0
<b>Итого</b>	<b>28</b>	<b>90 450,0</b>

**Перечень зданий создаваемых ресурсных центров для  
удовлетворения кадровых потребностей базовых  
работодателей РТ, подлежащих капитальному ремонту в  
2015 году**

<b>Наименование</b>	<b>Лимит, тыс. рублей</b>
Зеленодольский Механический колледж	83 035,1
Казанский строительный колледж	106 475,7
Мамадышский профессиональный колледж № 87	101 065,7
Нижнекамский индустриальный техникум	85 266,1
Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова	79 236,9
Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая	54 410,2
Заинский политехнический колледж	61 315,5
Лаишевский технико-экономический техникум	87 152,29
Лениногорский нефтяной техникум»	23 421,43
<b>Итого</b>	<b>681 379,18</b>



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 640</b>	<b>2 404</b>	<b>7 236</b>	<b>25</b>	<b>356 255,49</b>	<b>88 276,37</b>	<b>267 979,12</b>	<b>25</b>
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 532	131	1 401	9	52 600,47	4 583,86	48 016,61	9
3	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
4	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
5	Зеленодольский	3 019	413	2 606	14	120 785,26	13 558,60	107 226,66	11
6	Азнакаевский	256	38	218	15	13 098,60	1 947,90	11 150,70	15
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
9	Елабужский	101	30	71	30	3 072,15	794,70	2 277,45	26
10	Кукморский	426	134	292	31	13 182,90	4 169,00	9 013,90	32
11	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
12	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
13	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
14	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
15	Тетюшский	45	17	28	38	1 196,90	476,30	720,60	40



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 640</b>	<b>2 404</b>	<b>7 236</b>	<b>25</b>	<b>356 255,49</b>	<b>88 276,37</b>	<b>267 979,12</b>	<b>25</b>
16	Агрызский	153	58	95	38	5 972,70	2 441,90	3 530,80	41
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	117	115	50	7 919,94	5 089,10	2 830,84	64
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Высокогорский	288	172	116	60	9 303,20	5 590,50	3 712,70	60
21	Ютазинский	134	81	53	60	4 908,30	2 663,35	2 244,95	54
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	К.Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	31	13	70	1 464,30	1 259,60	204,70	86
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 640</b>	<b>2 404</b>	<b>7 236</b>	<b>25</b>	<b>356 255,49</b>	<b>88 276,37</b>	<b>267 979,12</b>	<b>25</b>
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	0,00	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	0,00	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	0,00	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	0,00	104
37	Р.Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
1	Агрызский	2	47		7	38
2	Азнакаевский		30	1		15
3	Актанышский	2	25			100
4	Алексеевский	15	5	2		70
5	Алькеевский		1			100
6	Альметьевский	20	7			29
7	Апастовский	13	8			100
8	Арский	38	23	2		50
9	Балтасинский	5	46			83
10	Буинский	20	4			64
11	Бугульминский	2	2			13
12	Верхнеуслонский		1			13
13	Высокогорский	15	65	5		60
14	Дрожжановский		2			100
15	Агрызский	2	47		7	38



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
16	Елабужский	8	21		1	30
17	Заинский	3	1			29
18	Зеленодольский	109	249	51	4	14
19	Кайбицкий					100
20	К.-Устьинский	18	2			69
21	Кукморский	88	31		2	31
22	Лаишевский	4	19			36
23	Лениногорский	6	14			37
24	Мамадышский	54	60			97
25	Менделеевский	1	6			58
26	Мензелинский	2	13			82
27	Муслюмовский	5	24			83
28	Нижнекамский		14			100
29	Новошешминский	1	10			100
30	Нурлатский	19	25			35





# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
31	Пестречинский		38			42
32	Р.-Слободский		4			100
33	Сабинский		2			100
34	Спасский	12	23			35
35	Тукаевский	10				100
36	Тетюшский	3	2			38
37	Тюлячинский					100
38	Чистопольский	33	34	5	2	9
39	Ютазинский	14	27		2	60
40	г.Казань	9	11			2

# Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>139,98</b>	
		<b>СМР</b> 136,18	<b>ПИР</b> 3,79
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	<b>3,95</b>	<b>3,96</b>	<b>100,25</b>
<b>СМР</b>	3,95	3,96	100,25
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ</b> 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	<b>11,85</b>	<b>11,92</b>	<b>100,59</b>
<b>СМР</b>	11,85	11,92	100,59
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 22.01.2015 г.</b>	<b>94,96</b>	<b>95,03</b>	<b>100,07</b>

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Казаньстройконсорциум»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>133,028</b>	
		<b>ПИР 1,88</b>	<b>СМР 119,068</b>
<b>Обор-е 12,08</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Ноябрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>	<b>101,75</b>
<b>СМР</b>	0,57	0,58	101,75
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.</b>	<b>2,57</b>	<b>2,58</b>	<b>100,39</b>
<b>СМР</b>	2,57	2,58	100,39
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>17,26</b>	<b>17,32</b>	<b>100,35</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Обор-е 44,92</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	<b>1,85</b>	<b>1,86</b>	<b>100,54</b>
<b>СМР</b>	1,85	1,86	100,54
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ</b> 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	<b>4,72</b>	<b>4,75</b>	<b>100,63</b>
<b>СМР</b>	4,72	4,75	100,63
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>65,89</b>	<b>66,75</b>	<b>101,30</b>

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в г. Тетюши**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>92,149</b>		
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 72,049</b>	<b>Обор-е 17,6</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2014 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Февраль 2015 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.</b>	<b>1,05</b>	<b>1,06</b>	<b>100,95</b>	
<b>СМР</b>	1,05	1,06	100,95	
<b>Оборудование</b>				
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.</b>	<b>4,65</b>	<b>4,67</b>	<b>100,43</b>	
<b>СМР</b>	4,65	4,67	100,43	
<b>Оборудование</b>				
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>64,75</b>	<b>65,01</b>	<b>100,40</b>	

## Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>186,241</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 180,271</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>100,46</b>
<b>СМР</b>	2,16	2,17	100,46
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.</b>	<b>5,87</b>	<b>5,90</b>	<b>100,51</b>
<b>СМР</b>	5,87	5,90	100,51
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>93,43</b>	<b>93,52</b>	<b>100,09</b>

## Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик	«КамГЭСэнергоСтрой»		
Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.	86,7		
	ПИР 5,37	СМР 63,7	Обор-е 17,6
Начало строительства	Январь 2015 г.		
Срок завершения строительства	Август 2015 г.		

№ пп	Наименование	Срок		Исполнитель
		План	Факт	
1	Разработка проектно-сметной документации	10.11.14	10.11.14	ГУП ТИГП
2	Проведение гос.экспертизы ПСД	12.12.14	12.12.14	Госэкспертиза
3	Утверждение РКМ РТ по объекту	18.12.14	18.12.14	Минфин РТ
5	Проведение аукциона	05.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ
6	Заключение договора на СМР	15.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ

<b>Генподрядчик</b>		<b>КамГЭСэнергоСтрой</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>140,5</b>	
		<b>ПИР 2,05</b>	<b>СМР 58,65</b>
		<b>Обор-е 79,8</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.</b>	<b>7,21</b>	<b>7,23</b>	<b>100,27</b>
<b>СМР</b>	<b>7,21</b>	<b>7,23</b>	<b>100,27</b>
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.</b>	<b>14,63</b>	<b>14,68</b>	<b>100,34</b>
<b>СМР</b>	<b>14,63</b>	<b>14,68</b>	<b>100,34</b>
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>47,95</b>	<b>48,04</b>	<b>100,18</b>



# Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>177,8 млн.руб</b>	
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 152,4</b>
<b>Обор-е 12,9</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 15.01.2015 г. – 22.01.2015г.</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>100</b>

# Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Спецстройинвест»</b>			
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Аксубаевского МР</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>181,7 млн.руб</b>			
		<b>ПИР</b> 3,1	<b>СМР</b> 128,8	<b>Обор-е</b> 40,4	<b>Проч.</b> 8,5
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>		<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ</b> 09.01.2015г. – 22.01.2015г.	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		<b>100</b>	
<b>СМР</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		<b>100</b>	
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>МЕСЯЦ ЯНВАРЬ</b> 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	<b>11,05</b>	<b>11,05</b>		<b>100</b>	
<b>СМР</b>	11,05	11,05		100	
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 22.01.2015 г.</b>	<b>93,05</b>	<b>93,05</b>		<b>100</b>	
