



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



11 сентября 2021 г.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2021 ГОД



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

27 программ всего

3 481 объект на 23 538,89 млн.руб.


8 программ реализовано

285 объектов на 1 537,67 млн.руб.

19 программ в работе

3 196 объектов на 22 001,22 млн.руб.

Общий СМР составляет 87%

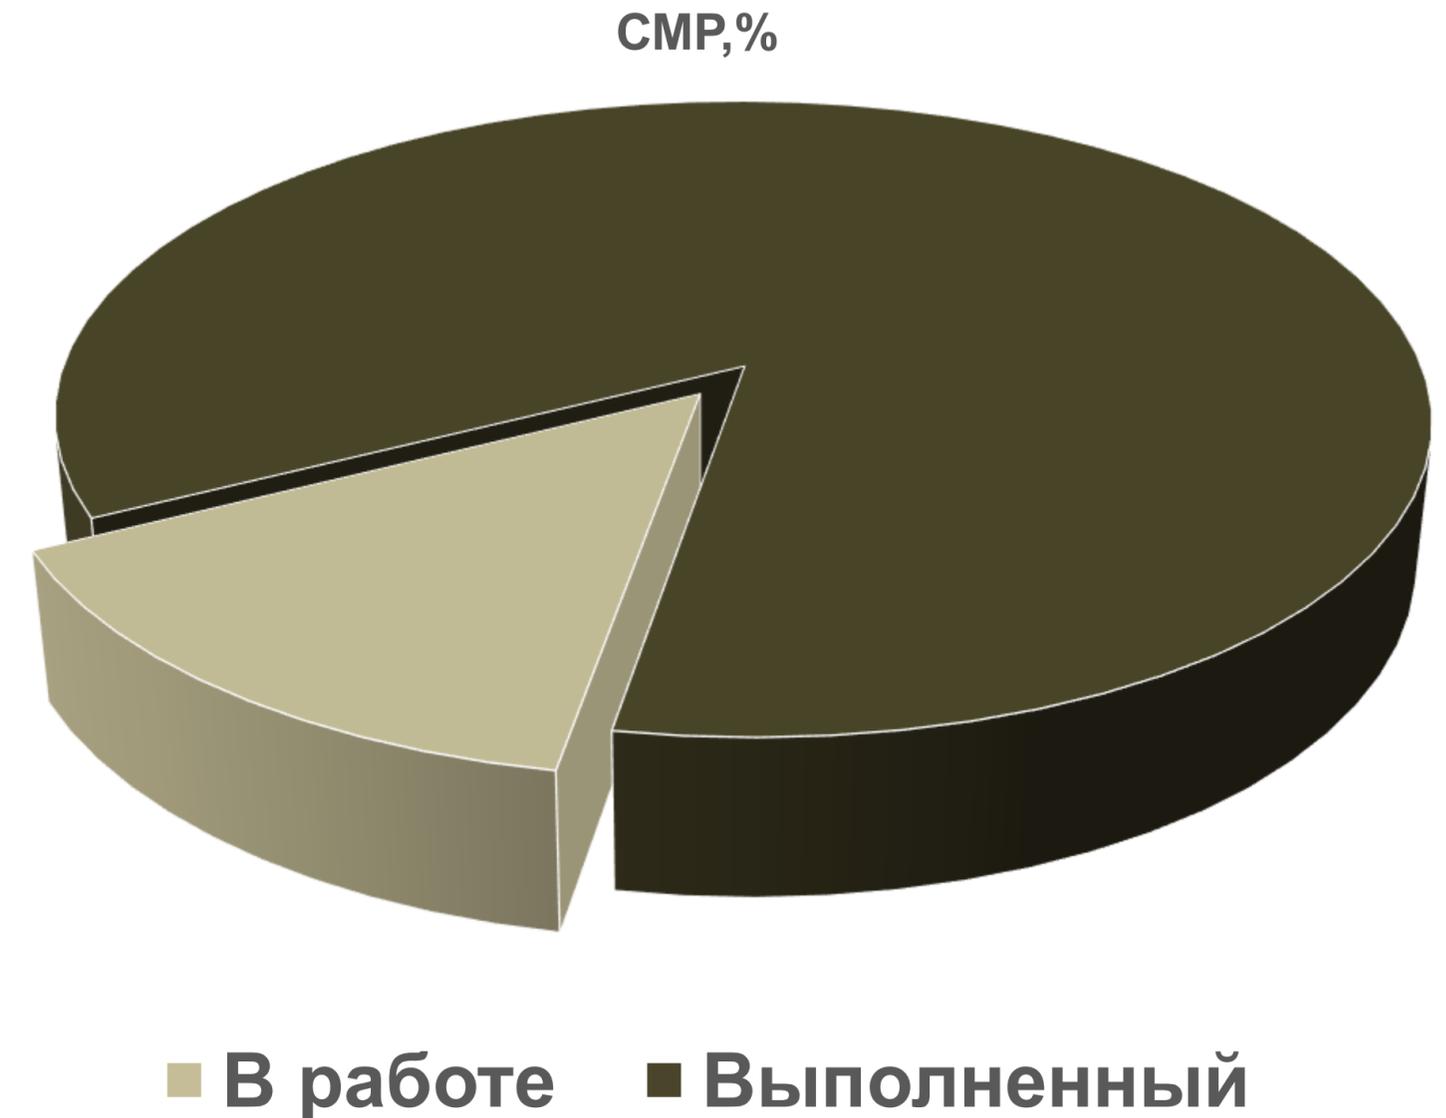

В рамках реализации республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года текущее выполнение составляет 87%. Я напомню, в этом году Татарстан реализует 27 таких программ. По сумме в них входят порядка 3,5 тысяч объектов с объемом освоения более 23 млрд рублей.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



№	МО РТ	Сумма, тыс. рублей	Кол-во объектов	СМР, %
				Факт
1	Капитальный ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия	20 000,00	13	100,00
2	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений управлению ветеринарии	30 000,00	12	100,00
3	Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений	27 215,87	15	100,00
4	Капитальный ремонт зданий общежитий	190 049,80	6	100,00
5	Капитальный ремонт административных зданий лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов	70 500,00	28	100,00
6	Капитальный ремонт муниципальных архивов	50 000,00	9	100,00
7	Капитальный ремонт образовательных организаций отрасли культуры (дши)	150 000,00	6	100,00
8	Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций с приобретением оборудования	1 000 000,00	196	100,00
ИТОГО:		1 537 765,67	285	100,00

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ



№	Виды учреждений	Сумма лимита по ГК, тыс. рублей	Количество объектов	Факт СМР,%
1	Ремонт образовательных учреждений	2 000 000	212	99,97
1.1	Школы	670 355,67	32	100,00
1.2	Школа (реконструкция)	29 188,19	1	100,00
1.3	Коррекционные школы	209 113,33	10	100,00
1.4	Детские сады (в т.ч. реставрация 1 дет.сада)	900 804,44	49	99,83
1.5	Функциональные зоны	100 674,10	116	100,00
1.6	«Доступная среда»	6 484,57	4	100,00
2	Ремонт пищеблоков в общеобразовательных организациях	1 000 000,00	196	100,00
3	Ремонт ресурсных центров	500 000,00	5	98,29
ИТОГО:		3 500 000,00	413	99,42

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЕТСКИЕ САДЫ)



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	г.Казань, МАДОУ «Детский сад № 93»	10 096,30	80,00	0,00
2	Заинский МР, МБДОУ «Детский сад «Светлячок»»	12 536,52	82,00	14,00
3	г.Казань, МАДОУ «Детский сад № 368»	24 718,60	85,00	5,00
4	г.Казань, МАДОУ «Детский сад № 362»	105 206,84	85,00	5,00
5	г.Казань, МАДОУ «Детский сад № 104»	21 972,81	90,00	6,00
6	Альметьевский МР, МБДОУ «Детский сад № 41 «Дружные ребята»	15 920,00	92,00	4,00
7	Новошешминский, МБДОУ «Ленинский детский сад «Ляйсан»	7 237,41	97,00	5,00
8	Чистопольский МР, МБДОУ «Детский сад № 8 «Дюймовочка»	18 829,80	98,00	5,00
9	г.Казань, МБДОУ «Детский сад № 126»	47 051,41	99,00	3,00
ИТОГО лимит по программе		896 805,50	99,83	5,30

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 126», Г.КАЗАНЬ




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» ЗАИНСКИЙ РАЙОН




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

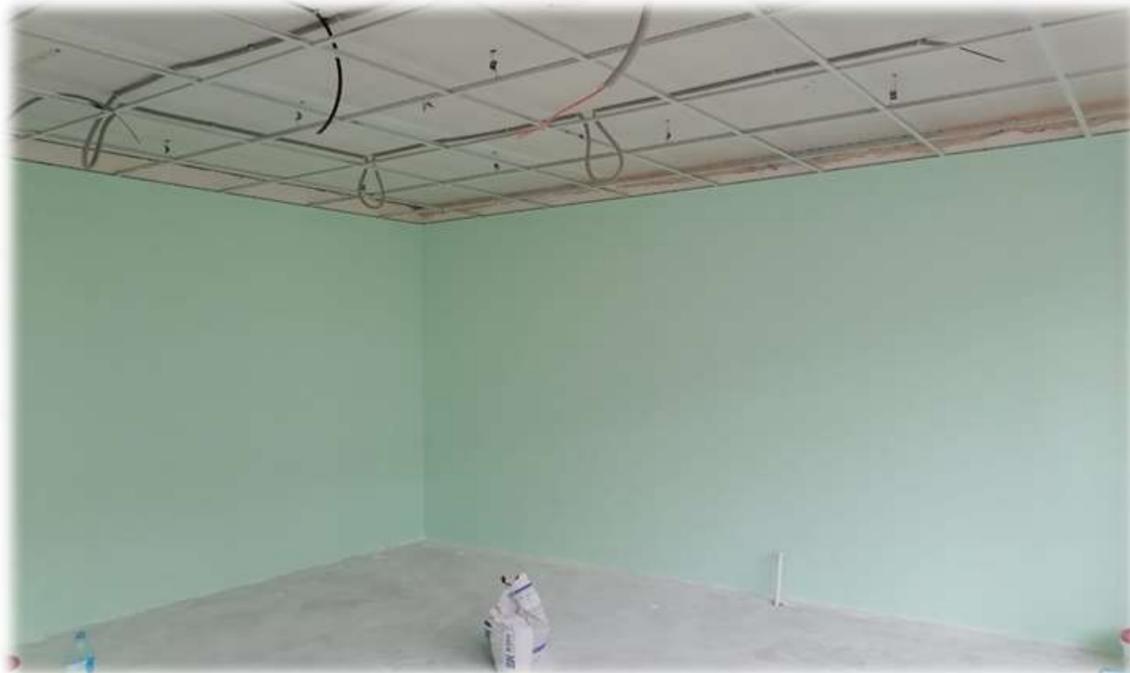

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №119», Г.КАЗАНЬ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

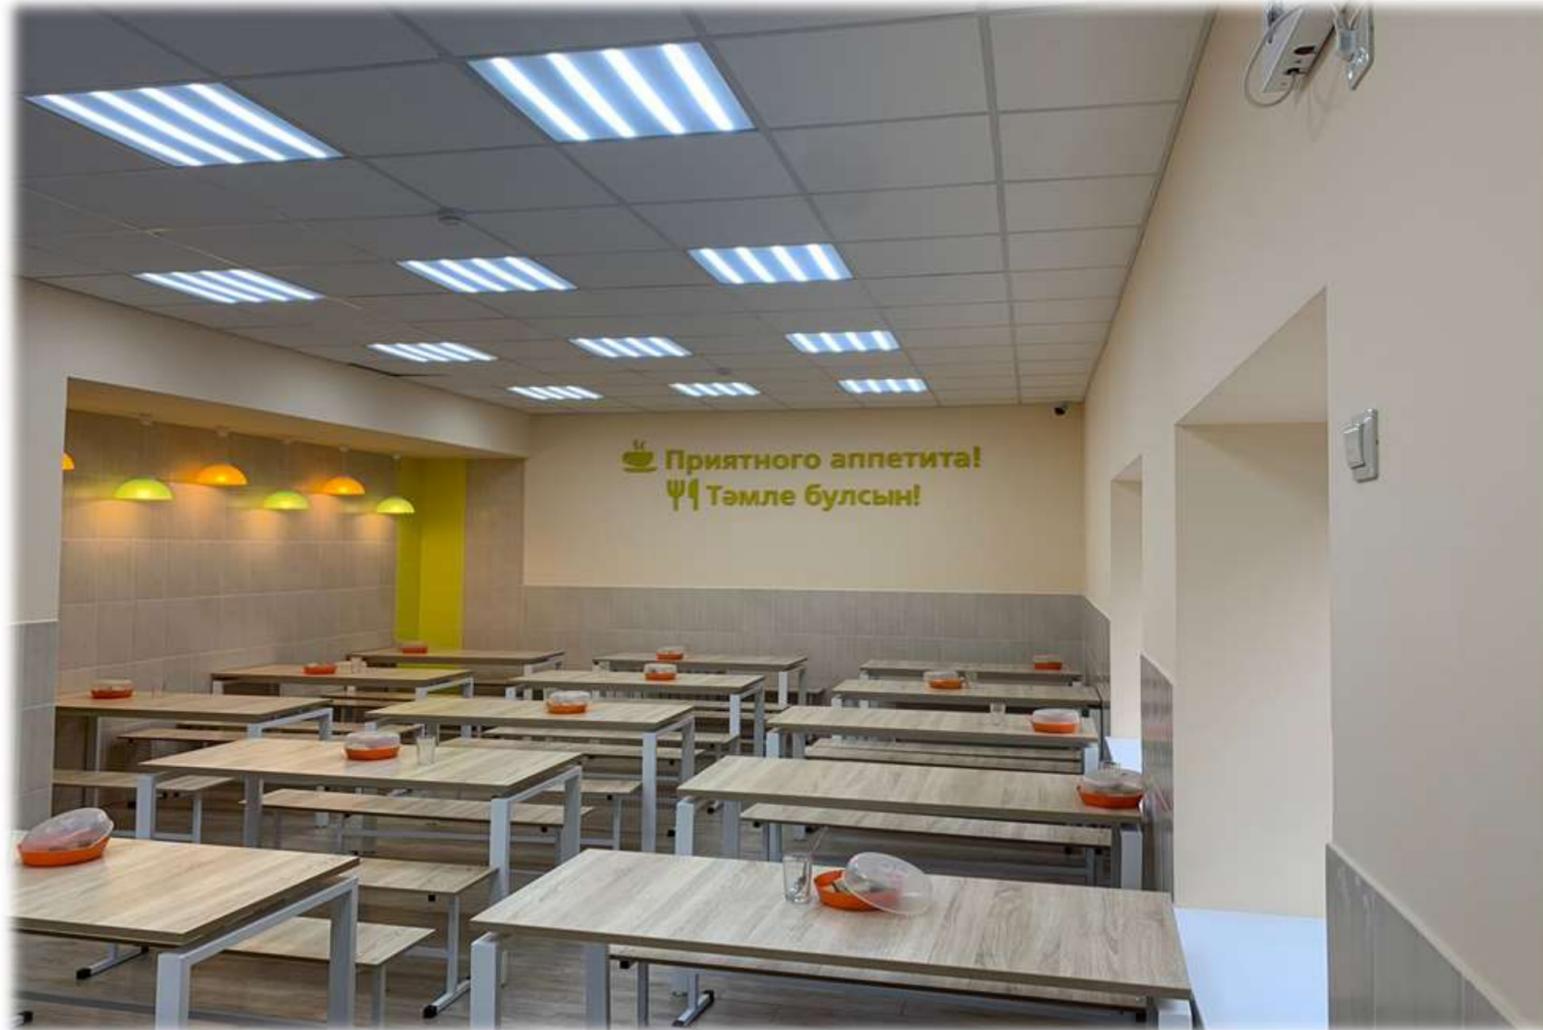

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №37», Г.КАЗАНЬ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»	37 751,46	90,00	10,00
2	Тетюшский, ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»	125 580,63	96,00	6,00
ИТОГО лимит по программе		432 716,49	98,29	5,67

ГАПОУ «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.Г.И.УСМАНОВА» ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» г.Нижнекамск, главный корпус, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.45	199 967,80	50,00	3,00
2	ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф.А.Ф.Агафонова», стационарные блоки, г.Казань	49 725,34	57,00	0,00
3	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», стационар, г.Чистополь	96 175,70	62,00	5,00
4	ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», лечебный корпус, г.Тетюши	69 650,00	78,00	0,00
5	ГАУЗ «Набережно- Челнинская инфекционная больница», блок "Б", г.Набережные Челны	149 250,00	78,00	4,00
6	ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», детская больница, г.Бугульма	99 500,00	80,00	6,00
7	ГАУЗ «Межрегиональный клинко-диагностический центр», стационарные блоки, г.Казань, ул.Карбышева, д.12а	99 500,00	82,00	12,00
8	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», лечебно- диагностический корпус, Высокогорский район, пос.ж./д.ст.Высокая Гора	33 425,94	88,00	6,00
ИТОГО лимит по программе		1 625 940,26	80,12	3,85

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
9	ГАУЗ «Ленинградская центральная районная больница», терапевтический корпус, г.Ленинградск	33 289,58	96,00	4,00
10	ГАУЗ «Нижекамская центральная районная многопрофильная больница», лечебный корпус № 3, г.Нижекамск	135 606,72	96,00	2,00
11	ГАУЗ «Буинская ЦРБ», корпус А, В, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137	114 425,00	98,00	1,00
12	Университетская клиника Казанского Федерального университета, здания сердечно-сосудистого и неврологического стационаров, г.Казань, ул.Чехова, д.1а	49 750,00	99,00	3,00
13	ГАУЗ «Апастовская ЦРБ», Апастовский район	57 506,51	99,00	4,00
ИТОГО лимит по программе		1 625 940,26	80,12	3,85

ГАУЗ «ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ» ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ГАУЗ «БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ», ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО РТ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Административное здание Отдела полиции «Гвардейский» Управления МВД России по г. Казани, ул. Патриса Лумумбы, д.52	6 467,50	40,00	4,00
2	Здания №1, №2 МВД по Республике Татарстан г. Казань, ул. Дзержинского, д.19/23, ул. Карла Фукса, д.3а/22	28 715,69	45,00	20,00
3	Здание караульного помещения и ограждение территории складов г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д.29	29 551,50	46,00	7,00
4	Административное здание Отдела полиции «Танкодром» Управления МВД России по г. Казани, г. Казань, ул. Курчатова, д.7а	995,00	70,00	10,00
5	Здание Отдела полиции «Зареченский» Управления МВД России по г. Казани, г. Казань, ул. Димитрова, д.11	4 975,00	80,00	13,00
6	Здание Отдела полиции "Центральный" Управления МВД России по г.Набережные Челны, ул.Шамякина Усманова д.59а	16 253,33	85,00	15,00
ИТОГО лимит по программе		108 251,01	62,73	11,26

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО РТ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
7	Нежилое помещение Отдела МВД России по Тукаевскому району г. Набережные Челны, ул. Габдуллы Тукая, д.35	9 353,00	92,00	4,00
8	Здание гаража ФКУ «ЦХиСО МВД по Республике Татарстан» г. Казань, ул. Богатырева, д.10	7 960,00	97,00	7,00
ИТОГО лимит по программе		108 251,01	62,73	11,26
9	Административное здание Отдела МВД России по Высокогорскому району, Республика Татарстан, поселок Высокая Гора, ул. Советская, д.25	3 980,00	100,00	0,00

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ТУКАЕВСКОМУ РАЙОНУ, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани СОЛ «Молодая гвардия»	40 243,71	51,00	4,00
2	ДОЛ «Солнышко» ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Высокогорского муниципального района	114 384,7	68,00	7,00
3	МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района (1 этап)	155 220,00	95,00	5,00
4	ДОЛ «Алмалы» МБУ «Подростковый клуб «Ровесник» Агрызского муниципального района	23 715,90	98,00	1,00
ИТОГО лимит по программе		518 754,29	87,53	4,25
5	СОЛ «Чайка» МБУ «Молодежный центр «Чайка» Зеленодольского муниципального района	172 093,38	100,00	-
6	Детский оздоровительный лагерь «Звездный» государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	13 096,60	100,00	-

МБУ «ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «КАМСКИЙ АРТЕК», НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Молодёжный (подростковый) клуб «Сандугач» г.Казань, ул.Гагарина, 77б	30 017,16	24,00	4,00
2	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства» с.Тлэнче Тамак, ул.Татарстан, д.19, Тукаевский	11 538,23	97,00	0,00
3	Молодёжный (подростковый) клуб «Икар-2» г.Казань, ул.Рахимова,23	4 844,66	99,00	0,00
ИТОГО по программе		91 594,38	74,70	1,25

МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА», ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики Татарстан г.Агрыз, ул.К.Маркса, д. 103 б	32 047,97	51,00	0,00
2	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан г. Нижнекамск, ул.им.Габдуллы Тукая, д. 25	41 671,51	74,00	0,00
3	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан г.Бавлы, ул.Пионерская, д.18	29 934,19	81,00	5,00
4	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Зилант» Кукморского муниципального района Республики Татарстан г.Кукмор, ул.Ленина, д. 34	12 608,74	85,00	14,00
5	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Савиново» г.Казани ул. Адоратского, д. 36 а	22 269,41	92,00	2,00
ИТОГО лимит по программе		471 560,82	92,20	1,42

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
6	Государственная автономное образовательное учреждение "Альметьевский колледж физической культуры") с благоустройством территории и приобретением оборудования) г.Альметьевск, пр.Р.Фахретдина, д.5	33 072,57	99,00	5,00
7	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» им.М.Ш.Бибишева» г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.25	115 157,35	99,50	0,00
ИТОГО лимит по программе		471 560,82	92,20	1,42

МАУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВИТЯЗЬ» ИМ.М.Ш.БИБИШЕВА» Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО РТ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Здание гаража для служебных автомашин УВО по городу Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», г. Казань	30 564,51	88,00	3,00
ИТОГО лимит по программе		100 852,46	96,66	1,24

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОВО ПО САБИНСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН», САБИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (ДШИ)



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Заинский, МБУ ДО «Заинская детская музыкальная школа» Заинского муниципального района, г.Заинск, ул.Ленина, д.9А	39 705,57	100,00	5,00
2	Черемшанский, МБУ ДО «Детская школа искусств» Черемшанского муниципального района, с.Черемшан, ул.Первомайская, д.26	27 764,18	100,00	5,00
ИТОГО лимит по программе		143 881,63	100,00	2,34
3	Чистопольский, МБОУ ДО «Детская художественная школа» Чистопольского муниципального района, г.Чистополь, ул.Вахитова, д.32	2 142,87	100,00	-
4	Зеленодольский, МБУ ДО «Зеленодольская детская художественная школа», г.Зеленодольск, ул.Засорина, 4А	56 547,94	100,00	-
5	Лениногорский, МБОУ ДО «Лениногорская детская художественная школа им.М.Х.Хаертдинова», г.Лениногорск, пр.Ленина, д.4	8 925,27	100,00	-
6	Пестречинский, МБУ ДО «Детская школа искусств» Пестречинского муниципального района, с.Пестрецы, Почтовая, д.1	8 795,80	100,00	-

МБУ ДО «ЗАИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА», ЗАИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «КЦСОН «Изгелек» МТЗ и СЗ РТ в Атнинском муниципальном районе», Атнинский	2 500,00	32,63	0,00
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	5 000,00	90,00	23,00
3	ГАУСО «КЦСОН «Тылсым» МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе», Кукморский	3 000,00	94,00	1,00
ИТОГО лимит по программе		99 976,00	97,64	9,70

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	Строительство канализационной насосной станции с сетями по ул. Советской в г. Болгар, Спаский муниципальный район	3 500,00	69,65	14,92
2	Строительство биологических очистных сооружений в поселке ж.-д. станции Высокая Гора и систем водоотведения в с.Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район	66 559,17	69,65	14,92
3	Капитальный ремонт систем водоотведения в г. Нурлат, Нурлатский муниципальный район	37 354,11	70,00	6,00
4	Реконструкция очистных сооружений и системы водоотведения в с. Актаныш, Актанышский муниципальный район	5 010,68	79,60	9,95
5	Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосных станций в с. Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район	5 099,17	91,54	6,96
ИТОГО		161 132,14	78,87	8,18
6	Капитальный ремонт системы водоотведения в г. Мамадыш, Мамадышский муниципальный район	10 500,0	100,00	-
7	Капитальный ремонт биологических очистных сооружений первой линии в г. Лаишево, Лаишевский муниципальный район	6 674,05	100,00	-
8	Строительство сетей водоотведения в пгт. Алексеевское, Алексеевский муниципальный район	26 434,96	100,00	-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



Актанышский район



Нурлатский район

РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНОВКИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ И КОТЛОВ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершенных объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	г.Казань	2	0	7 874,32	13,80	13,80
2	Зеленодольский	2	0	428,48	75,00	15,00
3	Елабужский	1	0	2 153,62	85,00	15,00
4	Алексеевский	1	0	13 268,88	90,00	0,00
5	Пестречинский	3	1	19 115,49	91,75	0,00
6	Кукморский	10	0	51 153,38	92,67	3,67
7	Арский	1	0	12 306,86	95,00	0,00
8	Атнинский	1	0	3 260,94	95,00	0,00
9	Буинский	5	0	2 825,47	95,00	0,00
10	Тукаевский	2	1	24 000,00	95,63	0,00
11	Ютазинский	6	1	1 880,72	96,20	0,80
12	Сабинский	2	1	12 344,69	96,36	3,65
	ИТОГО:	37	5	150 827,02	89,15	2,52
13	Бугульминский	1	1	214,17	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУКМОРСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



с. Вильмон



с. Киндери Куль

ВОДОБЕСПЕЧЕНИЕ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершённых объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	Нижнекамский	4	0	8 401,23	4,19	1,29
2	Пестречинский	5	0	10 413,42	58,71	3,39
3	Азнакаевский	2	1	4 547,01	74,56	47,24
4	Тукаевский	9	0	23 006,62	75,70	2,69
5	Сармановский	2	0	6 125,77	81,00	51,00
6	Арский	1	0	1 087,40	90,00	0,00
7	Высокогорский	1	0	2 547,69	90,00	0,00
8	г.Казань	7	5	16 327,21	90,97	17,12
9	Зеленодольский	6	2	8 433,72	91,97	31,86
10	Верхнеуслонский	10	8	16 499,68	94,91	14,32
11	Лайшевский	6	4	15 292,67	99,07	1,72
ИТОГО:		61	28	134 325,00	82,31	15,41
12	Заинский	3	3	11 404,72	100,00	52,50
13	Алексеевский	1	1	193,80	100,00	10,00
14	Елабужский	3	3	6 733,84	100,00	5,06
15	Буинский	1	1	3 310,22	100,00	0,00

УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершенных объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	Пестречинский	2	0	391,59	75,01	5,00
2	Высокогорский	1	0	576,24	95,00	0,00
3	Зеленодольский	5	4	1 251,83	98,52	15,17
4	Верхнеуслонский	2	1	348,37	99,14	9,14
ИТОГО:		30	25	9 900,15	98,50	2,43
5	Буинский	1	1	576,24	100,00	0,00
6	Тукаевский	13	13	5 616,78	100,00	0,00
7	г. Казань	6	6	1 139,1	100,00	0,00

ВОДОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



Тукаевский район



Елабужский район

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершенных объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	Верхнеуслонский	2	0	8 708,00	28,30	23,91
2	Муслюмовский	1	0	8 708,00	35,00	5,00
3	Кукморский	3	1	8 708,00	39,54	8,58
4	Бугульминский	3	2	8 708,00	42,09	3,17
5	г.Казань	5	3	23 898,00	47,72	0,00
6	Арский	4	0	15 908,00	52,39	15,54
7	Актанышский	2	1	8 708,00	58,04	41,96
8	Чистопольский	3	1	8 708,00	70,75	9,67
9	Пестречинский	3	1	13 533,00	71,65	3,72
10	Нурлатский	4	2	8 708,00	73,39	5,08
11	Алексеевский	2	0	8 708,00	73,67	22,06
12	Елабужский	3	0	8 708,00	79,61	26,36
13	Спасский	3	1	8 708,00	80,22	4,83
14	Балтасинский	5	2	23 708,00	81,66	0,99
15	Мамадышский	1	0	8 708,00	84,58	4,98
ИТОГО:		129	85	579 750,00	85,31	7,42

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершённых объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
16	Апастовский	4	2	31 808,00	85,08	11,57
17	Сабинский	3	0	15 958,00	85,28	0,00
18	Атнинский	4	1	8 708,00	85,79	8,82
19	Зеленодольский	2	1	8 708,00	87,94	16,86
20	Менделеевский	1	0	8 708,00	89,55	9,95
21	Буинский	8	7	57 908,00	89,80	12,53
22	Ютазинский	3	2	8 708,00	94,26	22,21
23	Дрожжановский	5	4	57 908,00	95,51	0,00
24	Высокогорский	3	2	8 708,00	96,90	1,39
ИТОГО:		129	85	579 750,00	85,31	7,25

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



Аксубаевский район



Апастовский район

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершенных объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	г.Казань	18	17	29 356,33	91,94	7,74
ИТОГО:		466	465	209 405,94	99,02	5,25


ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



г. Казань

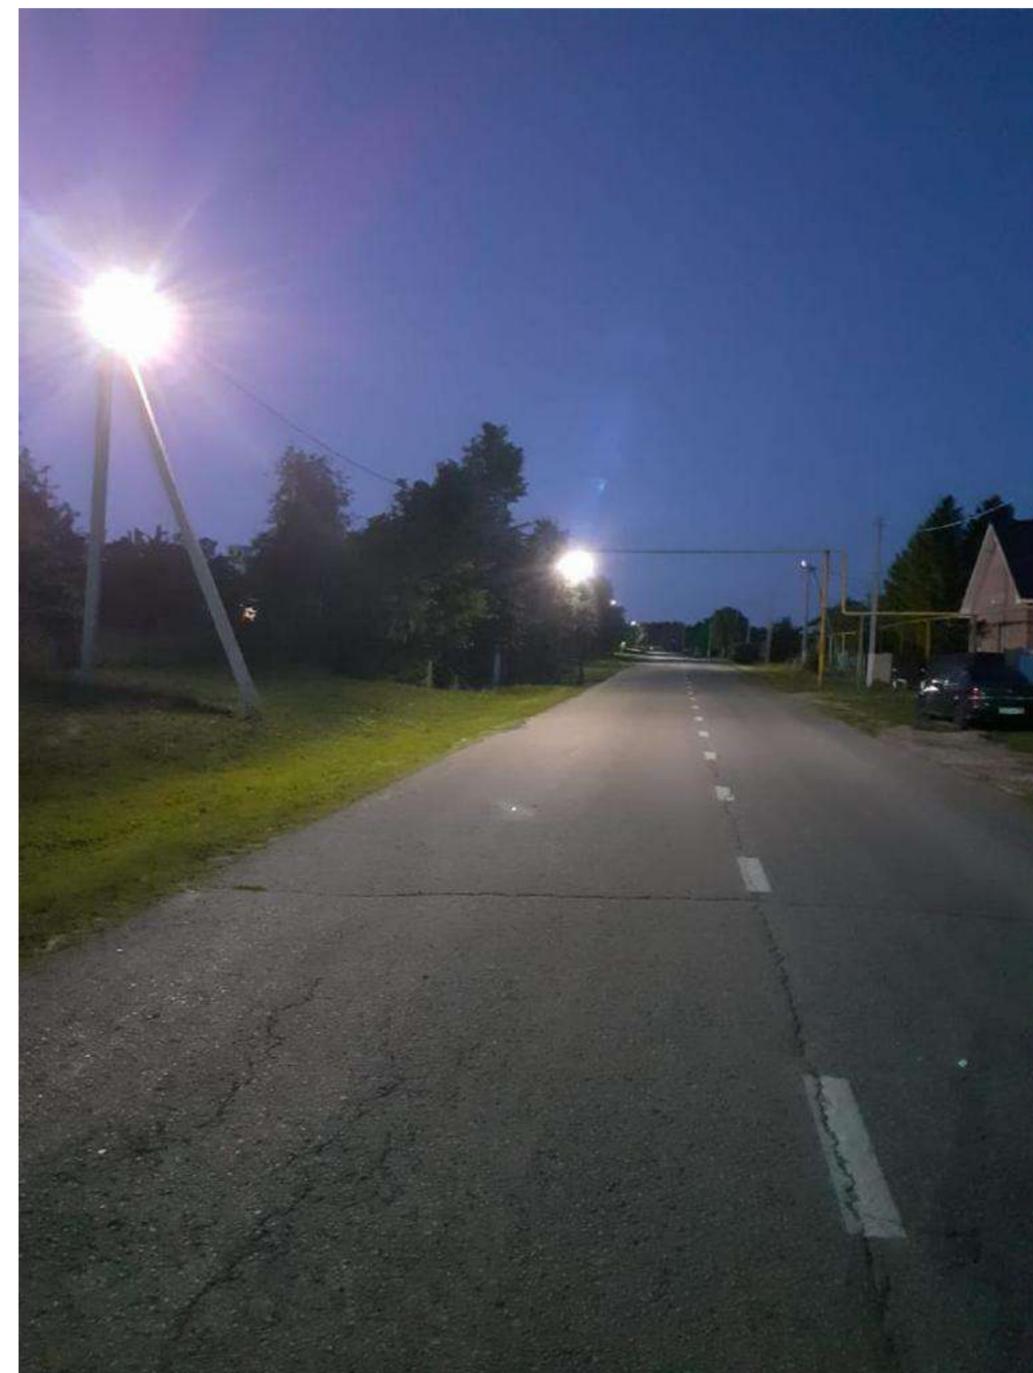

г. Нижнекамск

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ЗАМЕНОЙ КОТЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



№	МО РТ	Количество объектов	Количество завершенных объектов	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
1	Апастовский	1	0	1 850,00	95,00	0,00
2	Кайбицкий	1	0	2 931,13	96,00	1,00
3	Тетюшский	1	0	2 600,00	97,00	3,00
4	Высокогорский	1	0	2 300,00	98,00	3,00
ИТОГО:		44	40	64 073,27	99,52	3,34

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ЗАМЕНОЙ КОТЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН



КУКМОРСКИЙ РАЙОН

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2021 ГОД

41 МО

1035 ДОМОВ,
В Т.Ч.

дополнительно
102 дома



БЮДЖЕТ РТ



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ



СОБСТВЕННИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЫПОЛНЕНИЕ СМР В РАЗРЕЗЕ МО



№ п/п	МО РТ	Кол-во домов	Лимит, млн.руб.	Выполнение сезонных работ		Общее выполнение СМР		Принято НО «Фонд ЖКХ РТ» КС-2, %
				% от лимита	Динамика за 2 недели	% от лимита	Динамика за 2 недели	
1	Пестречинский	18	40,35	53,66	7,00	31,55	0,00	0,00
2	К.-Устьинский	5	10,20	62,00	1,00	58,45	0,00	54,53
3	Новошешминский	2	4,77	65,00	5,00	77,68	0,00	38,41
4	Алексеевский	6	11,14	68,00	4,00	69,92	3,84	49,27
5	Р.-Слободский	4	7,25	68,00	15,00	55,38	11,74	29,31
6	Зеленодольский	33	320,84	77,00	2,00	85,71	4,79	20,13
7	г. Казань	295	2 803,82	77,41	5,16	76,51	8,57	16,83
8	Арский	6	20,05	82,00	6,38	76,13	11,37	0,00
9	Менделеевский	11	58,61	84,00	4,00	76,12	7,97	35,55
10	Нижнекамский	98	611,41	84,00	4,00	91,33	6,86	58,37
11	Мамадышский	3	25,77	85,00	5,00	72,99	10,64	54,00
12	Черемшанский	4	2,40	85,00	5,00	95,71	0,73	0,00
13	Чистопольский	12	113,97	85,67	0,60	86,52	6,48	67,02
14	Лаишевский	8	25,91	87,00	5,00	88,15	9,53	48,94
15	г. Наб.Челны	152	1 466,37	87,63	1,12	94,24	8,90	53,67
16	Мензелинский	5	24,12	88,75	4,75	90,20	3,36	0,00
17	Бавлинский	11	43,74	91,19	6,19	93,63	6,02	62,42
18	Высокогорский	12	43,58	92,89	6,58	82,08	9,36	1,47
19	Азнакаевский	35	97,29	93,00	1,00	91,83	5,72	73,61
20	Альметьевский	37	339,29	93,61	1,11	96,08	6,96	51,11
21	Тукаевский	9	27,72	95,00	4,00	96,61	0,84	35,32
ИТОГО :		1035	7 030,53	88,56	2,69	84,61	7,98	36,94

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЫПОЛНЕНИЕ СМР В РАЗРЕЗЕ МО





№ п/п	МО РТ	Кол-во домов	Лимит, млн.руб.	Выполнение сезонных работ		Общее выполнение СМР		Принято НО «Фонд ЖКХ РТ» КС-2, %
				% от лимита	Динамика за 2 недели	% от лимита	Динамика за 2 недели	
22	Буинский	7	25,28	95,71	0,00	97,22	2,04	83,77
23	Бугульминский	35	240,64	96,00	1,00	92,56	5,78	62,24
24	Сармановский	19	44,79	96,00	0,00	94,49	6,52	51,30
25	Аксубаевский	9	7,24	98,00	0,00	88,86	10,71	84,32
26	Заинский	72	37,37	98,00	3,91	82,20	3,49	33,85
27	Елабужский	24	164,84	98,23	2,41	86,86	6,12	32,65
28	Агрызский	15	37,74	99,00	0,00	97,98	5,76	77,12
29	Спасский	3	7,43	99,00	0,00	95,40	0,00	32,87
30	Ютазинский	10	24,36	99,56	0,56	93,08	0,19	89,17
31	Тетюшский	7	10,70	99,67	0,00	94,30	0,95	0,00
32	Кукморский	7	24,46	99,78	0,28	95,30	2,09	36,46
33	Балтасинский	3	5,59	100,00	-	93,04	5,01	0,00
34	Верхнеуслонский	1	6,02	100,00	-	100,00	2,46	0,00
35	Лениногорский	25	142,2	100,00	-	99,62	6,48	86,77
36	Нурлатский	9	54,65	100,00	-	100,00	4,49	80,38
37	Апастовский	3	3,77	-	-	92,33	11,03	16,77
38	Сабинский	14	15,26	-	-	82,47	14,07	20,11
ИТОГО :		1035	7 030,53	88,56	2,69	84,61	7,98	36,94
39	Муслюмовский	3	7,34	100,00	-	100,00	0,00	100,00
40	Актанышский	2	9,92	100,00	-	100,00	3,91	100,00
41	Тюлячинский	1	0,48	-	-	100,00	0,00	100,00

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

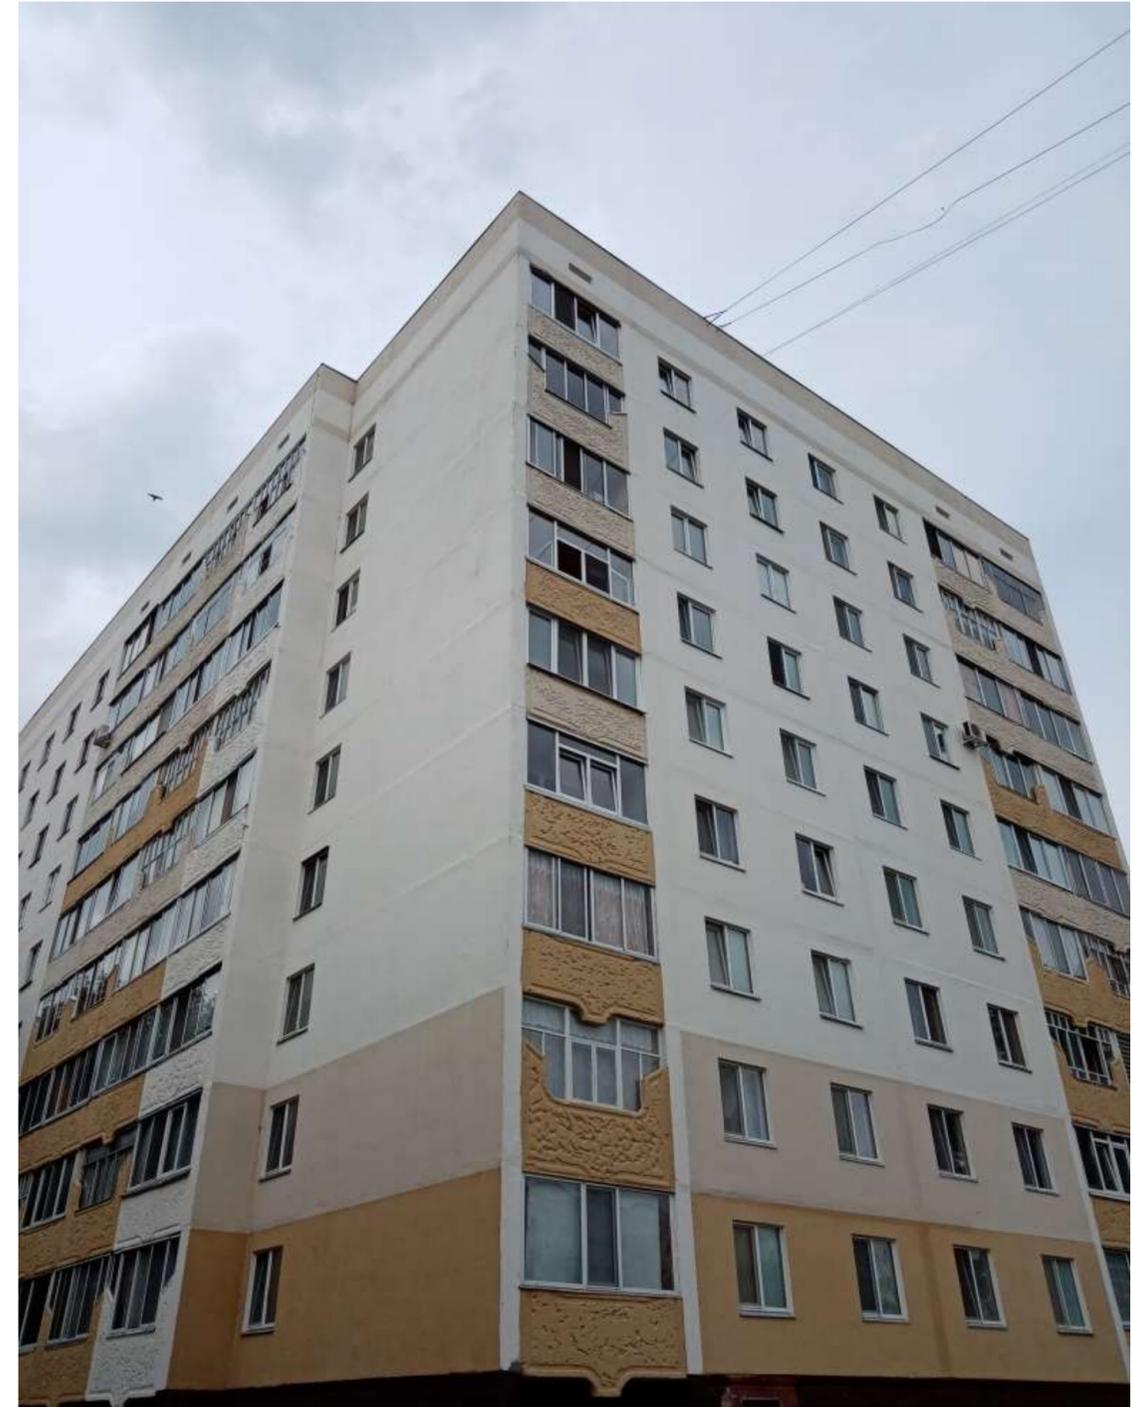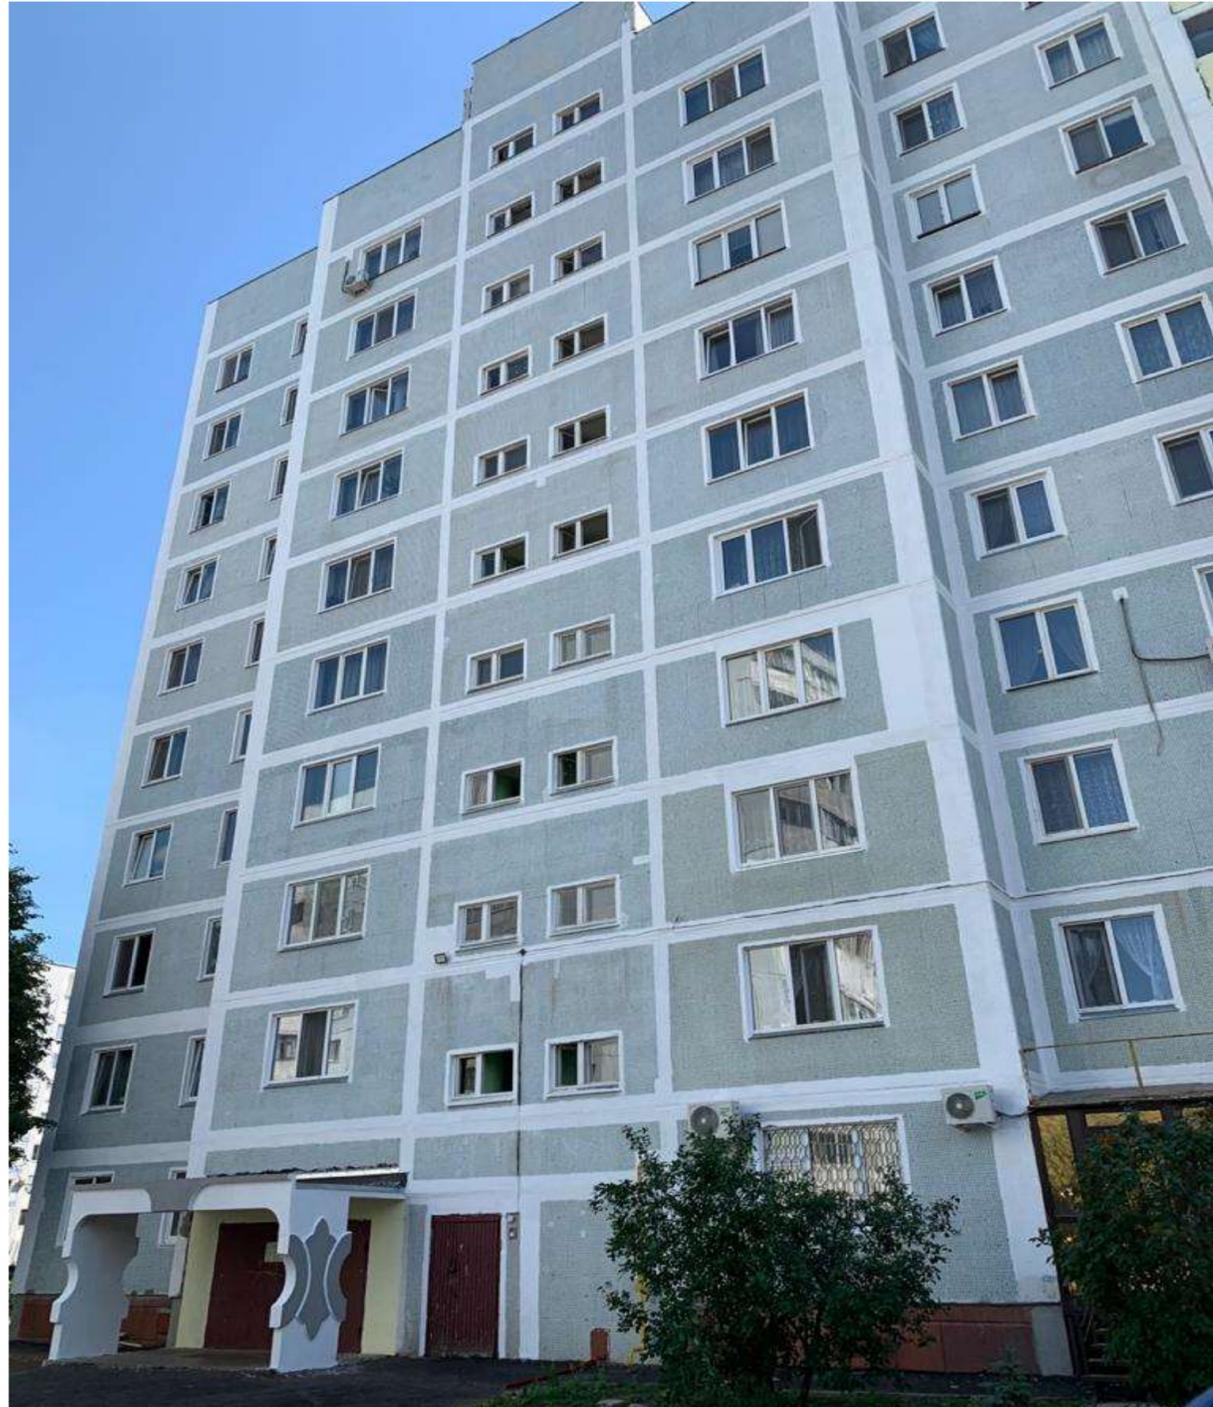

ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНЫХ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 ГГ.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2021

№	МО РТ	План	Факт	%	Динамика, %
1	Пестречинский	12	11	91,7	8,3
2	Казань	184	179	97,3	1,6
43 МО подготовку завершили					
	ВСЕГО по РТ	3 267	3 261	99,8	0,4

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 ГГ.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2021

№	МО РТ	План	Факт	%	Динамика, %
1	Пестречинский	32	31	96,9	3,1
2	Заинский	47	46	97,9	4,3
43 МО подготовку завершили					
	ВСЕГО по РТ	3 337	3 335	99,9	0,4

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 ГГ.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2021

№	МО РТ	План	Факт	%	Динамика, %
1	Менделеевский	27	26	96,3	0,0
2	Азнакаевский	57	56	98,2	5,3
43 МО подготовку завершили					
	ВСЕГО по РТ	2 014	2 012	99,9	0,6

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 ГГ.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2021

№	МО РТ	План	Факт	%	Динамика, %
1	Бугульминский	43	41	95,3	0,0
44 МО подготовку завершили					
	ВСЕГО по РТ	1 970	1 968	99,9	0,4

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ СПОРТА К ОТОПИТЕЛЬНОВОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 ГГ.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2021

№	МО РТ	План	Факт	%	Динамика, %
1	Казань	23	22	95,7	0,0
44 МО подготовку завершили					
	ВСЕГО по РТ	243	242	99,6	1,2

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ 2021/2022ГГ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА




№	МО РТ	План	Факт	%	Дин-ка
1	Балтасинский	45	42	93,3	3,3
2	Буинский	183	173	94,5	1,6
3	К-Устьинский	87	83	95,4	1,1
4	Верхнеуслонский	91	87	95,6	0,0
5	г. Казань	5 835	5 656	96,9	0,4
6	Пестречинский	422	412	97,6	4,0
7	Менделеевский	135	132	97,8	0,0
8	г. Н. Челны	1 433	1 408	98,3	2,1
9	Зеленодольский	920	906	98,5	0,2
10	Нижнекамский	999	985	98,6	0,5
11	Чистопольский	455	449	98,7	1,8
12	Арский	220	218	99,1	2,0
13	Бугульминский	875	868	99,2	1,8
14	Лениногорский	512	510	99,6	1,4
15	Елабужский	466	465	99,8	1,3
30 МО паспорта МКД получили					
ВСЕГО по РТ		17 470	17 186	98,4	2,4

ПРОГНОЗ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

по данным сайта «Gismeteo»



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

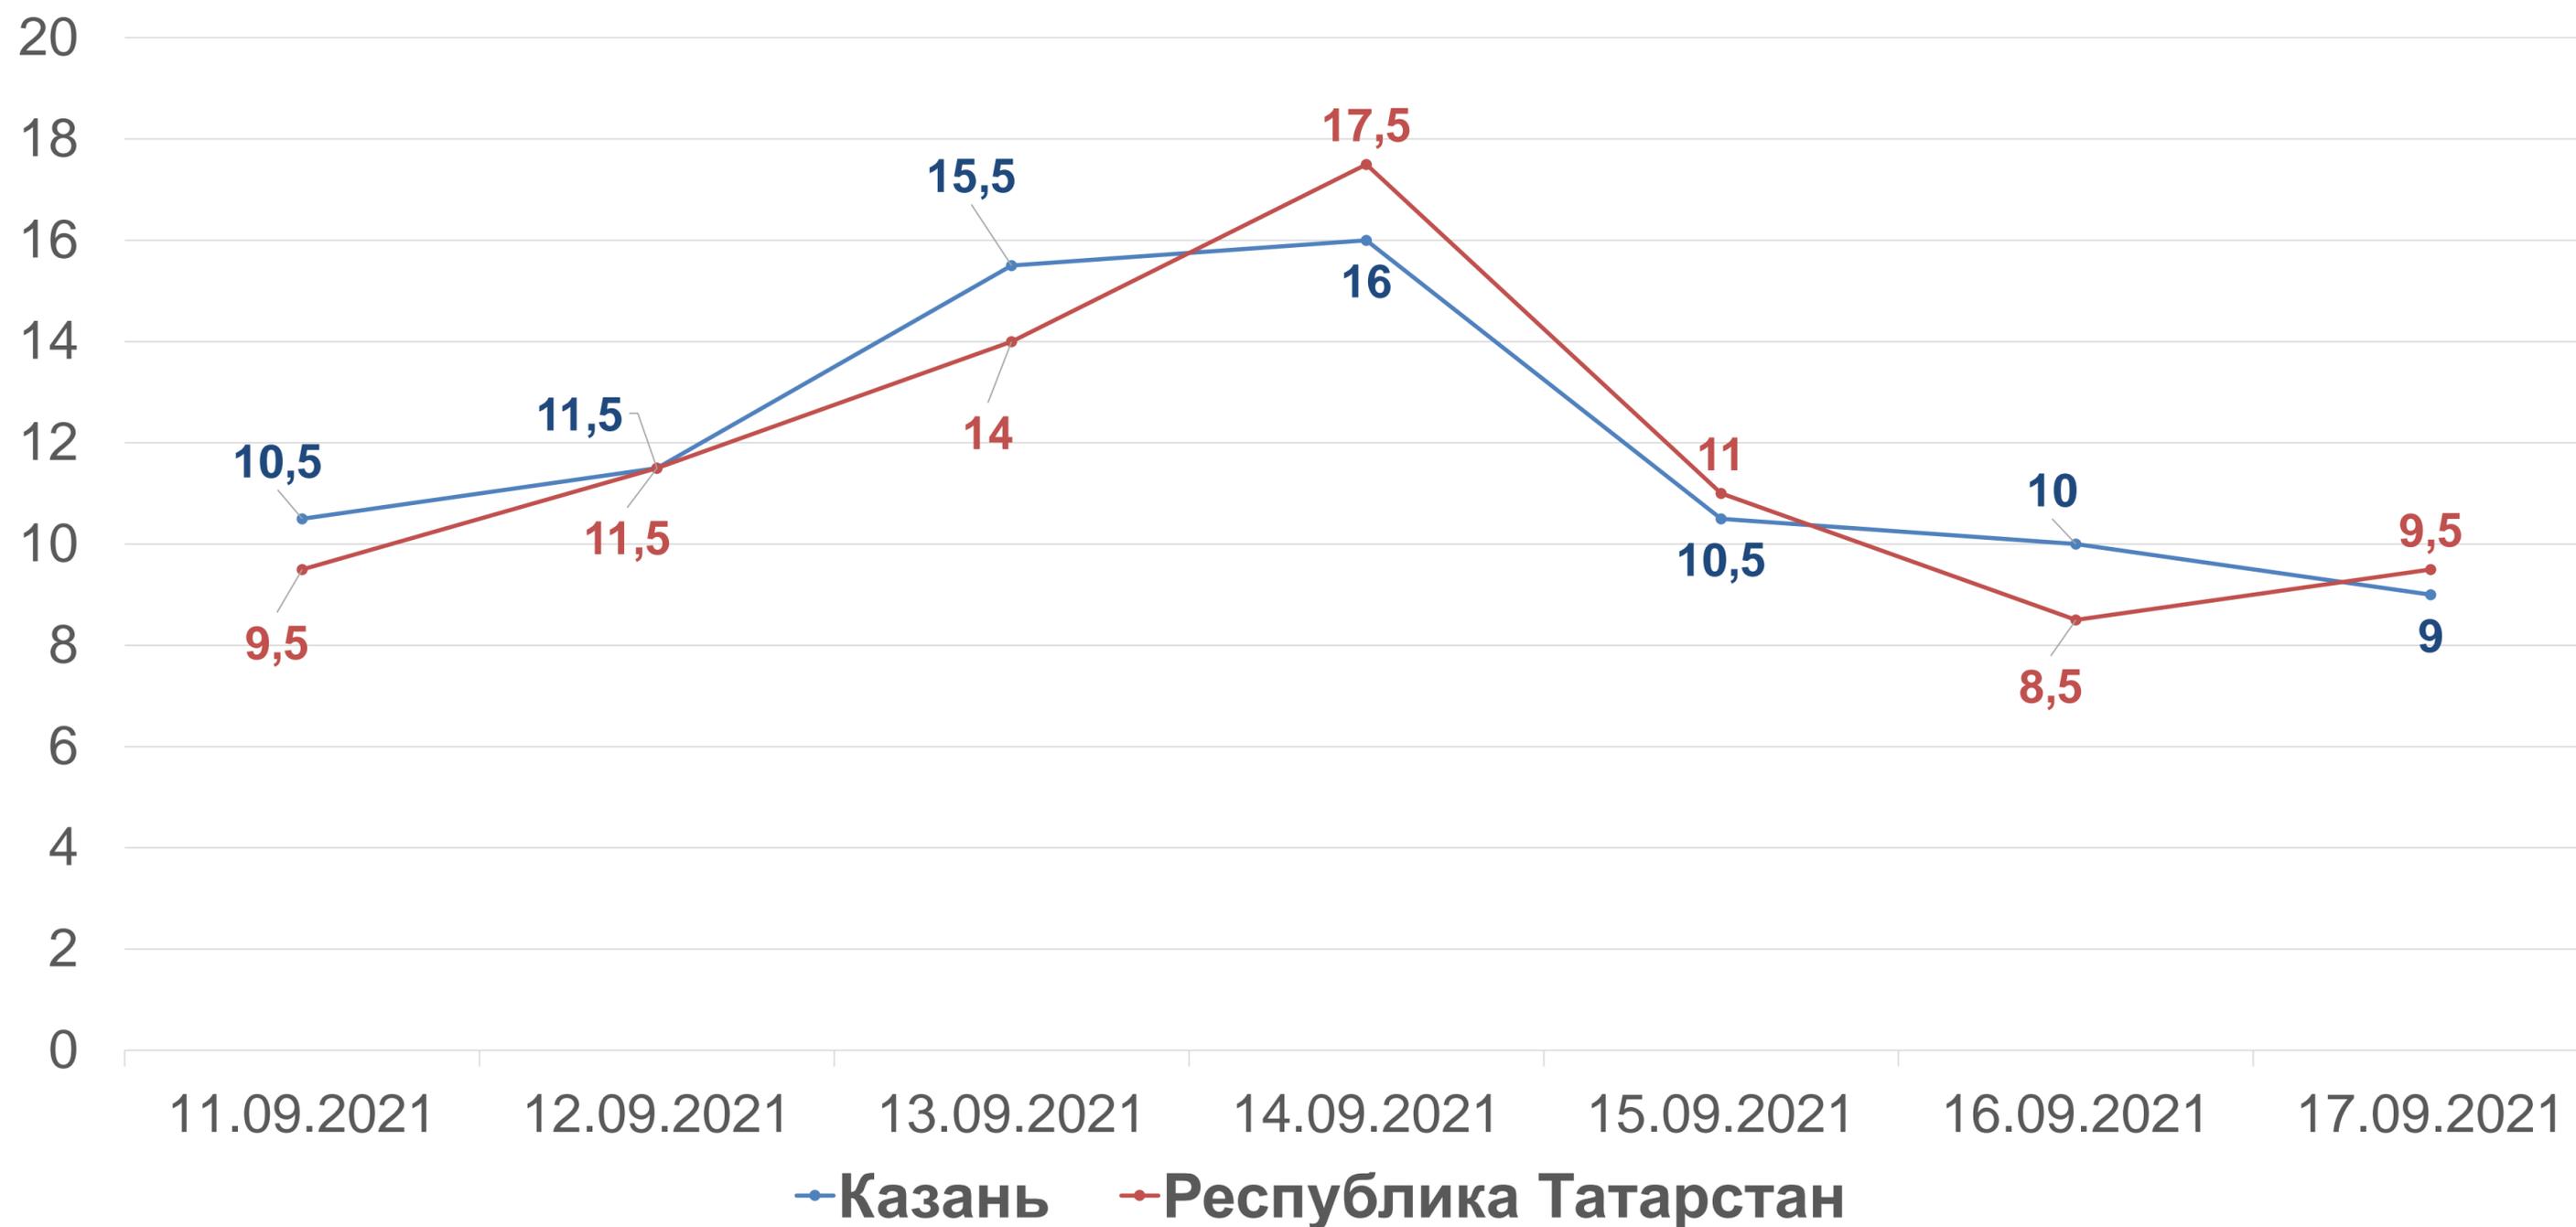

ПРОИЗВЕДЕН ПУСК ТЕПЛА на 10.09.2021 17.00 ч.



№	Объект	Произведен пуск	%
1	Котельные	667	20,42
2	Жилые дома	1 763	10,09
3	Школы	350	22,29
4	Детские сады	387	21,90
5	Здравоохранение	388	19,27
6	Культура	308	15,63
7	Спорт	37	15,23
8	Соцзащита	35	20,47



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
