



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

*18 сентября 2021 г.*

Сегодня докладываю о ходе строительства социально-значимых объектов в рамках республиканских программ и Национальных проектов, реализации программ обеспечения жильем граждан и подготовке к отопительному периоду.

# ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД




**17** программ, из них:  
*1 071 объект на 8 678,78 млн.руб.*

**1** программа реализована  
*49 объектов на 59,79 млн.руб.*

**16** программ в работе  
*1 022 объекта на 8 618,99 млн.руб.*

**Общий СМР составляет 77 %**

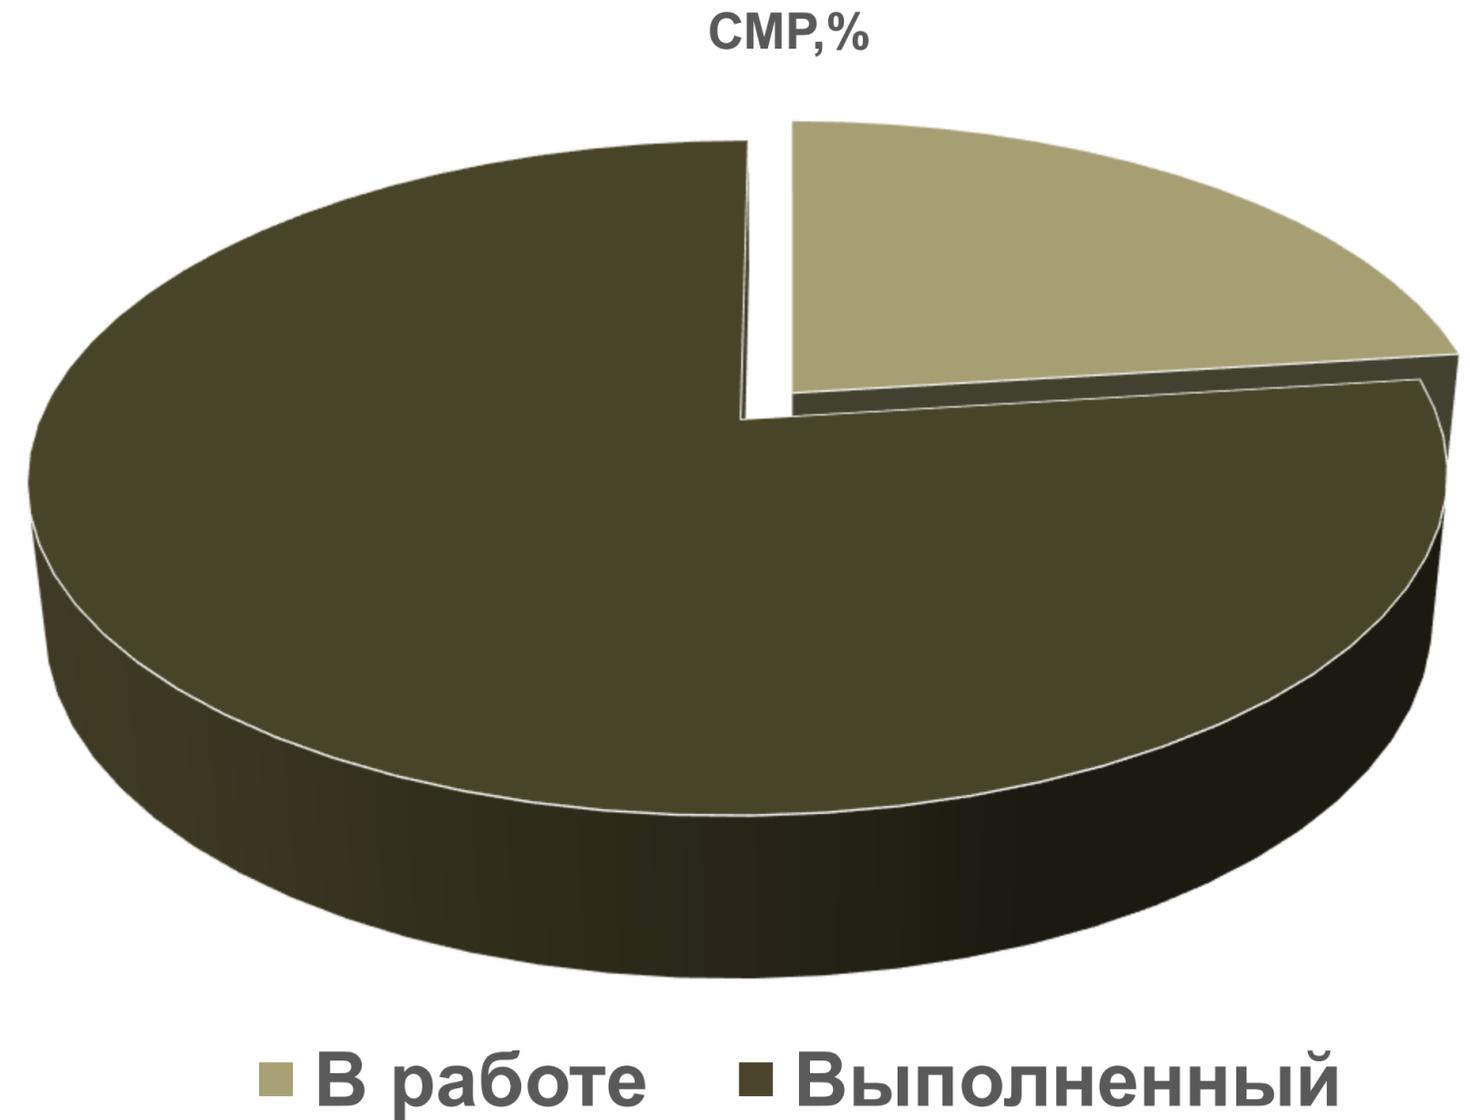

Общий процент выполнения программ к настоящему моменту оставляет 77%. Напомню, суммарная сметная стоимость 17-ти программ, реализуемых республикой, превышает 8 млрд 600 млн рублей.

# ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



**6** национальных проектов


**12** федеральных проектов

**95** объектов (**21** объект завершен)

**3,77** тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 11 341,15 млн рублей  
(освоено 5 967,84 млн рублей)*

**Общий СМР составляет 84,65%**

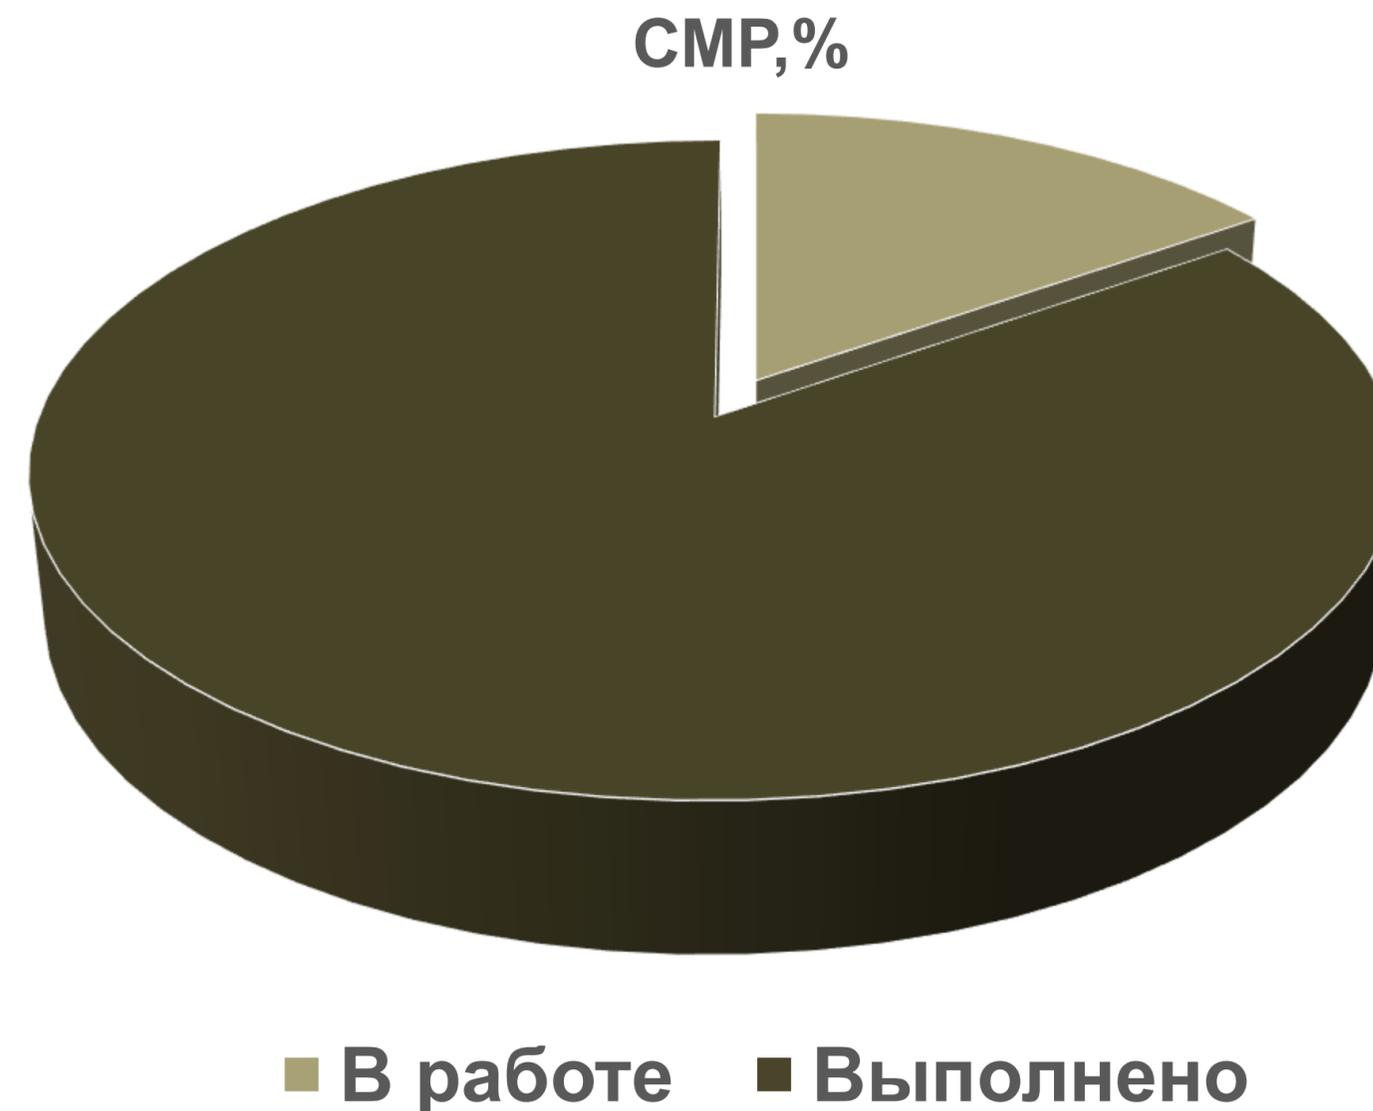

Еще 11 млрд выделено на реализацию Нацпроектов. В общей сложности по ним мы строим 95 объектов, 21 из которых мы уже завершили. В целом работы по Нацпроектам выполнены на 85%.

# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СМР/%
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	1. ФП «ЖИЛЬЕ»	1-школа (поставка оборудования)	100,00
		3-детских сада	84,37
		3 (1-очистн. сооруж., 1 внутриплоч. сети водоснабж., 1 внеплоч. сети водоснабж.)	47,00 55,00 100,00
		2. ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы)
	3. ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	8 (конкурс малых городов 2021 г.)	81,43
		1 (строительство станц. водопод.)	65,00
НП «ЭКОЛОГИЯ»	4. ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	1 реконструкция БОСК г.Казань	38,56
		1 строительство БОС в с.Коцаково	98,89
	5. ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки, переходящие объекты)	96,89
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	6. ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	100,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>95</b>	

# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СМР/%
НП «КУЛЬТУРА»	7. ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	3 - строительство дома культуры	39,67
		2- капитальный ремонт детских музыкальных школ	89,18
		2 - строительство центра культурного развития	41,60
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	8. ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	89,16
	9. ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал)	100,00
		1 (Поставка оборудования для создания ФОК)	100,00
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	10. ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	100,00
	11. ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	100,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>95</b>	

# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	69,50	3,50
2	ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район, ЖК «Столичный»	270 800,59	72,00	7,00
3	ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК «Лето»	268 455,01	80,00	8,00
4	ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	170 635,35	81,10	3,10
5	ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, д.Эстачи	270 800,59	84,00	9,00
6	ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	178 868,36	84,00	2,00
7	ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	268 612,14	89,00	4,00
8	ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	187 244,21	91,00	3,00
9	ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал ЖК «Салават Купере» (позиция 2)	279 750,60	95,00	12,00
10	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	267 956,21	99,00	0,50
<b>ИТОГО</b>		<b>3 791 699,38</b>	<b>88,04</b>	<b>5,37</b>
11	ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	176 706,64	100,00	7,00
12	ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	101 217,12	100,00	-
13	ДОО на 120 мест в г. Казани, ЖК«Весна-2» (позиция 2)	166 751,14	100,00	-
14	ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	267 220,91	100,00	-
15	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	284 690,31	100,00	-
16	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	256 895,04	100,00	-

# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 140 МЕСТ МКР.УРСАЛА АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 220 МЕСТ ЖК «СВЕТЛЫЙ» ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 140 МЕСТ, Г.КАЗАНЬ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Мамадышский МР, Малокирменский	3 974,00	40,00	20,00
2	Тукаевский МР, Новотроицкий	5 293,44	40,00	20,00
3	Нижнекамский МР, Верхне-Челнинский	3 974,01	41,50	1,50
4	Верхнеуслонский МР, Введено-Слободский	3 974,01	47,00	2,00
5	Тюлячинский МР, Шармашинский	3 974,01	47,00	3,00
6	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 974,01	50,00	6,00
7	Кайбицкий МР, Бурундуковский	3 974,01	50,00	0,00
8	Тетюшский МР, Больше-Атрясский	3 974,00	50,00	30,00
9	Агрызский МР, Янга-Аулский	3 974,01	65,75	3,75
10	Елабужский МР, Гаринский	3 974,01	66,00	4,00
11	Ютазинский МР, Ташкичуйский	2 502,37	68,00	13,00
12	Дрожжановский МР, Коршанга-Шигалинский	2 502,37	70,00	5,00
13	Зеленодольский МР, Ильинский	3 974,00	70,00	0,00
14	Сабинский МР, Миченбашский	3 974,01	70,00	20,00
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>79,23</b>	<b>8,54</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Менделеевский МР, Актазикский	3 974,00	70,50	5,50
16	Актанышский МР, Старо-Зияшевский	3 974,00	74,00	10,50
17	Камско-Устьинский МР, Шапкинский	3 974,01	75,00	3,00
18	Пестречинский МР, Карповский	3 974,00	78,00	2,00
19	Заинский МР, Кадыровский	3 974,01	79,00	14,00
20	Высокогорский МР, Ювасинский	3 974,00	82,00	11,00
21	Лаишевский МР, Шуранский	3 974,01	85,00	10,00
22	Атнинский МР, Дусюмский	3 974,00	87,00	7,00
23	Новошешминский МР, Андреевский	3 974,00	87,00	12,00
24	Рыбно-Слободский МР, Шеморбашский	3 974,01	87,00	10,00
25	Спасский МР, Чечеклинский	3 974,00	84,00	4,00
26	Буинский МР, Малобуинковский	3 974,01	90,00	5,00
27	Азнакаевский МР, Ильбяковский	3 974,01	92,00	7,00
28	Алексеевский МР, Подлесно-Шенталинский	3 974,00	95,00	5,00
29	Арский МР, Среднекорсинский	3 974,00	97,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>79,23</b>	<b>8,54</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
30	Мензелинский МР, Атряклинский	3 974,00	97,50	2,50
31	Апастовский МР, Шигаевский	3 974,00	99,00	19,00
32	Альметьевский МР, Клементейкинский	3 974,00	99,00	29,00
33	Балтасинский МР, Смаильский	3 974,00	99,00	0,00
34	Аксубаевский МР, Новоузеевский	3 974,01	100,00	-
35	Алькеевский МР, Каракульский	3 974,00	100,00	5,00
36	Бавлинский МР, Татарско-Тумбарлинский	3 974,00	100,00	-
37	Бугульминский МР, Наратлинский	3 974,00	100,00	-
38	Кукморский МР, Янцобинский	3 974,00	100,00	-
39	Лениногорский МР, Нижне-Чершилинский	3 974,00	100,00	8,00
40	Нурлатский МР, Андреевский	3 974,00	100,00	-
41	Сармановский МР, Юлтимеровский	3 974,00	100,00	-
42	Черемшанский МР, Карамышевский	3 974,00	100,00	-
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>79,23</b>	<b>8,54</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, АЛКЕЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 368,39	60,00	8,00
2	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 368,39	70,00	20,00
3	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 217,17	75,00	2,00
4	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 217,17	85,00	4,58
<b>ИТОГО</b>		<b>55 171,12</b>	<b>72,73</b>	<b>8,65</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ НУРЛАТСКИЙ РАЙОН



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	53 860,69	93,00	7,00
2	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.1406	53 860,69	94,50	9,50
3	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	53 860,69	95,00	5,00
4	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	53 860,69	97,00	2,00
<b>ИТОГО</b>		<b>215 442,77</b>	<b>94,87</b>	<b>5,88</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 332 551,38	38,56	9,00
2	Строительство биологических очистных сооружений в с. Коцаково Пестречинского муниципального района	66 321,36	98,89	0,27
<b>ИТОГО</b>		<b>1 398 872,74</b>		

# РЕКОНСТРУКЦИЯ БОСК Г.КАЗАНИ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С. КОЩАКОВО, ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	719 880,00	96,15	3,50



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Строительство станции водоподготовки в п. Васильево Зеленодольского района	136 284,40	70,00	5,00



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	Динамика за 2 недели
1	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса «Светлая долина» г.Казани.	17 860,47	47,00	18,00
2	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	971,30	100,00	90,00
3	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	31 593,58	55,00	16,00

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, Парк отдыха, 2 очередь	32 515,25	25,00	5,00
2	Пестречинский, Детский городок	33 887,54	35,00	6,00
3	Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	41,00	5,00
4	Сабинский, Парк по ул. З.Юсупова, 2 очередь	23 173,86	50,00	10,00
5	Сармановский, Сквер «100 летия ТАССР»	25 746,23	52,00	7,00
6	Черемшанский, ул. Советская	14 051,74	60,00	8,00
7	Арский, Площадь Советская и ул. Большая, 4 очередь	38 578,72	60,00	12,00
8	Нижнекамский, Экопарк, 2 очередь	44 775,00	72,00	8,00
9	Н.Челны, Бульвар Юных Ленинцев, 2 очередь	49 750,00	72,00	7,00
10	Елабужский, Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани	64 253,96	72,00	4,00
11	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки, 4 очередь	10 363,18	75,00	3,00
12	Агрызский, ул. Карла Маркса, 3 очередь	26 117,80	77,00	7,00
13	Апастовский, Набережная р.Табарка	14 676,03	78,00	8,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>82,08</b>	<b>9,72</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс .рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
14	Верхнеуслонский, Парк отдыха	12 437,50	78,00	3,00
15	Менделеевский, Бульвар Интернационалистов	22 612,75	79,00	4,00
16	Аксубаевский, Сквер по ул. Мазилина, 3 очередь	21 056,55	79,00	0,00
17	Лениногорский, Парк «Мэхэббэт»	60 976,36	80,00	10,00
18	Новошешминский, Площадь перед зданием ЗАГС, 2 очередь	9 614,03	80,00	5,00
19	Нурлатский, Городское озеро	41 627,20	80,00	11,50
20	Балтасинский, Набережная вдоль реки Шошма	17 608,76	82,00	22,00
21	Атнинский, Парк по ул. Пионерская	9 690,00	82,00	5,00
22	Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 4 очередь	18 641,38	85,00	23,00
23	Тетюшский, Березовая роща, 2 очередь	16 234,49	85,00	15,00
24	Алькеевский, Сквер "Спортивный"	14 046,47	85,00	10,00
25	Бавлинский, Парк Победы и Трудовой славы, 3 очередь	26 925,90	85,00	0,00
26	Тюлячинский, Пруд в селе Баландыш	9 950,00	89,00	2,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>82,08</b>	<b>9,72</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
27	Ютазинский, Сквер по ул. Ленина	15 229,61	90,00	15,00
28	Чистопольский, Центральная площадь	24 403,99	90,00	7,00
29	Дрожжановский, Парк «Дуслык»	16 223,21	90,00	5,00
30	Алексеевский, Сквер по ул. Казакова (Парк Победы), 3 очередь	18 780,53	91,00	9,00
31	Нижнекамский, Школьный бульвар	9 950,00	92,00	23,00
32	Высокогорский, Сквер "100 лет ТАССР", 2 очередь	38 786,32	92,00	16,00
33	Нижнекамский, Сквер по ул. Корабельная	28 739,66	93,00	6,00
34	Тукаевский, Парк «Дружбы народов»	15 987,41	95,00	10,00
35	Зеленодольский. Парк «Березовая роща», мкр. Мирный, 2 очередь	92 953,60	95,00	7,00
36	Альметьевский, Внутриквартальный бульвар микрорайона Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул.Бигаш)	78 567,73	95,00	42,00
37	Тукаевский, Сквер по ул.Центральная	15 987,41	95,00	3,00
38	Нижнекамский, Пр.Химиков, 2 очередь	44 775,00	96,00	4,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>82,08</b>	<b>9,72</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
39	Альметьевский, Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская)	78 567,73	97,00	5,00
40	Азнакаевский, ул. Сююмбике, 2 очередь	45 226,26	97,00	0,00
41	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, 3 очередь	35 669,39	99,00	9,00
42	Заинский, Набережная р.Зай, 4 очередь	13 271,55	99,00	4,00
43	Муслюмовский, Парк "Спортивный"	14 536,12	100,00	30,00
44	Нижнекамский, Центральный сквер, 2 очередь	9 950,00	100,00	20,00
45	Камско-Устьинский. Набережная р. Волга, 2 очередь	11 092,01	100,00	8,00
46	Нижнекамский, Экстрим-парк	69 650,00	100,00	3,00
47	Спасский, Центральная площадь, 3 очередь	13 989,31	100,00	2,00
48	Заинский, Площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь	40 389,16	100,00	0,00
49	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 2 очередь	7 344,70	100,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>82,08</b>	<b>9,72</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

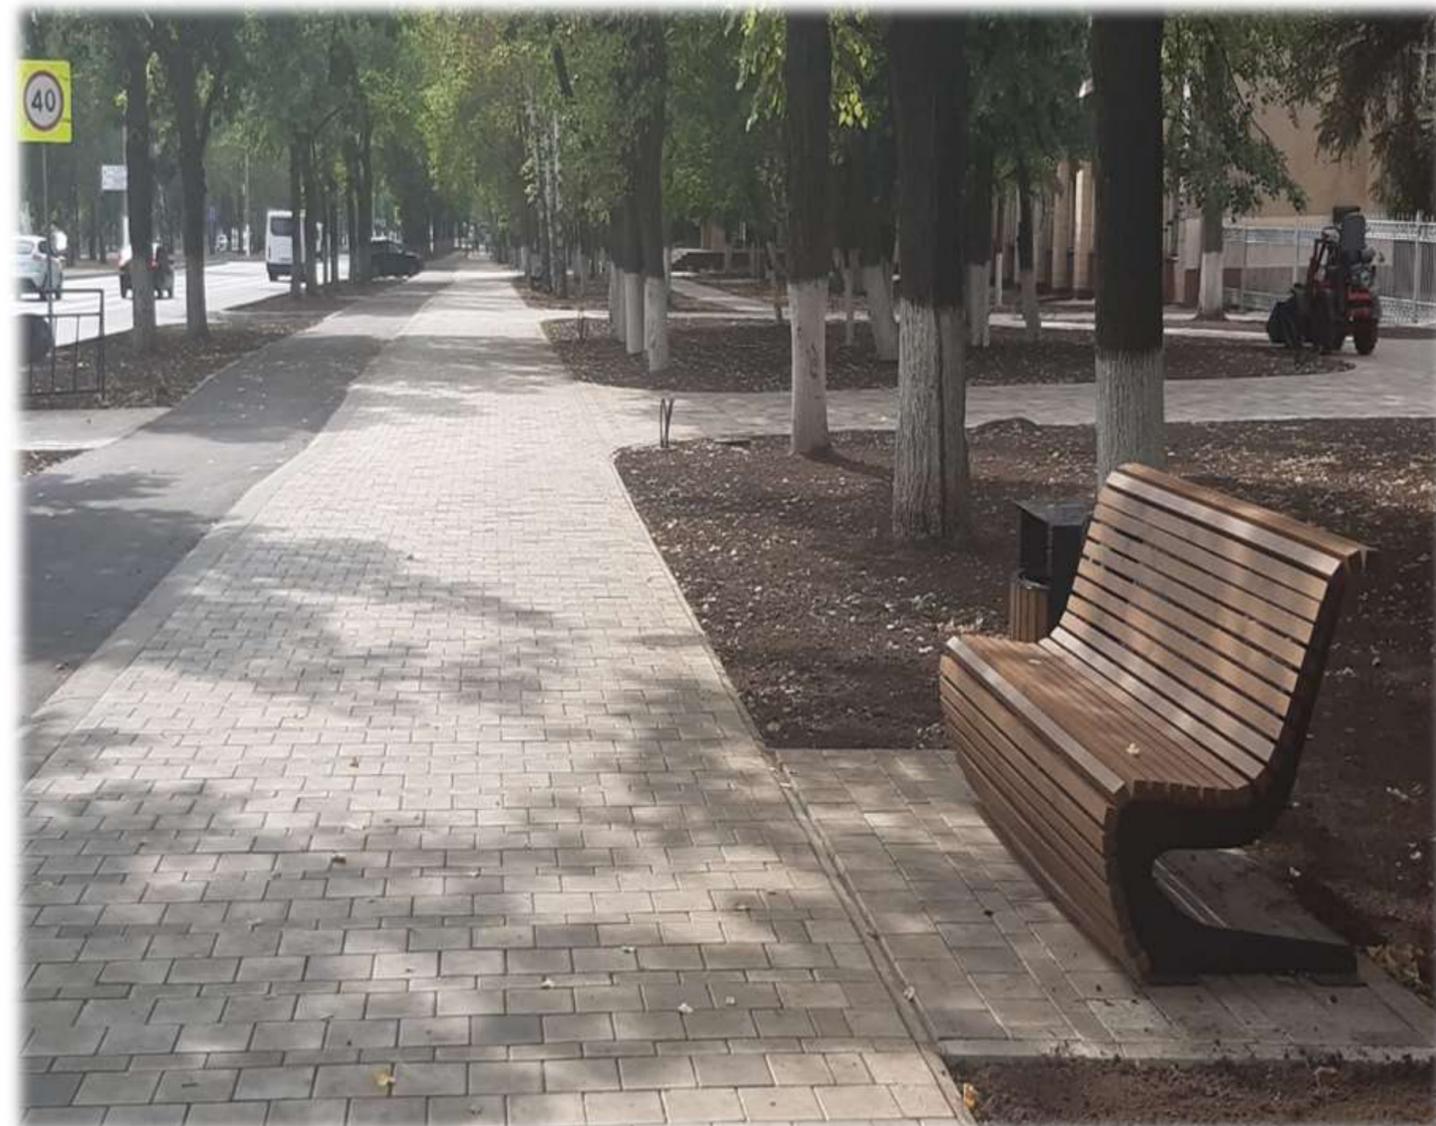

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	37,00	10,00
2	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	49 750,00	66,00	11,00
3	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	69 650,00	77,50	9,20
<b>ИТОГО</b>		<b>487 550,00</b>	<b>80,93</b>	<b>10,20</b>
4	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	79 600,00	86,00	8,00
5	Азнакаевский, Набережная реки Черная	69 650,00	87,00	7,00
7	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	49 750,00	87,00	5,00
6	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	49 750,00	98,00	18,00
8	Буинский, Центральная площадь	69 650,00	98,00	13,00

# БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	с.Кугарчино, ул.Зайтова, Рыбно-Слободский	5 363,59	94,00	9,00
2	п. Юлдуз, пер.Центральной, з/у 2а,Чистопольский	5 363,59	98,00	1,00
<b>ИТОГО</b>		<b>69 726,63</b>	<b>99,38</b>	<b>3,00</b>
3	с.Татарское Ходяшево, Пестречинский	5 363,59	100,00	1,00
4	с.Поисево, ул. Кирова, д.2А, Актанышский	5 363,59	100,00	1,00
5	с.Юхмачи, Ленина, д.1а, Алькеевский	5 363,59	100,00	-
6	с.Верхний Субаш, ул.Ленина, д.4, Балтасинский	5 363,59	100,00	-
7	с.Шугурово, ул. Ленина, д. 37, Лениногорский	5 363,59	100,00	-
8	с.Теньки, ул.Октябрьская, д.88А, Камско-Устьинский	5 363,59	100,00	-
9	с.Альшеево ул. Центральная, Буинский	5 363,59	100,00	-
10	г.Мензелинск, ул.Социалистическая, 65А, Мензелинский	5 363,59	100,00	-
11	с.Баландыш, ул.Гагарина, д.4, Тюлячинский	5 363,59	100,00	-
12	дер.Пойкино, ул.Первомайская, 51, Мамадышский	5 363,59	100,00	-
13	с.Бакрчи, ул.Гагарина, з/у 25а ,Тетюшский	5 363,59	100,00	-

# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ, АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ, ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	19,00	5,00
2	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	35,00	20,00
3	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	35,00	8,00
4	Строительство ДОЛ «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Камско-Устьинского муниципального района	30 118,12	62,00	15,00
5	Строительство МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 517,02	94,00	4,00
6	Строительство ДОЛ «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	77 051,25	100,00	-
<b>ИТОГО</b>		<b>380 273,06</b>	<b>46,17</b>	<b>10,40</b>

# МБУ «ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «КАМСКИЙ АРТЕК», НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Биктово, ул.Мирная	2 900,66	36,50	1,50
2	Тетюшский, с.Бессоново, ул.Стахановская	2 900,66	55,00	15,00
3	Дрожжановский, д.Татарские Тюки, ул.Советская	2 900,66	60,00	20,00
4	Пестречинский, с.Кулаево, ул.Профсоюзная	2 900,66	70,00	0,00
5	Кайбицкий, с.Мурали, ул.Центральная	2 900,66	78,00	6,00
6	Зеленодольский, с.Большие Ключи, ул.Волостнова	2 900,66	82,00	7,00
7	Кукморский, с.Каенсар, ул.1 Мая	2 900,66	83,00	3,00
8	Черемшанский, с.Мордовское Афонькино, ул.Цаплина	2 900,66	83,00	3,00
<b>ИТОГО</b>		<b>46 410,62</b>	<b>83,34</b>	<b>10,41</b>
9	Пестречинский, д.Надеждино, ул.Школьная	2 900,66	90,00	17,00
10	Сабинский, д.Куюк, ул.Татарстан	2 900,66	97,00	2,00
11	Актанышский, д.Нижнее Гареево, ул.Кирова	2 900,66	99,00	35,00
12	Елабужский, с.Новая Мурзиха, ул.Центральная	2 900,66	100,00	5,00
13	Сармановский, д.Кульметьево, ул.Хисамова	2 900,66	100,00	-
14	Чистопольский, с.Нарат-Елга, ул.Центральная	2 900,66	100,00	-
15	Алексеевский, с.Лебяжье, ул.65 лет Победы	2 900,66	100,00	-
16	Камско-Устьинский, д.Караталга, ул.Средняя	2 900,66	100,00	-

# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САБИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН






# ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

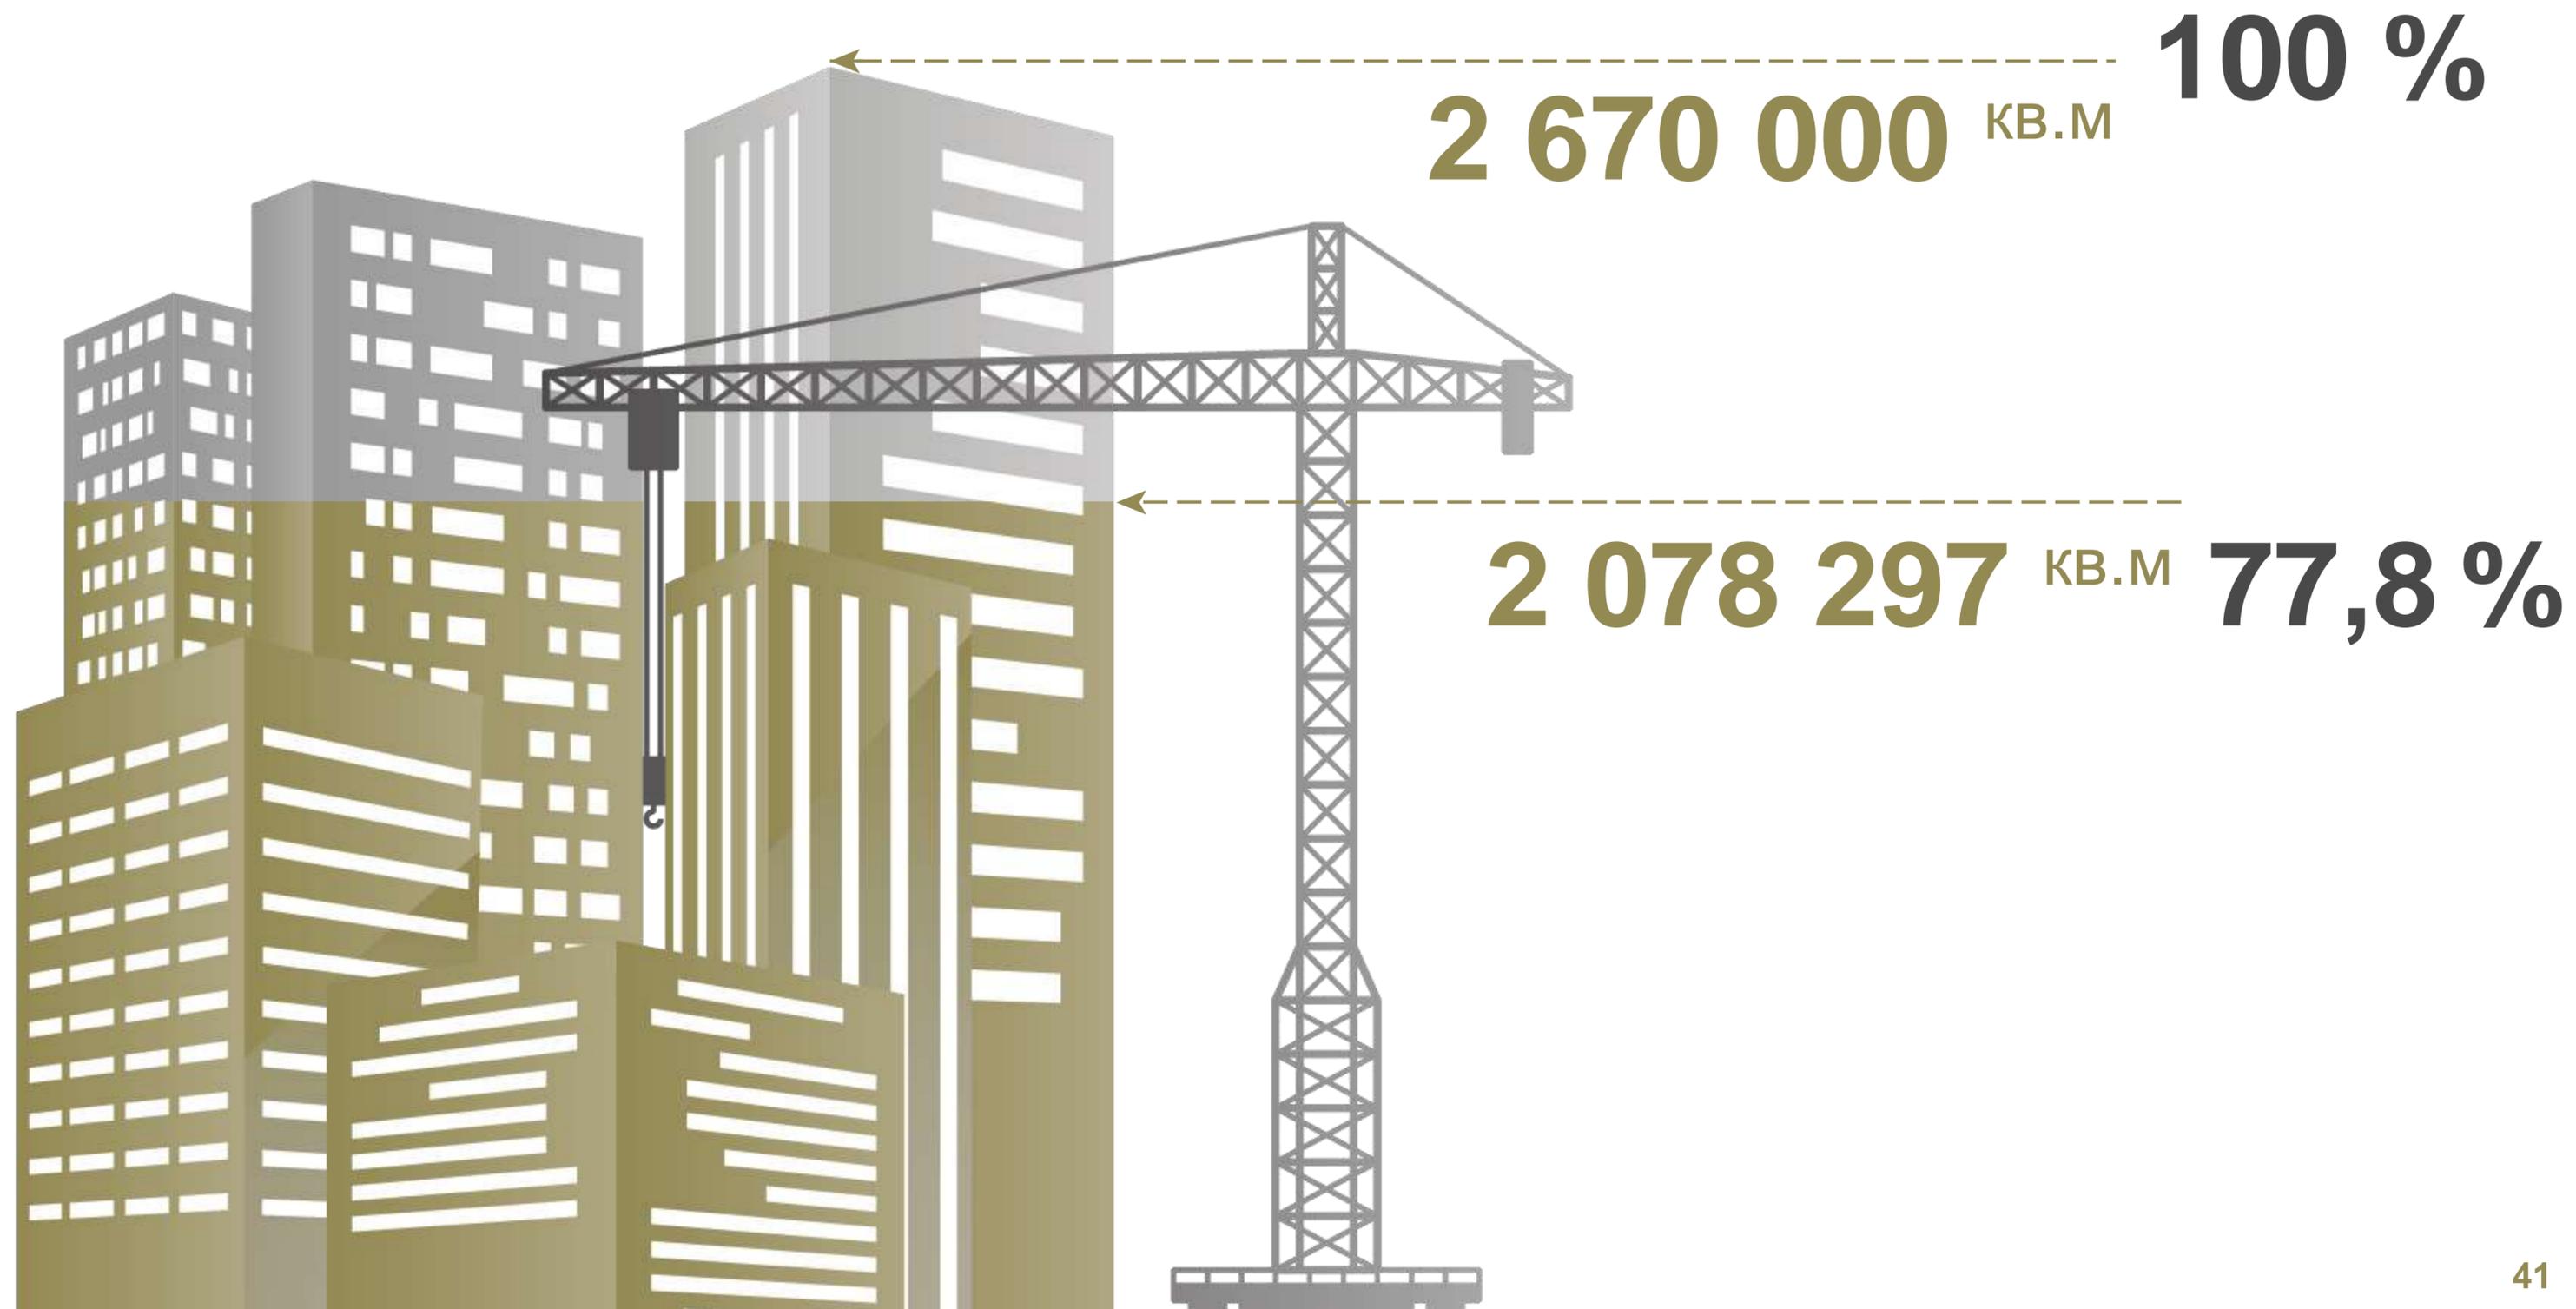

# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Лениногорский	25 000	6 822	27,3	18 178
2	Муслюмовский	10 000	3 398	34,0	6 602
3	Новошешминский	5 000	2 262	45,2	2 738
4	Нижнекамский	70 000	37 028	52,9	32 972
5	Чистопольский	22 000	12 264	55,7	9 736
6	Спасский	5 000	2 987	59,7	2 013
7	Буинский	16 000	9 748	60,9	6 252
8	Зеленодольский	90 000	54 994	61,1	35 006
9	Азнакаевский	22 000	14 021	63,7	7 979
10	В-Услонский	35 000	23 036	65,8	11 964
11	Альметьевский	120 000	79 737	66,4	40 263
12	Менделеевский	13 000	8 771	67,5	4 229
13	Агрызский	18 000	12 396	68,9	5 604
14	Сабинский	22 000	15 364	69,8	6 636
15	Нурлатский	17 000	11 884	69,9	5 116
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>2 078 297</b>	<b>77,8</b>	<b>591 703</b>

# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Апастовский	8 000	5 601	70,0	2 399
17	г.Наб.Челны	320 000	224 894	70,3	95 106
18	Аксубаевский	8 000	5 627	70,3	2 373
19	Тетюшский	10 000	7 117	71,2	2 883
20	Кайбицкий	5 000	3 577	71,5	1 423
21	Бавлинский	15 000	10 945	73,0	4 055
22	Арский	25 000	18 346	73,4	6 654
23	Балтасинский	15 000	11 095	74,0	3 905
24	Ютазинский	13 000	9 654	74,3	3 346
25	г.Казань	930 000	692 255	74,4	237 745
26	Алексеевский	16 000	12 136	75,9	3 864
27	Сармановский	10 000	7 706	77,1	2 294
28	К-Устьинский	7 000	5 412	77,3	1 588
29	Алькеевский	8 000	6 214	77,7	1 786
30	Заинский	20 000	15 790	79,0	4 210
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>2 078 297</b>	<b>77,8</b>	<b>591 703</b>

# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.




**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Дрожжановский	7 000	5 599	80,0	1 401
32	Елабужский	60 000	48 309	80,5	11 691
33	Актанышский	15 000	12 187	81,2	2 813
34	Мамадышский	20 000	16 522	82,6	3 478
35	Бугульминский	35 000	29 082	83,1	5 918
36	Р-Слободский	15 000	12 479	83,2	2 521
37	Мензелинский	14 000	11 779	84,1	2 221
38	Кукморский	27 000	23 047	85,4	3 953
39	Атнинский	4 000	3 746	93,7	254
40	Тюлячинский	7 000	6 618	94,5	382
41	Лаишевский	160 000	151 559	94,7	8 441
42	Черемшанский	6 000	5 908	98,5	92
43	Тукаевский	110 000	108 826	98,9	1 174
44	Пестречинский	190 000	192 379	101,3	0
45	Высокогорский	110 000	119 176	108,3	0
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>2 078 297</b>	<b>77,8</b>	<b>591 703</b>

# МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

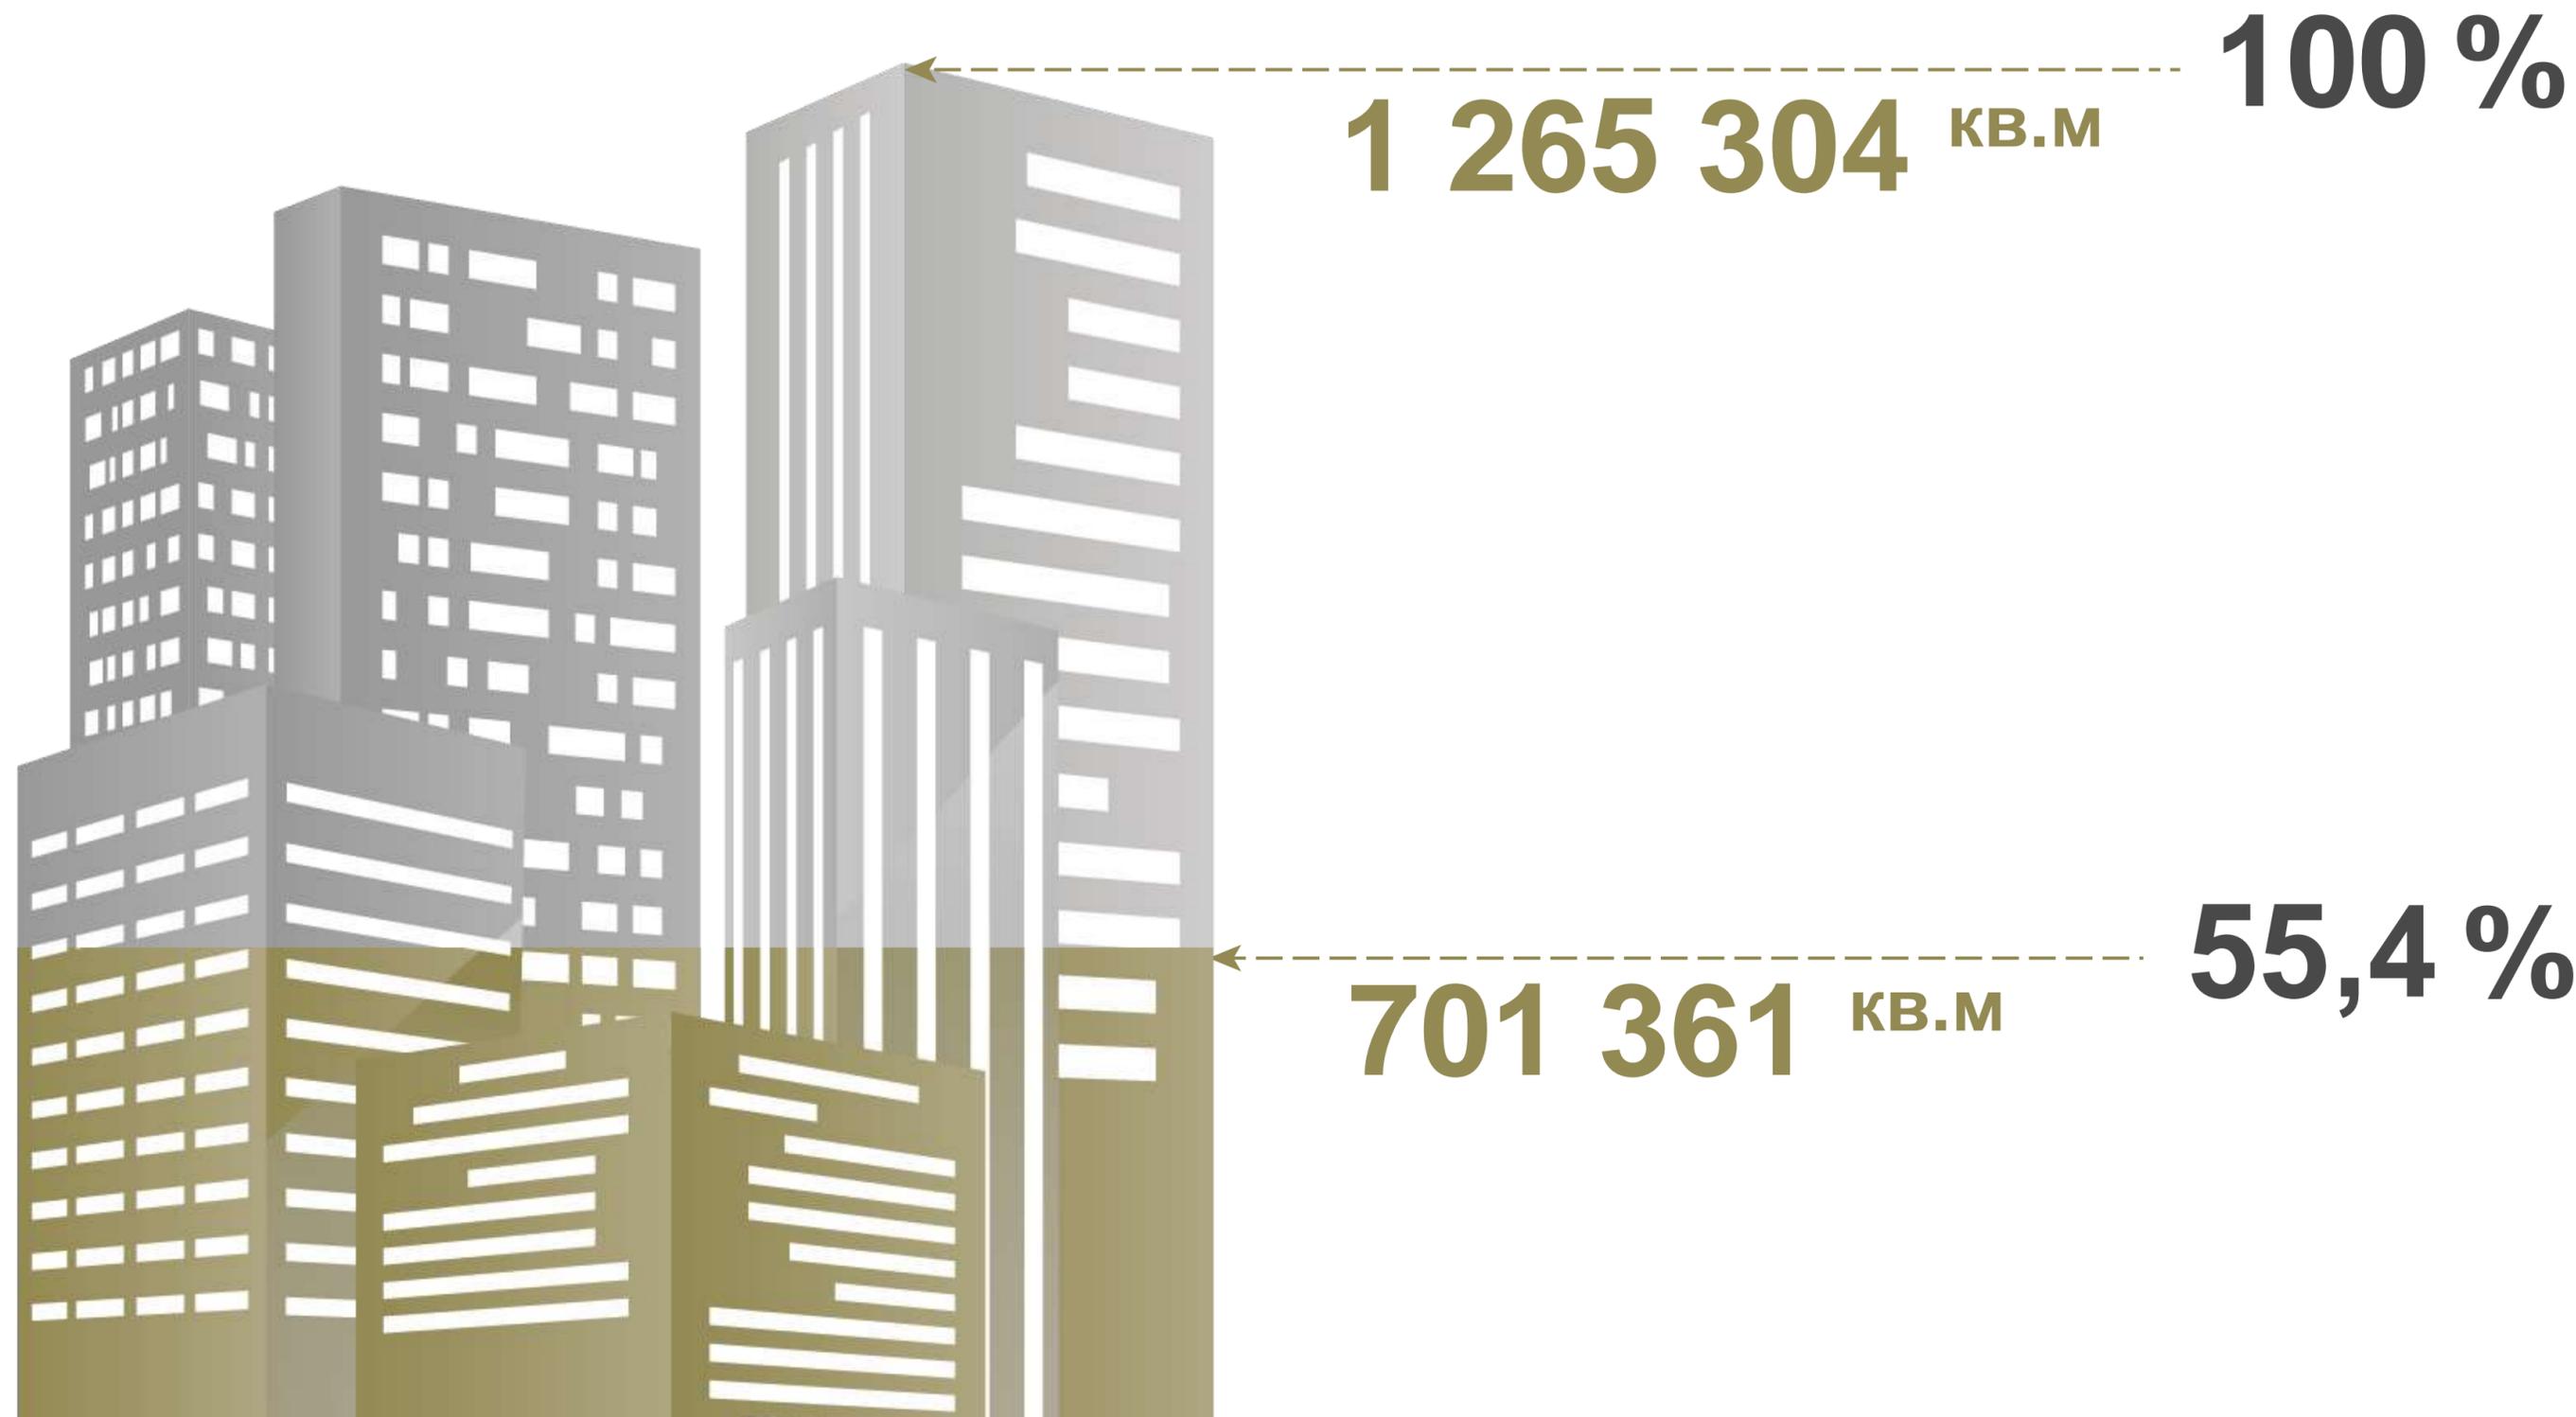

# МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-	-
2	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	-	-
3	АРСКИЙ	1	1	-	-
4	БУИНСКИЙ	1	1	-	-
5	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	2	5	-
6	ВЫСОКОГОРСКИЙ	1	1	-	-
7	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	-	1	-
8	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	3	3	-	-
9	ЛАИШЕВСКИЙ	1	1	-	-
10	НИЖНЕКАМСКИЙ	1	1	-	-
11	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-	-
12	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	15	8	3	4
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	10	9	1	-
14	Г.КАЗАНЬ	32	13	13	6
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>76</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>10</b>

# ПРОГРАММА ГЖФ РТ



**280 496** КВ.М

**100 %**

**113 702** КВ.М

**40,5 %**

# МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	161	98	1	63	35	14	14
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	5 159	2059	60	3 100	2 459	582	59
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	280,50	113,7	3,2	166,8	128,7	34,5	3,6

# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



**9 357** ДОМОВ

**112,2 %**



**8 330** ДОМОВ

**100 %**

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	81	109	6
2	Чистопольский	183	128	55	4
3	Кукморский	53	47	6	0
4	Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	74	2	0
6	Лаишевский	20	19	1	0
7	Бугульминский	12	12	0	2
8	Агрызский	21	21	0	1
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>1102</b>	<b>926</b>	<b>176</b>	<b>13</b>

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



## Земельные участки с ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	город Казань	3
4	Кукморский	1
	<b>ВСЕГО по РТ</b>	<b>71</b>

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



## Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не сносены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский			36	30	25	91
2	Чистопольский		1	3		2	6
3	Кукморский	2	1			2	5
4	Высокогорский					2	2
5	Лаишевский			1			1
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>105</b>

# УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

## ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	8	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	6,87	6,87	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>740</b>	<b>1 196,65</b>	<b>100,28</b>	<b>1 096,37</b>

# МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспечено
1	АЗНАКАЕВСКИЙ	1	1
2	АРСКИЙ	1	1
3	БАВЛИНСКИЙ	1	1
4	БУГУЛЬМИНСКИЙ	1	1
5	БУИНСКИЙ	1	1
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	1	1
8	НУРЛАТСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспечено
9	САБИНСКИЙ	1	1
10	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1
11	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
12	АПАСТОВСКИЙ	2	2
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	8	8
14	НИЖНЕКАМСКИЙ	11	8
15	Г.КАЗАНЬ	17	17
<b>ИТОГО:</b>		<b>49</b>	<b>46</b>

# ДЕТИ-СИРОТЫ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено сирот
1	АКТАНЫШСКИЙ	4	4	0	0
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8	0	0	0
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18	18	0	0
4	АРСКИЙ	4	4	4	4
5	АТНИНСКИЙ	1	1	1	1
6	БАЛТАСИНСКИЙ	4	4	4	4
7	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6	6	6	6
8	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8	0	0	0
9	МАМАДЫШСКИЙ	16	16	16	16
<b>ИТОГО:</b>		<b>389</b>	<b>156</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

# ДЕТИ-СИРОТЫ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено сирот
10	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	19	0	0	0
11	НИЖНЕКАМСКИЙ	28	28	28	28
12	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4	0	0	0
13	НУРЛАТСКИЙ	12	0	0	0
14	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1	0	0	0
15	САРМАНОВСКИЙ	1	1	1	1
16	ТЕТЮШСКИЙ	4	0	0	0
17	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1	1	1
18	Г.НАБ.ЧЕЛНЫ	80	0	0	0
19	Г.КАЗАНЬ	170	73	73	73
<b>ИТОГО:</b>		<b>389</b>	<b>156</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

# МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	1
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	1
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	0
6	БАВЛИНСКИЙ	1	0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	2
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	1
9	БУИНСКИЙ	1	1
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	5
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
12	ЗАИНСКИЙ	1	0
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4
14	КУКМОРСКИЙ	1	1


№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
16	МАМАДЫШСКИЙ	1	1
17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	0
18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	1
19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	1
20	НУРЛАТСКИЙ	3	3
21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
22	САБИНСКИЙ	1	1
23	САРМАНОВСКИЙ	1	1
24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
25	Г.КАЗАНЬ	2	2
26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	6
<b>ИТОГО:</b>		<b>47</b>	<b>36</b>

# ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН



№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
<b>1</b>	<b>УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
1.3	<i>г.Казань</i>	1	0	-	-
1.4	<i>Менделеевский</i>	1	0	-	-
<b>2</b>	<b>ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
<b>3</b>	<b>ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	<i>Буинский</i>	1	1	-	-
3.2	<i>Тетюшский</i>	1	1	-	-
	<b>ВСЕГО по РТ</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

# КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

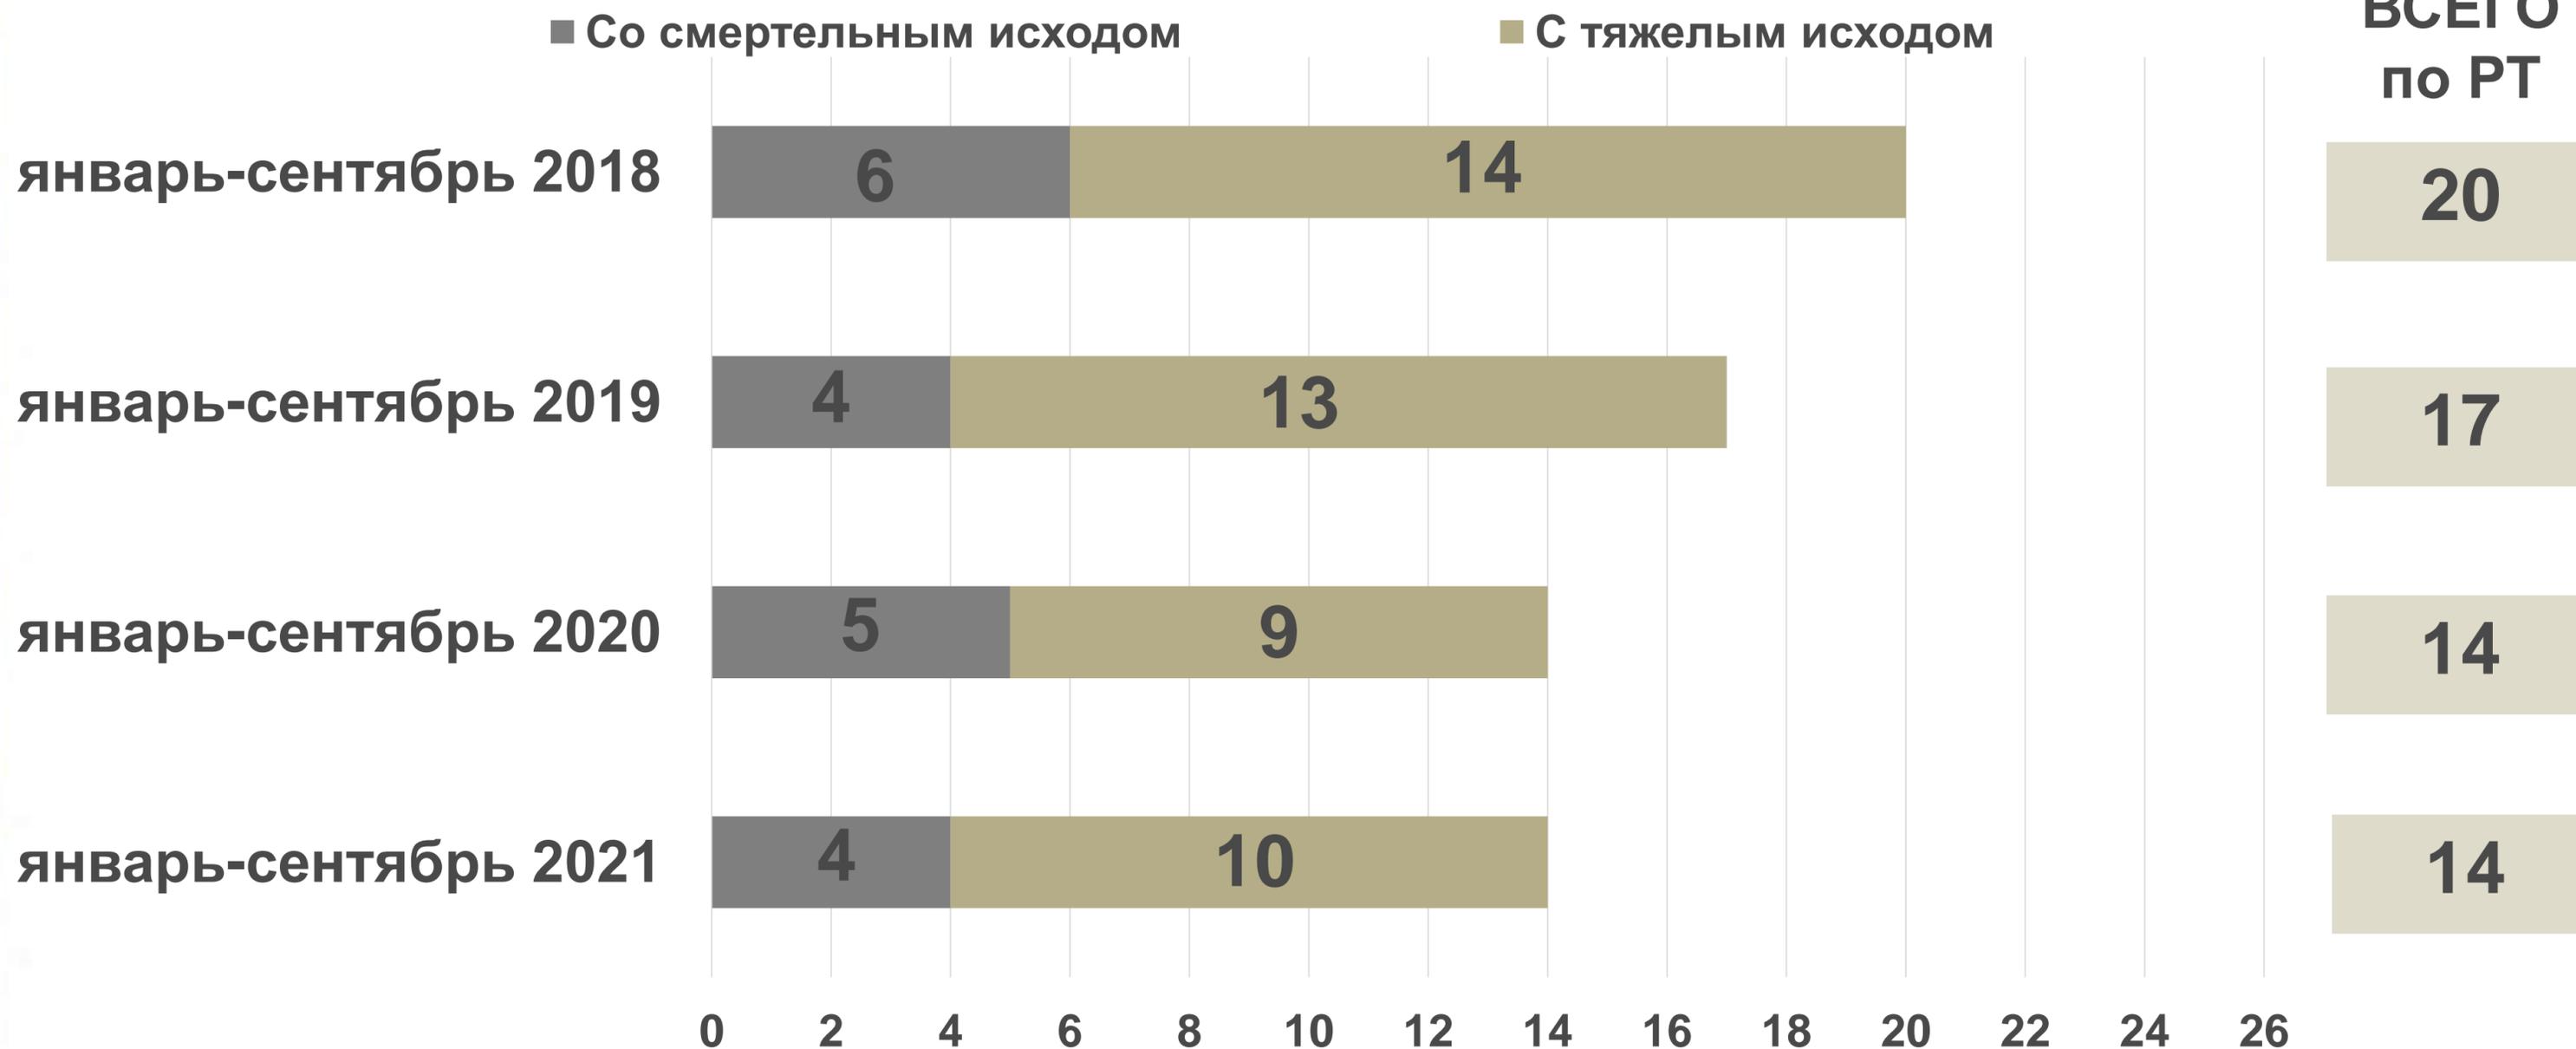

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
<b>КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК</b>	<b>1 177</b>	<b>-</b>
<b>ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b>	<b>90</b>	<b>5 127,00</b>
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	28	-
<b>ВЗЫСКАНО ВСЕГО</b>	<b>38</b>	<b>3 936,00</b>
<b>НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ</b>	<b>24</b>	<b>1 176,00</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
<b>ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:</b>	<b>1 353</b>
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	679
<b>ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:</b>	<b>820</b>
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	351
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	166
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	74
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	229

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	557
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	893
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	893
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	274

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	129	249	249	100
2	г.Набережные Челны	37	37	37	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	6	2	2	100
7	Алексеевский	11	20	20	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	15	85	85	100
10	Апастовский	19	26	26	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	1	2	2	100
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	14	13	13	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>557</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>100</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	1	10	10	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	11	15	15	100
20	Елабужский	25	19	19	100
21	Заинский	4	20	20	100
22	Зеленодольский	9	18	18	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	5	9	9	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	21	44	44	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>557</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>100</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	37	22	22	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	9	8	8	100
35	Пестречинский	4	71	71	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	4	3	3	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	8	3	3	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	1	7	7	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>557</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>100</b>

# ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ



ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.09.2021

№	Объекты в сферах	План	Факт	%
1	Котельные (Казань – 1)	3 146	3 145	99,9
2	Образования (Заинск – 1)	3 333	3 332	99,9
3	Здравоохранения	2 013	2 013	100,0
4	Культуры	1 962	1 962	100,0
5	Спорта и молодежи	311	311	100,0
6	Соцзащиты	175	175	100,0

# ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ 2021/2022 гг. ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА



№	МО РТ	План	Факт	%	Дин-ка
1	К-Устьинский	87	83	95,4	0,0
2	Пестречинский	425	415	97,6	0,0
3	Балтасинский	45	44	97,8	4,5
4	Менделеевский	135	132	97,8	0,0
5	г. Казань	5 842	5 725	98,0	1,1
6	Чистопольский	455	450	98,9	0,2
7	Арский	220	218	99,1	0,0
8	Зеленодольский	920	914	99,3	0,8
9	г. Наб. Челны	1 429	1 421	99,4	1,1
10	Бугульминский	875	874	99,9	0,7
<b>35 МО получили паспорта готовности МКД</b>					
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>17 476</b>	<b>17 319</b>	<b>99,1</b>	<b>0,9</b>


# ПРОИЗВЕДЕН ПУСК ТЕПЛА на 17.09.2021 18.00 ч.



<b>№</b>	<b>Объект</b>	<b>Всего</b>	<b>Произведен пуск</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Котельные</b>	<b>3 146</b>	<b>3 026</b>	<b>96,19</b>
<b>2</b>	<b>Жилые дома</b>	<b>17 476</b>	<b>13 720</b>	<b>78,51</b>
<b>3</b>	<b>Школы</b>	<b>1 564</b>	<b>1 521</b>	<b>97,25</b>
<b>4</b>	<b>Детские сады</b>	<b>1 769</b>	<b>1 744</b>	<b>98,59</b>
<b>5</b>	<b>Здравоохранение</b>	<b>2 013</b>	<b>1 846</b>	<b>91,70</b>
<b>6</b>	<b>Культура</b>	<b>1 962</b>	<b>1 707</b>	<b>87,00</b>
<b>7</b>	<b>Спорта и молодежи</b>	<b>311</b>	<b>258</b>	<b>82,96</b>
<b>8</b>	<b>Соцзащита</b>	<b>175</b>	<b>169</b>	<b>96,57</b>

# ПРОГНОЗ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

по данным сайта «Gismeteo»

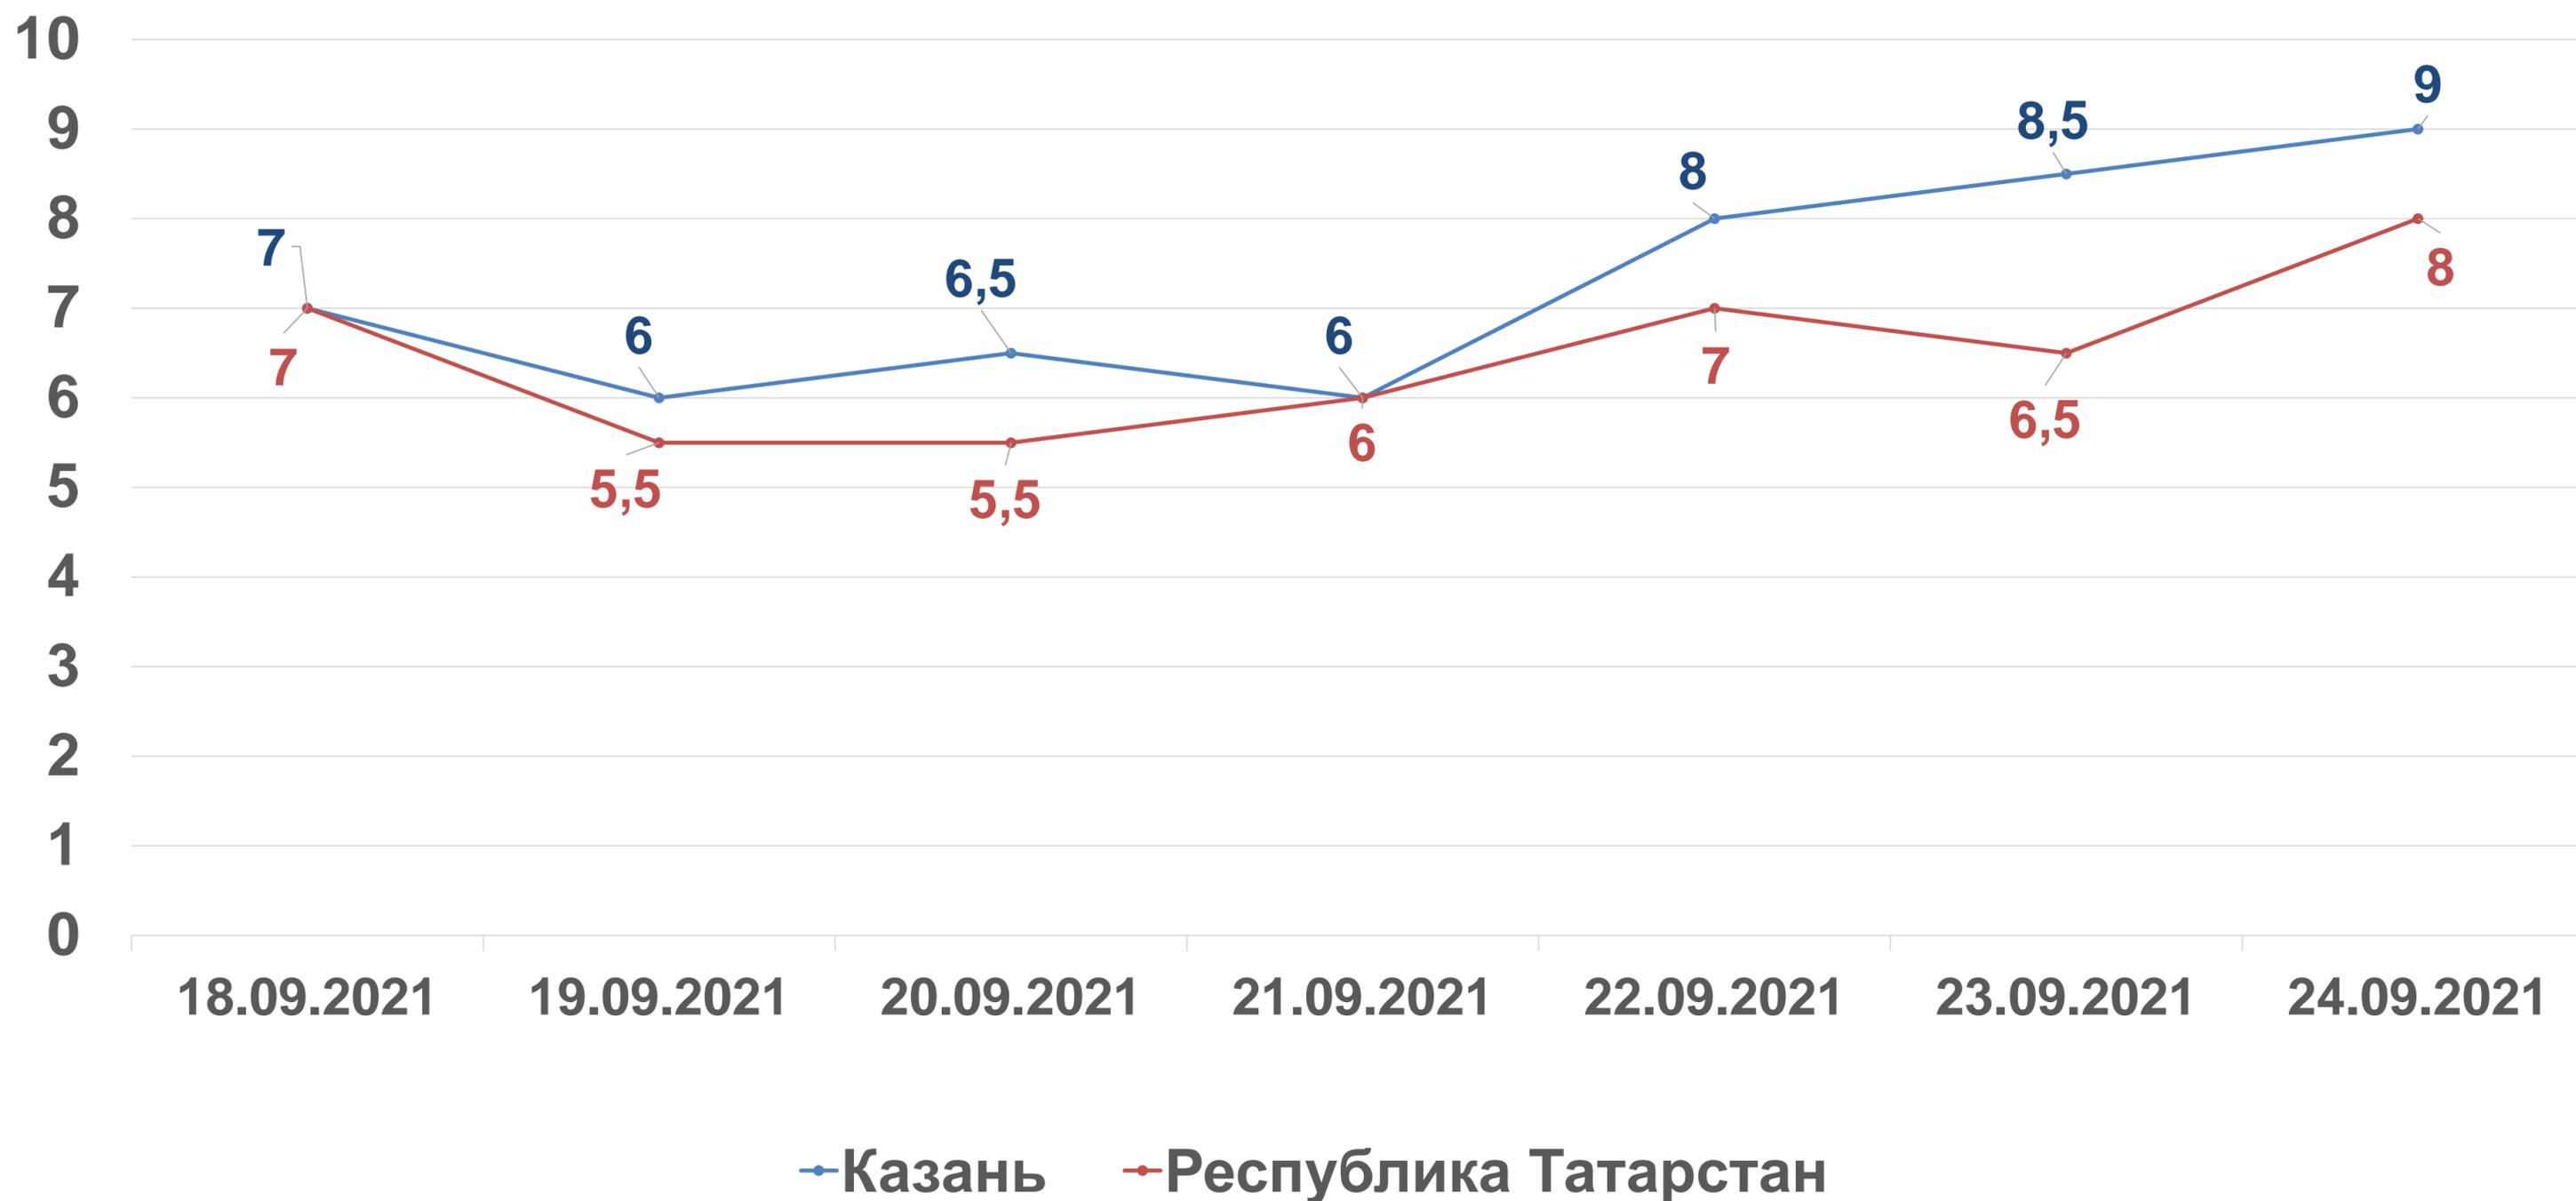



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**
