




Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь 2014 года	3	1	2
январь 2015 года	3	1	2



Причины несчастных случаев в 2014 году

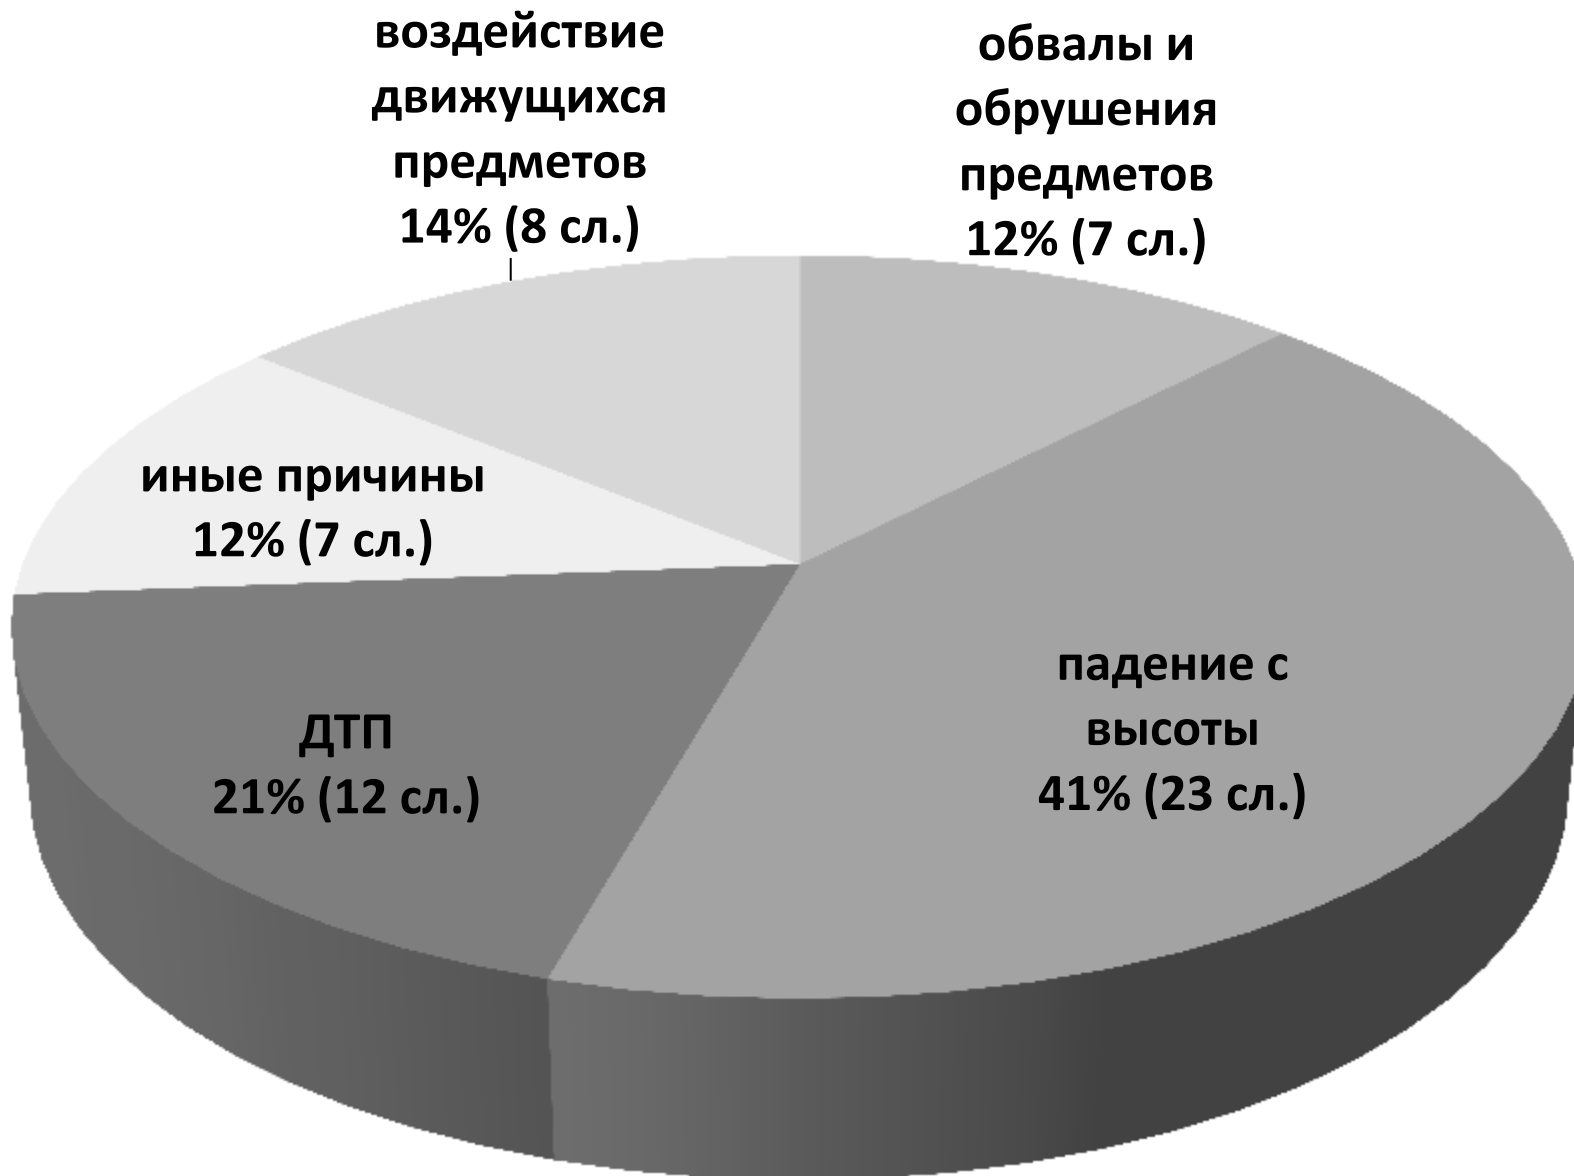



Ограждения деформированы или отсутствуют
Жилые дома, г.Казань, ул. Профессора Камая

Заказчик – ООО «Промышленная компания Сити»
Генеральный подрядчик - ООО «Спецресурс»

Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствуют перила переходного мостика, ширина настила менее 1м

Жилой дом, г.Казань, микрорайон М-14

Заказчик – МКУ «УКСиР ИК г.Казани». Подрядчик - ООО «СФ «Ак таш»

Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствует ограждение открытого проема
Спальный корпус базы отдыха «Вишневая поляна», Нурлатский район
Заказчик – НГДУ «Нурлатнефть». Подрядчик - ООО «СК Континент»
Составлен протокол об административном правонарушении



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
Количество проверок	40	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	10	357,0



Программы 2015 года, рассматриваемые на **1** неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
5	Жилье для детей-сирот
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 639	2 422	7 217	25	356 238,79	88 898,67	267 340,12	25
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 532	131	1 401	9	52 600,47	4 583,86	48 016,61	9
3	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
4	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
5	Зеленодольский	3 019	413	2 606	14	120 785,26	13 558,60	107 226,66	11
6	Азнакаевский	256	41	215	16	13 098,60	2 102,10	10 996,50	16
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
9	Елабужский	101	30	71	30	3 072,15	794,70	2 277,45	26
10	Кукморский	426	137	289	32	13 182,90	4 250,90	8 932,00	32
11	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
12	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
13	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
14	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
15	Агрызский	153	58	95	38	5 972,70	2 441,90	3 530,80	41



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 639	2 422	7 217	25	356 238,79	88 898,67	267 340,12	25
16	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,90	40
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	118	114	51	7 919,94	5 142,60	2 777,34	65
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	81	53	60	4 908,30	2 663,35	2 244,95	54
21	Высокогорский	288	182	106	63	9 303,20	5 887,90	3 415,30	63
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	К.Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	32	12	73	1 464,30	1 294,90	169,40	88
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 639	2 422	7 217	25	356 238,79	88 898,67	267 340,12	25
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	0,00	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	0,00	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	0,00	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	0,00	104
37	Р.Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	25
1	Агрызский	2	47		7		38
2	Азнакаевский		30	1		3	16
3	Актанышский	2	25				100
4	Алексеевский	15	5	2		1	73
5	Алькеевский		1				100
6	Альметьевский	20	7				29
7	Апастовский	13	8				100
8	Арский	38	23	2		1	51
9	Балтасинский	5	46				83
10	Буинский	20	4				64
11	Бугульминский	2	2				13
12	Верхнеуслонский		1				13
13	Высокогорский	15	65	5		10	63
14	Дрожжановский		2				100
15	Елабужский	8	21		1		30



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	25
16	Заинский	3	1				29
17	Зеленодольский	109	249	51	4		14
18	Кайбицкий						100
19	К.-Устьинский	18	2				69
20	Кукморский	88	31		2	3	32
21	Лаишевский	4	19				36
22	Лениногорский	6	14				37
23	Мамадышский	54	60				97
24	Менделеевский	1	6				58
25	Мензелинский	2	13				82
26	Муслюмовский	5	24				83
27	Нижнекамский		14				100
28	Новошешминский	1	10				100
29	Нурлатский	19	25				35
30	Пестречинский		38				42



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	25
31	Р.-Слободский		4				100
32	Сабинский		2				100
33	Спасский	12	23				35
34	Тукаевский	10					100
35	Тетюшский	3	2				39
36	Тюлячинский						100
37	Чистопольский	33	34	5	2		9
38	Ютазинский	14	27		2		60
39	г.Казань	9	11				2



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 января 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	251 479	10,5	2 148 521
1	Новошешминский	5 000	0	0,0	5 000
2	К-Устьинский	35 000	461	1,3	34 539
3	Дрожжановский	7 000	166	2,4	6 834
4	В-Услонский	40 000	1 033	2,6	38 967
5	Бугульминский	40 000	1 283	3,2	38 717
6	Арский	27 000	911	3,4	26 089
7	г.Наб.Челны	340 000	12 760	3,8	327 240
8	Атнинский	4 000	151	3,8	3 849
9	Бавлинский	17 000	752	4,4	16 248
10	Нурлатский	26 000	1 203	4,6	24 797
11	Лениногорский	30 000	1 462	4,9	28 538
12	Спасский	8 000	417	5,2	7 583
13	Р-Слободской	13 000	706	5,4	12 294
14	Муслюмовский	8 000	478	6,0	7 522
15	г.Казань	850 000	51 135	6,0	798 865



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 января 2015 года

15

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	251 479	10,5	2 148 521
16	Черемшанский	10 000	613	6,1	9 387
17	Агрызский	20 000	1 273	6,4	18 727
18	Альметьевский	155 000	10 361	6,7	144 639
19	Нижнекамский	130 000	9 815	7,6	120 185
20	Чистопольский	32 500	2 929	9,0	29 571
21	Буинский	19 000	1 801	9,5	17 199
22	Высокогорский	50 000	5 056	10,1	44 944
23	Мамадышский	15 000	1 517	10,1	13 483
24	Сармановский	10 000	1 110	11,1	8 890
25	Тукаевский	52 000	5 780	11,1	46 220
26	Азнакаевский	25 000	2 826	11,3	22 174
27	Тюлячинский	6 500	766	11,8	5 734
28	Кайбицкий	4 800	628	13,1	4 172
29	Мензелинский	16 000	2 186	13,7	13 814
30	Заинский	20 000	2 991	15,0	17 009



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 января 2015 года

16

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	251 479	10,5	2 148 521
31	Алексеевский	14 000	2 113	15,1	11 887
32	Менделеевский	10 000	2 034	20,3	7 966
33	Лаишевский	62 000	12 909	20,8	49 091
34	Алькеевский	6 500	1 532	23,6	4 968
35	Актанышский	17 000	4 044	23,8	12 956
36	Сабинский	18 000	4 292	23,8	13 708
37	Кукморский	10 000	2 638	26,4	7 362
38	Тетюшский	10 000	2 678	26,8	7 322
39	Зеленодольский	130 000	35 272	27,1	94 728
40	Балтасинский	14 000	3 846	27,5	10 154
41	Ютазинский	8 000	2 449	30,6	5 551
42	Елабужский	45 000	15 625	34,7	29 375
43	Аксубаевский	11 000	3 918	35,6	7 082
44	Пестречинский	42 000	26 803	63,8	15 197
45	Апастовский	12 000	8 756	73,0	3 244



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

17

на 31.01.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	145	15	130	59	35	36
Общая площадь (тыс.кв.м.)	420,9	9,5	411,4	103,2	108,9	199,3
Кол-во квартир	7 025	193	6 832	2 130	1 782	2 920



Арендное жилье 2015 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
123 кв. ж/дом ул.Айдарова Авиастроительного района г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	85	85	Февраль 2015
220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе Кировский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Февраль 2015
44(45) кв ул.Журналистов Советский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Февраль 2015

Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
Перепрофилирование ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" по ул.Ленина, 92 в г.Бугульме	ООО «Строй Сервис»	ООО «Строй Сервис»	75	77	Июнь 2015
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	90 77	91 77	Июль 2015
Промышленные предприятия					
64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ "Алабуга"	ОАО «Камгэсэнерго строй»	70	70	Февраль 2015



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

20

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		11	66	2	7	2
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Арский	1	1	-	-	1
3	Бавлинский	1	13	-	1	-
4	Высокогорский	1	16	-	1	-
5	Зеленодольский	1	1	-	1	-
6	Кукморский	1	2	1	-	-
7	Лениногорский	1	8	-	1	-
8	Муслюмовский	1	6	-	1	-
9	Ютазинский	1	4	-	1	-
10	Наб. Челны	2	11	-	1	1



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
Сдаются до 9 мая 2015 года					
1	Азнакаевский район 144 кв. ж.д. №9 в мкр. 9 г.Азнакаево	ООО «КСТ-2000»	ООО «КСТ-2000»	4	27.02.2015
2	Бавлинский район 30 кв. ж.д по ул.Зиновьева, д 16, г.Бавлы	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энергострой сервис"	1	30.04.2015
3	Кукморский район 40 кв. ж.д. по ул.Гафиатуллина, поз 3, п.г.т.Кукмор	МУП «Гарант»	ОАО "Строй сервис"	2	30.04.2014
4	Лениногорский район 24-ти кв.ж.д. ул. Садовая 8Б г.Лениногорск	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Сарет"	8	30.04.2014
5	Муслюмовский район 15 кв. ж.д. Молодежная д.3/1 с.Муслюмово	ГКУ "ГИСУ"	ЗАО "Муслюмовская МСО"	6	30.04.2014
6	Ютазинский район 15-ти кв.ж.д. ул. Каримова, д.3 пгт Уруссу	ГКУ "ГИСУ"	ООО"Энергострой сервис"	4	30.04.2014



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

22

Предусмотрено средств	356,42	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ		помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами		договоров



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

23

в Сводный список включено	801	семья
выделено из бюджета РТ	128,101	млн. руб.
Оформлено		сертификатов
Реализовано		сертификатов



Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ПВГО ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на **2015** год

24

	ЧАЭС	Вынужденные переселенцы	Переселенцы с Крайнего Севера	
в Сводный список включено	74	177	142	семей
Контрольные цифры бюджета РФ	32,6	26,3	4,2	млн. руб.
Оформлено				Серти- фикатов
Реализовано				Серти- фикатов



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)



г.Набережные Челны, ж/д № 134а, пр. Московский
Застройщик – ООО «ЙОРТ»



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск, ж/д № 25, пр. Шинников
Застройщик – ОАО «ЖИК-НК»

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		123	35	39	49
1	Альметьевский	5	3	1	1
2	Арский	2	1	1	-
3	Бавлинский	1	-	-	1
4	Бугульминский	4	-	3	1
5	Высокогорский	2	2	-	-
6	Елабужский	8	1	4	3
7	Зеленодольский	11	5	2	4
8	Лаишевский	2	1	1	-
9	Лениногорский	3	1	-	2
10	Нижнекамский	11	1	1	9
11	Пестречинский	2	2	-	-
12	г. Наб. Челны	39	9	15	15
13	г. Казань	33	9	11	13



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 830	1 529	8 301



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

29

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	47 295,0	15,2	0,0	0,0
Алькеевский район, с. Салман	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Бавлинский район, с. Александровка	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Пестречинский район, с.Тат Ходяшево	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Сабинский район, с. Измя	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Спасский район, д. Кожаевка	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Чистопольский район, с.Кубассы	2 627,5	0,0	0,0	0,0
Бугульминский район, с. Татарская Дымская	2 627,5	1,0	0,0	0,0
Лаишевский район, д. Старая Пристань	2 627,5	1,0	0,0	0,0
Лаишевский район, с. Малая Елга	2 627,5	1,0	0,0	0,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

30

Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Принято КС-2	Оплата
Итого по РТ	47 295,0	15,2	0,0	0,0
Верхнеуслонский район, п. Октябрьское	2 627,5	5,0	0,0	0,0
Лениногорский район, с. Сугушла	2 627,5	10,0	0,0	0,0
Сармановский район, с. Старый Кашир	2 627,5	10,0	0,0	0,0
Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма	2 627,5	15,0	0,0	0,0
Аксубаевский район, с. Старое Ибрайкино	2 627,5	28,0	0,0	0,0
Высокогорский район, д. Пановка	2 627,5	30,0	0,0	0,0
Агрызский район, с. Кичкетан	2 627,5	54,0	0,0	0,0
Альметьевский район, мкр. "Урсала"	2 627,5	60,0	0,0	0,0
Мамадышский район, с. Рагозино	2 627,5	60,0	0,0	0,0



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

31

Альметьевский район, мкр. Урсала
Подрядчик - ООО «СК «Капремстрой»





Программа детских садов 2015

32



Лаишевский район
Подрядчик: ООО «Строитель +»



Программа детских садов 2015

33



Пестречинский район
Подрядчик: ООО «Строитель +»



Программа детских садов 2015

34

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	0	0
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	0	0
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	0	0



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
1	Агрызский, с. Шаршада	50				
2	Азнакаевский, г. Азнакаево	50				
3	Актанышский, с. Актаныш	140				
4	Алексеевский, с. Лебяжье	50				
5	Алькеевский, с. Базарные Матаки	80				
6	Альметьевский, г. Альметьевск	260				
7	Арский, д. Мендюш	50				
8	Арский, пос. Урняк	50				
9	Атнинский, с. Кошар	50				
10	Бавлинский, г. Бавлы	220				
11	Балтасинский, с. Ципья	120				
12	Буинский, г. Буинск	140				
13	Бугульминский, г. Бугульма	140				
14	Верхнеуслонский, с. Верхний Услон	120				
15	Верхнеуслонский, с.Тат. Бурнашево	50				
16	Высокогорский, ст. Высокая Гора	220				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
17	Высокогорский, пос. Березовка	80				
18	Елабужский, г. Елабуга	240				
19	Заинский, г. Заинск	140				
20	Зеленодольский, г. Зеленодольск	260				
21	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	50				
22	К-Устьинский, п.г.т. Кубыш. Затон	50				
23	Кукморский, д. Туембаш	50				
24	Кукморский, пгт Кукмор	260				
25	Лаишевский, с. Сокуры	140				
26	Лаишевский, с. Большие Кабаны	140				
27	Лаишевский, г. Лаишево	140				
28	Лениногорский, с. Тимяшево	120				
29	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	220				
30	Менделеевский, с. Ижевка	80				
31	Муслюмовский, с. Муслюмово	140				
32	Нижнекамский, г. Нижнекамск, мкр. 31	260				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
33	Нижнекамский, с. Городище	50				
34	Нижнекамский, с. Ташлык	80				
35	Новошешминский, с. Новошешминск	80				
36	Нурлатский, г. Нурлат	260				
37	Пестречинский, с. Пестрецы	120				
38	Рыбно- Слободский, п.г.т. ыб.Слобода	80				
39	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	80				
40	Сармановский, с. Сарманово	120				
41	Тетюшский, с. Урюм	50				
42	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	80				
43	Тюлячинский, д. Шадки	50				
44	Черемшанский, с. Ульяновка	50				
45	Черемшанский, с. Черемшан	80				
46	Чистопольский, г.Чистополь	140				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
47	Ютазинский, пос. Уруссу	80				
48	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	240				
49	г. Н.Челны, Сармановский тракт	240				
50	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	240				
51	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	240				
52	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек" ул. Янтарная	240				
53	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	240				
54	г. Казань, п. Кояшлы	80				
55	г. Казань, ул. Фермское шоссе	140				
56	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	140				
57	г. Казань, ул. Павлюхина	140				
58	г. Казань, ул. Габишева	140				
59	г. Казань, ул. Ак. Павлова-Молодежная	80				
60	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	120				
61	г. Казань, ул. Тэцевская	220				



Программа детских садов 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы			
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля
62	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар.10	260				
63	г. Казань, ул. Ю.Фучика	220				
64	г. Казань, п. Чебакса	120				
65	г. Казань, п. Константиновна	80				
66	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	260				
67	г. Казань, мкр. М-14	260				
68	г. Казань, ж.к. "Светлая долина»	340				
69	г. Казань, ул. Халезова	80				
70	г. Казань, ж/м "Салават купере", квар. 11	260				
71	г. Казань, п. Сосновка	140				
72	г. Казань, ул. Р.Зорге	50				
73	г. Казань, ул. Гвардейская	80				



Программа детских садов 2015

40

Капитальный ремонт-реконструкция

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
1	Аксубаевский п.Мюд	
2	Арский г.Арск	
3	Актанышский с. Атясево	
4	Бугульминский г. Бугульма	
5	Мензелинский г.Мензелинск	
6	Менделеевский г.Менделеевск	
7	Пестречинский с.Ленино-Кокушкино	
8	Тетюшский с Большие Атряси	

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
9	Тетюшский Тоншерма	
10	Черемшанский Сивашкино	
11	г.Казань ул. Годовикова, 8	
12	г.Казань ул. Толстого, 16	
13	г.Казань ул. 40 лет Октября, 22	
14	г.Казань Военный городок, 32, пос. Аракчино	
15	г.Казань ул. Агрызская, 61	
16	г.Казань ул. Жуковка, 2	



Программа детских садов 2015

41

Капитальный ремонт с открытием доп. групп

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
1	Апастовский п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, д. 66	
2	Бавлинский МБДОУ №2, г. Бавлы	
3	Бугульминский МБДОУ "Прогрессский детский сад", пос. Прогресс	
4	Зеленодольский МБДОУ № 40, п.г.т. Васильево	
5	Заинский МБДОУ "Красная шапочка", г. Заинск	
6	Кайбицкий МБДОУ "Кушманский "Белочка", с. Кушманы	
7	Лениногорский МБДОУ "Детский сад № 26", г. Лениногорск	
8	Лениногорский МБДОУ "Детский сад №30", Лениногорск	
9	Рыбно-Слободский МБДОУ "Полянский детский сад "Радуга" п.г.т Рыбная Слобода	
10	Тукаевский МБДОУ "Тополек" с. Шильнебаш	

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
11	г. Набережные Челны МБДОУ № 85	
12	г. Набережные Челны МБДОУ № 93	
13	г. Казань МБДОУ № 26	
14	г. Казань МАДОУ №111	
15	г. Казань МАДОУ №365	
16	г. Казань МБДОУ № 375	
17	г. Казань МАДОУ № 392	
18	г. Казань МАДОУ № 19	
19	г. Казань МАДОУ № 93	
20	г. Казань МАДОУ №129	



Программа детских садов 2015

Капитальный ремонт с открытием доп. групп

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
21	г. Казань МАДОУ № 370	
22	г. Казань МАДОУ № 388	
23	г. Казань МАДОУ № 401	
24	г. Казань МАДОУ № 411	
25	г. Казань МАДОУ № 69	
26	г. Казань МБДОУ № 321	
27	г. Казань МБДОУ № 350	
28	г. Казань МАДОУ № 217	
29	г. Казань МАДОУ № 217	
30	г. Казань МАДОУ № 25	

№	Место расположения	Строительно-монтажные работы
31	г. Казань МАДОУ № 171	
32	г. Казань МАДОУ № 298	
33	г. Казань МАДОУ № 206	
34	г. Казань МАДОУ № 224	
35	г. Казань МАДОУ № 259	
36	г. Казань МАДОУ № 284	
37	г. Казань МАДОУ № 11	
38	г. Казань МБДОУ № 76	



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы				
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
1	Агрызский, с.Ямурзино	300					
2	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	200					
3	Актанышский, с.Атясево	200					
4	Алексеевский, с.Ялкын	200					
5	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	100					
6	Альметьевский, с.Калейкино	300					
7	Апастовский, с.Кзыл-Тау	200					
8	Арский, с.Старый Яваш	100					
9	Атнинский, с.Кошар	200					
10	Бавлинский, с.Хагсверкино	100					
11	Балтасинский, с.Тюнтерь	200					
12	Бугульминский, с.Соколка	200					
13	Верх.-Услонский, с.Майдан	100					
14	Высокогорский, с.Айбаш	200					
15	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	200					
16	Елабужский, с.Лекарево	100					
17	Заинский, с.Старый Токмак	100					



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы				
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
18	Зеленодольский, пгт. Васильево	300					
19	Кайбицкий, с.Надеждино	100					
20	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	200					
21	Кукморский, с.Мамашир	200					
22	Лаишевский, с.Каипы	200					
23	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	300					
24	Мамадышский, пос.Мамадышский	200					
25	Менделеевский, с.Тураево	100					
26	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	100					
27	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	200					
28	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	200					
29	Новошешминский, д.Новое Иванаево	100					
30	Нурлатский, с.Караульная Гора	100					
31	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	200					
32	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	350					
33	Сабинский, с.Тимершик	200					



Программа «Сельские клубы» 2015

45

Строительство

№	Район	Кол-во мест	Строительно-монтажные работы				
			Земляные работы	Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
34	Сармановский, с.Ляки	100					
35	Спасский, с.Красная Слобода	100					
36	Тетюшский, с.Чинчурино	100					
37	Тукаевский, н.п.Комсомолец	200					
38	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	100					
39	Черемшанский, д.Сосновка	100					
40	Чистопольский, с.Каргали	300					
41	Ютазинский, с.Акбаш	100					
42	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	300					
Капитальный ремонт							
43	г.Казань, ДК "Полимер"	340					



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

46



Аксубаевский район, с.Старое Ильдеряково
Подрядчик: ООО «СК Максад»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершён монтаж ФАП
	Всего: 60 объектов	44	26	7	
1	Агрызский, Сарсак-Омгинский				
2	Агрызский, Иж-Бобинский				
3	Азнакаевский, Асеевский				
4	Азнакаевский, Нижне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, Сунчелеевский				
6	Актанышский, Чуганаковский				
7	Алексеевский, Куркульский				
8	Алексеевский, Ромодановский				
9	Алькеевский, Алпаровский				
10	Алькеевский, Средне-Алькеевский				
11	Альметьевский, Тихоновский				
12	Апастовский, Булым-Булыхчинский				
13	Арский, Старо-Масринский				
14	Атнинский, Кошарский				
15	Бавлинский, Крым-Сарайский				



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Строительно-монтажные работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершён монтаж ФАП
16	Балтасинский, Соснинский				
17	Балтасинский, Нормабашский				
18	Бугульминский, Староисаковский				
19	Бугульминский, Подстанция				
20	Буинский, Адав-Тулумбаевский				
21	Буинский, Камбродский				
22	Верхнеуслонский, Русско-Бурнашевский				
23	Верхнеуслонский, Больше-Меминский				
24	Высокогорский, Татарско-Айшинский				
25	Дрожжановский, Убейский				
26	Елабужский, Котловский				
27	Елабужский, Анзирский				
28	Заинский, Чубуклинский				
29	Зеленодольский, Карашамский				
30	Зеленодольский, Татарско-Танаевский				



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Строительно-монтажные работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершён монтаж ФАП
31	Кайбицкий, Бол.Русаковский				
32	Камско-Устьинский, Лабышкинский				
33	Кукморский, Кошкинский				
34	Лаишевский, Кирбиский				
35	Лаишевский, Мало-Кабанский				
36	Лениногорский, Ст.Писмянский				
37	Мамадышский, п.Фермы №2				
38	Мамадышский, Ишкеевский				
39	Менделеевский, Татарско-Челнинский				
40	Мензелинский, Ново-Мазинский				
41	Мензелинский, Деуковский				
42	Набережные Челны, Элеваторная гора				
43	Нижнекамский, Смыловский				
44	Нижнекамский, Тетвельский				
45	Новошешминский, Петропавловский				



Программа «Первичной медико-санитарной помощи населению» 2015

МО РТ Месторасположение		Строительно-монтажные работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершён монтаж ФАП
46	Нурлатский, Криво-Озерский				
47	Пестречинский, Ново-Шигалеевский				
48	Рыбно-Слободский, Бетьковский				
49	Рыбно-Слободский, Малоошнякский				
50	Сабинский, Язлы-Арташский				
51	Сабинский, Нижнешитцинский				
52	Сармановский, Ст.Мензелябашинский				
53	Сармановский, Старокаширский				
54	Спасский, Тат.-Тахталинский				
55	Тетюшский, Малошемянский				
56	Тукаевский, Круглопольский				
57	Тюлячинский, Тактамышский				
58	Черемшанский, Ульяновский				
59	Чистопольский, Ишалкинский				
60	Ютазинский, пгт.Уруссу				

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	2,66	2,67	100,37
СМР	2,66	2,67	100,37
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	14,51	14,59	100,55
СМР	14,51	14,59	100,55
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	97,62	97,70	100,08

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 119,068
Обор-е 12,08			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	0,97	0,98	101,03
СМР	0,97	0,58	101,03
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	2,57	3,56	100,39
СМР	2,57	2,58	100,39
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	17,26	17,32	100,35

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	3,10	3,11	100,32
СМР	3,10	3,11	100,32
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	7,82	7,86	100,51
СМР	7,82	7,86	100,51
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	68,99	69,86	101,26

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149		
		ПИР 2,5	СМР 72,049	Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.		
Срок завершения строительства		Март 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	1,35	1,22	90,37	
СМР	1,35	1,22	90,37	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	6,00	5,89	98,16	
СМР	6,00	5,89	98,16	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	66,10	66,23	100,19	

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	2,21	2,22	100,45
СМР	2,21	2,22	100,45
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	8,08	8,12	100,49
СМР	8,08	8,12	100,49
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	95,64	95,74	100,11

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в г.Нижнекамске**

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	0,33	0,33	100,00
СМР	0,33	0,33	100,00
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	0,33	0,33	100,00
СМР	0,33	0,33	100,00
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	0,33	0,33	100,00

Капитальный ремонт Камского детского медицинский центра в г.Н.Челны (блок «Г»)

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,05	СМР 58,65
Обор-е 79,8			
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 16.01.2015г. – 22.01.2015г.	4,03	4,04	100,25
СМР	4,03	4,04	100,25
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 22.01.2015 г.	18,66	18,72	100,32
СМР	18,66	18,72	100,32
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 22.01.2015 г.	51,98	52,08	100,19

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		177,8 млн.руб			
		ПИР 2,0	СМР 152,4	Обор-е 12,9	Проч 10,5
Начало строительства		Декабрь 2014 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	1,0%	1,0%		100,0	
СМР	1,0%	1,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	2,0%	2,0%		100,0	
СМР	2,0%	2,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	2,5%	2,5%		100	

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 09.01.2015г. – 15.01.2015г.	2,10	2,10	100		
СМР	2,10	2,10	100		
Оборудование	0	0	0		
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.01.2015 г. – 15.01.2015 г.	8,85	8,85	100		
СМР	8,85	8,85	100		
Оборудование	0	0	0		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 15.01.2015 г.	90,85	90,85	100		
