



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

02 октября 2021 г.

Сегодня докладываю о ходе строительства социально-значимых объектов в рамках республиканских программ и Национальных проектов, программ в области строительства жилья и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД




17 программ, из них:
1 071 объект на 8 678,78 млн.руб.

2 программы реализованы
62 объекта на 132,57 млн.руб.

15 программ в работе
1 009 объектов на 8 546,21 млн.руб.

Общий СМР составляет 82 %

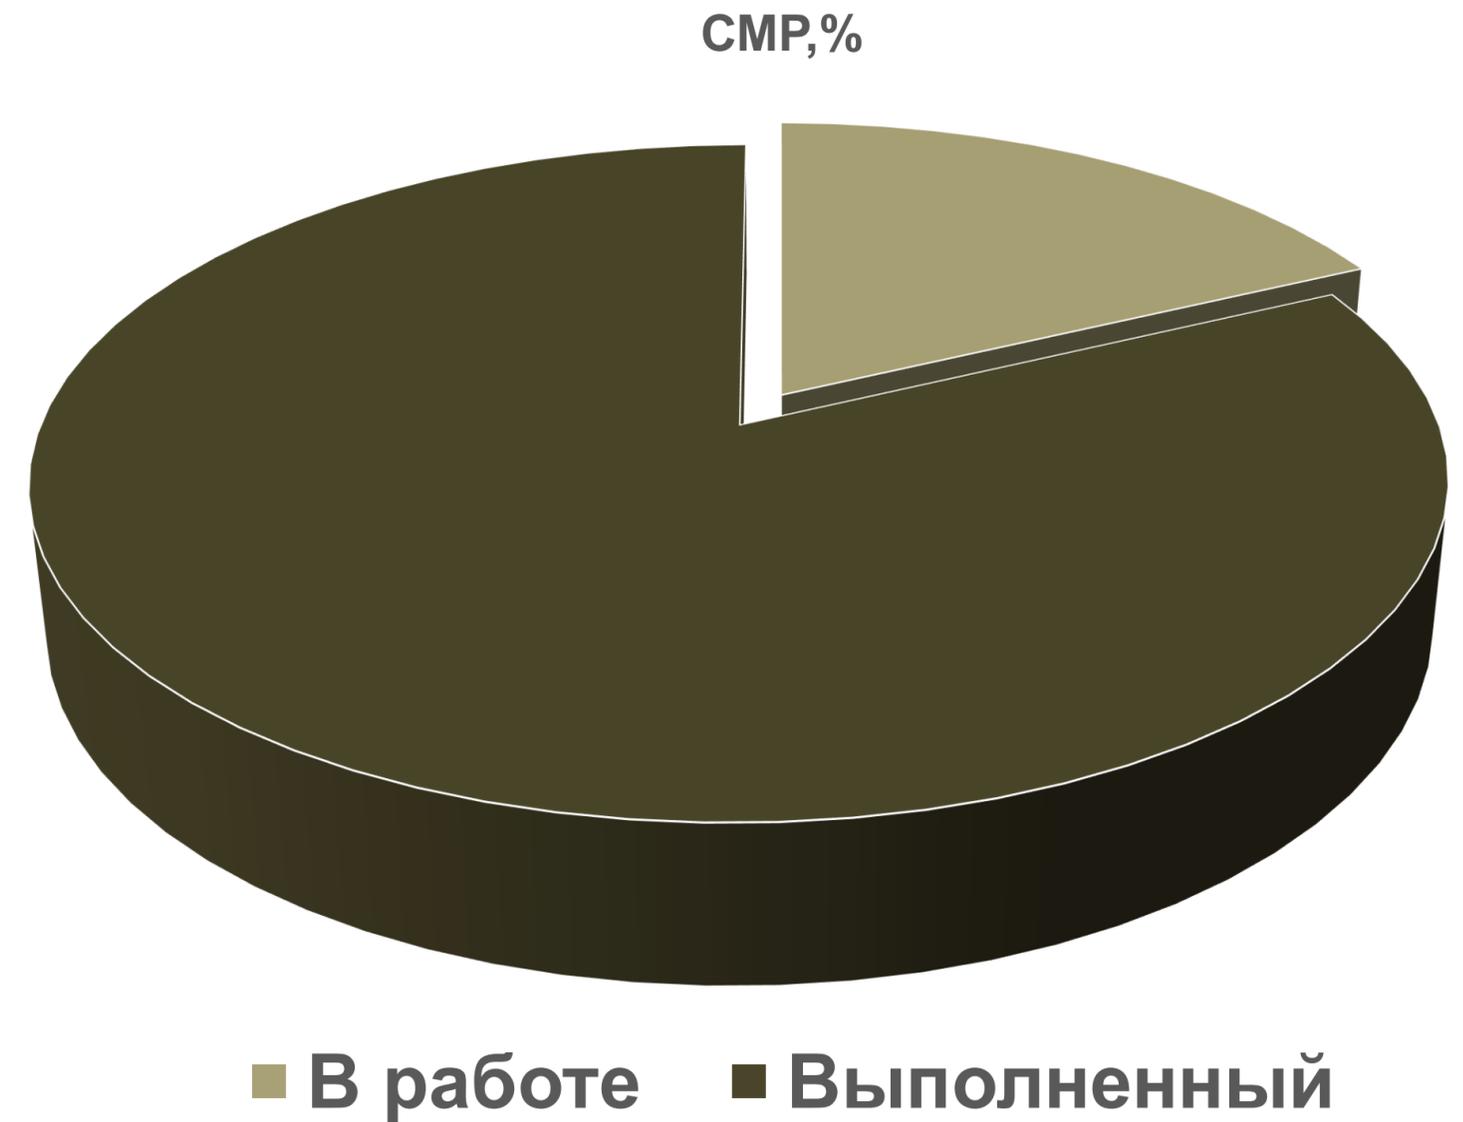

Общий процент выполнения 17 республиканских программ в строительстве к настоящему моменту составляет 82%.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



6 национальных проектов


12 федеральных проектов

95 объектов (**28** объектов завершены)

3,77 тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 11 334,43 млн рублей
(освоено 7 009,97 млн рублей)*

Общий СМР составляет 88,7%

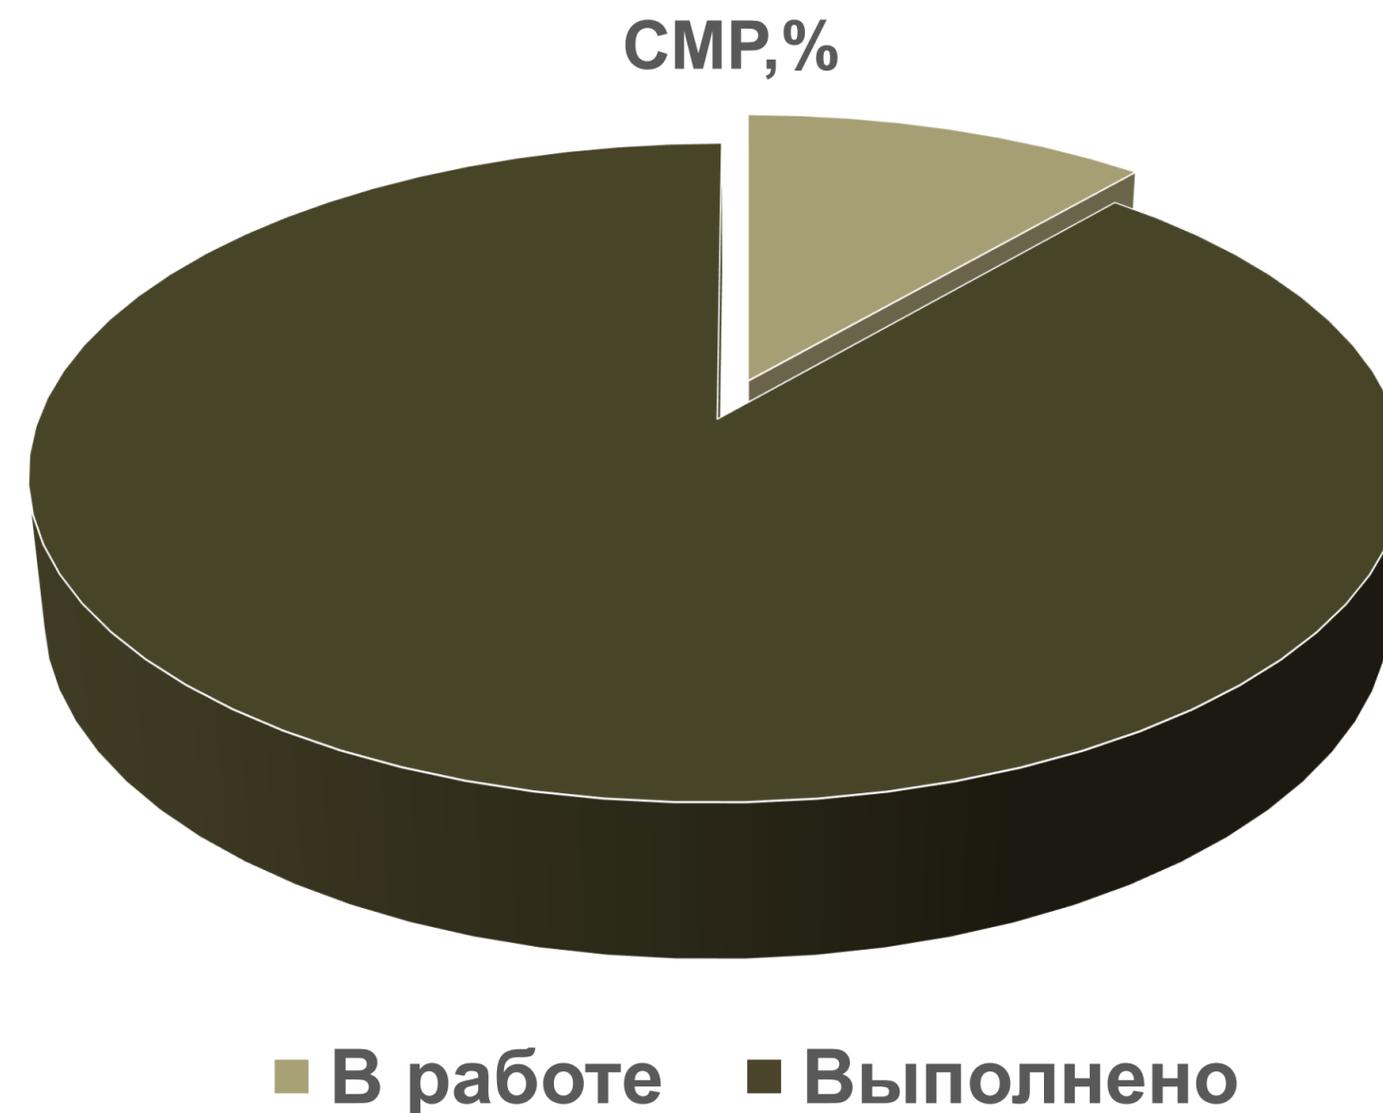

По 95 объектам, реализуемым в рамках 6 Национальных проектов, выполнение составляет 89%. 28 объектов на сегодняшний день завершены.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СМР/%
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	1. ФП «ЖИЛЬЕ»	1-школа (поставка оборудования)	100,00
		3-детских сада	87,33
		3 (1-очистн. сооруж., 1 внутрипл. сети водоснабж., 1 внепл. сети водоснабж.)	59,00 65,00 100,00
	2. ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы)	87,30
		8 (конкурс малых городов 2021 г.)	88,10
	3. ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	1 (строительство станц. водопод.)	78,00
НП «ЭКОЛОГИЯ»	4. ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	1 реконструкция БОСК г.Казань	45,42
		1 строительство БОС в с.Коцаково	99,73
	5. ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки, переходящие объекты)	96,30
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	6. ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	100,00
ИТОГО:		95	88,7

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 ГОД




НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СМР/%
НП «КУЛЬТУРА»	7. ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	3 - строительство дома культуры	44,33
		2- капитальный ремонт детских музыкальных школ	99,50
		2 - строительство центра культурного развития	61,00
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	8. ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	94,12
	9. ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал)	100,00
		1 (Поставка оборудования для создания ФОК)	100,00
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	10. ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	100,00
	11. ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	100,00
ИТОГО:		95	88,7

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	73,00	3,50
2	ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район, ЖК «Столичный»	270 800,59	80,00	8,00
3	ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	170 635,35	84,50	3,40
4	ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	178 868,36	86,00	2,00
5	ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, д.Эстачи	270 800,59	90,00	6,00
ИТОГО		3 791 699,38	91,48	3,44
6	ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	268 612,14	93,00	4,00
7	ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК «Лето»	268 455,01	95,00	15,00
8	ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	187 244,21	96,00	5,00
9	ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал ЖК «Салават Купере» (позиция 2)	279 750,60	99,00	4,00
10	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	267 956,21	99,00	0,00
11	ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	176 706,64	100,00	-
12	ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	101 217,12	100,00	-
13	ДОО на 120 мест в г. Казани, ЖК«Весна-2» (позиция 2)	166 751,14	100,00	-
14	ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	267 220,91	100,00	-
15	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	284 690,31	100,00	-
16	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	256 895,04	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО НА 220 МЕСТ ЖК «СТОЛИЧНЫЙ» Г.КАЗАНИ

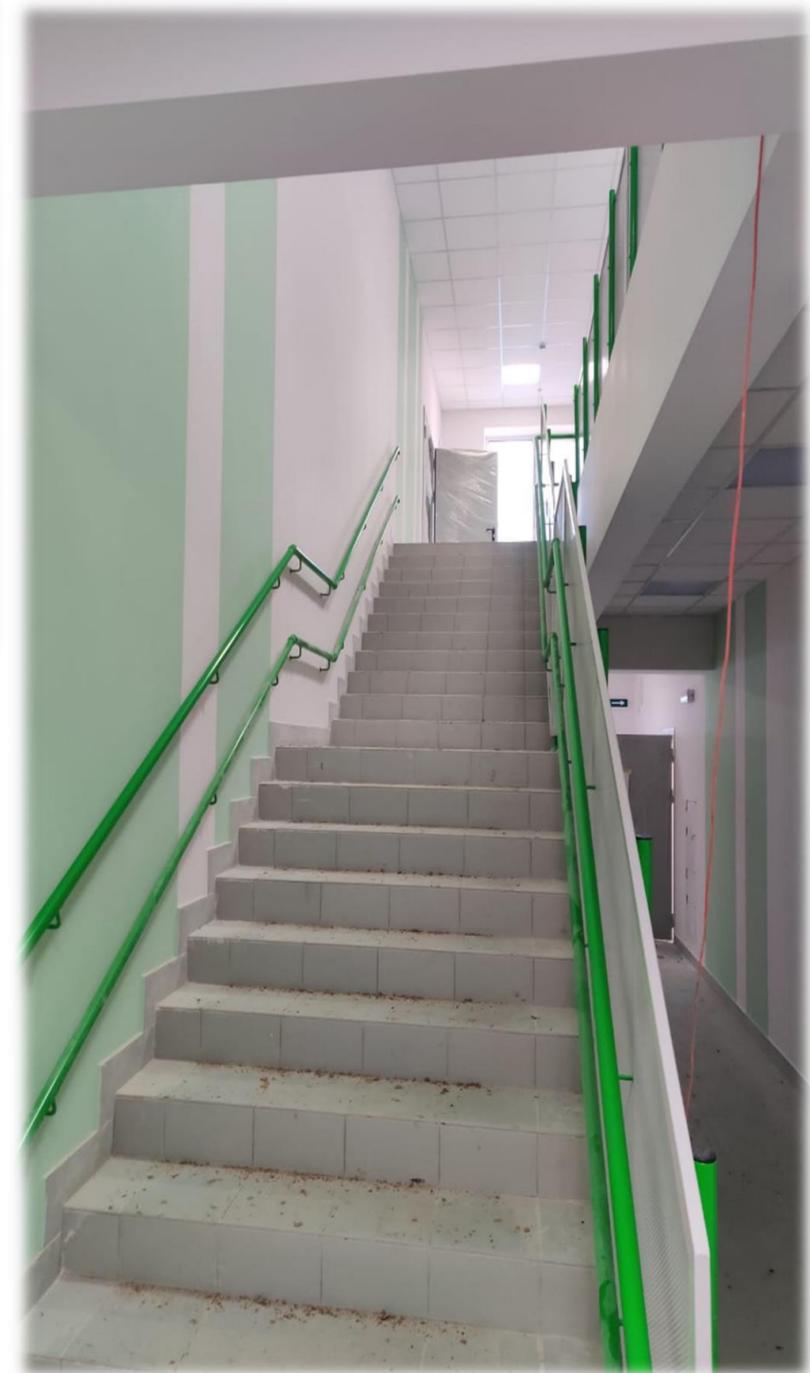

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 260 МЕСТ ЖК «ЛЕТО», Г.КАЗАНИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	Динамика за 2 недели
1	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса «Светлая долина» г.Казани.	17 860,47	59,00	12,00
2	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	31 593,58	65,00	10,00
3	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	971,30	100,00	0,00

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 332 551,38	45,42	6,86
2	Строительство биологических очистных сооружений в с. Коцаково Пестречинского муниципального района	66 321,36	99,73	0,84
ИТОГО		1 398 872,74		

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОСК Г.КАЗАНИ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С. КОЩАКОВО, ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Строительство станции водоподготовки в п. Васильево Зеленодольского района	136 284,40	78,00	8,00

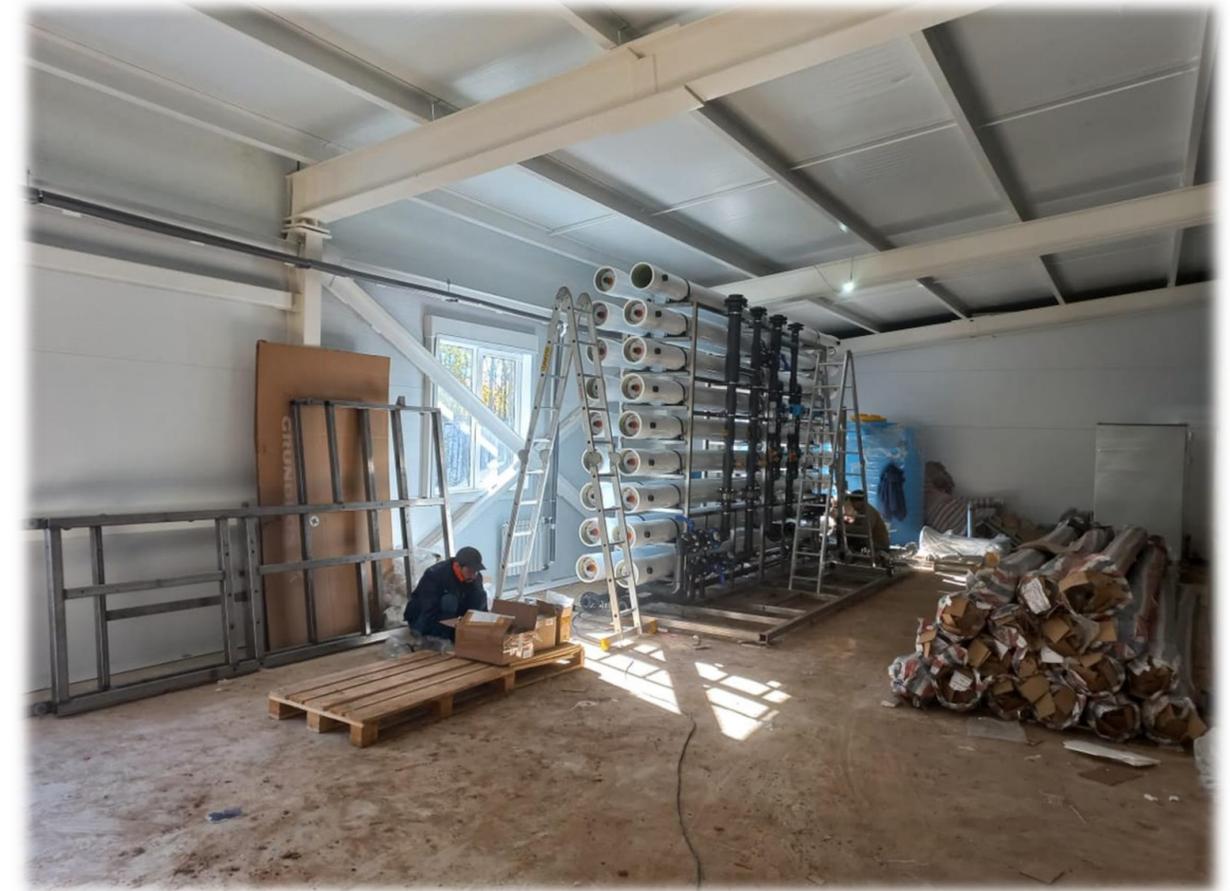

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	719 880,00	96,30	0,15



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, Парк отдыха, 2 очередь	32 515,25	40,00	15,00
2	Пестречинский, Детский городок	33 887,54	40,00	5,00
3	Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	50,00	9,00
4	Черемшанский, ул. Советская	14 051,74	63,00	3,00
5	Сармановский, Сквер «100 летия ТАССР»	25 746,23	70,00	18,00
6	Елабужский, Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани	64 253,96	75,00	3,00
7	Сабинский, Парк по ул. З.Юсупова, 2 очередь	23 173,86	76,00	26,00
8	Н.Челны, Бульвар Юных Ленинцев, 2 очередь	49 750,00	76,00	4,00
9	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки, 4 очередь	10 363,18	77,00	2,00
10	Верхнеуслонский, Парк отдыха	12 437,50	78,00	0,00
11	Аксубаевский, Сквер по ул. Мазилина, 3 очередь	21 056,55	79,00	0,00
12	Арский, Площадь Советская и ул. Большая, 4 очередь	38 578,72	80,00	20,00
13	Апастовский, Набережная р.Табарка	14 676,03	82,00	4,00
ИТОГО		1 452 960,79	87,30	7,25

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс .рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
14	Нурлатский, Городское озеро	41 627,20	83,00	3,00
15	Нижнекамский, Экопарк, 2 очередь	44 775,00	85,00	13,00
16	Балтасинский, Набережная вдоль реки Шошма	17 608,76	85,00	3,00
17	Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 4 очередь	18 641,38	87,00	2,00
18	Агрызский, ул. Карла Маркса, 3 очередь	26 117,80	88,00	11,00
19	Лениногорский, Парк «Мэхэббэт»	60 976,36	88,00	8,00
20	Атнинский, Парк по ул. Пионерская	9 690,00	90,00	8,00
21	Тетюшский, Березовая роща, 2 очередь	16 234,49	90,00	5,00
22	Чистопольский, Центральная площадь	24 403,99	90,00	0,00
23	Дрожжановский, Парк «Дуслык»	16 223,21	90,00	0,00
24	Менделеевский, Бульвар Интернационалистов	22 612,75	92,00	13,00
25	Тюлячинский, Пруд в селе Баландыш	9 950,00	93,00	4,00
26	Высокогорский, Сквер "100 лет ТАССР", 2 очередь	38 786,32	94,00	2,00
27	Нижнекамский, Сквер по ул. Корабельная	28 739,66	94,00	1,00
ИТОГО		1 452 960,79	87,30	7,25

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
28	Ютазинский, Сквер по ул. Ленина	15 229,61	95,00	5,00
29	Бавлинский, Парк Победы и Трудовой славы, 3 очередь	26 925,90	96,00	11,00
30	Алексеевский, Сквер по ул. Казакова (Парк Победы), 3 очередь	18 780,53	96,00	5,00
31	Нижнекамский, Пр.Химиков, 2 очередь	44 775,00	97,00	1,00
32	Азнакаевский, ул. Сююмбике, 2 очередь	45 226,26	97,00	0,00
33	Новошешминский, Площадь перед зданием ЗАГС, 2 очередь	9 614,03	98,00	18,00
34	Тукаевский, Парк «Дружбы народов»	15 987,41	98,00	3,00
35	Альметьевский, Внутриквартальный бульвар микрорайона Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул.Бигаш)	78 567,73	98,00	3,00
36	Тукаевский, Сквер по ул.Центральная	15 987,41	98,00	3,00
37	Алькеевский, Сквер "Спортивный"	14 046,47	99,00	14,00
38	Альметьевский, Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская)	78 567,73	99,00	2,00
ИТОГО		1 452 960,79	87,30	7,25

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
39	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, 3 очередь	35 669,39	99,00	0,00
40	Нижнекамский, Школьный бульвар	9 950,00	100,00	8,00
41	Зеленодольский. Парк «Березовая роща», мкр. Мирный, 2 очередь	92 953,60	100,00	5,00
42	Заинский, Набережная р.Зай, 4 очередь	13 271,55	100,00	1,00
43	Муслюмовский, Парк "Спортивный"	14 536,12	100,00	0,00
44	Нижнекамский, Центральный сквер, 2 очередь	9 950,00	100,00	0,00
45	Камско-Устьинский. Набережная р. Волга, 2 очередь	11 092,01	100,00	0,00
46	Нижнекамский, Экстрим-парк	69 650,00	100,00	0,00
47	Спасский, Центральная площадь, 3 очередь	13 989,31	100,00	0,00
48	Заинский, Площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь	40 389,16	100,00	0,00
49	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 2 очередь	7 344,70	100,00	0,00
ИТОГО		1 452 960,79	87,30	7,25

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

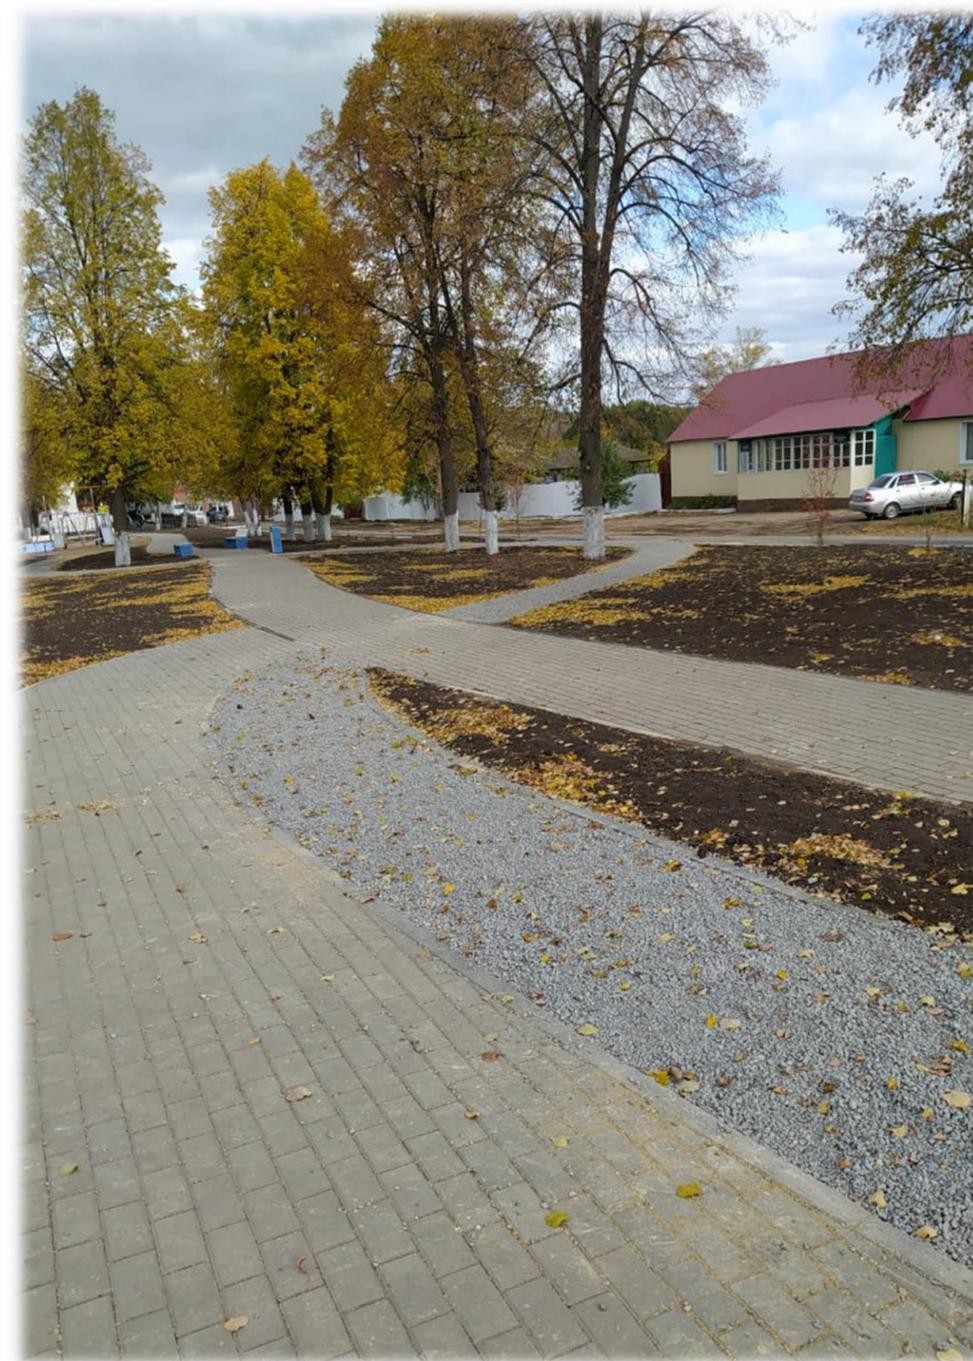

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АТНИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	42,00	5,00
2	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	49 750,00	74,00	8,00
ИТОГО		487 550,00	88,10	6,67
3	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	69 650,00	90,00	9,00
4	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	49 750,00	92,00	5,00
5	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	79 600,00	94,00	8,00
6	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	49 750,00	99,00	1,00
7	Азнакаевский, Набережная реки Черная	69 650,00	100,00	13,00
8	Буинский, Центральная площадь	69 650,00	100,00	2,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ «НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ВЯТКА» МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Нижнекамский МР, Верхне-Челнинский	3 974,01	59,00	17,50
2	Тукаевский МР, Новотроицкий	5 293,44	60,30	20,30
3	Мамадышский МР, Малокирменский	3 974,00	61,50	21,50
4	Кайбицкий МР, Бурундуковский	3 974,01	65,00	15,00
5	Тетюшский МР, Больше-Атрянский	3 974,00	65,00	15,00
6	Верхнеуслонский МР, Введено-Слободский	3 974,01	70,00	23,00
7	Зеленодольский МР, Ильинский	3 974,00	70,00	0,00
8	Тюлячинский МР, Шармашинский	3 974,01	72,00	25,00
9	Елабужский МР, Гаринский	3 974,01	72,30	6,30
10	Сабинский МР, Миченбашский	3 974,01	78,00	8,00
11	Агрызский МР, Янга-Аулский	3 974,01	78,50	12,75
12	Заинский МР, Кадыровский	3 974,01	79,00	9,00
13	Ютазинский МР, Ташкичуйский	2 502,37	80,00	12,00
14	Дрожжановский МР, Коршанга-Шигалинский	2 502,37	80,00	10,00
ИТОГО		165 284,33	88,01	12,44

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Камско-Устьинский МР, Шапкинский	3 974,01	85,00	10,00
16	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 974,01	85,00	35,00
17	Пестречинский МР, Карповский	3 974,00	87,00	9,00
18	Атнинский МР, Дусюмский	3 974,00	90,00	3,00
19	Буинский МР, Малобуинковский	3 974,01	92,00	2,00
20	Лаишевский МР, Шуранский	3 974,01	93,00	8,00
21	Рыбно-Слободский МР, Шеморбашский	3 974,01	94,00	7,00
22	Высокогорский МР, Ювасинский	3 974,00	95,00	13,00
23	Арский МР, Среднекорсинский	3 974,00	97,00	0,00
24	Спасский МР, Чечеклинский	3 974,00	97,00	13,00
25	Мензелинский МР, Атряклинский	3 974,00	97,50	2,50
26	Азнакаевский МР, Ильбяковский	3 974,01	99,00	7,00
27	Альметьевский МР, Клементейкинский	3 974,00	99,00	22,00
28	Новошешминский МР, Андреевский	3 974,00	99,00	12,00
29	Актанышский МР, Старо-Зияшевский	3 974,00	99,70	25,70
ИТОГО		165 284,33	88,01	12,44

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
30	Апастовский МР, Шигаевский	3 974,00	100,00	17,00
31	Алексеевский МР, Подлесно-Шенталинский	3 974,00	100,00	5,00
32	Аксубаевский МР, Новоузеевский	3 974,01	100,00	-
33	Алькеевский МР, Каракульский	3 974,00	100,00	-
34	Бавлинский МР, Татарско-Тумбарлинский	3 974,00	100,00	-
35	Балтасинский МР, Смаильский	3 974,00	100,00	1,00
36	Бугульминский МР, Наратлинский	3 974,00	100,00	-
37	Кукморский МР, Янцобинский	3 974,00	100,00	-
38	Лениногорский МР, Нижне-Чершилинский	3 974,00	100,00	6,00
39	Менделеевский МР, Актазикский	3 974,00	100,00	29,50
40	Нурлатский МР, Андреевский	3 974,00	100,00	-
41	Сармановский МР, Юлтимеровский	3 974,00	100,00	-
42	Черемшанский МР, Карамышевский	3 974,00	100,00	-
ИТОГО		165 284,33	88,01	12,44

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, АГРЫЗСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 368,39	70,00	10,00
2	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 368,39	80,00	10,00
3	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 217,17	82,00	7,00
4	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 217,17	90,00	5,00
ИТОГО		55 171,12	80,67	8,00

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ НУРЛАТСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	53 860,69	97,00	4,00
2	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.1406	53 860,69	97,00	2,50
3	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	53 860,69	98,00	3,00
4	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	53 860,69	98,00	1,00
ИТОГО		215 442,77	97,50	2,63

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	30,00	11,00
2	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	40,00	5,00
3	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	45,00	10,00
4	Строительство ДОЛ «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Камско-Устьинского муниципального района	30 118,12	75,00	13,00
5	Строительство МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 517,02	97,00	3,00
6	Строительство ДОЛ «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	77 051,25	100,00	-
ИТОГО		380 273,06	54,15	8,40

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, КАМСКО-УСТЬИНСКОГО РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Биктово, ул.Мирная	2 900,66	55,50	19,50
2	Тетюшский, с.Бессоново, ул.Стахановская	2 900,66	68,00	13,00
3	Дрожжановский, д.Татарские Тюки, ул.Советская	2 900,66	68,00	8,00
4	Пестречинский, с.Кулаево, ул.Профсоюзная	2 900,66	75,00	5,00
5	Кукморский, с.Каенсар, ул.1 Мая	2 900,66	83,00	0,00
6	Черемшанский, с.Мордовское Афонькино, ул.Цаплина	2 900,66	85,00	2,00
ИТОГО		46 410,62	87,78	7,89
7	Зеленодольский, с.Большие Ключи, ул.Волостнова	2 900,66	88,00	6,00
8	Кайбицкий, с.Мурали, ул.Центральная	2 900,66	90,00	12,00
9	Пестречинский, д.Надеждино, ул.Школьная	2 900,66	95,00	5,00
10	Сабинский, д.Куюк, ул.Татарстан	2 900,66	97,00	0,00
11	Актанышский, д.Нижнее Гареево, ул.Кирова	2 900,66	100,00	1,00
12	Елабужский, с.Новая Мурзиха, ул.Центральная	2 900,66	100,00	-
13	Сармановский, д.Кульметьево, ул.Хисамова	2 900,66	100,00	-
14	Чистопольский, с.Нарат-Елга, ул.Центральная	2 900,66	100,00	-
15	Алексеевский, с.Лебяжье, ул.65 лет Победы	2 900,66	100,00	-
16	Камско-Устьинский, д.Караталга, ул.Средняя	2 900,66	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН



КУКМОРСКИЙ РАЙОН

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	с.Кугарчино, ул.Зайтова, Рыбно-Слободский	5 363,59	100,00	6,00
2	п. Юлдуз, пер.Центральной, з/у 2а,Чистопольский	5 363,59	100,00	2,00
ИТОГО		69 726,63	100,00	4,00
3	с.Татарское Ходяшево, Пестречинский	5 363,59	100,00	-
4	с.Поисево, ул. Кирова, д.2А, Актанышский	5 363,59	100,00	-
5	с.Юхмачи, Ленина, д.1а, Алькеевский	5 363,59	100,00	-
6	с.Верхний Субаш, ул.Ленина, д.4, Балтасинский	5 363,59	100,00	-
7	с.Шугурово, ул. Ленина, д. 37, Лениногорский	5 363,59	100,00	-
8	с.Теньки, ул.Октябрьская, д.88А, Камско-Устьинский	5 363,59	100,00	-
9	с.Альшеево ул. Центральная, Буинский	5 363,59	100,00	-
10	г.Мензелинск, ул.Социалистическая, 65А, Мензелинский	5 363,59	100,00	-
11	с.Баландыш, ул.Гагарина, д.4, Тюлячинский	5 363,59	100,00	-
12	дер.Пойкино, ул.Первомайская, 51, Мамадышский	5 363,59	100,00	-
13	с.Бакрчи, ул.Гагарина, з/у 25а ,Тетюшский	5 363,59	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ, РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ РАЙОН




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

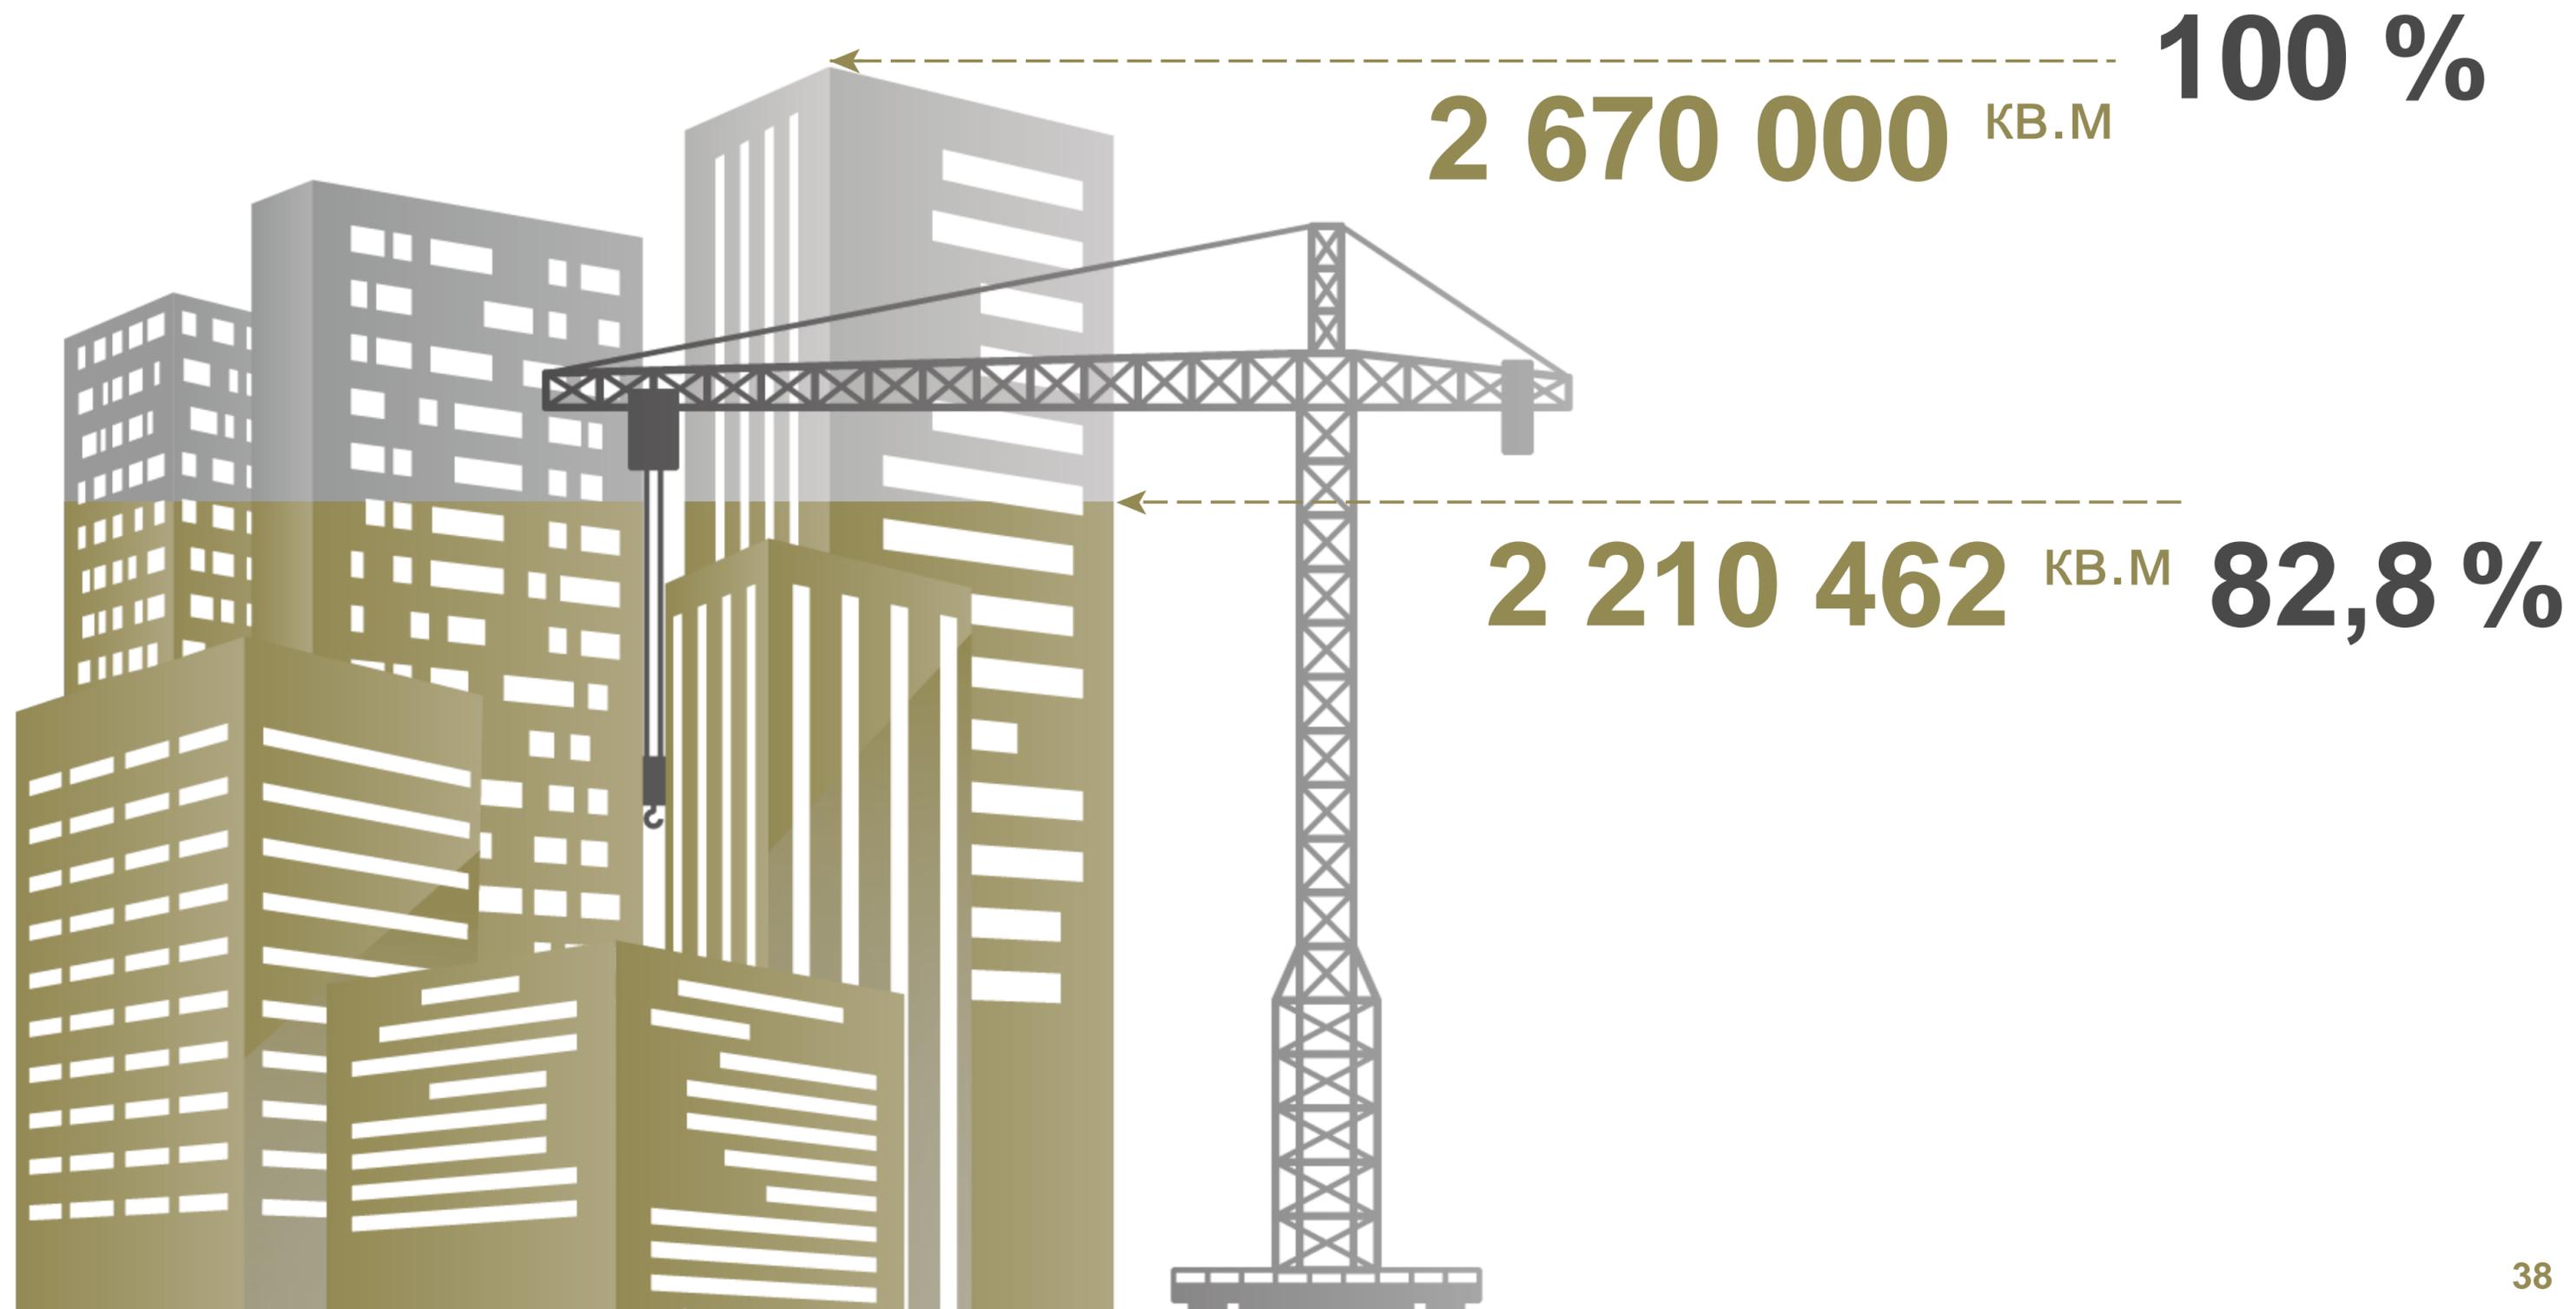

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Лениногорский	25 000	6 822	27,3	18 178
2	Муслюмовский	10 000	4 415	44,2	5 585
3	Новошешминский	5 000	2 630	52,6	2 370
4	Нижнекамский	70 000	37 028	52,9	32 972
5	Чистопольский	22 000	13 281	60,4	8 719
6	Зеленодольский	90 000	56 413	62,7	33 587
7	Азнакаевский	22 000	14 297	65,0	7 703
8	Альметьевский	120 000	79 737	66,4	40 263
9	Спасский	5 000	3 339	66,8	1 661
10	Менделеевский	13 000	8 771	67,5	4 229
11	Буинский	16 000	11 070	69,2	4 930
12	г.Наб.Челны	320 000	224 894	70,3	95 106
13	Агрызский	18 000	12 682	70,5	5 318
14	Бавлинский	15 000	10 945	73,0	4 055
15	В-Услонский	35 000	25 750	73,6	9 250
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 210 462	82,8	459 538

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Кайбицкий	5 000	3 690	73,8	1 310
17	Нурлатский	17 000	12 673	74,5	4 327
18	Апастовский	8 000	6 023	75,3	1 977
19	Алексеевский	16 000	12 136	75,9	3 864
20	Тетюшский	10 000	7 702	77,0	2 298
21	Сабинский	22 000	16 982	77,2	5 018
22	Аксубаевский	8 000	6 306	78,8	1 694
23	Дрожжановский	7 000	5 599	80,0	1 401
24	Елабужский	60 000	48 309	80,5	11 691
25	Актанышский	15 000	12 187	81,2	2 813
26	Заинский	20 000	16 294	81,5	3 706
27	Сармановский	10 000	8 238	82,4	1 762
28	Бугульминский	35 000	29 082	83,1	5 918
29	Р-Слободский	15 000	12 479	83,2	2 521
30	К-Устьинский	7 000	5 838	83,4	1 162
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 210 462	82,8	459 538

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.




№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	г.Казань	930 000	792 278	85,2	137 722
32	Ютазинский	13 000	11 353	87,3	1 647
33	Алькеевский	8 000	7 001	87,5	999
34	Балтасинский	15 000	13 141	87,6	1 859
35	Кукморский	27 000	23 974	88,8	3 026
36	Мамадышский	20 000	17 861	89,3	2 139
37	Арский	25 000	22 539	90,2	2 461
38	Мензелинский	14 000	12 781	91,3	1 219
39	Тюлячинский	7 000	6 618	94,5	382
40	Лайшевский	160 000	156 775	98,0	3 225
41	Черемшанский	6 000	5 908	98,5	92
42	Тукаевский	110 000	108 826	98,9	1 174
43	Пестречинский	190 000	192 379	101,3	0
44	Атнинский	4 000	4 240	106,0	0
45	Высокогорский	110 000	119 176	108,3	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 210 462	82,8	459 538

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

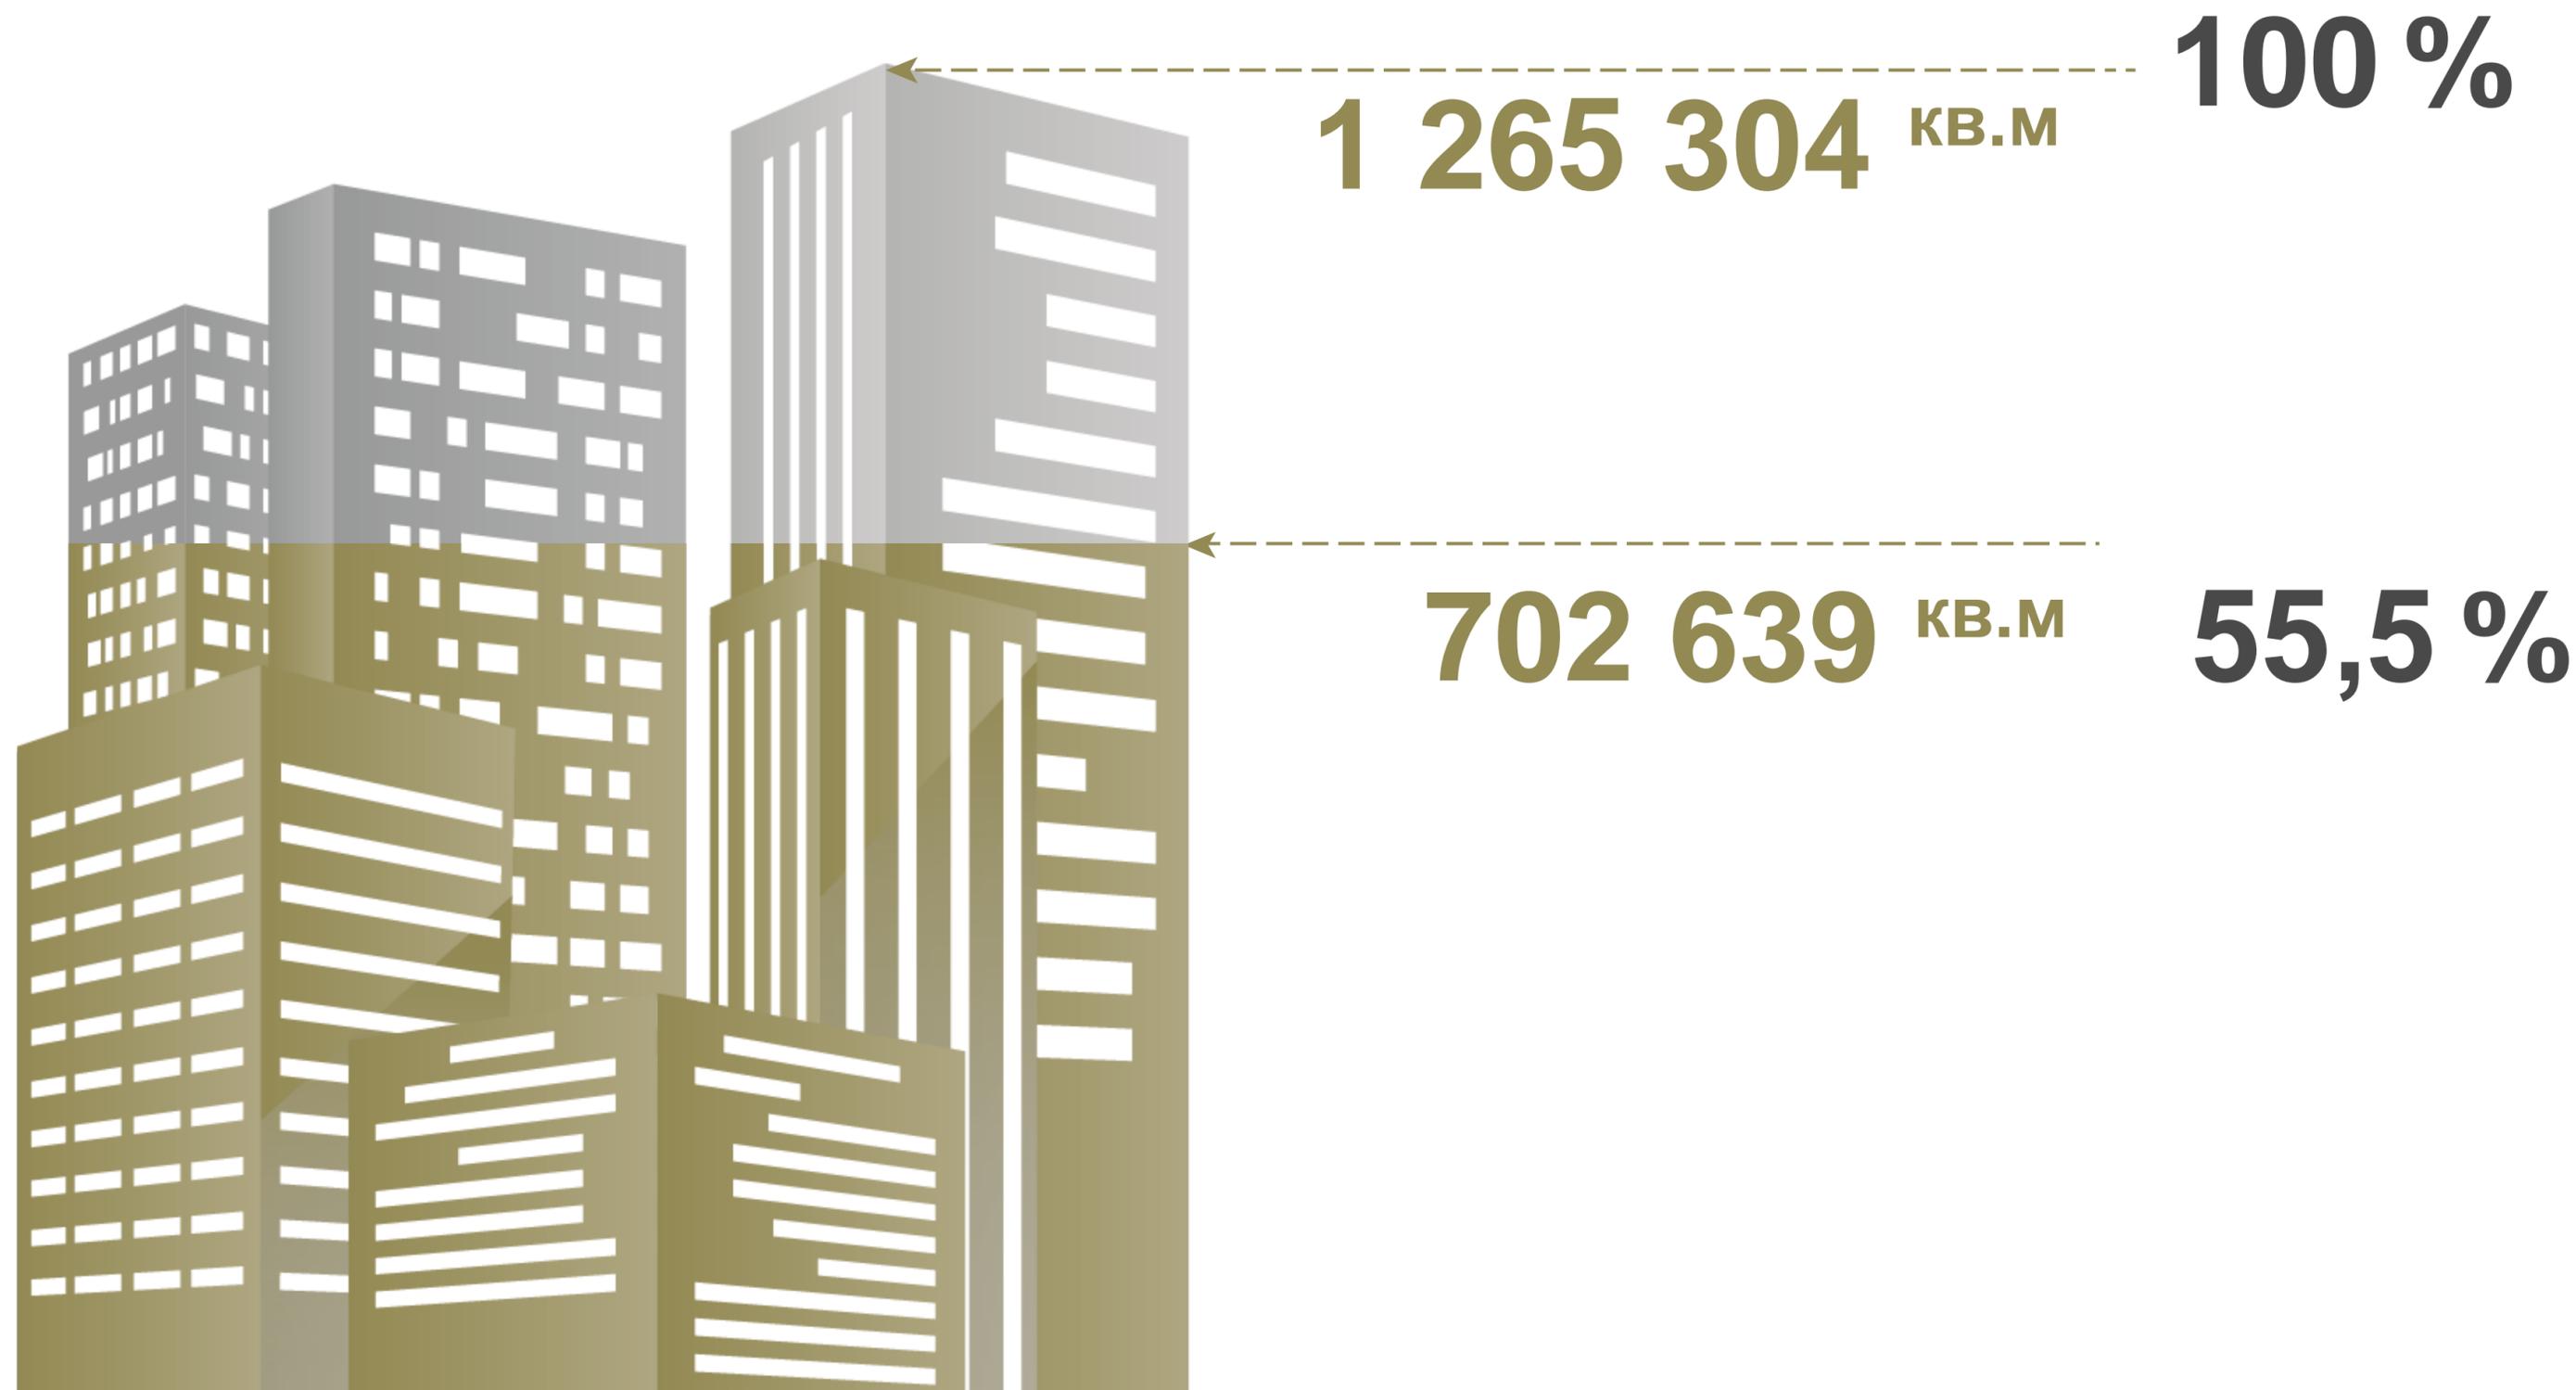

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-
2	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	-
3	АРСКИЙ	1	1	-
4	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	2	5
5	ВЫСОКОГОРСКИЙ	1	1	-
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	-	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	3	3	-
8	ЛАИШЕВСКИЙ	1	1	-
9	НИЖНЕКАМСКИЙ	1	1	-
10	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-
11	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	15	8	7
12	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	9	9	-
13	Г.КАЗАНЬ	32	13	19
ВСЕГО по РТ		74	42	32

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



280 496 КВ.М

100 %

116 399 КВ.М

41,5 %

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	161	99	1	62	37	11	14
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	5 159	2 104	45	3 055	2 634	362	59
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	280,50	116,4	2,7	164,1	136,9	23,6	3,6

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

←-----
10 307 ДОМОВ

123,7 %

←-----
8 330 ДОМОВ

100 %



ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	93	97	12
2	Чистопольский	183	128	55	0
3	Кукморский	53	47	6	0
4	Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	74	2	0
6	Лаишевский	20	20	0	1
ВСЕГО по РТ		1 102	939	163	13

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Земельные участки с ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	город Казань	3
4	Кукморский	1
	ВСЕГО по РТ	71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не снесены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский			34	28	17	79
2	Чистопольский		1	3		2	6
3	Кукморский	2	1			2	5
4	Высокогорский					2	2
ВСЕГО по РТ		2	2	37	28	23	92

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	8	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	6,87	6,87	-
ИТОГО:	740	1 196,65	100,28	1 096,37

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспечено
1	АЗНАКАЕВСКИЙ	1	1
2	АРСКИЙ	1	1
3	БАВЛИНСКИЙ	1	1
4	БУГУЛЬМИНСКИЙ	1	1
5	БУИНСКИЙ	1	1
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	1	1
8	НУРЛАТСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспечено
9	САБИНСКИЙ	1	1
10	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1
11	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
12	АПАСТОВСКИЙ	2	2
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	8	8
14	НИЖНЕКАМСКИЙ	11	8
15	Г.КАЗАНЬ	17	17
ИТОГО:		49	46

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено сирот
1	АКТАНЫШСКИЙ	4	4	0	0
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8	8	0	0
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18	18	18	18
4	АРСКИЙ	4	4	4	4
5	АТНИНСКИЙ	1	1	1	1
6	БАЛТАСИНСКИЙ	4	4	4	4
7	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6	6	6	6
8	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8	0	0	0
9	МАМАДЫШСКИЙ	16	16	16	16
ИТОГО:		389	164	152	152

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено сирот
10	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	19	0	0	0
11	НИЖНЕКАМСКИЙ	28	28	28	28
12	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4	0	0	0
13	НУРЛАТСКИЙ	12	0	0	0
14	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1	0	0	0
15	САРМАНОВСКИЙ	1	1	1	1
16	ТЕТЮШСКИЙ	4	0	0	0
17	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1	1	1
18	Г.НАБ.ЧЕЛНЫ	80	0	0	0
19	Г.КАЗАНЬ	170	73	73	73
ИТОГО:		389	164	152	152

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	1
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	1
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	2
6	БАВЛИНСКИЙ	1	0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	2
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	2
9	БУИНСКИЙ	1	1
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	5
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
12	ЗАИНСКИЙ	1	0
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4
14	КУКМОРСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
16	МАМАДЫШСКИЙ	1	1
17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	0
18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	1
19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	1
20	НУРЛАТСКИЙ	3	3
21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
22	САБИНСКИЙ	1	1
23	САРМАНОВСКИЙ	1	1
24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
25	Г.КАЗАНЬ	2	2
26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	6
ИТОГО:		47	39

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН




№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	4	1	1	1
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
1.3	<i>Менделеевский</i>	1	0	-	-
1.4	<i>Нижнекамский</i>	1	0	-	-
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	2	2	2
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	2	0	0
3.1	<i>Буинский</i>	1	1	1	-
3.2	<i>Тетюшский</i>	1	1	1	-
	ВСЕГО по РТ	8	5	5	3

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

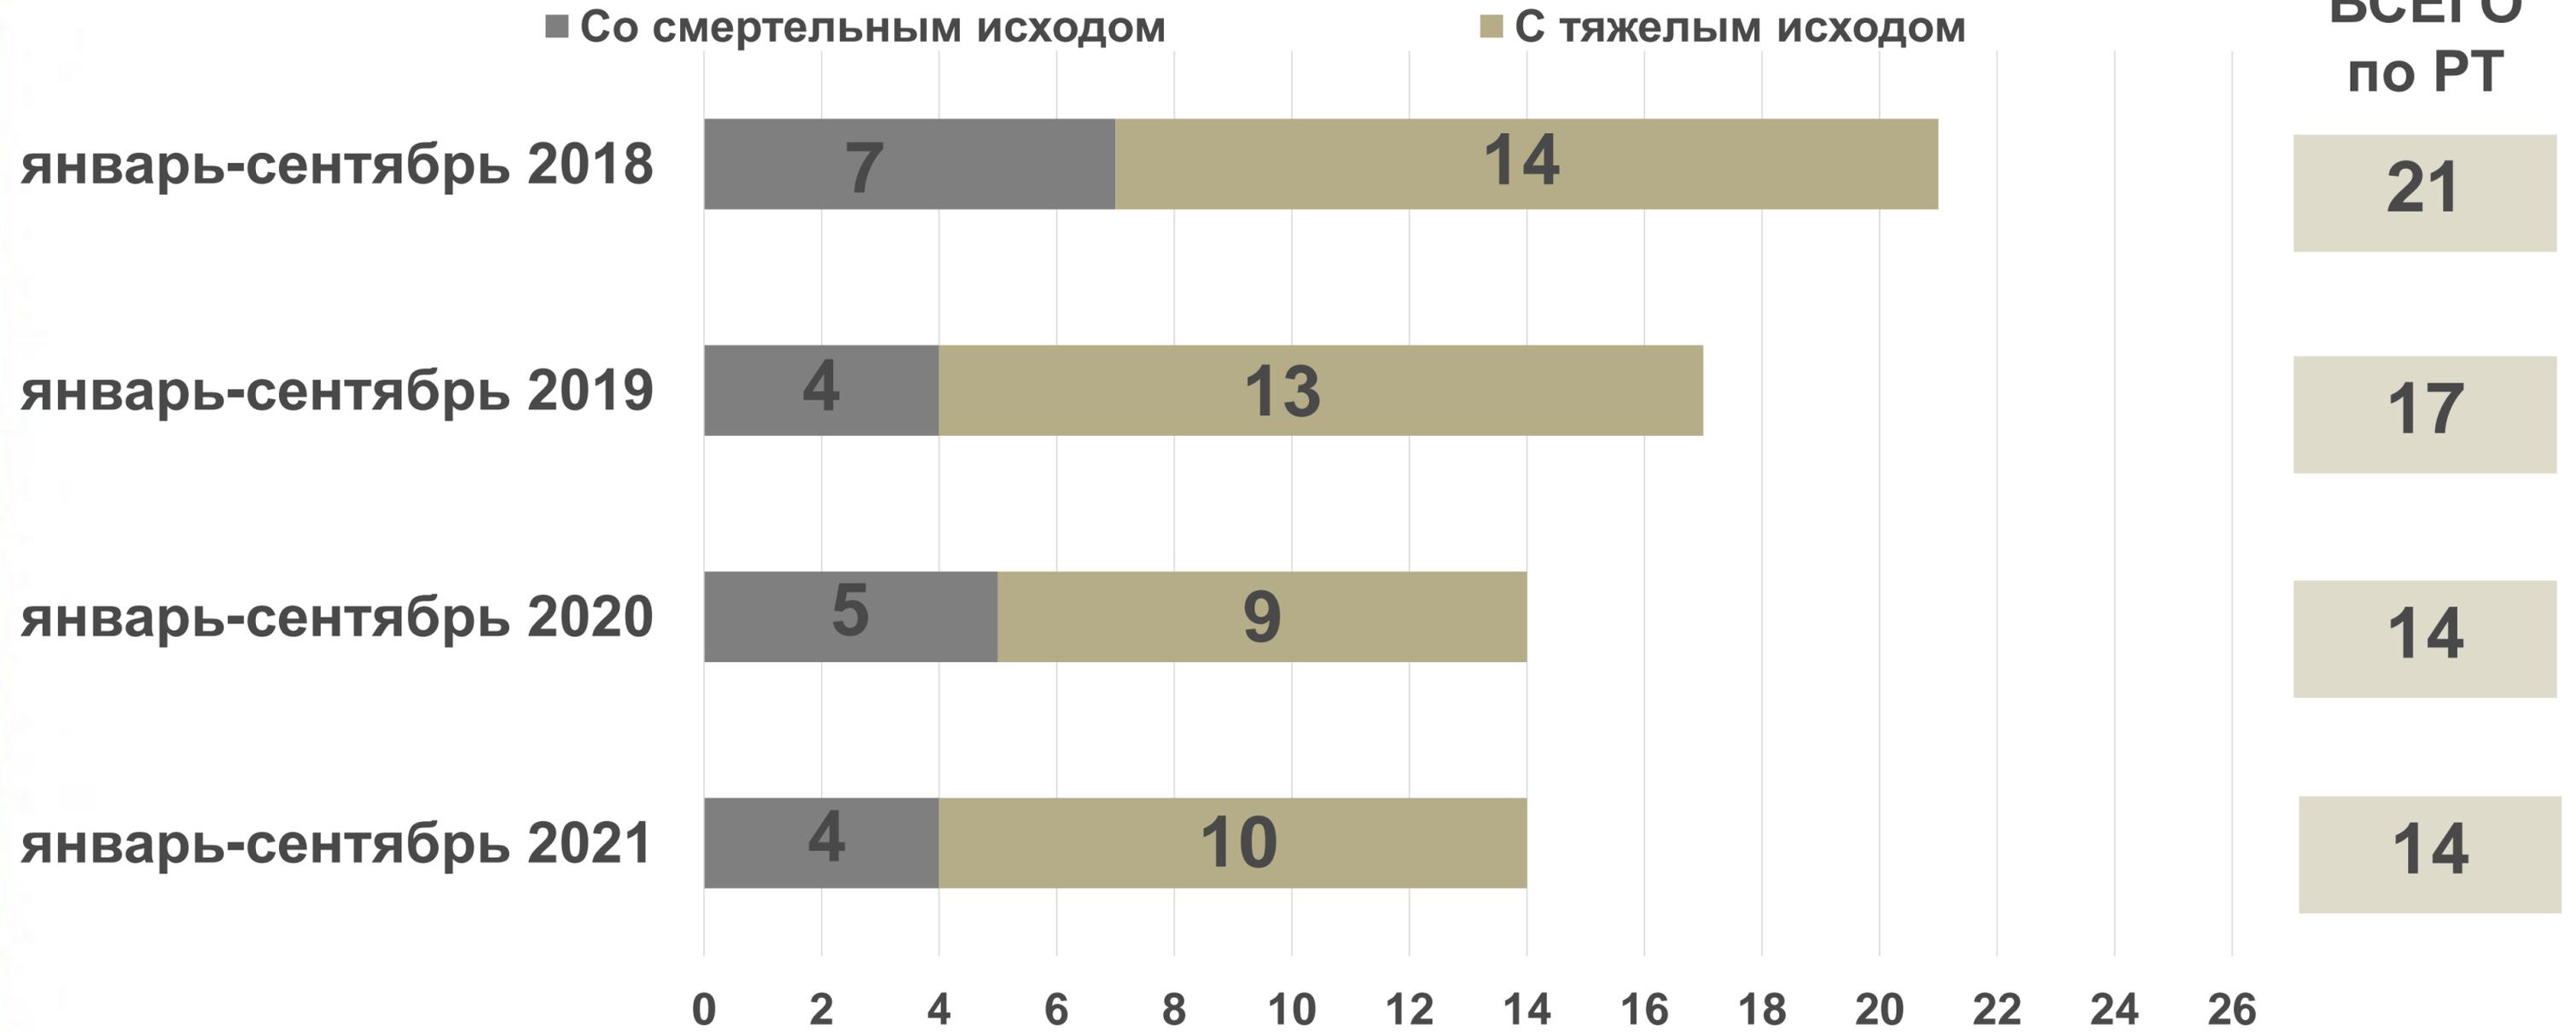


КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

Строительство жилого комплекса по ул. Шульгина, г. Казань

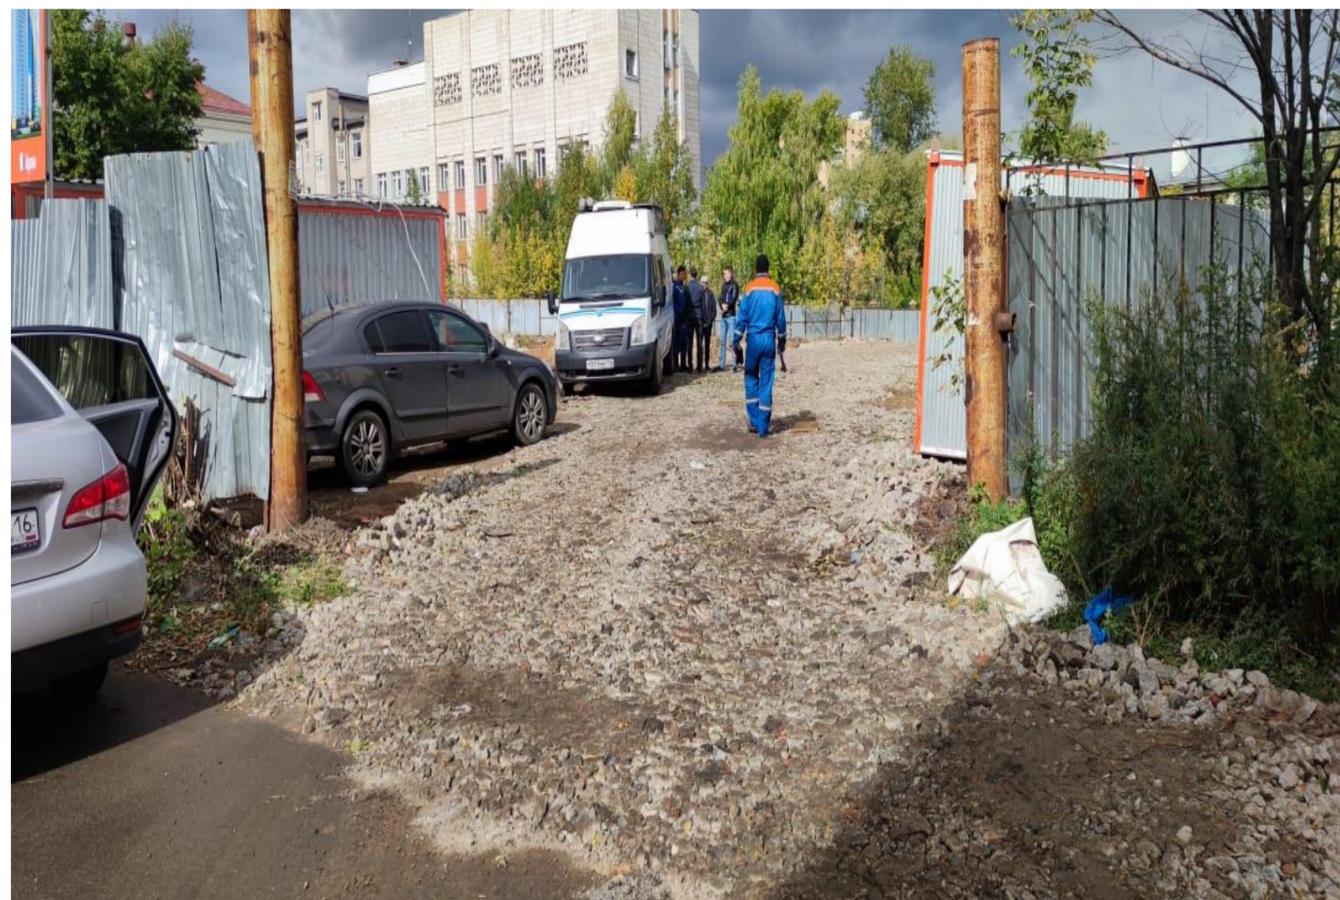

При строительстве жилого комплекса по ул. Шульгина в г. Казани при выезде со строительной площадки отсутствует пункт мойки колес

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Рама Строй Инвест»
Генподрядчик: ООО «Строительно-монтажное управление 16»**

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	1 356	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	94	5 238,00
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	29	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	39	4 147,00
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	26	1 091,00

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	1 571
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	810
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	929
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	358
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	188
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	102
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	281

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	564
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	918
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	910
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	284

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	131	259	251	97
2	г.Набережные Челны	38	38	38	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	6	2	2	100
7	Алексеевский	11	20	20	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	15	85	85	100
10	Апастовский	19	26	26	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	1	2	2	100
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	14	13	13	100
ВСЕГО по РТ		564	918	910	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	1	10	10	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	11	15	15	100
20	Елабужский	25	19	19	100
21	Заинский	4	20	20	100
22	Зеленодольский	11	25	25	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	6	11	11	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	22	49	49	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
ВСЕГО по РТ		564	918	910	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	37	22	22	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	9	8	8	100
35	Пестречинский	4	71	71	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	4	3	3	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	8	3	3	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	1	7	7	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
ВСЕГО по РТ		564	918	910	99



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
