



Оперативные данные Государственной жилищной инспекции по РТ

Год	Количество обследований	Количество нарушений, виды нарушений					
		Всего	в том числе				
			отсутствие средств индивидуальной защиты	нарушения правил использования и хранения баллонов высокого давления	нарушения правил производства высотных работ	отсутствие ограждений в опасной зоне производства работ	прочие нарушения
2013	2 519	23	7	4	9	0	3
2014	4 077	40	14	2	17	3	4
		↑	↑	↓	↑	↑	↑



Основные показатели деятельности Государственной жилищной инспекции РТ по контролю за капитальным ремонтом МКД

Наименование показателя	2014 год
Количество обследований (ед.)	4 077
Площадь обследованных домов (тыс. кв.м.)	14 048,6
Количество выданных предписаний (ед.)	17
Количество составленных протоколов (ед.)	1
Направлено писем в органы Прокуратуры (ед.)	24



Причины несчастных случаев


отсутствие средств индивидуальной защиты
14

отсутствие ограждений в опасной зоне производства работ
3

нарушения правил использования и хранения баллонов высокого давления
2

иные причины
4

нарушения правил производства высотных работ
17

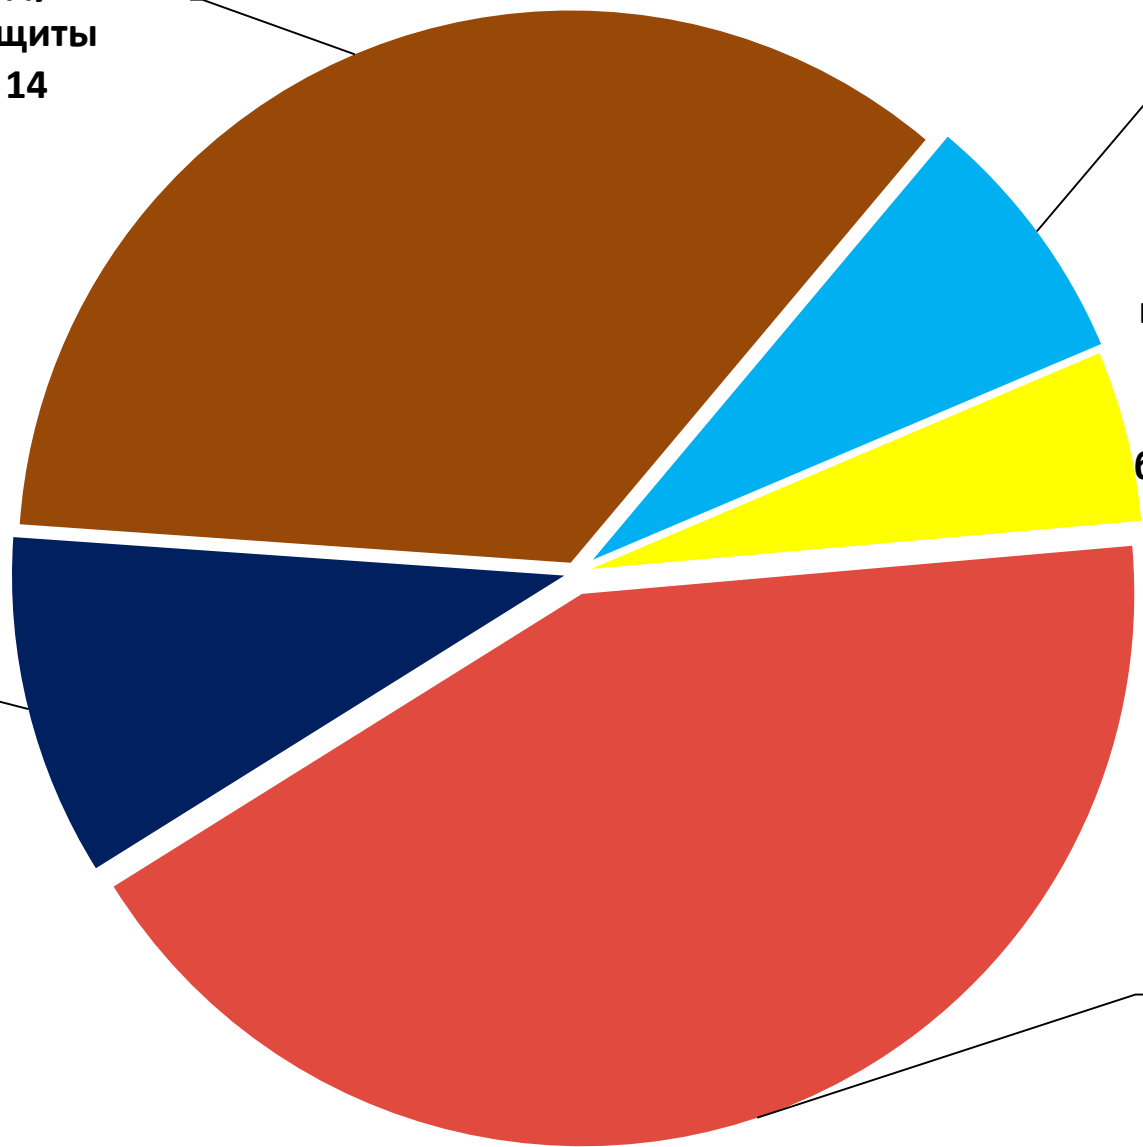



Программы 2015г., рассматриваемые на 2-ой неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

6

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Агрызский	8	5	16.01.2015	4	8
Азнакаевский	29	14	26.01.2015	14	29
Аксубаевский	3	2	27.01.2015	2	3
Актанышский	3	3	30.01.2015	1	3
Алексеевский	6	3	21.01.2015	1	6
Алькеевский	2	2	03.02.2015	1	2
Альметьевский	34	31	20.01.2015	18	34
Апастовский	1	2	20.01.2015	1	1
Арский	8	4	30.01.2015	4	8
Бавлинский	7	5	16.01.2015	3	7
Балтасинский	2	2	26.01.2015	1	2
Бугульминский	87	12	23.01.2015	9	87
Буинский	8	5	17.01.2015	5	8
Верхнеуслонский	1	2	22.01.2015	1	1
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

7

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Высокогорский	9	4	30.01.2015	4	9
г. Казань	280	110	19.01.2015	54	280
г. Наб.Челны	144	15	24.01.2015	7	144
Елабужский	44	6	15.01.2015	2	44
Заинский	14	5	12.01.2015	5	14
Зеленодольский	27	10	20.01.2015	5	27
К.-Устьинский	10	2	30.01.2015	1	10
Кукморский	9	2	22.01.2015	2	9
Лаишевский	6	3	23.01.2015	2	6
Лениногорский	15	14	23.01.2015	9	15
Мамадышский	11	2	16.01.2015	1	11
Менделеевский	6	3	19.01.2015	1	6
Мензелинский	6	3	23.01.2015	2	6
Муслюмовский	4	3	22.01.2015	1	4
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

8

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Нижнекамский	97	9	22.01.2015	6	97
Новошешминский	13	3	23.01.2015	1	13
Нурлатский	15	7	26.01.2015	5	15
Пестречинский	7	4	29.01.2015	4	7
Р.-Слободский	2	2	17.01.2015	1	2
Сабинский	7	2	29.01.2015	2	7
Сармановский	9	2	16.01.2015	2	9
Спасский	7	3	30.01.2015	3	7
Тетюшский	7	2	22.01.2015	1	7
Тукаевский	13	2	24.01.2015	2	13
Тюлячинский	1	2	30.01.2015	1	1
Черемшанский	7	2	03.02.2015	2	7
Чистопольский	16	4	16.01.2015	2	16
Ютазинский	14	2	28.01.2015	1	14
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	5
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	2
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	25
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	3
Бавлинский	7	36 195,78	5
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	32
Буинский	8	22 901,32	5
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	370



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	47
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	76
Елабужский	44	109 329,11	11
Заинский	14	62 977,49	6
Зеленодольский	27	235 365,55	16
К.-Устьинский	10	7 246,88	2
Кукморский	9	19 094,68	5
Лаишевский	6	17 684,29	3
Лениногорский	15	105 329,68	6
Мамадышский	11	13 897,90	7
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	4
Муслюмовский	4	6 636,76	3
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	370



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	18
Новошешминский	13	4 864,22	
Нурлатский	15	48 849,58	7
Пестречинский	7	14 868,35	2
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	5
Сармановский	9	33 119,83	2
Спасский	7	7 517,28	
Тетюшский	7	8 601,89	2
Тукаевский	13	29 854,94	10
Тюлячинский	1	1 224,36	
Черемшанский	7	10 003,84	3
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	6
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	370



Программа по капитальному ремонту школ программы на 2015 год

12

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 общеобраз., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
3

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	11,5	3,6	0
1	Атнинский	31 161,2	0,0	0,0	0,0
2	Новошешминский	9 457,0	0,0	0,0	0,0
3	Кайбицкий	11 577,1	0,4	0,0	0,0
4	Спасский	6 653,7	0,8	0,0	0,0
5	Ютазинский	8 544,4	1,5	0,8	0,0
6	Кукморский	36 822,7	1,7	0,8	0,0
7	Альметьевский	75 918,2	2,0	0,7	0,0
8	Балтасинский	27 728,9	2,2	1,5	0,0
9	Алексеевский	13 340,5	3,0	3,0	0,0
10	Чистопольский	43 111,7	4,0	3,6	0,0
11	Бавлинский	37 378,0	4,2	2,9	0,0
12	Черемшанский	22 374,4	4,4	2,5	0,0
13	Актанышский	53 863,8	5,2	3,3	0,0
14	Алькеевский	16 979,4	6,0	3,0	0,0
15	Нурлатский	35 851,6	6,3	2,4	0,0



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
4

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	11,5	3,6	0
16	Тюлячинский	14 781,9	7,5	3,8	0,0
17	Зеленодольский	79 090,7	7,6	2,7	0,0
18	Дрожжановский	29 477,6	8,1	7,4	0,0
19	Мамадышский	62 479,2	8,2	1,9	0,0
20	Мензелинский	48 987,0	8,2	3,8	0,0
21	Сабинский	47 870,8	8,3	7,9	0,0
22	Высокогорский	14 510,1	9,0	1,5	0,0
23	Сармановский	29 247,4	9,0	1,5	0,0
24	Аксубаевский	7 810,1	9,3	7,0	0,0
25	Азнакаевский	65 270,2	10,1	10,1	0,0
26	Бугульминский	109 789,8	10,2	3,4	0,0
27	г.Казань	413 937,7	10,9	4,8	0,0
	Итого по РТ	2 109 574,9	11,5	3,6	0,0
28	Менделеевский	25 563,7	12,5	2,8	0,0
29	Камско-Устьинский	16 267,4	12,7	12,0	0,0
30	Арский	76 384,0	13,5	6,0	0,0



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
5

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	11,5	3,6	0
31	Буинский	29 117,9	13,8	4,9	0,0
32	Лениногорский	33 112,6	13,8	5,0	0,0
33	Агрызский	16 830,8	14,4	0,4	0,0
34	г.Набережные Челны	310 059,3	14,8	3,0	0,0
35	Тукаевский	23 076,5	18,5	3,0	0,0
36	Нижнекамский	88 762,3	20,2	4,8	0,0
37	Муслюмовский	28 224,2	22,4	4,0	0,0
38	Апастовский	24 789,4	23,1	1,5	0,0
39	Пестречинский	24 054,6	24,4	6,8	0,0
40	Лаишевский	18 936,8	45,2	4,3	0,0
41	Заинский	25 569,6	50,5	3,0	0,0
42	Тетюшский	14 811,0	66,3	9,9	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	210 018,0	16,3	3,8	0,0
1	г.Казань "Специальная (коррекционная) ОШ №61 VIII вида"	28 507,4	0,0	0,0	0,0
2	Ютазинский , "Уруссинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	30 652,0	1,8	1,0	0,0
3	Пестречинский "Пестречинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	28 687,0	4,1	0,0	0,0
4	Арский, "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	27 100,0	5,5	4,4	0,0
5	Менделеевский, "Менделеевская специальная (коррекционная) ОШ VIII вида"	22 116,0	13,3	0,7	0,0
	Итого по РТ	210 018,0	16,3	3,8	0,0
6	Муслюмовский, "Нижнетабынская специальная (коррекционная) ОШ-интернат"	15 633,0	27,0	2,5	0,0
7	Бугульминский, «Бугульминская специальная (коррекционная) ОШ - интернат I, II вида	57 322,5	42,0	8,6	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	11,8	6,6	0,0
1	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, "Коргузинский детский сад"	3 281,0	0,0	0,0	0,0
2	г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, "Детский сад комбинированного вида № 16" "Лучик"	4 083,9	0,0	0,0	0,0
3	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад № 316 комбинированного вида"	30 595,7	0,0	0,0	0,0
4	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад № 407 комбинированного вида"	13 000,0	0,0	0,0	0,0
5	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад № 4" "Березка"	5 000,0	3,0	3,0	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

1
8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	11,8	6,6	0,0
6	пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	3,0	3,0	0,0
	Итого по РТ	156 734,1	11,8	6,6	0,0
7	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	14,0	12,0	0,0
8	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	17,0	17,0	0,0
9	г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	24,0	8,0	0,0
10	г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	25,0	8,0	0,0



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 72,100 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г. 20

Данные за 2 - 8 февраля 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	72 100,0	6,5	6,5	0,0
1	Сабинский, МБУ "Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 800,0	0,0	0,0	0,0
2	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм	15 000,0	0,0	0,0	0,0
3	Черемшанский, МБУ «ДОЛ "Солнечный"	2 950,0	0,0	0,0	0,0
4	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь "Чулпан"	5 000,0	2,5	1,5	0,0
5	г. Казань, Столовая спортивно-оздоровительного лагеря "Экран"	4 500,0	3,0	3,0	0,0
6	Елабужский, ДОЛ "Юный строитель"	4 800,0	5,0	5,0	0,0
7	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь "Олимпиец"	4 800,0	5,0	4,0	0,0
8	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 800,0	9,5	2,5	0,0
	Итого по РТ	72 100,0	12,9	6,4	0,0
9	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 200,0	15,0	15,0	0,0
10	Лениногорский, МБУ «ДОЛ "Дружба"	4 800,0	20,0	8,0	0,0
11	Нижнекамский, МБУ «ДОЛ "Заря"	4 800,0	30,0	15,0	0,0
12	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 800,0	43,0	35,0	0,0
13	Мамадышский, МБУ детский оздоровительный лагерь "Кама"	3 850,0	67,0	1,0	0,0

Перечень зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году

Наименование	Лимит, тыс. рублей
«Зеленодольский Механический колледж»	83 035,1
«Казанский строительный колледж»	106 475,7
«Мамадышский профессиональный колледж № 87»	101 065,7
«Нижекамский индустриальный техникум»	85 266,1
«Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	79 236,9
«Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая»	54 410,2
«Заинский политехнический колледж»	61 315,5
«Лаишевский технико-экономический техникум»	87 152,29
«Лениногорский нефтяной техникум»	23 421,43
Итого	681 379,18



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб	МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб
Агрызский	1	4 574,1	Заинский	1	4 434,1
Аксубаевский	1	1 061,5	Кукморский	1	3 165,2
Актанышский	1	4 434,1	Лайшевский	1	6 683,5
Алексеевский	1	2 026,5	Мамадышский	1	4 434,1
Альметьевский	1	2 026,5	Мензелинский	1	1 954,1
Апастовский	1	4 434,1	Муслюмовский	1	4 436,1
Арский	1	2 026,5	Новошешминский	1	1 341,3
Атнинский	1	4 535,5	Рыбно-Слободский	1	4 434,1
Балтасинский	1	4 434,1	Сабинский	1	8 294,1
Бугульминский	1	1 758,2	Сармановский	1	4 429,3
Высокогорский	1	2 991,5	Спасский	1	2 991,5
Дрожжановский	1	4 434,1	Тукаевский	1	4 434,1
Елабужский	1	3 165,2	Черемшанский	1	2 026,5
			Итого	26	94 960,7



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

МО	Количество клубов	Лимит финансирования, тыс. руб
Альметьевский	3	9 600,0
Балтасинский	1	4 000,0
Елабужский	2	5 250,0
Заинский	2	1 000,0
Зеленодольский	4	9 400,0
г.Казань	5	38 300,0
Мамадышский	1	4 000,0
Наб. Челны	5	9 900,0
Нижнекамский	5	9 000,0
Итого	28	90 450,0



Реализация Программы перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	4 349	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Реализация Программы по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» (ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	309,4 39 61	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

**Программа по восстановлению
освещения в 2015 году
(РКМ от 01.12.2014 № 2435-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов учета электроэнергии, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	31	+1
Вывезено на площадку модулей	26	+5
Подведены инж.сети	10	+1
Завершен монтаж	20	+3



Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

Строительство

29



Зеленодольский район, с.Кугушево
Генподрядчик «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000	8,6	3,5
1	г.Казань (Гос. ветеринарное объединение)	1 500	0	0
2	г.Казань (Респуб. ветеринарная лаборатория)	4 500	0	0
3	Кайбицкий	500	0	0
4	Лениногорский	2 000	0	0
5	Новошешминский	1 500	0	0
6	Аксубаевский	500	1	1
7	Алексеевский	1 000	2	2
8	Бавлинский	2 000	5	0
9	Сармановский	1 500	5	0
10	Балтасинский	2 000	6	1
11	Рыбно-Слободский	2 000	6	1
12	Тукаевский	1 000	7	7
13	Чистопольский	1000	8	1
14	Сабинский	4 000	14	4
15	Лаишевский	500	17	17
16	Нурлатский	2000	20	15
17	Спасский	1 500	20	15
18	Тюлячинский	1 000	45	0



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	20 000	6,5	5,2
1	Алькеевский	300	0	0
2	Апастовский	600	0	0
3	Балтасинский	200	0	0
4	Бугульминский	1 100	0	0
5	Буинский	660	0	0
6	Высокогорский	600	0	0
7	Дрожжановский	900	0	0
8	Заинский	250	0	0
9	Кайбицкий	300	0	0
10	Кукморский	1 000	0	0
11	Лениногорский	2 130	0	0
12	Муслюмовский	450	0	0



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
13	Нижнекамский	700	0	0
14	Тетюшский	1 600	0	0
15	Чистопольский	400	0	0
16	Актанышский	500	1	1
17	Бавлинский	480	1	1
18	Спасский	900	1	0
19	Сармановский	1 510	10	10
20	Пестречинский	800	13	11
21	Мамадышский	1 650	16	1
22	Лаишевский	1 000	20	20
23	Камско-Устьинский	450	30	25
24	Агрызский	500	32	32
25	Рыбно-Слободский	800	40	35



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	244	1 670,5	470,7	1 199,8
2	Строительство силосно-сенажных траншей	152	282,6	61,3	221,3
	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	24	166,6	50,0	116,6



Программа по созданию и обустройству парков и скверов в МО РТ на 2015 год

Распоряжение КМ РТ от 17.01.2015 № 39-р
Объем выделяемых средств
из бюджета РТ – 1 млрд. рублей

Муниципальным образованиям:

10 февраля – подача информации по землеотводам и
выдача технических заданий на проектирование

15 февраля - подписание Соглашений с Минстроем РТ и ГКУ
«Главинвестстрой»



Проведение квалификационного экзамена:

- ✓ экзамен проводится в форме компьютерного тестирования;
- ✓ из 200 вопросов путем произвольной выборки формируется 100, время-120 минут, если 86 ответов и > «правильно» - сдал;
- ✓ протокол экзамена направляется в ГЖИ РТ,
- ✓ график экзаменов утверждается лицензионной комиссией,
- ✓ квалификационный аттестат (срок действия - 5 лет) выдается ГЖИ на основании заявления.



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 441	2 446	6 995	26	349 417,29	89 675,87	259 741,42	26
1	город Казань	1 572	35	1537	2	50583,78	873,84	49709,94	2
2	Чистопольский	1 334	131	1203	10	45778,97	4583,86	41195,11	10
3	Зеленодольский	3 019	420	2599	14	120785,26	13735,4	107049,86	11
4	Бугульминский	97	15	82	15	4485,3	819,5	3665,8	18
5	Азнакаевский	256	41	215	16	13098,6	2102,1	10996,5	16
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,5	42,4	233,1	15
7	Заинский	21	6	15	29	806,2	258,8	547,4	32
8	Альметьевский	118	34	84	29	5187,4	1523,2	3664,2	29
9	Елабужский	101	30	71	30	3072,15	794,7	2277,45	26
10	Кукморский	426	137	289	32	13182,9	4250,9	8932	32
11	Спасский	129	47	82	36	5556,1	2244,1	3312	40
12	Лаишевский	85	31	54	36	3073,7	1055,7	2018	34
13	Лениногорский	73	27	46	37	3296,57	1187,6	2108,97	36
14	Нурлатский	173	64	109	37	5483,5	2294,6	3188,9	42
15	Агрызский	153	58	95	38	5972,7	2441,9	3530,8	41



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 441	2 446	6 995	26	349 417,29	89 675,87	259 741,42	26
16	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,9	40
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	119	113	51	7 919,94	5 209,50	2 710,44	66
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	84	50	63	4 908,30	2 727,15	2 181,15	56
21	Высокогорский	288	182	106	63	9 303,20	5 887,90	3 415,30	63
22	Буинский	147	95	52	65	6 974,00	4 058,50	2 915,50	58
23	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	34	10	77	1 464,30	1 335,40	128,90	91
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
27	Муслюмовский	80	68	12	85	3 550,42	3 126,23	424,19	88
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 441	2 446	6 995	26	349 417,29	89 675,87	259 741,42	26
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	на 07.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	24	26
1	Агрызский	2	47		7			38
2	Азнакаевский		30	1		3		16
3	Актанышский	2	25					100
4	Алексеевский	15	5	2		1	2	77
5	Алькеевский		1					100
6	Альметьевский	20	7					29
7	Апастовский	13	8					100
8	Арский	38	23	2		1	1	51
9	Балтасинский	5	46					83
10	Буинский	20	4				1	65
11	Бугульминский	2	2				2	15
12	Верхнеуслонский		1				1	25
13	Высокогорский	15	65	5		10		63
14	Дрожжановский		2					100
15	Елабужский	8	21		1			30



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	На 07.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	24	26
16	Заинский	3	1					29
17	Зеленодольский	109	249	51	4		7	14
18	Кайбицкий							100
19	К.-Устьинский	18	2					69
20	Кукморский	88	31		2	3		32
21	Лаишевский	4	19					36
22	Лениногорский	6	14					37
23	Мамадышский	54	60					97
24	Менделеевский	1	6					58
25	Мензелинский	2	13					82
26	Муслюмовский	5	24				2	85
27	Нижнекамский		14					100
28	Новошешминский	1	10					100
29	Нурлатский	19	25				3	37
30	Пестречинский		38					42



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	на 17.01.2015 (шт.)	на 23.01.2015 (шт.)	на 30.01.2015 (шт.)	На 07.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	66	18	18	24	26
31	Р.-Слободский		4					100
32	Сабинский		2					100
33	Спасский	12	23				2	36
34	Тукаевский	10						100
35	Тетюшский	3	2					39
36	Тюлячинский							100
37	Чистопольский	33	34	5	2			9
38	Ютазинский	14	27		2		3	63
39	г.Казань	9	11					2



Предоставление годового отчета по программе АЖФ

1	Азнакаевский	21	Зеленодольский
2	Алексеевский	22	К.Устьинский
3	Алькеевский	23	Казань
4	Апастовский	24	Кукморский
5	Заинский	25	Лаишевский
6	Кайбицкий	26	Лениногорский
7	Сабинский	27	Мамадышский
8	Тукаевский	28	Менделеевский
9	Агрызский	29	Мензелинский
10	Актанышский	30	Муслюмовский
11	Альметьевский	31	Нижекамский
12	Арский	32	Новошешминский
13	Бавлинский	33	Нурлатский
14	Балтасинский	34	Пестречинский
15	Бугульминский	35	Р.Слободский
16	Буинский	36	Спасский
17	В.Услонский	37	Тетюшский
18	Высокогорский	38	Тюлячинский
19	Дрожжановский	39	Чистопольский
20	Елабужский	40	Ютазинский

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	2,55	2,56	100,39
СМР	2,55	2,56	100,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	2,55	2,56	100,39
СМР	2,55	2,56	100,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	100,17	100,26	100,08

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 119,068
Обор-е 12,08			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	1,83	1,85	101,09
СМР	1,83	1,85	101,09
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	1,83	1,85	101,09
СМР	1,83	1,85	101,09
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	19,09	19,62	102,78

Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	4,95	4,96	100,20
СМР	4,95	4,96	100,20
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	4,95	4,96	100,20
СМР	4,95	4,96	100,20
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	73,94	74,82	101,18

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149	
		ПИР 2,5	СМР 72,049
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Март 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	2,15	1,96	91,16
СМР	2,15	1,96	91,16
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	2,15	1,96	91,16
СМР	2,15	1,96	91,16
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	68,25	68,19	99,91

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	1,90	1,93	101,50
СМР	1,90	1,93	101,50
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	1,90	1,93	101,50
СМР	1,90	1,93	101,50
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	97,54	97,67	100,13

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	1,05	1,00	95,24
СМР	1,05	1,00	95,24
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	1,05	1,00	95,24
СМР	1,05	1,00	95,24
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	1,38	1,33	96,38

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,05	СМР 58,65
		Обор-е 79,8	
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	3,65	3,68	100,82
СМР	3,65	3,68	100,82
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	3,65	3,68	100,82
СМР	3,65	3,68	100,82
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	55,63	55,76	100,23

Ведется: демонтажные работы – 98%, кладка стен – 98%, электромонтажные – 86%, монтаж системы отопления – 86%, системы вентиляции – 84%, отделочные работы – 62%, канализация – 87%. Тепло есть.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	1,05	1,00	95,24
СМР	1,05	1,00	95,24
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	1,05	1,00	95,24
СМР	1,05	1,00	95,24
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	1,38	1,33	96,38

Генподрядчик	ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик	Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.	181,7 млн.руб			
	ПИР 3,1	СМР 177,9	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства	Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства	Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 31.01.2015г. – 05.02.2015г.	2,10	2,10	100	
СМР	2,10	2,10	100	
Оборудование	0	0	0	
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 05.02.2015 г.	2,10	2,10	100	
СМР	2,10	2,10	100	
Оборудование	0	0	0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.02.2015 г.	97,25	97,27	100	



№	МО	№	МО
1	г.Казань	24	К.-Устьинский
2	Наб.Челны	25	Кукморский
3	Агрызский	26	Лаишевский
4	Азнакаевский	27	Лениногорский
5	Аксубаевский	28	Мамадышский
6	Актанышский	29	Менделеевский
7	Алексеевский	30	Мензелинский
8	Алькеевский	31	Муслюмовский
9	Альметьевский	32	Нижнекамский
10	Апастовский	33	Новошешминский
11	Арский	34	Нурлатский
12	Атнинский	35	Пестречинский
13	Бавлинский	36	Р.-Слободский
14	Балтасинский	37	Сабинский
15	Бугульминский	38	Сармановский
16	Буинский	39	Спасский
17	В.Услонский	40	Тетюшский
18	Высокогорский	41	Тукаевский
19	Дрожжановский	42	Тюлячинский
20	Елабужский	43	Черемшанский
21	Заинский	44	Чистопольский
22	Зеленодольский	45	Ютазинский
23	Кайбицкий		

**Информация
о заключении договоров
об информационно-
технологическом
взаимодействии
с ОАО "АК БАРС" Банком,
в части приема платежей
за ЖКУ через Портал
Госуслуг**

на 06.02.2015

Нет источников

Договор подписан
