



## Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-февраль 2014 года	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
январь-февраль 2015 года	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>



Опоры лесов установлены на случайные предметы

**Спортивно-оздоровительный комплекс, г. Набережные Челны**

**Заказчик – Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов. Подрядчик - ООО «Реконструкция»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Разводка временных электросетей проложена по земле  
**Детский сад на 260 мест в мкр. «Дуслык», г. Альметьевск**

**Заказчик – Управление образования Альметьевского района РТ**  
**Подрядчик - ООО «Стройкомплекс»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Строительные леса не обеспечены сплошными настилами

**3-этажное торговое здание, г.Казань, ул. Чистопольская**

**Заказчик – ООО «ТермоСервис». Генеральный подрядчик - ООО «Вега»**

Составлен протокол об административном правонарушении



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда в РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
Количество проверок	119	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	37	1 097,0
Взыскано всего	1	20, 0
Не истек срок оплаты	36	1 077,0

# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2015

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	96
- с выездом на объекты строительства	23
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	33
Выдано предписаний	9
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	24



# Программы 2015 года, рассматриваемые на **1** неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
5	Жилье для детей-сирот
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 441</b>	<b>2 502</b>	<b>6 939</b>	<b>27</b>	<b>349 417,29</b>	<b>91 469,68</b>	<b>257 947,61</b>	<b>26</b>
1	Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 334	151	1 183	11	45 778,97	5 087,77	40 691,20	11
3	Зеленодольский	3 019	420	2 599	14	120 785,26	13 735,40	107 049,86	11
4	Бугульминский	97	15	82	15	4 485,30	819,50	3 665,80	18
5	Азнакаевский	256	41	215	16	13 098,60	2 102,10	10 996,50	16
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	233,10	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
8	Заинский	21	7	14	33	806,20	298,10	508,10	37
9	Кукморский	426	150	276	35	13 182,90	4 592,80	8 590,10	35
10	Елабужский	101	36	65	36	3 072,15	1 025,00	2 047,15	33
11	Спасский	129	47	82	36	5 556,10	2 244,10	3 312,00	40
12	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
13	Нурлатский	173	65	108	38	5 483,50	2 327,30	3 156,20	42
14	Агрызский	153	58	95	38	5 972,70	2 441,90	3 530,80	41
15	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,90	40





№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 441</b>	<b>2 502</b>	<b>6 939</b>	<b>27</b>	<b>349 417,29</b>	<b>91 469,68</b>	<b>257 947,61</b>	<b>26</b>
16	Пестречинский	98	41	57	<b>42</b>	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
17	Лаишевский	85	39	46	<b>46</b>	3 073,70	1 333,90	1 739,80	43
18	Арский	232	120	112	<b>52</b>	7 919,94	5 256,60	2 663,34	66
19	Менделеевский	26	15	11	<b>58</b>	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	84	50	<b>63</b>	4 908,30	2 727,15	2 181,15	56
21	Высокогорский	288	185	103	<b>64</b>	9 303,20	5 976,20	3 327,00	64
22	Буинский	147	98	49	<b>67</b>	6 974,00	4 248,60	2 725,40	61
23	К-Устьинский	62	43	19	<b>69</b>	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	34	10	<b>77</b>	1 464,30	1 377,40	86,90	94
25	Мензелинский	160	131	29	<b>82</b>	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Балтасинский	71	59	12	<b>83</b>	2 602,85	2 263,40	339,45	87
27	Муслюмовский	80	68	12	<b>85</b>	3 550,42	3 126,23	424,19	88
28	Мамадышский	341	331	10	<b>97</b>	12 395,45	11 937,21	458,24	96



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 441</b>	<b>2 502</b>	<b>6 939</b>	<b>27</b>	<b>349 417,29</b>	<b>91 469,68</b>	<b>257 947,61</b>	<b>26</b>
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>27</b>
1	Агрызский	2	47	7			38
2	Азнакаевский		30	4			16
3	Актанышский	2	25				100
4	Алексеевский	15	5	3	2		77
5	Алькеевский		1				100
6	Альметьевский	20	7				29
7	Апастовский	13	8				100
8	Арский	38	23	3	1	1	52
9	Балтасинский	5	46				83
10	Буинский	20	4		1	3	67
11	Бугульминский	2	2		2		15
12	Верхнеуслонский		1		1		25
13	Высокогорский	15	65	15		3	64
14	Дрожжановский		2				100
15	Елабужский	8	21	1		6	36



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>27</b>
16	Заинский	3	1			1	33
17	Зеленодольский	109	249	55	7		14
18	Кайбицкий						100
19	К.-Устьинский	18	2				69
20	Кукморский	88	31	5		13	35
21	Лаишевский	4	19			8	46
22	Лениногорский	6	14				37
23	Мамадышский	54	60				97
24	Менделеевский	1	6				58
25	Мензелинский	2	13				82
26	Муслюмовский	5	24		2		85
27	Нижнекамский		14				100
28	Новошешминский	1	10				100
29	Нурлатский	19	25		3	1	38
30	Пестречинский		38				42



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>27</b>
31	Р.-Слободский		4				100
32	Сабинский		2				100
33	Спасский	12	23		2		36
34	Тукаевский	10					100
35	Тетюшский	3	2				39
36	Тюлячинский						100
37	Чистопольский	33	34	7		20	11
38	Ютазинский	14	27	2	3		63
39	г.Казань	9	11				2



# Предоставление годового отчета по программе АЖФ

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>
1	Чистопольский	1			
2	Казань	1			
3	Мензелинский	1	1		
4	Тюлячинский	1	1		
5	Камско-Устьинский	1	1	1	
6	Спасский	1	1	1	
7	Агрызский	1	1	1	1
8	Азнакаевский	1	1	1	1
9	Актанышский	1	1	1	1
10	Алексеевский	1	1	1	1
11	Алькеевский	1	1	1	1
12	Альметьевский	1	1	1	1
13	Апастовский	1	1	1	1



## Предоставление годового отчета по программе АЖФ

15

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>
14	Арский	1	1	1	1
15	Бавлинский	1	1	1	1
16	Балтасинский	1	1	1	1
17	Бугульминский	1	1	1	1
18	Буинский	1	1	1	1
19	Верхнеуслонский	1	1	1	1
20	Высокогорский	1	1	1	1
21	Дрожжановский	1	1	1	1
22	Елабужский	1	1	1	1
23	Заинский	1	1	1	1
24	Зеленодольский	1	1	1	1
25	Кайбицкий	1	1	1	1
26	Кукморский	1	1	1	1
27	Лаишевский	1	1	1	1



# Предоставление годового отчета по программе АЖФ

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>		<b>40</b>	<b>38</b>	<b>36</b>
28	Лениногорский	1	1	1	1
29	Мамадышский	1	1	1	1
30	Менделеевский	1	1	1	1
31	Муслюмовский	1	1	1	1
32	Нижнекамский	1	1	1	1
33	Новошешминский	1	1	1	1
34	Нурлатский	1	1	1	1
35	Пестречинский	1	1	1	1
36	Рыбно-Слободский	1	1	1	1
37	Сабинский	1	1	1	1
38	Тетюшский	1	1	1	1
39	Тукаевский	1	1	1	1
40	Ютазинский	1	1	1	1





# Информация по представлению данных МО в НО ГЖФ РТ по АЖФ по состоянию на 13.02.2015

№	МО	Площадь (кв.м.)	Кол-во (чел.)	Кол-во лицевых счетов	Кол-во семей принятых на учет в ГЖФ РТ	Заполнены ВСЕ данные для учетного дела АЖФ (чел.)	Заполнены ЧАСТИЧНО данные для учетного дела АЖФ (чел.)
<b>Итого по РТ</b>		<b>193742,56</b>	<b>12133</b>	<b>4977</b>	<b>1396</b>	<b>1923</b>	<b>4156</b>
1	Агрызский						
2	Азнакаевский	9895,90	497	194	192	92	405
3	Актанышский						
4	Алексеевский	1143,80	66	28	20	46	20
5	Алькеевский						
6	Альметевский	4062,60	298	105	23	63	235
7	Апастовский	865,37	69	24	21	69	0
8	Арский	7406,90	494	208	131	226	111
9	Бавлинский	0,00	0	0	0	0	0
10	Балтасинский						
11	Бугульминский	4504,30	217	100	30	8	87
12	Буинский	5231,50	379	120	62	181	198
13	Верхнеуслонский	275,50	15	9	9	-	9
14	Высокогорский						
15	Елабужский						
16	Дрожжановский	202,20	11	6	6	6	0



# Информация по представлению данных МО в НО ГЖФ РТ по АЖФ по состоянию на 13.02.2015

№	МО	Площадь (кв.м.)	Кол-во (чел.)	Кол-во лицевых счетов	Кол-во семей принятых на учет в ГЖФ РТ	Заполнены ВСЕ данные для учетного дела АЖФ (чел.)	Заполнены ЧАСТИЧНО данные для учетного дела АЖФ (чел.)
<b>Итого по РТ</b>		<b>193742,56</b>	<b>12133</b>	<b>4977</b>	<b>1396</b>	<b>1923</b>	<b>4156</b>
17	Заинский	806,20	53	21	21	51	2
18	Зеленодольский	120785,26	6942	3021	15	109	2883
19	Кайбицкий	43,52	5	3	3	3	0
20	К.Устьинский	2625,40	145	68	68		
21	Кукморский	8372,90	840	275	98	217	0
22	Лаишевский						
23	Лениногорский						
24	Нижнекамский	544,70	36	14	14	14	0
25	Новошешминский	633,60	37	18	8		
26	Нурлатский	5447,50	489	174	173	401	89
27	Мамадышский	12679,64	1006	377	296	296	0
28	Менделеевский	1066,87	70	26	26	26	0
29	Мензелинский						
30	Муслюмовский	148,40	9	5	0	0	5
31	Пестречинский	3513,40	284	98	98	13	85
32	Р.Слободский	310,10	13	7	7	0	13



# Информация по представлению данных МО в НО ГЖФ РТ по АЖФ по состоянию на 13.02.2015

№	МО	Площадь (кв.м.)	Кол-во (чел.)	Кол-во лицевых счетов	Кол-во семей принятых на учет в ГЖФ РТ	Заполнены ВСЕ данные для учетного дела АЖФ (чел.)	Заполнены ЧАСТИЧНО данные для учетного дела АЖФ (чел.)
<b>Итого по РТ</b>		<b>193742,56</b>	<b>12133</b>	<b>4977</b>	<b>1396</b>	<b>1923</b>	<b>4156</b>
33	Сабинский						
34	Спасский	2078,40	69	43	43	69	0
35	Тетюшский	756,90	64	23	22	8	14
36	Тукаевский	341,70	25	10	10	25	0
37	Тюлячинский						
38	Чистопольский						
39	Ютазинский						
40	Казань						



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 февраля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>309 729</b>	<b>12,9</b>	<b>2 090 271</b>
1	Новошешминский	5 000	0	0	5 000
2	В-Услонский	40 000	1 033	2,6	38 967
3	Арский	27 000	911	3,4	26 089
4	Бавлинский	17 000	752	4,4	16 248
5	К-Устьинский	10 000	461	4,6	9 539
6	Лениногорский	30 000	1 462	4,9	28 538
7	г.Наб.Челны	340 000	16 771	4,9	323 229
8	Спасский	8 000	417	5,2	7 583
9	Бугульминский	40 000	2 133	5,3	37 867
10	Агрызский	20 000	1 273	6,4	18 727
11	Нурлатский	26 000	1 732	6,7	24 268
12	Альметьевский	155 000	10 361	6,7	144 639
13	Дрожжановский	7 000	476	6,8	6 524
14	г.Казань	850 000	58 513	6,9	791 487
15	Нижнекамский	130 000	11 293	8,7	118 707



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 февраля 2015 года

21

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>309 729</b>	<b>12,9</b>	<b>2 090 271</b>
16	Р-Слободский	13 000	1 228	9,4	11 772
17	Буинский	19 000	1 801	9,5	17 199
18	Тукаевский	52 000	5 780	11,1	46 220
19	Атнинский	4 000	448	11,2	3 552
20	Азнакаевский	25 000	2 826	11,3	22 174
21	Черемшанский	10 000	1 219	12,2	8 781
22	Кайбицкий	4 800	628	13,1	4 172
23	Кукморский	35 000	4 656	13,3	30 344
24	Чистопольский	32 500	4 440	13,7	28 060
25	Мензелинский	16 000	2 186	13,7	13 814
26	Мамадышский	15 000	2 066	13,8	12 934
27	Заинский	20 000	2 991	15,0	17 009
28	Высокогорский	50 000	8 023	16,0	41 977
29	Сармановский	10 000	1 652	16,5	8 348
30	Муслюмовский	8 000	1 425	17,8	6 575



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 февраля 2015 года

22

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>309 729</b>	<b>12,9</b>	<b>2 090 271</b>
31	Алексеевский	14 000	2 639	18,9	11 361
32	Менделеевский	10 000	2 034	20,3	7 966
33	Тюлячинский	6 500	1 382	21,3	5 118
34	Сабинский	18 000	4 292	23,8	13 708
35	Балтасинский	14 000	3 846	27,5	10 154
36	Тетюшский	10 000	2 837	28,4	7 163
37	Алькеевский	6 500	1 982	30,5	4 518
38	Ютазинский	8 000	2 449	30,6	5 551
39	Актанышский	17 000	5 696	33,5	11 304
40	Аксубаевский	11 000	3 918	35,6	7 082
41	Зеленодольский	130 000	48 046	37,0	81 954
42	Лаишевский	62 000	23 165	37,4	38 835
43	Елабужский	45 000	18 949	42,1	26 051
44	Пестречинский	42 000	28 667	68,3	13 333
45	Апастовский	12 000	10 870	90,6	1 130



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

23

на 13.02.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	145	15	130	68	31	31
Общая площадь (тыс.кв.м.)	421,3	9,5	411,8	127,1	128,3	156,4
Кол-во квартир	7 018	193	6 825	2 501	2 154	2 170



# Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

Республика Татарстан	Кол-во объектов	Кол-во дольщиков	Общая площадь тыс. кв.м.
На 01.01.2008г.	93	10 342	777,5
На 10.02.2015г.	6	559*	77,2

**\*- договора с дольщиками (559 человек) по указанным объектам заключены в рамках ФЗ-214, сроки действия соответствуют графикам строительства**





# Информация по объектам долевого строительства в г.Казань

№	Наименование объекта	Застройщик	% готовности	Кол-во дольщиков	Динамика за 2 недели (%)
Объекты, включенные в федеральный реестр					
1	123 кв. ж.д по ул. Четаева	ООО «Элит строй»	50	18	2
2	139 кв. ж.д. ул.Амирхана	ООО «Магстрой»	65	24	0
3	128 кв. ж.д. ул.Амирхана	ООО «Магстрой»	95	3	0,5
4	82 кв.ж.д. по ул. Бехтерева/Космодемьянская	ООО "Фирма"Свей"	85	69	3
5	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского, 57	ООО «Фирма "Свей"»	90	27	2
6	218 кв.ж.д по ул Краснококшайская – ул.Баруди	ООО «ИТЦ»	70	121	3
<b>Итого:</b>				<b>262</b>	



# Объект долевого строительства (застройщик ООО «Магстрой»)



**128 кв. ж.д. по ул.Амирхана, 68 квартал**



# Объект долевого строительства (застройщик ООО «Свей»)





# Объект долевого строительства (застройщик ООО «Элит-строй»)





# Объект долевого строительства (застройщик ООО «ИТЦ»)



**218-кв. ж.д. по ул. Краснококшайская и ул.Баруди**



# Объект долевого строительства (застройщик ООО «Свей»)

30



30

82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/3.Космодемьянская



# Объект долевого строительства (застройщик ООО «Химстрой»)

31



**360-кв. ж/д стр.№58/02 Г. Набережные Челны**



# Информация по объекту долевого строительства в г.Набережные Челны на 10.02.2015г.

Наименование объекта	Застройщик	% готовности	Кол-во дольщиков
360 кв.ж.д. №58/02	ООО «Химстрой»	82	297

\*-На сегодняшний день привлечен новый застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье», который приступил к строительству работ.





## Мероприятия в отношении граждан, включенных в реестр дольщиков в соответствии с приказом Минрегиона России №403 от 20 сентября 2013 г.

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во дольщиков	Пути решения
1.	г.Казань	5	8	- привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов (4), - предоставление жилья в иных сдаточных домах (3).
2.	г. Набережные Челны 58/2	1	139	Привлечен новый застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье» для завершения строительства объекта.
3.	г. Бавлы	1	3	Привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов.
Итого в РТ		7	150	

# Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
<b>Через ГЖФ</b>					
123 кв. ж/дом ул.Айдарова Авиастроительного района г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	85	85	Февраль 2015
220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе Кировский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Февраль 2015
44(45) кв ул. Журналистов Советский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Февраль 2015

# Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
<b>Через ГЖФ</b>					
Перепрофилирование ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" по ул.Ленина, 92 в г.Бугульме	ООО «Строй Сервис»	ООО «Строй Сервис»	79	79	Июнь 2015
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	91 77	92 78	Июль 2015
<b>Промышленные предприятия</b>					
64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ "Алабуга"	ОАО «Камгэсэнерго строй»	77	78	Май 2015



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

36

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>10</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Бавлинский	1	13	-	1	-
3	Высокогорский	1	16	-	1	-
4	Зеленодольский	1	1	-	1	-
5	Кукморский	1	2	1	-	-
6	Лениногорский	1	8	-	1	-
7	Муслюмовский	1	6	-	1	-
8	Ютазинский	1	4	-	1	-
9	Наб. Челны	2	11	-	1	1



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
<b>Сдаются до 9 мая 2015 года</b>					
1	<b>Азнакаевский район</b> 144 кв. ж.д. №9 в мкр. 9 г.Азнакаево	ООО «КСТ-2000»	ООО «КСТ-2000»	4	27.02.2015
2	<b>Бавлинский район</b> 30 кв. ж.д по ул.Зиновьева, д 16, г.Бавлы	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энергострой сервис"	1	30.04.2015
3	<b>Кукморский район</b> 40 кв. ж.д. по ул.Гафиатуллина, поз 3, п.г.т.Кукмор	МУП «Гарант»	ОАО "Строй сервис"	2	30.04.2014
4	<b>Лениногорский район</b> 24-ти кв.ж.д. ул. Садовая 8Б г.Лениногорск	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Сарет"	8	30.04.2014
5	<b>Муслюмовский район</b> 15 кв. ж.д. Молодежная д.3/1 с.Муслюмово	ГКУ "ГИСУ"	ЗАО "Муслюмовска я МСО"	6	30.04.2014
6	<b>Ютазинский район</b> 15-ти кв.ж.д. ул. Каримова, д.3 пгт Уруссу	ГКУ "ГИСУ"	ООО"Энерго- стройсервис"	4	30.04.2014



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

Предусмотрено средств	356,42	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ		помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами		договоров



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

39

в Сводный список включено	801	семья
выделено из бюджета РТ	128,101	млн. руб.
В списке получателей	44	семья
Оформлено		сертификатов
Реализовано		сертификатов



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

40

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
1	Алькеевский	1	11	К-Устьинский	5
2	Альметьевский	2	12	Кукморский	1
3	Арский	4	13	Лаишевский	1
4	Аксубаевский	1	14	Мензелинский	1
5	Бавлинский	1	15	Н.Челны	3
6	Буинский	1	16	Нижнекамский	1
7	Дрожжановский	8	17	Спасский	1
8	Заинский	1	18	Чистопольский	2
9	Зеленодольский	2	19	Ютазинский	1
10	г.Казань	7		<b>ИТОГО</b>	<b>44</b>





# Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ПВГО ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на **2015** год

41

	ЧАЭС	Вынужденные переселенцы	Переселенцы с Крайнего Севера	
в Сводный список включено	74	177	142	семей
Контрольные цифры бюджета РФ	32,6	26,3	4,2	млн. руб.
Оформлено				Серти- фикатов
Реализовано				Серти- фикатов



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)



**г.Зеленодольск, ж/д по ул. пр. Строителей  
Застройщик – ООО «Ремстройсервис»**

# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>114</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
1	Альметьевский	6	3	1	2
2	Арский	2	1	1	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Бугульминский	4	1	1	2
5	Высокогорский	2	2	-	-
6	Елабужский	5	2	2	1
7	Зеленодольский	7	1	3	3
8	Лаишевский	2	1	1	-
9	Лениногорский	3	1	-	2
10	Нижнекамский	10	-	2	8
11	Пестречинский	2	1	1	-
12	г. Наб. Челны	38	12	15	11
13	г. Казань	32	8	11	13



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>9 826</b>	<b>1 859</b>	<b>7 967</b>



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
1	Пестречинский, с.Татарское Ходяшево	<b>Работы не начаты</b>			
2	Сабинский, с. Измя				
3	Спасский, д. Кожаевка				
4	Чистопольский, с.Кубассы				
5	Бугульминский, с.Татарская Дымская				
6	Лаишевский, д. Старая Пристань				
7	Лаишевский, с. Малая Елга				
8	Алькеевский, с. Салман				
9	Бавлинский, с. Александровка				



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
10	Верхнеуслонский, п.Октябрьское				
11	Лениногорский, с.Сугушла				
12	Сармановский, с.Старый Кашир				
13	Нижнекамский, с.Нижняя Уратьма				
14	Высокогорский, д.Пановка				
15	Аксубаевский, с.Старое Ибрайкино				
16	Агрызский, с.Кичкетан				
17	Альметьевский, мкр. "Урсала"				
18	Мамадышский, с.Рагозино				



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

47

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
1	Аксубаевский, с.Емелькино	<b>Работы не начаты</b>			
2	Бавлинский, с.Крым-сарай				
3	Лаишевский, с.Габишево				
4	Пестричинский, д.Куюки				
5	Сармановский, с.Саклов-баш				
6	Спасский, с.Никольское				
7	Чистопольский, с.Каргали				
8	Агрызский, с.Салауши				
9	Алькеевский, с.Старые Челны				
10	Лениногорский, с.Старые Иштерьяк				



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

48

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
11	Нижнекамский, п.Шингальчи				
12	Сабинский, с.Сатышево				
13	Высокогорский, с.Шапши				
14	Мамадышский, с.Тавели (ГЖФ)				
15	Мамадышский, с.Соколка (ГЖФ)				
16	Мамадышский, с.Зюри (ГЖФ)				
17	Бугульминский, п.г.п. Карабаш				
18	Альметьевский, с.Кама-Исмагилово				
19	Верхне-услонский, с.Канаш(рек-я)				
20	Мамадышский, с.Катлыш				





# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

49



**Агрызский район, с.Кичкетан**  
Подрядчик - ООО «СК СтройГрад»



# Программа детских садов **2015**

50

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	0	0
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	0	0
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	0	0



# Программа детских садов 2015

51

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динами ка
1	г. Казань, ул. Халезова	ООО Ак таш	55 310,90	1	1
2	Алексеевский, с. Лебяжье	ООО Керамика маркет	29 567,60	1	0
3	Нижнекамский, с. Ташлык	ООО ПромАльянс	29 567,60	1	1
4	г. Казань, п. Константиновна	ООО Градостроитель	55 310,90	1	1
5	г. Казань, ж/м "Салават купере"	ОАО Грейтстрой	141 660,07	2	2
6	Заинский, г. Заинск	ТеплоЭнергоМонтаж	83 358,63	3	3
7	Кукморский, д. Туембаш	ООО Строй-гарант	29 567,60	3	0
8	Тетюшский, с. Урюм	ООО ПМК Стройинвест	29 567,60	3	3
9	г. Казань, п. Сосновка	ООО Ак таш	83 358,63	3	3
10	г. Казань, ул. Р.Зорге	ООО Ак таш	29 567,60	3	3
11	Алькеевский, с. Базарные Матаки	ООО Тезелеш	55 310,90	4	0



# Программа детских садов 2015

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динамика
12	Лениногорский, с. Тимяшево	ООО Модуль	75 927,16	4	0
13	Менделеевский, с. Ижевка	ООО Евростиль	55 310,90	4	1
14	г. Казань, ул. Гвардейская	ООО Ак таш	55 310,90	4	4
15	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Сувар -Актив	83 358,63	5	2
16	г. Казань, п. Чебакса	ООО Ак таш	75 927,16	5	0
17	Арский, д. Мендюш	ООО Арская МСО	29 567,60	7	4
18	Арский, пос. Урняк	ООО СК МСУ Строй	29 567,60	7	4
19	Высокогорский, ст. Выс.Гора	ООО Плауэн	119 690,88	7	2
20	Высокогорский, пос. Березовка	ООО Плауэн	55 310,90	7	1
21	Лаишевский, с. Бол. Кабаны	Конвентстройинжиниринг	83 358,63	7	2
22	Альметьевский, г. Альметьевск	ООО Стройкомплекс	141 660,07	8	1



# Программа детских садов 2015

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динамик а
23	Верхнеуслонский, с. Вер.Услон	ОАО Каздорстрой	75 927,16	8	1
24	Елабужский, г. Елабуга	МУП «АпоТПЕМР»	147 457,79	8	0
25	К-Устьинский, п.г.т. К.Затон	ООО "Кама"	29 567,60	8	0
26	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	ООО Грань	147 457,79	8	1
27	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	8	1
28	Атнинский, с. Кошар	ООО СМ-СтройИнвест	29 567,60	9	0
29	Бавлинский, г. Бавлы	ООО Энергостройсервис	119 690,88	9	0
30	Р.Слободский, п.г.т. Р.Слобода	ООО Русартстрой	55 310,90	9	3
31	Черемшанский, с. Черемшан	ООО Промградстрой	55 310,90	9	0
32	г. Казань, ж/м Салават купере	ОАО Грейтстрой	141 660,07	9	0
33	Нурлатский, г. Нурлат	ООО ПИК+	141 660,07	10	3



# Программа детских садов 2015

54

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динами ка
34	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	ООО Ак таш	55 310,90	<b>10</b>	2
35	Ютазинский, пос. Уруссу	ООО ТАТ РДС	55 310,90	<b>10</b>	1
36	г. Казань, ул. Ю.Фучика	ООО Ак таш	119 690,88	<b>11</b>	7
37	г. Казань, ж.к. "Светлая долина»	ООО Ак Барс строй	183 842,15	<b>11</b>	0
38	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	<b>12</b>	6
39	г. Казань, п. Кояшлы	ООО ТНГС-И	55 310,90	<b>12</b>	2
40	Нижнекамский, с. Городище	ООО ПрофиСтрой- НК	29 567,60	<b>12</b>	3
41	г. Нижнекамск, мкр. 31	ООО Центрстрой	141 660,07	<b>13</b>	4
42	Азнакаевский, г. Азнакаево	ООО Азнакаевская ПМК	29 567,60	<b>14</b>	3
43	Балтасинский, с. Ципья	ООО СК Созидание	75 927,16	<b>14</b>	4
44	Верхнеуслонский, с.Т.Бурнашево	ООО БарсЭлитСтрой	29 567,60	<b>14</b>	6



# Программа детских садов 2015

55

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динамиче-ска
45	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	ЗАО Стройсервис	119 690,88	14	0
46	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройдорсервис+	83 358,63	14	1
47	г. Казань, ул. Павлюхина	ООО Унистрой	83 358,63	14	3
48	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	ООО Бриз	75 927,16	14	4
49	Сармановский, с. Сарманово	ООО Каптехстрой	75 927,16	15	1
50	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	ООО Евростиль	55 310,90	15	0
51	Тюлячинский, д. Шадки	ООО Цереком	29 567,60	15	0
52	Черемшанский, с. Ульяновка	ООО Промградстрой	29 567,60	15	1
53	г. Казань, ул. Фермское шоссе	ООО Грань	83 358,63	15	0
54	г. Казань, ул. Тэцевская	ООО Жик строй	119 690,88	15	0
55	Агрызский, с. Шаршада	ООО Строй гигант	29 567,60	16	0



# Программа детских садов 2015

56

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 13.02.15	динами ка
56	Зеленодольский, г. Зеленодольск	ООО Восход"	141 660,07	<b>16</b>	1
57	Новошешминский, с.Новошешминск	ООО Строитель	55 310,90	<b>16</b>	0
58	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	ООО Ак Барс строй	83 358,63	<b>17</b>	6
59	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	ООО Ак Барс строй	141 660,07	<b>17</b>	3
60	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	ООО Альтаир-1	29 567,60	<b>18</b>	2
61	г. Н.Челны, Сармановский тракт	ООО Грань	147 457,79	<b>18</b>	3
62	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек"	ООО Евростиль	147 457,79	<b>18</b>	5
63	г. Казань, ул. Габишева	ООО Унистрой	83 358,63	<b>18</b>	3
64	г. Казань, ул. Ак.Павлова- Молодежная	ООО Казан	55 310,90	<b>18</b>	1
65	г. Казань, мкр. М-14	ООО Ак таш	141 660,07	<b>18</b>	2
66	Буинский, г. Буинск	ООО СК Строй-Град	83 358,63	<b>19</b>	2





# Программа детских садов 2015

57

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 14.02.15	динами ка
67	Кукморский, пгт Кукмор	ООО Строй-гарант	141 660,07	<b>20</b>	3
68	Актанышский, с. Актаныш	ООО «ПМК»	83 358,63	21	5
69	Муслюмовский, с.Муслюмово	Менделеевск Дом строй	83 358,63	<b>22</b>	5
70	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	ООО Евростиль	147 457,79	<b>24</b>	6
71	Лаишевский, с. Сокуры	ООО Стройкорпорация	83 358,63	<b>27</b>	6
72	Лаишевский, г. Лаишево	ООО Строитель +	83 358,63	<b>27</b>	6
73	Пестречинский, с. Пестрецы	ООО Строитель +	75 927,16	<b>27</b>	6



# Программа детских садов 2015

## Строительство

58



**с. Сокуры, Лаишевский район  
Подрядчик: ООО «Стройкорпорация»**



# Программа детских садов 2015

59

## Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 13.02.15	динамика
1	Мензелинский, г. Мензелинск	ООО Лига	0	0
2	г. Казань, ул. Толстого	РемонтСтройСервис	0	0
3	г. Казань, ул. Агрызская	РемонтСтройСервис	0	0
4	г. Казань, пос. Аракчино	РемонтСтройСервис	1	1
5	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Стройсервис	3	3
6	Актанышский, с. Атясево	ООО Мастерстрой	5	0
7	Черемшанский, Сивашкино	ООО Строитель	10	10
8	г. Казань, ул. 40 лет Октября	РемонтСтройСервис	15	3
9	Менделеевский, г. Менделеевск	ООО СК КАМА	15	3
10	Тетюшский, Тоншерма	ООО Стройград	19	19
11	Тетюшский С. Большие Атряси	ООО Стройград	19	19
12	Аксубаевский, п. Мюд	ИП Зайдуллин	20	1
13	Арский, г. Арск	ООО Арская МСО	26	2
14	Пестречинский, с. Ленино-Кокушкино	ООО Универсал	50	40
15	г. Казань, ул. Годовикова	РемонтСтройСервис	53	53
16	г. Казань, ул. Жуковка	РемонтСтройСервис	100	0



# Программа детских садов 2015

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 13.02.15	динамика
1	г. Казань, МАДОУ №111	ООО РемонтСтройСервис	0	0
2	г. Казань, МАДОУ №365		0	0
3	г. Казань, МБДОУ № 375		0	0
4	г. Казань, МАДОУ № 392		0	0
5	г. Казань, МАДОУ № 19		0	0
6	г. Казань ,МАДОУ № 93		0	0
7	г. Казань, МАДОУ №129		0	0
8	г. Казань,МАДОУ № 370		0	0
9	г. Казань, МАДОУ № 388		0	0
10	г. Казань, МАДОУ № 401		0	0
11	г. Казань, МАДОУ № 411		0	0
12	г. Казань, МАДОУ № 69		0	0
13	г. Казань, МБДОУ № 321		0	0
14	г. Казань, МБДОУ № 350		0	0
15	г. Казань ,МАДОУ № 217		0	0



# Программа детских садов 2015

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 13.02.15	динамика
16	г. Казань, МАДОУ № 217	ООО РемонтСтройСервис	0	0
17	г. Казань, МАДОУ № 25		0	0
18	г. Казань, МАДОУ № 171		0	0
19	г. Казань, МАДОУ № 298		0	0
20	г. Казань, МАДОУ № 206		0	0
21	г. Казань, МАДОУ № 224		0	0
22	г. Казань, МАДОУ № 259		0	0
23	г. Казань, МАДОУ № 284		0	0
24	г. Казань, МАДОУ № 11		0	0
25	г. Казань, МБДОУ № 76		0	0



# Программа детских садов 2015

62

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 13.02.15	динамика
26	Апастовский п.г.т. Апастово	ООО УК Апк Апас	0	0
27	Зеленодольский, МБДОУ № 40	ООО Жилищная компания	0	0
28	Кайбицкий, МБДОУ Кушманский	ООО Заман	0	0
29	г. Казань, МБДОУ № 26	РемонтСтройСервис	0	0
30	Лениногорский, МБДОУ №30	ИП Загретдинова	1	1
31	Бугульминский, МБДОУ Прогресский	ООО Стройсервис	5	5
32	Лениногорский, МБДОУ № 26	ИП Загретдинова	5	5
33	Рыбно- Слободский, п.г.т Р.Слобода	ООО Рыбнослободский Универсалстрой	20	14
34	Заинский, МБДОУ Красная шапочка	ООО РемСтрой	33	18
35	Бавлинский, МБДОУ №2	ООО Ак строй	50	40
36	Тукаевский, с. Шильнебаш	ООО Диалог	70	51
37	г. Наб.Челны, МБДОУ № 85	ООО Медик	100	0
38	г. Наб.Челны, МБДОУ № 93	ООО Медик	100	0



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 13.02.2015	Дина- мика
1	Бугульминский, с.Соколка	ООО "СМ поезд №189"	11 035,5	0	0
2	Елабужский, с.Большой Шурняк	МУП «АпоТПЕМР»	9 459,0	1	0
3	Атнинский, с.Кошар	ООО "Атнинская МСО"	11 035,5	2	0
4	Р.-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	ООО "РусАртСтрой"	48 000,0	2	0
5	Спасский, с.Красная Слобода	ООО "РегионСторй"	9 459,0	2	2
6	Менделеевский, с.Тураево	ООО "СК Кама"	9 459,0	3	1
7	Тетюшский, с.Чинчурино	ООО "Надежда"	9 459,0	3	2
8	Чистопольский, с.Каргали	ЗАО "Строитех"	12 927,3	3	3
9	Бавлинский, с.Хагсверкино	ООО "Меготек-строй"	9 459,0	5	3
10	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	ООО "Евростиль"	11 035,5	5	5
11	Кукморский, с.Мамашир	ООО "Промкомбинат"	11 035,5	6	0
12	Кайбицкий, с.Надеждино	ООО "Альтаир-1"	9 459,0	8	6



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 13.02.15	Динамика
13	Сабинский, с.Тимершик	ООО "Ак Таш"	11 035,5	13	10
14	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	ООО "СФ "Строитель"	9 459,0	14	6
15	Алексеевский, с.Ялкын	ООО "Жилстройсервис"	11 035,5	15	0
16	Апастовский, с.Кзыл-Таш	ООО "СК "Свияжный"	11 035,5	15	3
17	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	ООО "Лига"	9 459,0	15	0
18	Новошешминский, д.Новое Иванаево	ООО "Строитель"	9 459,0	15	0
19	Сармановский, с.Ляки	ООО "Камстройфон"	9 459,0	15	0
20	Черемшанский, д.Сосновка	ООО "Строитель"	9 459,0	15	0
21	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	12 927,3	15	1
22	Альметьевский, с.Калейкино	ООО "Основа С"	12 927,3	17	2
23	Зеленодольский, пгт. Васильево	ООО "МУП-2"	12 927,3	17	2





# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 14.02.2015	Дина- мика
24	Тукаевский, н.п.Комсомолец	ООО "Камстройфон"	11 035,5	<b>17</b>	0
25	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	ООО "Строитель и К"	9 459,0	<b>18</b>	1
26	Агрызский, с.Ямурзино	ООО СК "СтройГрад"	12 927,3	<b>19</b>	0
27	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	ООО "Главстрой"	16 304,2	<b>20</b>	0
28	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	ООО "Глав Строй"	11 035,5	<b>22</b>	5
29	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	ООО "Максад"	11 035,5	<b>23</b>	2
30	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	ООО "Технология "	11 035,5	<b>23</b>	5
31	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	ООО "Сарет"	12 927,3	<b>24</b>	1
32	Мамадышский, пос.Мамадышский	ЗАО "Мамадышстрой"	11 035,5	<b>27</b>	1
33	Ютазинский, с.Акбаш	ООО "Юлдыз"	94 59,0	<b>28</b>	7



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 14.02.2015	Дина- мика
34	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	ООО "Строитель+"	11 035,5	<b>31</b>	11
35	Балтасинский, с.Тюнтерь	ООО "Сторй-Град"	11 035,5	<b>33</b>	5
36	Высокогорский, с.Айбаш	ООО "БарсЭлитСтрой"	11 035,5	<b>34</b>	7
37	Верх.-Услонский, с.Майдан	ООО "БарсЭлитСтрой"	9 459,0	<b>35</b>	0
38	Лаишевский, с.Каипы	ООО "СтройКом"	11 035,5	<b>35</b>	14
39	Заинский, с.Старый Токмак	ООО "Эверест"	9 459,0	<b>37</b>	1
40	Нурлатский, с.Караульная Гора	ООО "ГородСтрой"	9 459,0	<b>40</b>	6
41	Актанышский, с.Атясево	ООО "ПМК"	11 035,5	<b>42</b>	4
42	Арский, с.Старый Яваш	ООО "Арская МСО"	9 459,0	<b>69</b>	0
<b>Капитальный ремонт</b>					
1	г.Казань, ДК "Полимер"	ООО "Сайяр"	18 300,0	<b>0</b>	0



# Программа «Сельские клубы» 2015

## Строительство

67



Лаишевский район, с.Каипы  
Подрядчик: ООО "СтройКом"



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2015 год

68

№	Наименование	Кол-во	Фундамент	Вывезено модулей на площадку	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика
<b>1. Строительство</b>							
1.1	ФАП	60	47	8	0	<b>21</b>	9
1.2	Врач. амбулат.	2	1	0	0	<b>0,2</b>	0,2
1.3	ПАО	3	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>2. Капитальный ремонт</b>							
№	Наименование	Кол-во	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика	
2.1	Участковые больницы	5	3	0	<b>16</b>	5	
2.2	Врачебные амбул.	7	6	0	<b>17</b>	9	
2.3	Существующие ФАП	230	46	27	<b>18</b>	11	
2.4	ФАПы в школах	8	4	2	<b>42</b>	22	
2.5	Поликлиники	7	4	0	<b>26</b>	15	

**Строительство крытого плавательного бассейна  
с тренажерным залом в г.Болгар**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>139,98</b>	
		<b>СМР</b> <b>136,18</b>	<b>ПИР</b> <b>3,79</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> <b>06.02.2015г. – 12.02.2015г.</b>	<b>1,65</b>	<b>1,63</b>	<b>98,78</b>
<b>СМР</b>	1,65	1,63	100,39
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> <b>01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>4,20</b>	<b>4,19</b>	<b>99,76</b>
<b>СМР</b>	4,20	4,19	100,39
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 12.02.2015 г.</b>	<b>101,82</b>	<b>101,89</b>	<b>100,6</b>

# Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Казаньстройконсорциум»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>133,028</b>	
		<b>ПИР 1,88</b>	<b>СМР 119,068</b>
<b>Обор-е 12,08</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Ноябрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 06.02.2015г. – 12.02.2015г.</b>	<b>3,75</b>	<b>3,77</b>	<b>101,53</b>
<b>СМР</b>	<b>3,75</b>	<b>3,77</b>	101,09
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>5,58</b>	<b>5,62</b>	<b>100,72</b>
<b>СМР</b>	<b>5,58</b>	<b>5,62</b>	100,72
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>22,84</b>	<b>23,39</b>	<b>102,41</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 06.02.2015г. – 12.02.2015г.	<b>1,95</b>	<b>1,79</b>	<b>91,79</b>
<b>СМР</b>	1,95	1,79	91,79
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.	<b>6,90</b>	<b>6,75</b>	<b>97,83</b>
<b>СМР</b>	6,90	6,75	97,83
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>75,89</b>	<b>76,61</b>	<b>100,95</b>

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149	
		ПИР 2,5	СМР 72,049 Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Март 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ</b> 06.01.2015г. – 12.02.2015г.	1,21	1,22	100,82
СМР	1,21	1,22	100,82
Оборудование			
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.	3,36	3,18	94,64
СМР	3,36	3,18	94,64
Оборудование			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> НА 12.02.2015 г.	69,46	69,41	99,92



**Строительство универсального спортивного комплекса  
с игровым залом и бассейном в г. Чистополь**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>186,241</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 180,271</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 06.02.2015г. – 12.02.2015г.</b>	<b>1,45</b>	<b>1,32</b>	<b>91,03</b>
<b>СМР</b>	1,45	1,32	91,03
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>3,35</b>	<b>3,25</b>	<b>97,01</b>
<b>СМР</b>	3,35	3,25	97,01
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>

## Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7 Обор-е 17,6
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ</b> 06.02.2015г. – 12.02.2015г.	0,71	0,77	108,45
СМР	0,71	0,77	108,45
Оборудование			
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.	1,76	1,77	100,57
СМР	1,76	1,77	100,57
Оборудование			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> НА 12.02.2015 г.	2,09	2,10	100,48

**Капитальный ремонт Камского детского медицинский центра  
в г.Н.Челны (блок «Г»)**

<b>Генподрядчик</b>		<b>КамГЭСэнергоСтрой</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>140,5</b>	
		<b>ПИР 2,05</b>	<b>СМР 58,65</b>
<b>Обор-е 79,8</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b>			
<b>06.02.2015г. – 12.02.2015г.</b>	<b>7,80</b>	<b>7,78</b>	<b>99,74</b>
<b>СМР</b>	<b>2,80</b>	<b>2,78</b>	<b>99,74</b>
<b>Оборудование</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b>			
<b>01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>11,45</b>	<b>11,46</b>	<b>100,08</b>
<b>СМР</b>	<b>6,45</b>	<b>6,46</b>	<b>100,08</b>
<b>Оборудование</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>63,43</b>	<b>63,54</b>	<b>100,17</b>

## Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>195,2 млн.руб</b>		
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 169,8</b>	<b>Обор-е 12,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>сентябрь 2015 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ 06.02.2015 г. – 12.02.2015г.</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>100,0</b>	
<b>СМР</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>100,0</b>	
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100,0</b>	
<b>СМР</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100,0</b>	
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100</b>	

# Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Спецстройинвест»</b>			
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Аксубаевского МР</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>181,7 млн.руб</b>			
		<b>ПИР 3,1</b>	<b>СМР 177,9</b>	<b>Обор-е 40,4</b>	<b>Проч 8,5</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>		
<b>НЕДЕЛЯ 05.02.2015г. – 12.02.2015г.</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>100</b>		
<b>СМР</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>100</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 12.02.2015 г.</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>100</b>		
<b>СМР</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>100</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 12.02.2015 г.</b>	<b>99,45</b>	<b>99,47</b>	<b>100</b>		




## Сдача квалификационных экзаменов руководителями УК на 13.02.2015

	МО РТ	Кол-во аттесту- емых	Сдали	Не сдали	% не сдавших
6.02	Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Аксубаевский	44	41	3	7
9.02	Арский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, г. Казань Верхнеуслонский	42	33	9	27
10.02	г. Казань	32	29	3	10
11.02.	г. Казань	34	27	7	20
12.02	г.Набережные Челны	56	49	7	12
13.02	Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Камско-Устьинский	55	44	11	25
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>267</b>	<b>226</b>	<b>41</b>	<b>15</b>



# Информация о платежах за ЖКУ, через Портал государственных и муниципальных услуг по г. Набережные Челны

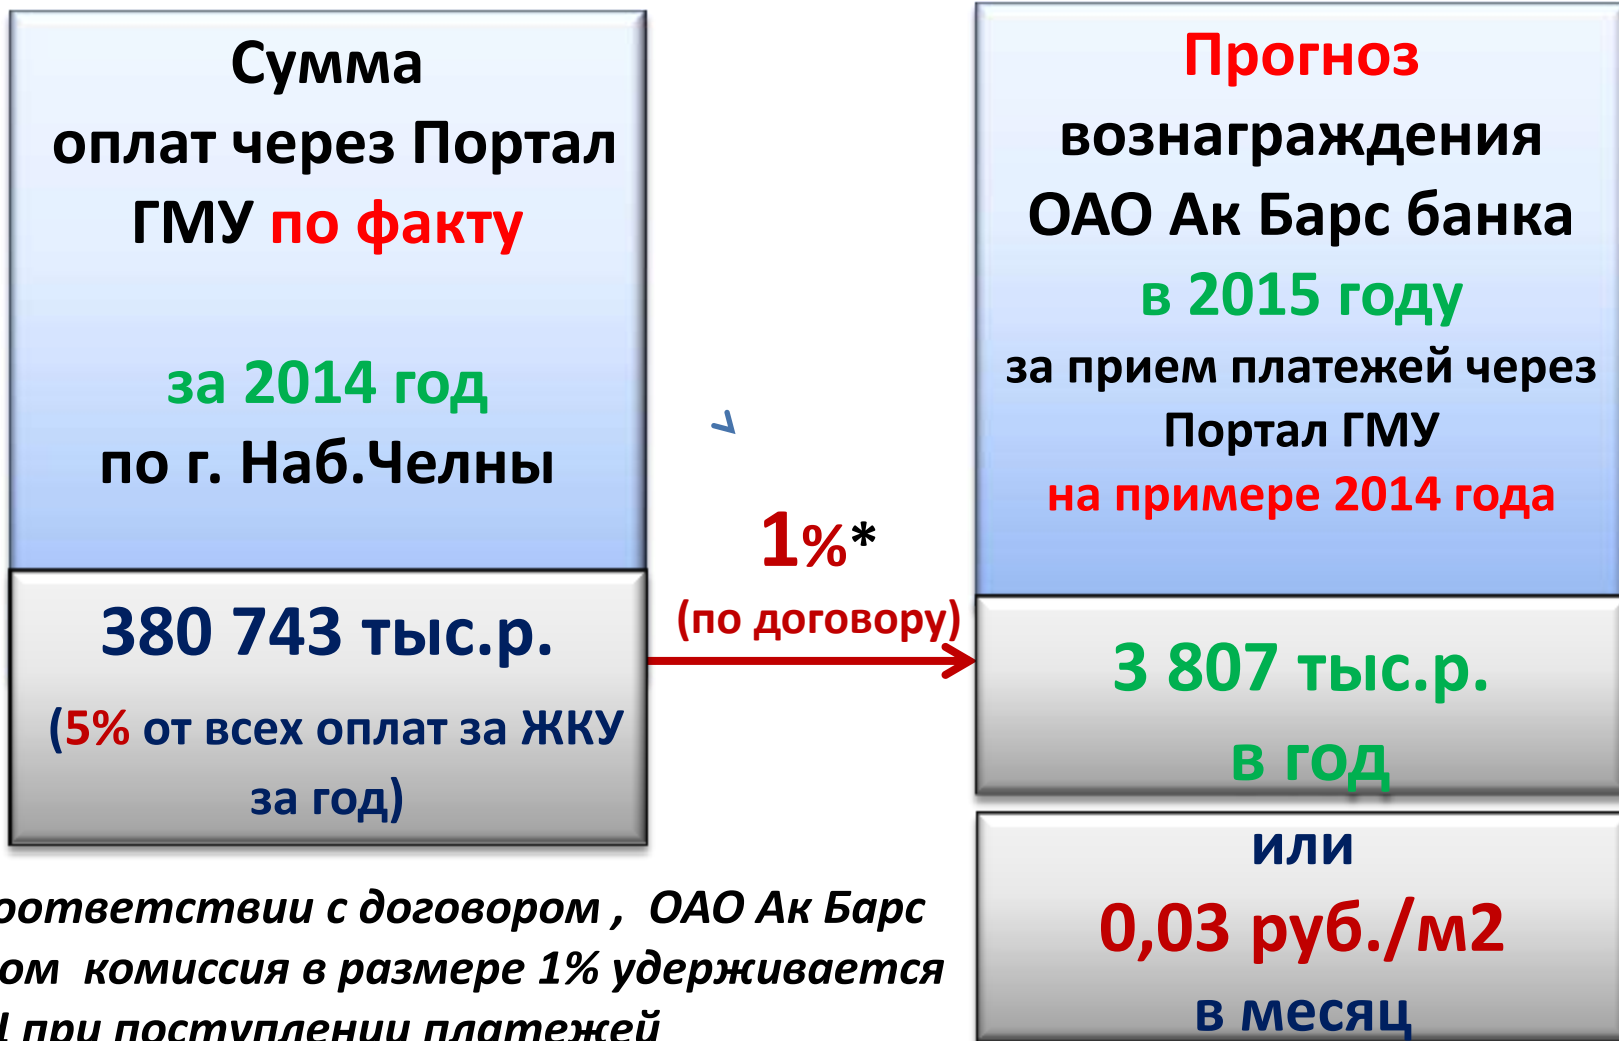

*\* В соответствии с договором, ОАО Ак Барс банком комиссия в размере 1% удерживается с ЕРЦ при поступлении платежей*
