



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

13 ноября 2021 г.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД



17 программ, из них:
1 073 объекта на 8 710,18 млн.руб.

3 программы реализованы
78 объектов на 182,57 млн.руб.

14 программ в работе
995 объектов на 8 527,61 млн.руб.

Общий СМР составляет 88 %



В республике в завершающую стадию вошли республиканских программы строительства социально культурных объектов, жилищного строительства и Национальных проектов. Общий объем выполнения всех 17-ти республиканских программ этого года составляет 88%.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА



№	Наименование программ	Сумма, млн.рублей	Кол-во объектов	СМР, %
				Факт
1	Обеспечение жильем молодых семей	59,79	49	100
2	Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	72,78	13	100
3	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	50,00	16	100
ИТОГО:		182,57	78	100,00

3 программы, в которые суммарно входят 78 объектов, завершены. Их финансовый объем – 182 млн рублей.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



6 национальных проектов


12 федеральных проектов

99 объектов (**58** объектов завершены)

3,77 тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 11 918,39 млн рублей
(освоено 8 018,8 млн рублей)*

Общий СМР составляет 93,5 %

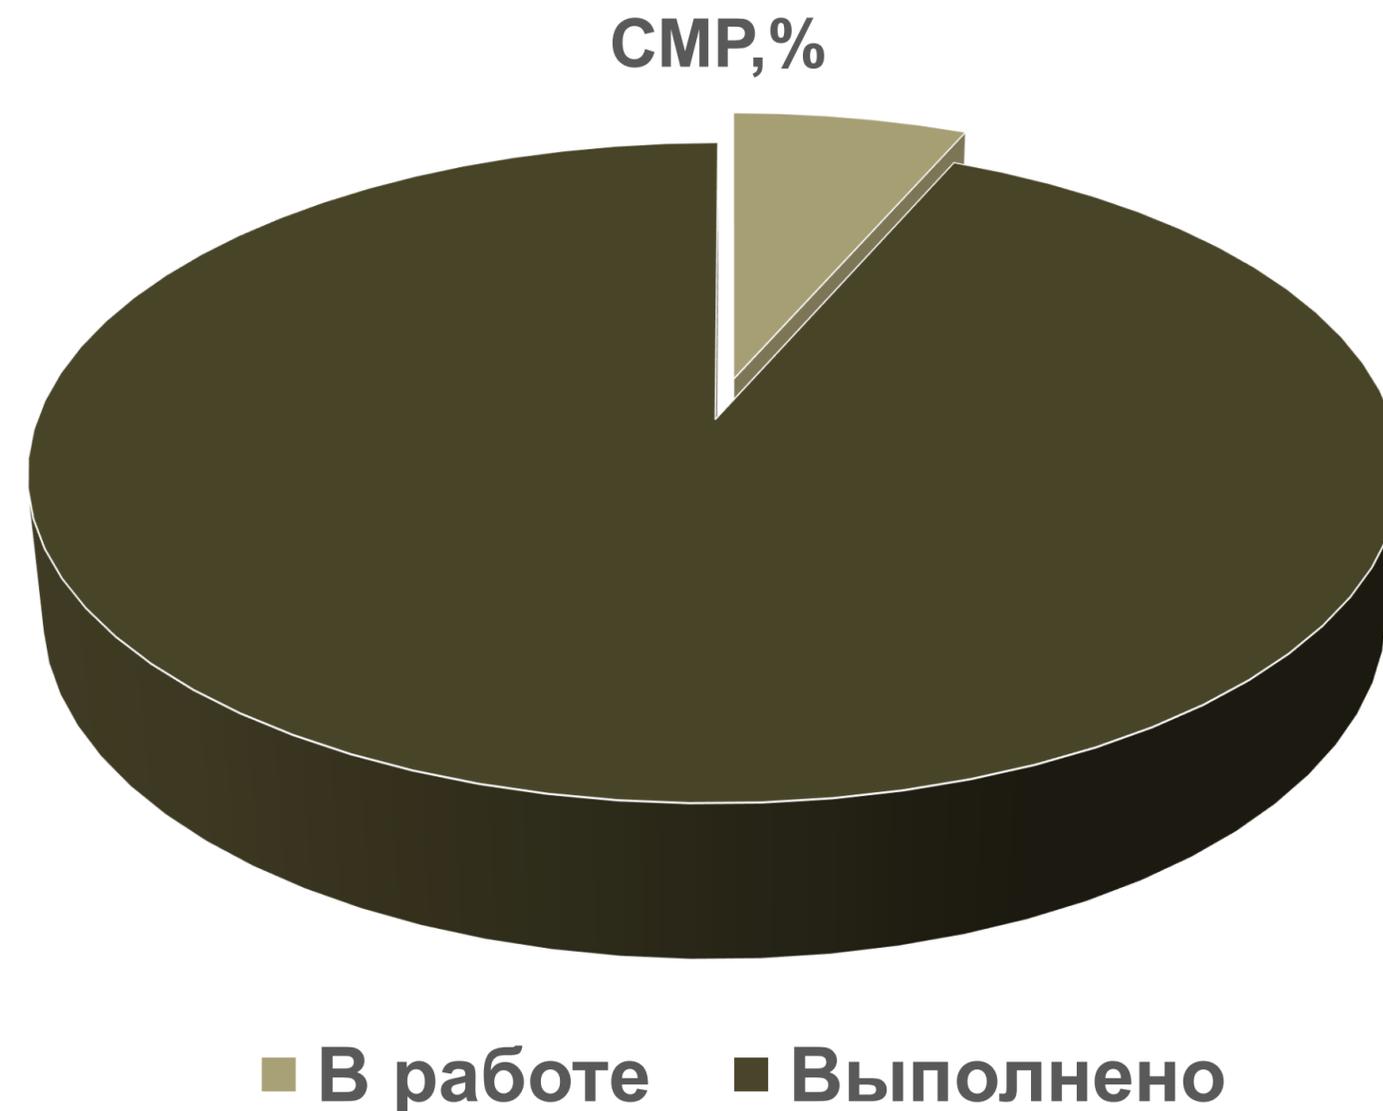


99 объектов включены в 6 Нацпроектов, курируемых нашим Министерством. Здесь на текущую дату выполнено 93% строительно-монтажных работ. Полностью готовы 58 объектов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	88,00	5,00
2	ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	170 635,35	90,00	2,00
3	ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	178 868,36	92,00	3,00
ИТОГО		3 791 699,38	97,67	2,71
4	ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	187 244,21	98,00	1,00
5	ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	268 612,14	98,00	2,00
6	ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, д.Эстачи	270 800,59	99,00	1,00
7	ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район, ЖК «Столичный»	270 800,59	100,00	5,00
8	ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК «Лето»	268 455,01	100,00	-
9	ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал ЖК «Салават Купере» (позиция 2)	279 750,60	100,00	-
10	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	267 956,21	100,00	-
11	ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	176 706,64	100,00	-
12	ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	101 217,12	100,00	-
13	ДОО на 120 мест в г. Казани, ЖК«Весна-2» (позиция 2)	166 751,14	100,00	-
14	ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	267 220,91	100,00	-
15	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	284 690,31	100,00	-
16	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	256 895,04	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 220 МЕСТ В Г.КАЗАНИ, НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН, ЖК «СТОЛИЧНЫЙ»

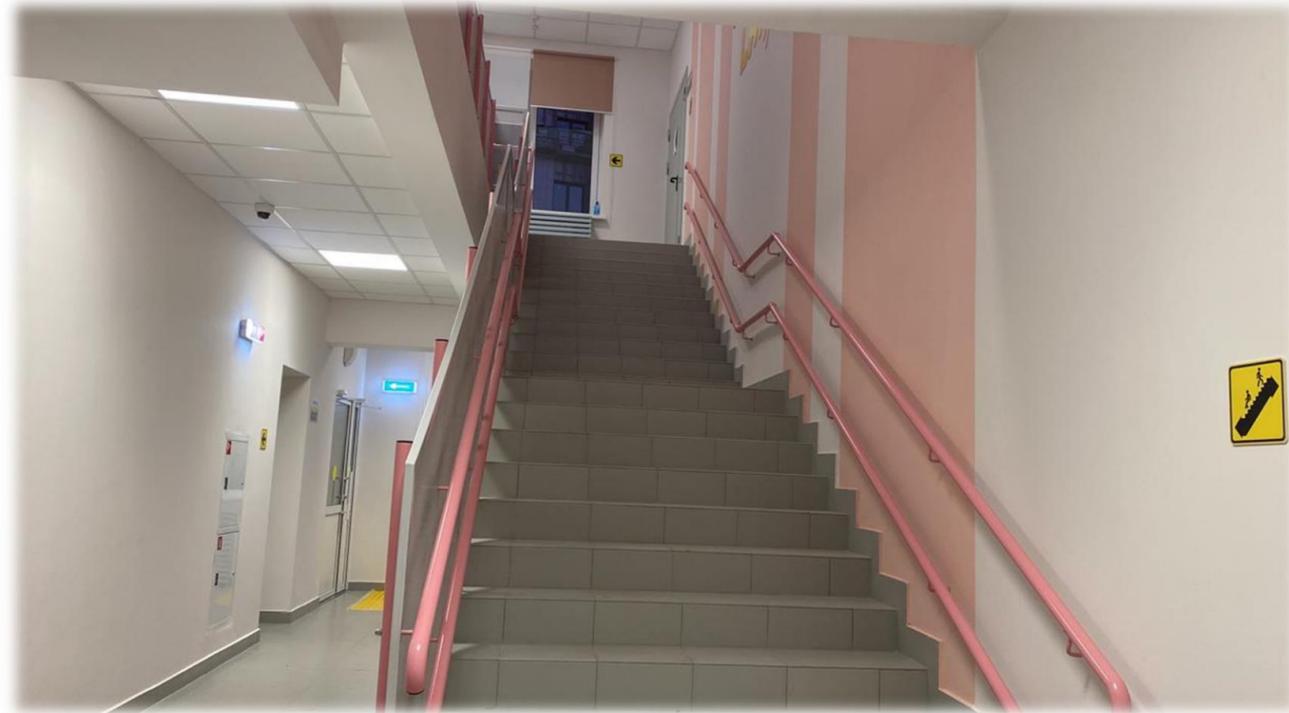

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 140 МЕСТ В Г. КАЗАНИ, П.КОНСТАНТИНОВКА



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 330 МЕСТ В ЖК «НОВЫЕ ГОРКИ», Г. КАЗАНЬ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 820 137,44	61,61	12,67
	ИТОГО	1 886 651,80	61,61	12,67



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Строительство станции водоподготовки в п. Васильево Зеленодольского района	136 284,40	100,00	7,00



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	732 860,00	98,46	1,30



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	70,00	8,00
2	Пестречинский, Детский городок	33 887,54	80,00	16,00
3	Нурлатский, Городское озеро	41 627,20	92,00	0,00
4	Сабинский, Парк по ул. З.Юсупова, 2 очередь	23 173,86	93,00	4,00
5	Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 4 очередь	18 641,38	93,50	1,50
6	Ютазинский, Сквер по ул. Ленина	15 229,61	95,00	0,00
7	Арский, Площадь Советская и ул. Большая, 4 очередь	38 578,72	95,00	0,00
8	Сармановский, Сквер «100 летия ТАССР»	25 746,23	96,00	6,00
9	Балтасинский, Набережная вдоль реки Шошма	17 608,76	97,00	3,00
ИТОГО		1 452 960,79	97,60	5,20
10	Чистопольский, Центральная площадь	24 403,99	98,00	6,00
11	Черемшанский, ул. Советская	14 051,74	98,00	3,00
12	Дрожжановский, Парк «Дуслык»	16 223,21	98,00	1,00
13	Чистопольский, Парк отдыха, 2 очередь	32 515,25	99,00	24,00

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс .рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
14	Атнинский, Парк по ул. Пионерская	9 690,00	99,00	7,00
15	Лениногорский, Парк «Мэхэббэт»	60 976,36	99,00	1,00
16	Аксубаевский, Сквер по ул. Мазилина, 3 очередь	21 056,55	100,00	5,00
17	Верхнеуслонский, Парк отдыха	12 437,50	100,00	5,00
18	Н.Челны, Бульвар Юных Ленинцев, 2 очередь	49 750,00	100,00	5,00
19	Елабужский, Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани	64 253,96	100,00	4,00
20	Нижнекамский, Экопарк, 2 очередь	44 775,00	100,00	3,00
21	Тюлячинский, Пруд в селе Баландыш	9 950,00	100,00	3,00
22	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки, 4 очередь	10 363,18	100,00	3,00
23	Апастовский, Набережная р.Табарка	14 676,03	100,00	2,00
24	Тетюшский, Березовая роца, 2 очередь	16 234,49	100,00	1,00
25	Высокогорский, Сквер "100 лет ТАССР", 2 очередь	38 786,32	100,00	1,00
26	Агрызский, ул. Карла Маркса, 3 очередь	26 117,80	100,00	0,00
27	Азнакаевский, ул. Сююмбике, 2 очередь	45 226,26	100,00	0,00
ИТОГО		1 452 960,79	97,60	5,20

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
28	Новошешминский, Площадь перед зданием ЗАГС, 2 очередь	9 614,03	100,00	0,00
29	Альметьевский, Внутриквартальный бульвар микрорайона Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул.Бигаш)	78 567,73	100,00	0,00
30	Алькеевский, Сквер "Спортивный"	14 046,47	100,00	0,00
31	Альметьевский, Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская)	78 567,73	100,00	0,00
32	Менделеевский, Бульвар Интернационалистов	22 612,75	100,00	0,00
33	Нижнекамский, Сквер по ул. Корабельная	28 739,66	100,00	0,00
34	Бавлинский, Парк Победы и Трудовой славы, 3 очередь	26 925,90	100,00	0,00
35	Алексеевский, Сквер по ул. Казакова (Парк Победы), 3 очередь	18 780,53	100,00	0,00
36	Нижнекамский, Пр.Химиков, 2 очередь	44 775,00	100,00	0,00
37	Тукаевский, Парк «Дружбы народов»	15 987,41	100,00	0,00
38	Тукаевский, Сквер по ул.Центральная	15 987,41	100,00	0,00
ИТОГО		1 452 960,79	97,60	5,20

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
39	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, 3 очередь	35 669,39	100,00	0,00
40	Нижнекамский, Школьный бульвар	9 950,00	100,00	0,00
41	Зеленодольский. Парк «Березовая роща», мкр. Мирный, 2 очередь	92 953,60	100,00	0,00
42	Заинский, Набережная р.Зай, 4 очередь	13 271,55	100,00	0,00
43	Муслюмовский, Парк "Спортивный"	14 536,12	100,00	0,00
44	Нижнекамский, Центральный сквер, 2 очередь	9 950,00	100,00	0,00
45	Камско-Устьинский. Набережная р. Волга, 2 очередь	11 092,01	100,00	0,00
46	Нижнекамский, Экстрим-парк	69 650,00	100,00	0,00
47	Спасский, Центральная площадь, 3 очередь	13 989,31	100,00	0,00
48	Заинский, Площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь	40 389,16	100,00	0,00
49	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 2 очередь	7 344,70	100,00	0,00
ИТОГО		1 452 960,79	97,60	5,20

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ, СКВЕР ЛЕНИНА, 4 ОЧЕРЕДЬ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ САРМАНОВСКИЙ, СКВЕР «100 ЛЕТИЯ ТАССР»



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ




№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	80,00	18,00
2	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	49 750,00	95,00	6,00
ИТОГО		487 550,00	96,84	6,10
3	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	79 600,00	98,00	1,00
4	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	69 650,00	98,00	0,50
5	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	49 750,00	100,00	5,00
6	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	49 750,00	100,00	0,00
7	Азнакаевский, Набережная реки Черная	69 650,00	100,00	0,00
8	Буинский, Центральная площадь	69 650,00	100,00	0,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУГУЛЬМИНСКИЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. М. ДЖАЛИЛЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОДОЕМУ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

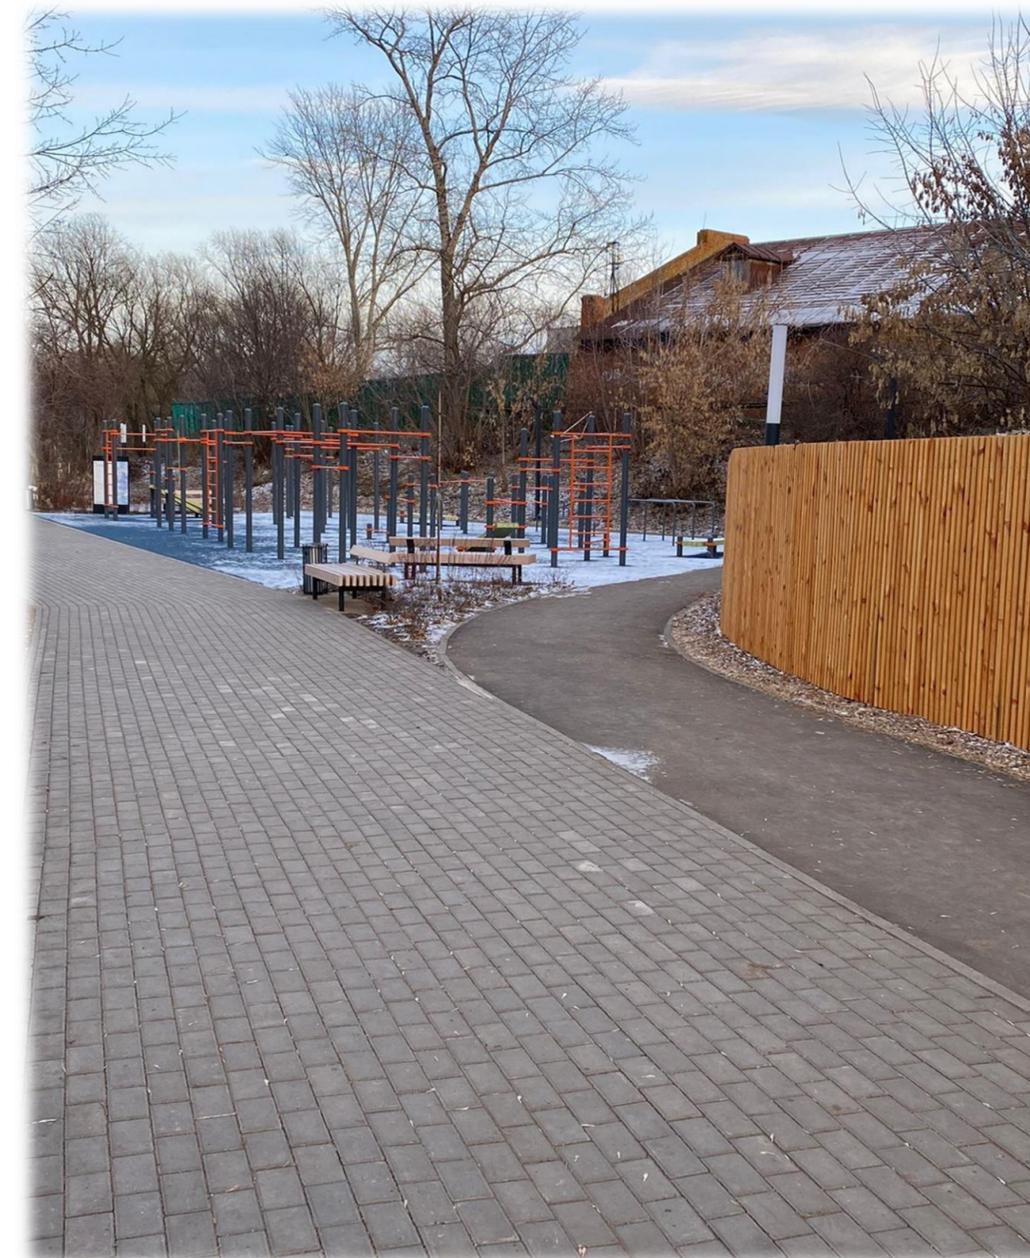

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Атнинский МР, Дусюмский	3 974,00	92,00	0,00
2	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 974,01	96,00	5,00
3	Сабинский МР, Миченбашский	3 974,01	98,00	3,00
ИТОГО		165 284,33	99,66	4,88
4	Заинский МР, Кадыровский	3 974,01	100,00	10,00
5	Кайбицкий МР, Бурундуковский	3 974,01	100,00	7,00
6	Тетюшский МР, Больше-Атрясский	3 974,00	100,00	5,00
7	Верхнеуслонский МР, Введено-Слободский	3 974,01	100,00	5,00
8	Нижнекамский МР, Верхне-Челнинский	3 974,01	100,00	2,00
9	Елабужский МР, Гаринский	3 974,01	100,00	2,00
10	Пестречинский МР, Карповский	3 974,00	100,00	-
11	Актанышский МР, Старо-Зияшевский	3 974,00	100,00	-
12	Агрызский МР, Янга-Аулский	3 974,01	100,00	-
13	Азнакаевский МР, Ильбяковский	3 974,01	100,00	-
14	Аксубаевский МР, Новоузеевский	3 974,01	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Алексеевский МР, Подлесно-Шенталинский	3 974,00	100,00	-
16	Алькеевский МР, Каракульский	3 974,00	100,00	-
17	Альметьевский МР, Клементейкинский	3 974,00	100,00	-
18	Апастовский МР, Шигаевский	3 974,00	100,00	-
19	Арский МР, Среднекорсинский	3 974,00	100,00	-
20	Бавлинский МР, Татарско-Тумбарлинский	3 974,00	100,00	-
21	Балтасинский МР, Смаильский	3 974,00	100,00	-
22	Бугульминский МР, Наратлинский	3 974,00	100,00	-
23	Буинский МР, Малобуинковский	3 974,01	100,00	-
24	Высокогорский МР, Ювасинский	3 974,00	100,00	-
25	Дрожжановский МР, Коршанга-Шигалинский	2 502,37	100,00	-
26	Зеленодольский МР, Ильинский	3 974,00	100,00	-
27	Камско-Устьинский МР, Шапкинский	3 974,01	100,00	-
28	Кукморский МР, Янцобинский	3 974,00	100,00	-
29	Лаишевский МР, Шуранский	3 974,01	100,00	-
ИТОГО		165 284,33	99,66	4,88

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
30	Лениногорский МР, Нижне-Чершилинский	3 974,00	100,00	-
31	Мамадышский МР, Малокирменский	3 974,00	100,00	-
32	Менделеевский МР, Актазиковский	3 974,00	100,00	-
33	Мензелинский МР, Атряклинский	3 974,00	100,00	-
34	Новошешминский МР, Андреевский	3 974,00	100,00	-
35	Нурлатский МР, Андреевский	3 974,00	100,00	-
36	Рыбно-Слободский МР, Шеморбашский	3 974,01	100,00	-
37	Сармановский МР, Юлтимеровский	3 974,00	100,00	-
38	Спасский МР, Чечеклинский	3 974,00	100,00	-
39	Тукаевский МР, Новотроицкий	5 293,44	100,00	-
40	Тюлячинский МР, Шармашинский	3 974,01	100,00	-
41	Черемшанский МР, Карамышевский	3 974,00	100,00	-
42	Ютазинский МР, Ташкичуйский	2 502,37	100,00	-
ИТОГО		165 284,33	99,66	4,88

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ТЕТЮШСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШЕ-АТРСКИЙ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 368,39	95,00	0,00
2	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 368,39	98,00	8,00
ИТОГО		55 171,12	98,30	3,67
3	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 217,17	100,00	3,00
4	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 217,17	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ СПАССКИЙ МР, КУЗНЕЧИХИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	66 768,10	98,00	0,00
2	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.1406	68 403,07	99,00	1,00
ИТОГО		278 296,72	99,25	0,62
3	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	75 112,97	100,00	0,50
4	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	68 012,58	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Г.ЧИСТОПОЛЬ, УЛ.ЭНГЕЛЬСА, Д.140Б



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	55,00	11,00
2	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	61,00	6,00
ИТОГО		380 273,06	73,11	5,50
3	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	80,00	10,00
4	Строительство ДОЛ «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Камско-Устьинского муниципального района	30 118,12	100,00	5,00
5	Строительство МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 517,02	100,00	1,00
6	Строительство ДОЛ «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	77 051,25	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛ «ВОЛГА» ГБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СЭЛЭТ» КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МР РТ




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

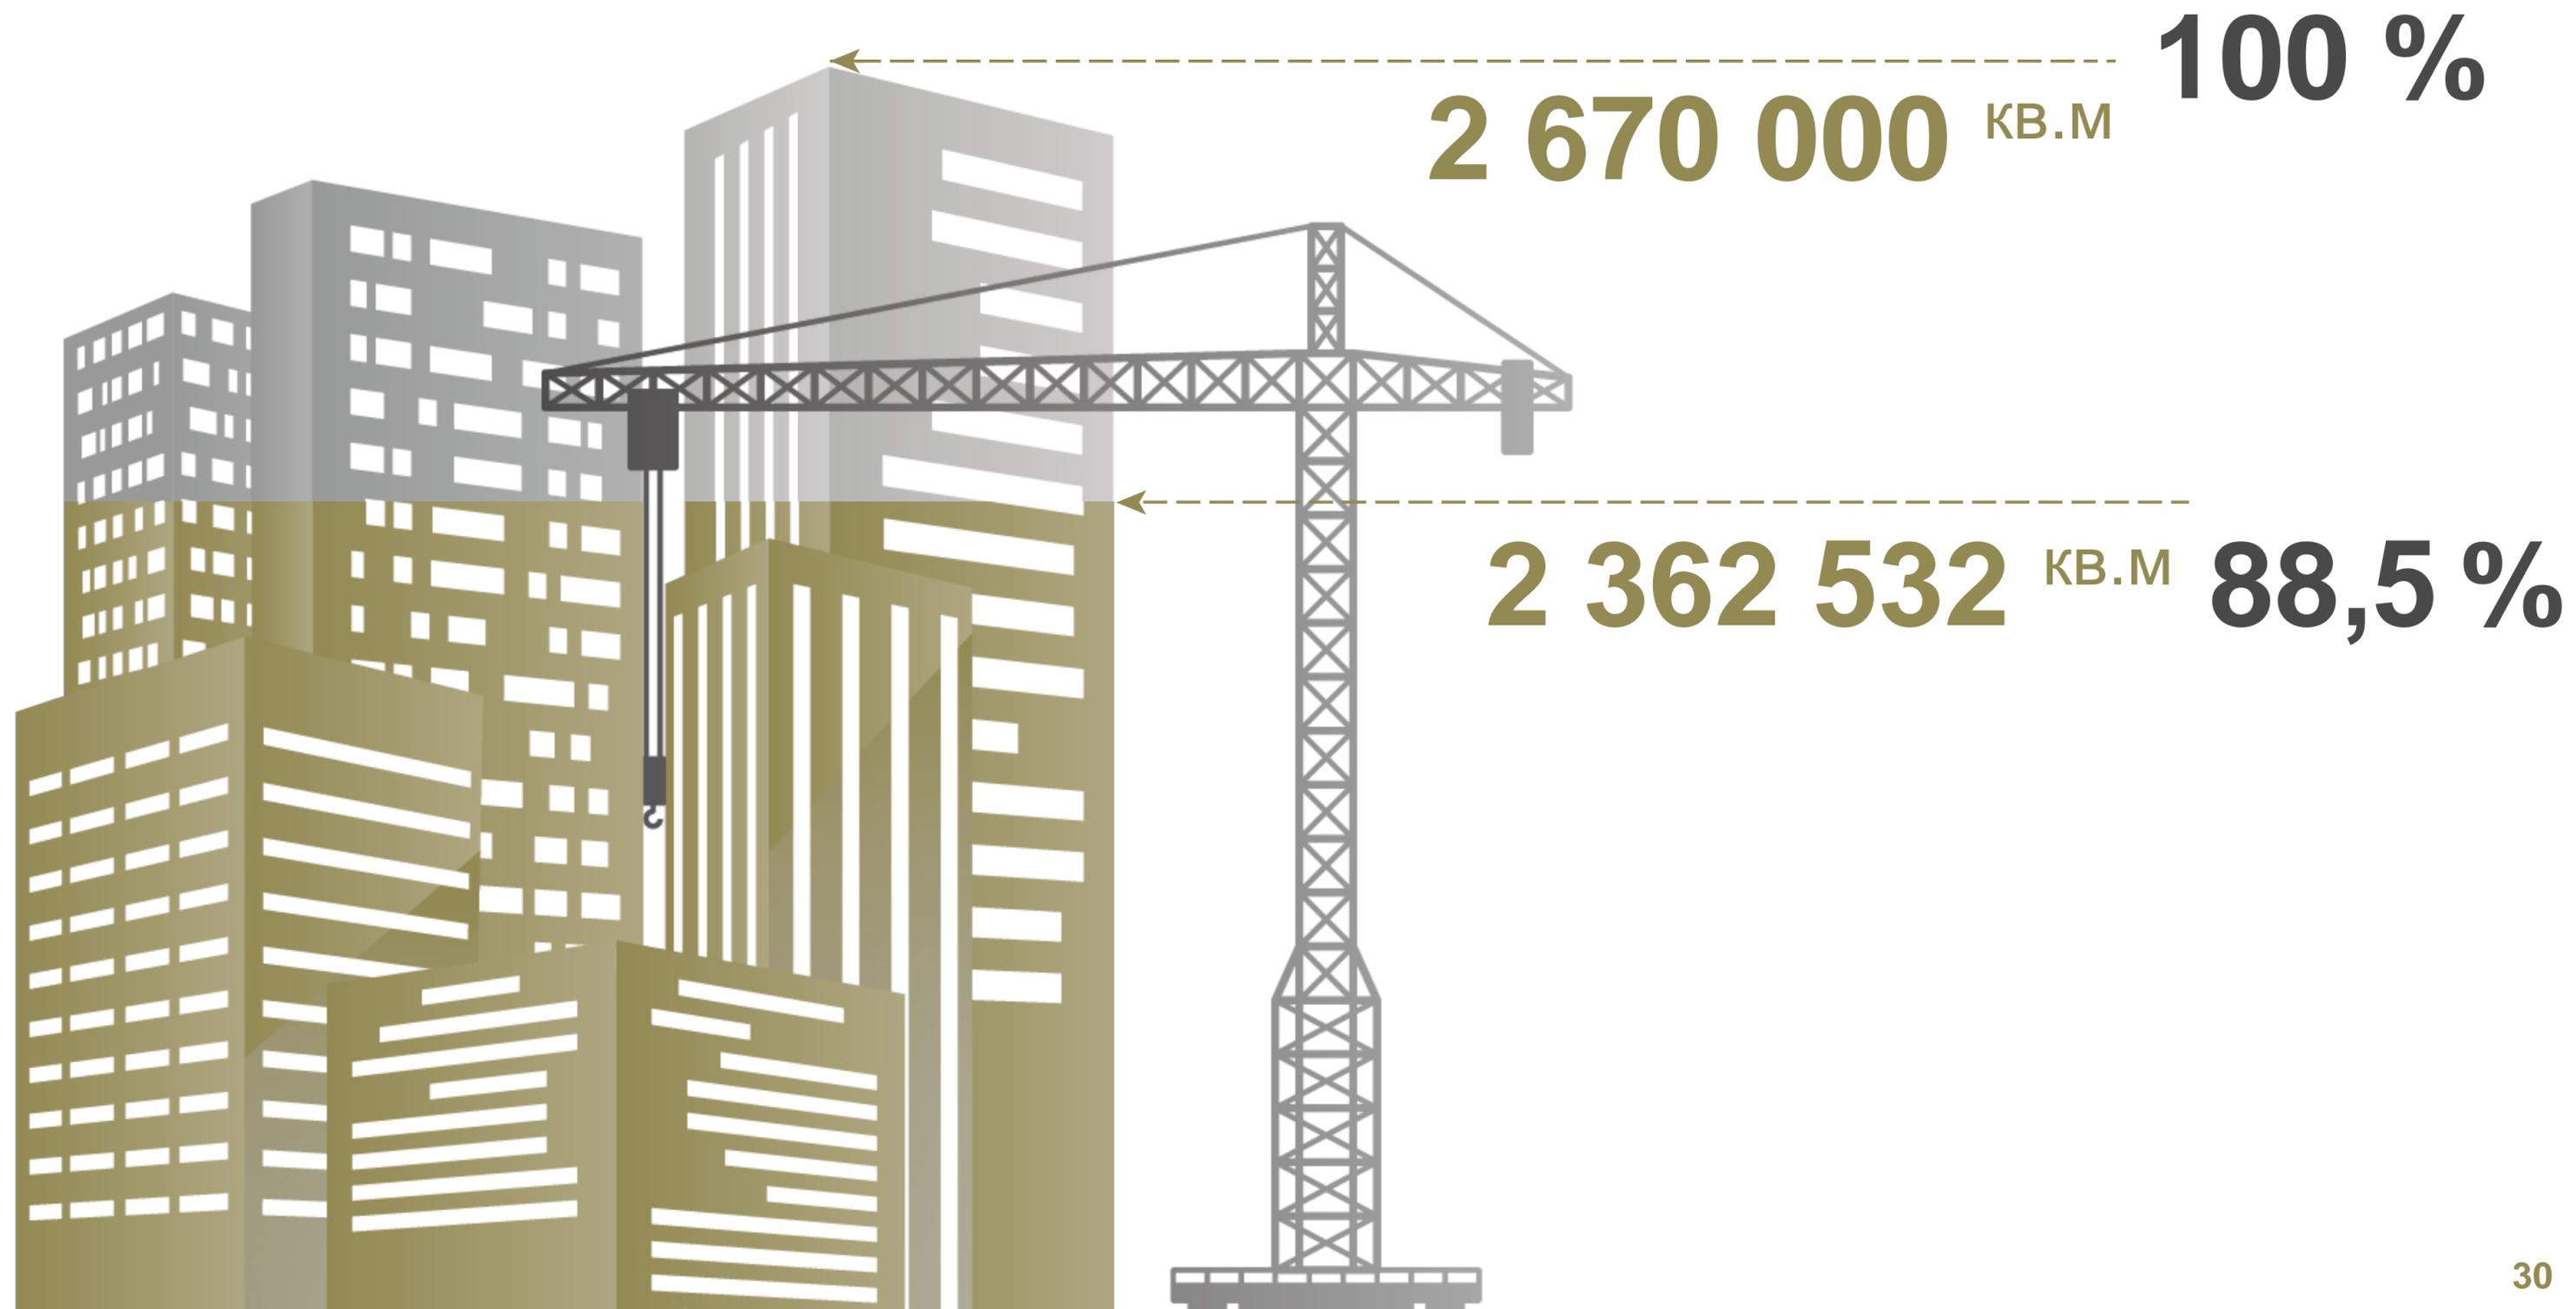

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Лениногорский	25 000	8 715	34,9	16 285
2	Нижнекамский	70 000	44 797	64,0	25 203
3	Менделеевский	13 000	8 771	67,5	4 229
4	Муслюмовский	10 000	6 958	69,6	3 042
5	Новошешминский	5 000	3 650	73,0	1 350
6	Чистопольский	22 000	16 086	73,1	5 914
7	Азнакаевский	22 000	16 578	75,4	5 422
8	Агрызский	18 000	13 582	75,5	4 418
9	Альметьевский	120 000	91 367	76,1	28 633
10	Буинский	16 000	12 189	76,2	3 811
11	Нурлатский	17 000	12 973	76,3	4 027
12	Зеленодольский	90 000	70 325	78,1	19 675
13	Бавлинский	15 000	12 045	80,3	2 955
14	г.Наб.Челны	320 000	261 145	81,6	58 855
15	Апастовский	8 000	6 573	82,2	1 427
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 362 532	88,5	307 468

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Тетюшский	10 000	8 538	85,4	1 462
17	Кайбицкий	5 000	4 279	85,6	721
18	Аксубаевский	8 000	6 876	86,0	1 124
19	г.Казань	930 000	802 581	86,3	127 419
20	Сабинский	22 000	19 427	88,3	2 573
21	Актанышский	15 000	13 256	88,4	1 744
22	Кукморский	27 000	24 453	90,6	2 547
23	Елабужский	60 000	54 695	91,2	5 305
24	Ютазинский	13 000	11 920	91,7	1 080
25	Алькеевский	8 000	7 400	92,5	600
26	Бугульминский	35 000	32 511	92,9	2 489
27	Мензелинский	14 000	13 049	93,2	951
28	Мамадышский	20 000	18 917	94,6	1 083
29	Алексеевский	16 000	15 181	94,9	819
30	В-Услонский	35 000	33 350	95,3	1 650
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 362 532	88,5	307 468

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Р-Слободский	15 000	14 364	95,8	636
32	К-Устьинский	7 000	6 731	96,2	269
33	Спасский	5 000	4 887	97,7	113
34	Сармановский	10 000	9 909	99,1	91
35	Заинский	20 000	20 009	100,0	0
36	Арский	25 000	25 022	100,1	0
37	Балтасинский	15 000	15 017	100,1	0
38	Тукаевский	110 000	110 769	100,7	0
39	Дрожжановский	7 000	7 056	100,8	0
40	Лайшевский	160 000	161 974	101,2	0
41	Пестречинский	190 000	192 379	101,3	0
42	Тюлячинский	7 000	7 235	103,4	0
43	Черемшанский	6 000	6 345	105,8	0
44	Высокогорский	110 000	123 639	112,4	0
45	Атнинский	4 000	5 009	125,2	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 362 532	88,5	307 468

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

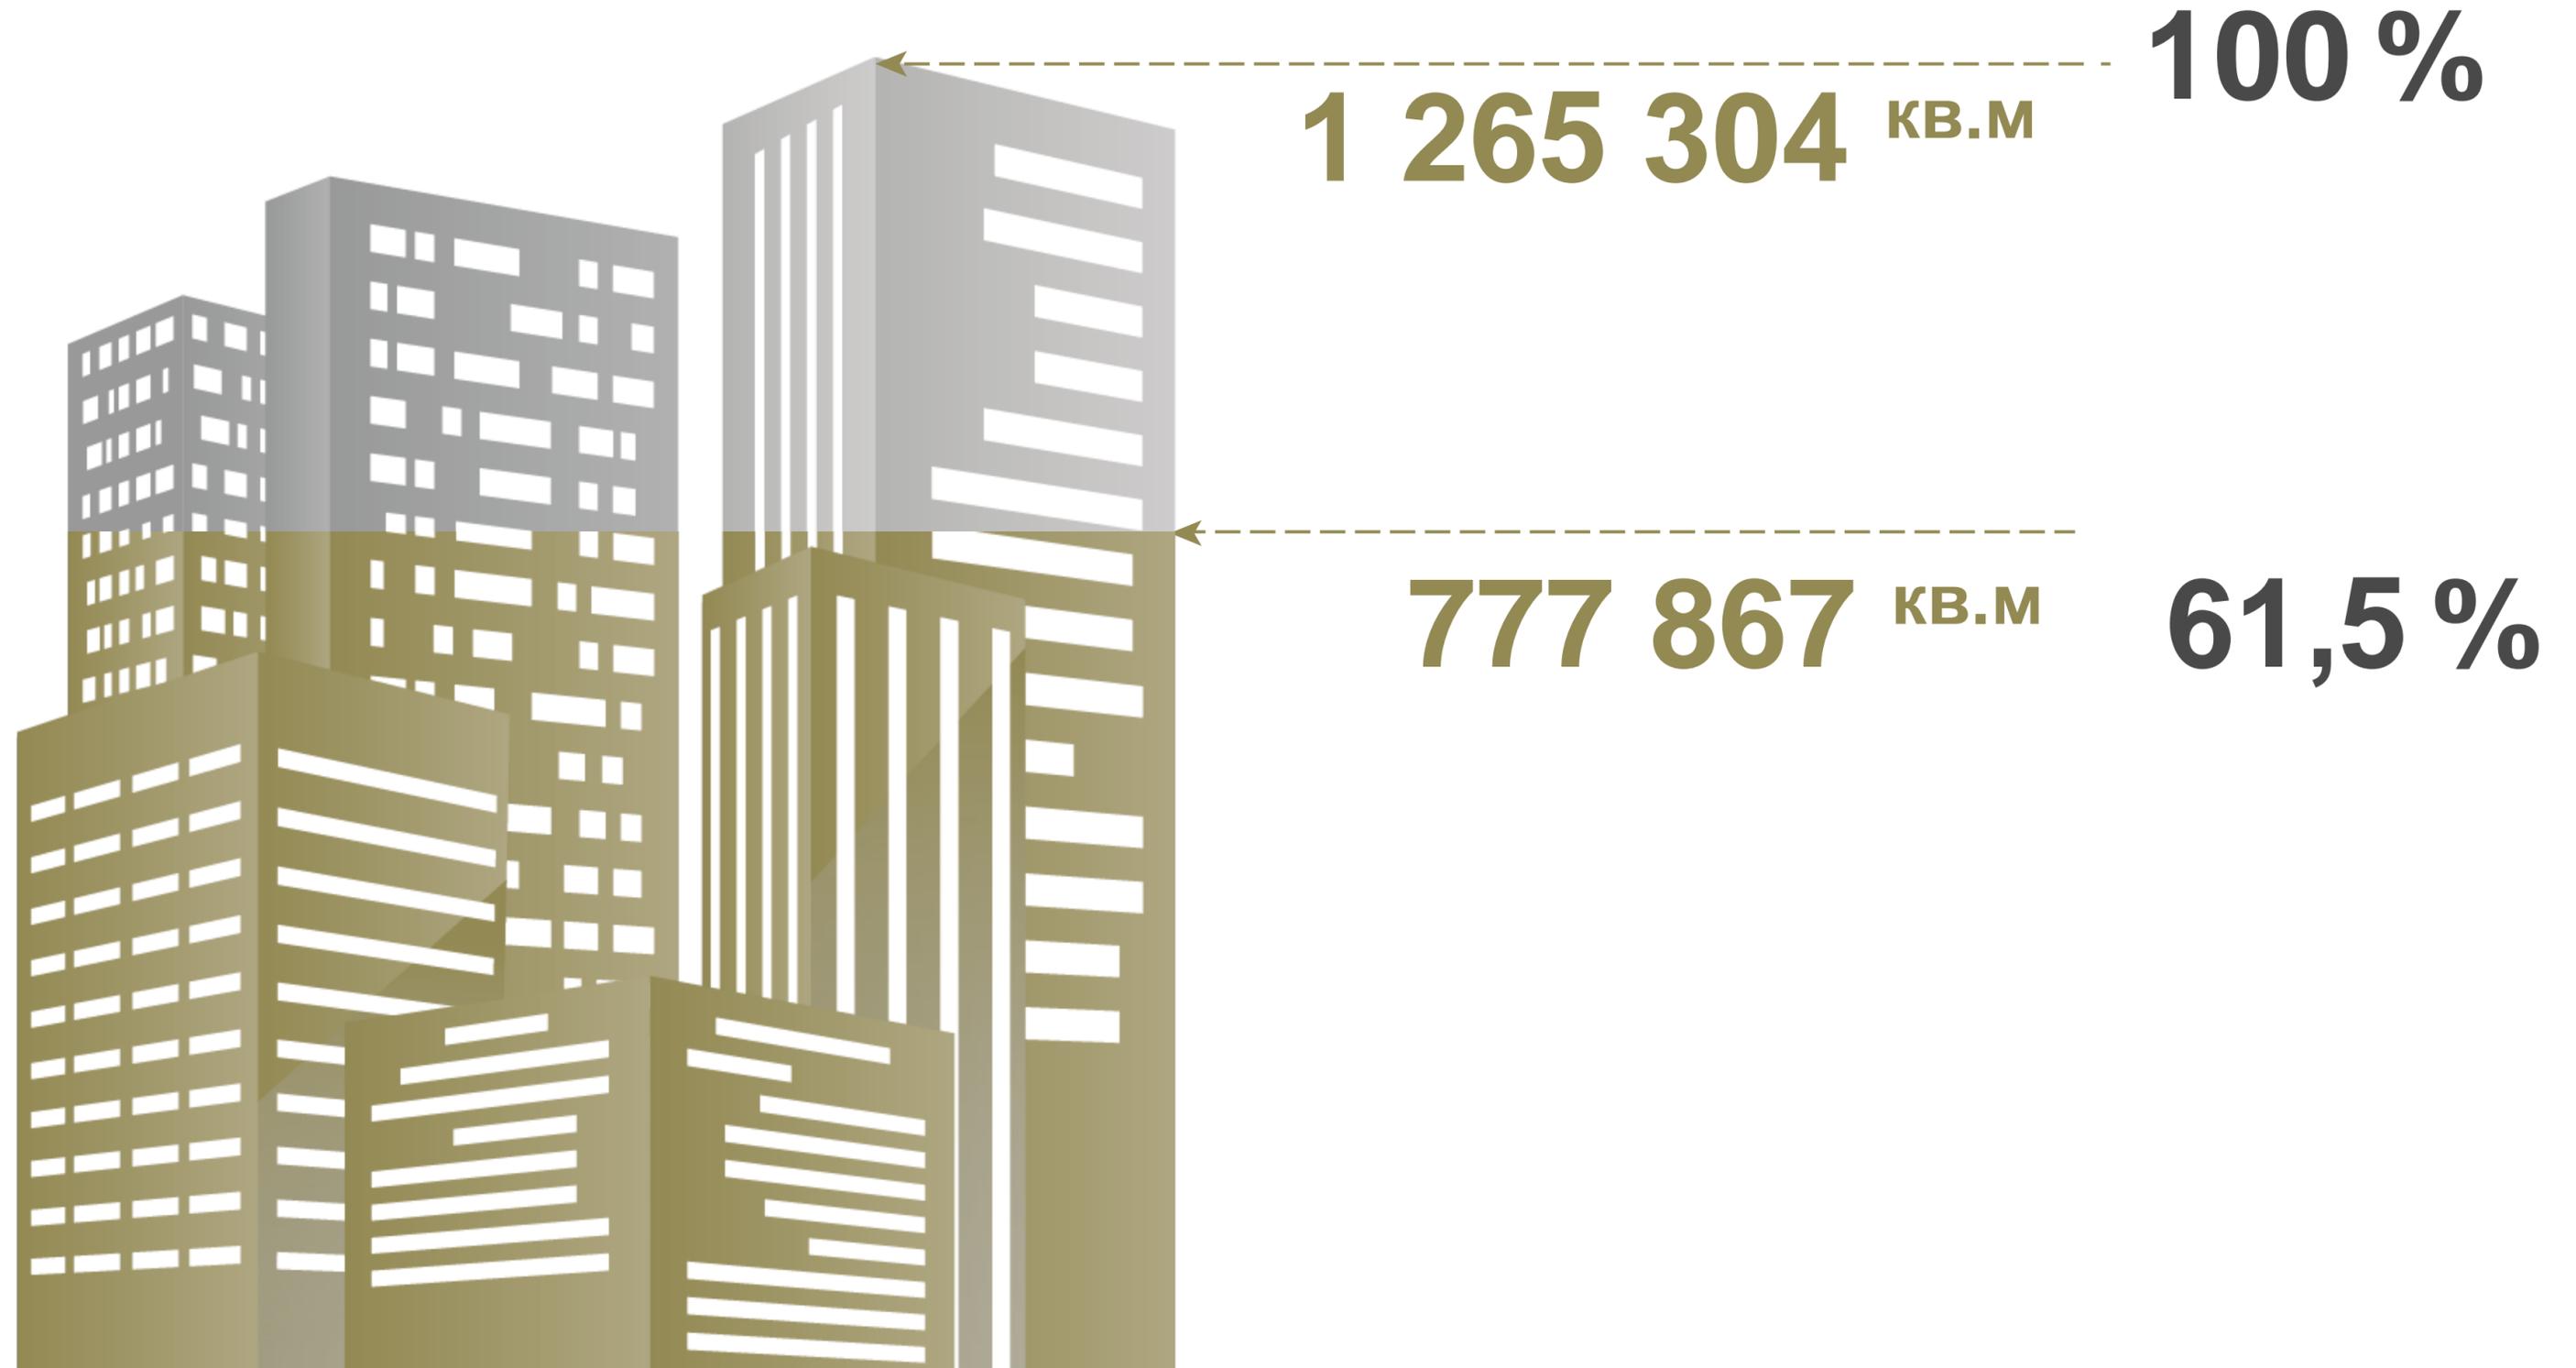

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-
2	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	3	4
3	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	-	1
4	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	2	2	-
5	ЛАИШЕВСКИЙ	1	1	-
6	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-
7	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	15	8	7
8	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	4	4	-
9	Г.КАЗАНЬ	32	26	6
ВСЕГО по РТ		64	46	18

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



280 496 КВ.М

100 %

117 053 КВ.М

41,7 %

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	113	77	10
2	Чистопольский	183	131	52	1
3	Кукморский	53	47	6	0
4	г.Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	74	2	0
ВСЕГО по РТ		1 102	962	140	11

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Земельные участки с ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	г.Казань	3
4	Кукморский	1
	ВСЕГО по РТ	71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не сношены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский			26	23	10	59
2	Кукморский	2	1			2	5
3	Чистопольский			3			3
4	Высокогорский					2	2
ВСЕГО по РТ		2	1	29	23	14	69

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	8	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	6,87	6,87	-
ИТОГО:	740	1 196,65	100,28	1 096,37

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
1	АКТАНЫШСКИЙ	4		4
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8		8
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18		18
4	АРСКИЙ	14	10	4
5	АТНИНСКИЙ	1		1
6	БАВЛИНСКИЙ	8		0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4		4
8	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6		6
9	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8		0
10	ДРОЖЖАНОВСКИЙ	4	4	0
ИТОГО:		636	260	164

* 19 ставятся на кадастровый учет и проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 193 помещения в достраиваемых домах.

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
11	МАМАДЫШСКИЙ	16		16
12	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	15		0
13	НИЖНЕКАМСКИЙ	28		28
14	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4		0
15	НУРЛАТСКИЙ	13	13	0
16	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1	1	0
17	САРМАНОВСКИЙ	1		1
18	ТЕТЮШСКИЙ	4	4	0
19	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1	0
20	ЮТАЗИНСКИЙ	1		1
21	Г.НАБ.ЧЕЛНЫ	80		0
22	Г.КАЗАНЬ	397	227	73
ИТОГО:		636	260	164

* 19 ставятся на кадастровый учет и проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 193 помещения в незавершенных строительстве домах.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	1
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	1
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	2
6	БАВЛИНСКИЙ	1	1
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	2
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	2
9	БУИНСКИЙ	1	1
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	5
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
12	ЗАИНСКИЙ	1	1
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4
14	КУКМОРСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
16	МАМАДЫШСКИЙ	1	1
17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	0
18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	1
19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	2
20	НУРЛАТСКИЙ	3	3
21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
22	САБИНСКИЙ	1	1
23	САРМАНОВСКИЙ	1	1
24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
25	Г.КАЗАНЬ	2	2
26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	6
ИТОГО:		47	42

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН




№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	4	1	1	1
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
1.3	<i>Менделеевский</i>	1	0	-	-
1.4	<i>Нижнекамский</i>	1	0	-	-
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	2	2	2
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	2	0	0
3.1	<i>Буинский</i>	1	1	1	-
3.2	<i>Тетюшский</i>	1	1	1	-
	ВСЕГО по РТ	8	5	5	3

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

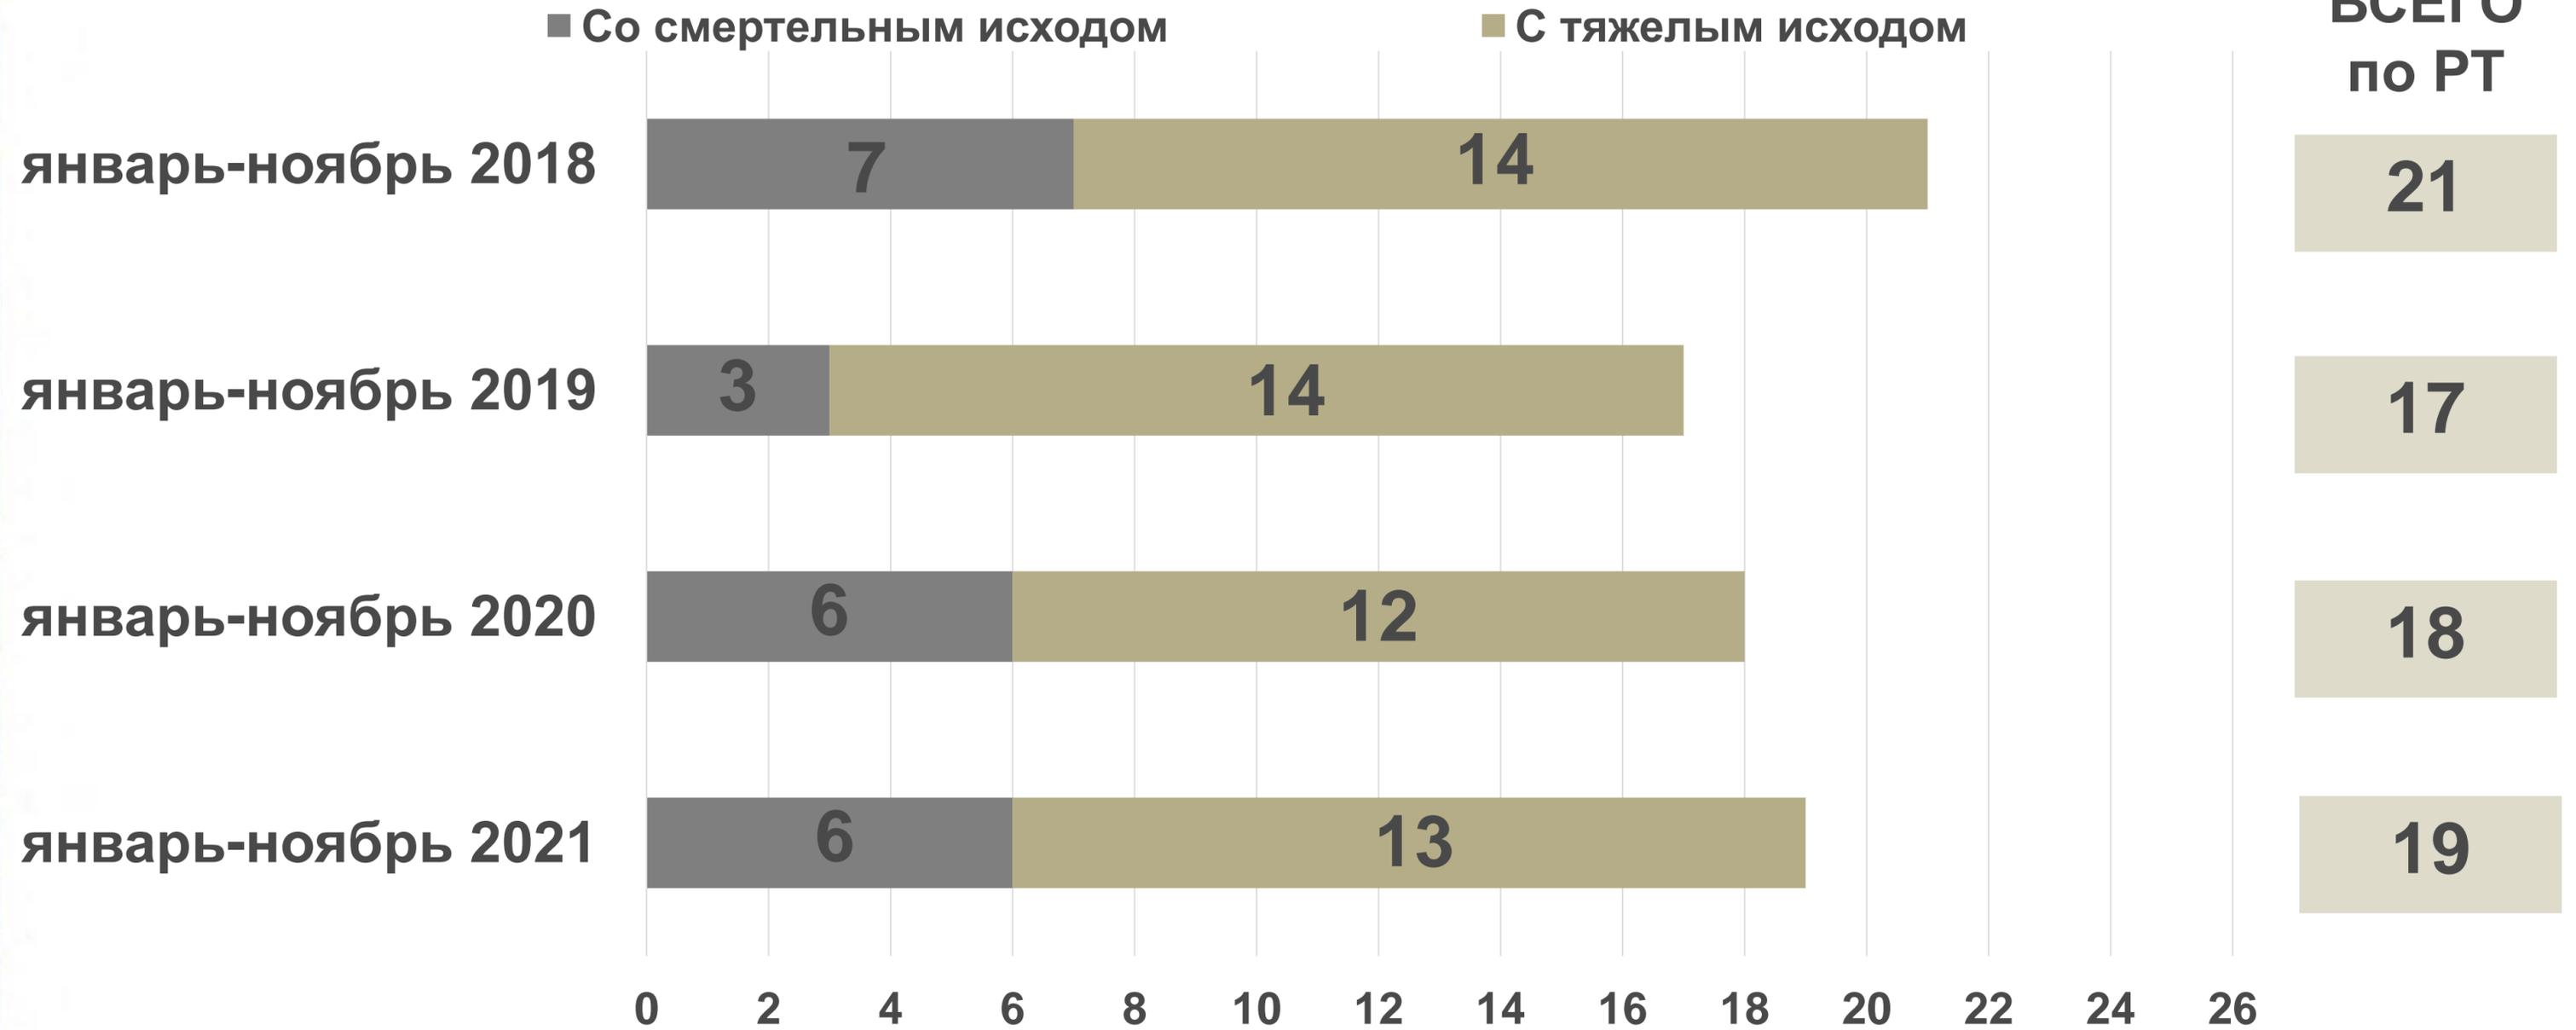

Строительство жилого комплекса в 64 мкрн., г. Набережные Челны



Грузовые крюки не снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Технический заказчик: ООО ГК «Профит»
Генподрядчик: ООО УКС «ЛИДЕР»**

Строительство жилого дома, г. Набережные Челны



**Кабели под напряжением до 1000 В
проложены по земле**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Технический заказчик: ООО «СЗ «ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»
Подрядчик: ООО «СтройТраст»

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	1 547	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	100	5 618,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	31	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	44	4 357,0
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	25	1 261,0

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	1 767
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	917
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	1 067
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	416
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	219
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	108
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	324

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	581
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	993
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	981
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	291

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	135	291	279	96
2	г.Набережные Челны	38	38	38	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	6	2	2	100
7	Алексеевский	13	24	24	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	17	96	96	100
10	Апастовский	20	28	28	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	1	2	2	100
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	14	13	13	100
ВСЕГО по РТ		581	993	981	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	2	12	12	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	12	17	17	100
20	Елабужский	25	19	19	100
21	Заинский	4	20	20	100
22	Зеленодольский	12	27	27	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	6	11	11	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	22	49	49	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
ВСЕГО по РТ		581	993	981	99

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	38	23	23	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	9	8	8	100
35	Пестречинский	5	82	82	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	6	9	9	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	9	5	5	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	1	7	7	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
ВСЕГО по РТ		581	993	981	99
