



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

27 ноября 2021 г.

В республике на завершающей стадии находятся реализация республиканских программ строительства социально культурных объектов, жилищного строительства и Национальных проектов.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД



17 программ, из них:

1 073 объекта на 8 835,52 млн.руб.


6 программ реализовано

234 объекта на 1 088,19 млн.руб.

11 программ в работе

*Всего в них входит 839 объектов на 7 747,33 млн.руб.,
осталось завершить 33 объекта на 1 914,05 млн.руб.*

Общий СМР составляет 90 %

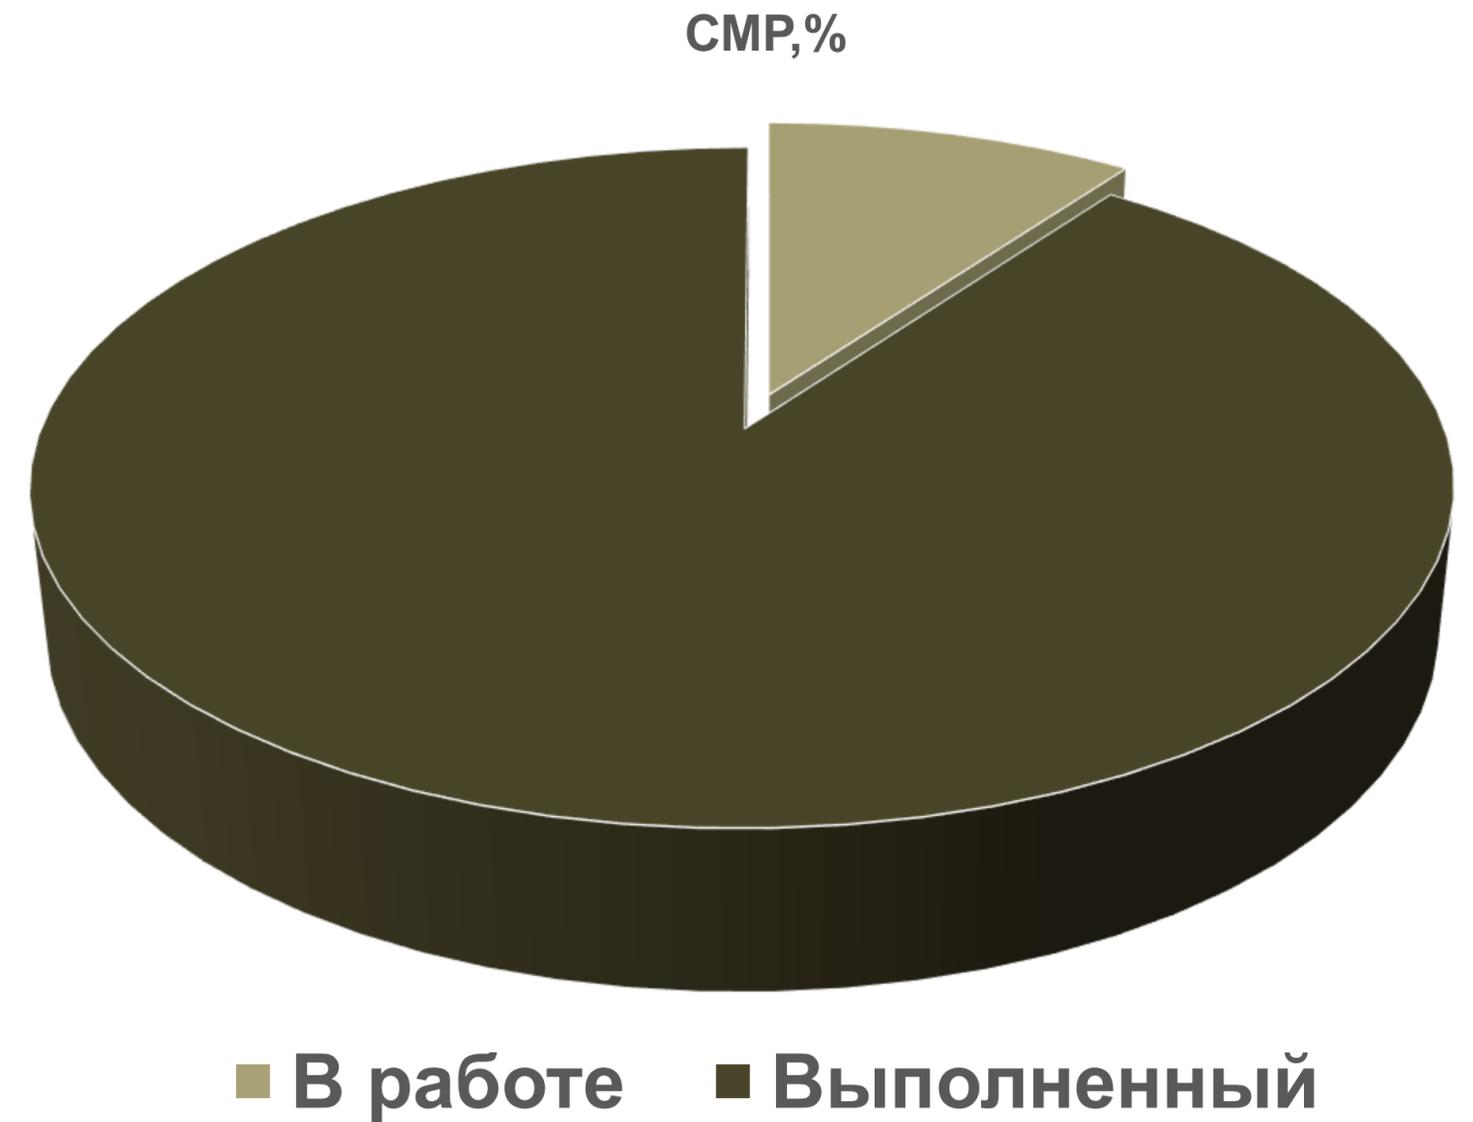

Общий объем выполнения всех 17-ти республиканских программ этого года составляет 90%.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА



№	Наименование программ	Сумма, млн.рублей	Кол-во объектов	СМР, %
				Факт
1	Обеспечение жильем молодых семей	59,79	49	100
2	Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	72,78	13	100
3	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	67,52	16	100
4	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	107,56	7	100
5	Обеспечение населения питьевой водой	650,00	129	100
6	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах РТ	130,54	20	100
ИТОГО:		1 088,19	234	100,00

Полностью завершены 6 программ, финансовый объем которых – превышает один миллиард рублей. В данные программы входят 234 объекта.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



6 национальных проектов


12 федеральных проектов

99 объектов (**82** объекта завершены)

3,77 тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 11 920,02 млн рублей
(освоено 9 255,3 млн рублей)*

Общий СМР составляет 96,3 %

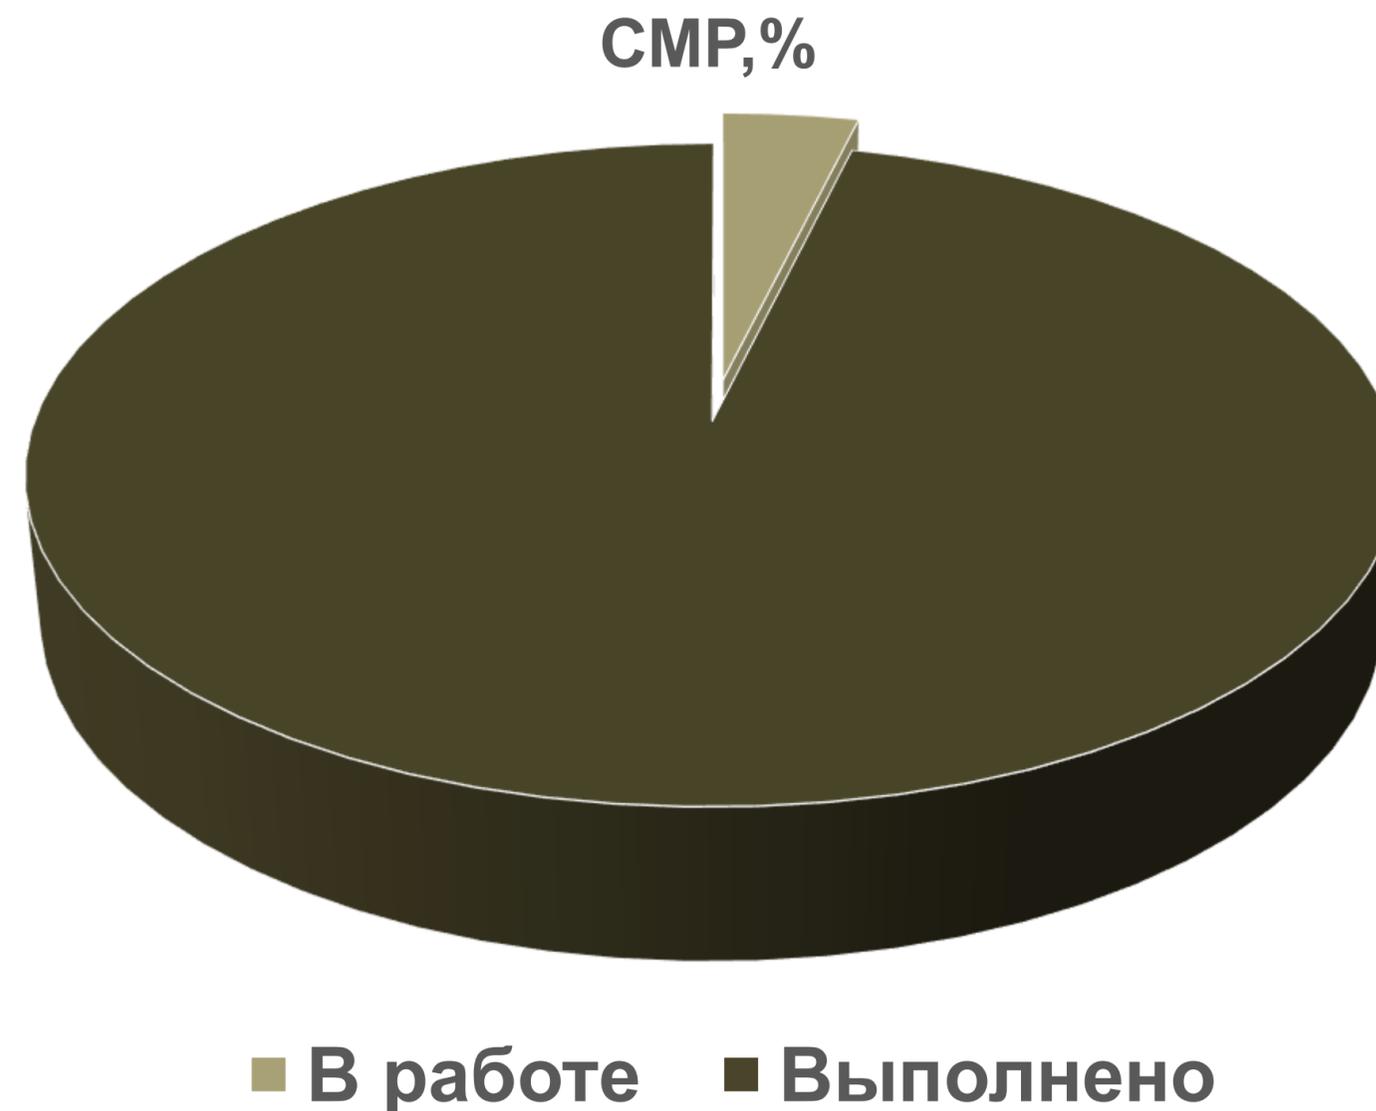

На 96% выполнены работы в рамках Национальных проектов этого года. Мы курируем 6 Нацпроектов, в рамках которых строятся 99 объектов общей сметной стоимостью 11 млрд 900 млн руб. К текущей дате завершены 82 из них.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	90,00	2,00
2	ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	170 635,35	93,00	3,00
3	ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	178 868,36	98,00	6,00
4	ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	187 244,21	98,00	0,00
ИТОГО		3 791 699,38	98,50	2,80
5	ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, д.Эстачи	270 800,59	100,00	1,00
6	ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	268 612,14	100,00	2,00
7	ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район, ЖК «Столичный»	270 800,59	100,00	-
8	ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК «Лето»	268 455,01	100,00	-
9	ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал ЖК «Салават Купере» (позиция 2)	279 750,60	100,00	-
10	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	267 956,21	100,00	-
11	ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	176 706,64	100,00	-
12	ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	101 217,12	100,00	-
13	ДОО на 120 мест в г. Казани, ЖК«Весна-2» (позиция 2)	166 751,14	100,00	-
14	ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	267 220,91	100,00	-
15	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	284 690,31	100,00	-
16	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	256 895,04	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 220 МЕСТ В ПЕСТРЕЧИНСКОМ МО, ЖК «СВЕТЛЫЙ»



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 120 МЕСТ В ПЕСТРЕЧИНСКОМ МО, С.БОГОРОДСКОЕ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	Динамика за 2 недели
1	ЖК «Усадьба Царева»:			
	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации	96 465,25	52,00	37,00
2	ЖК «Светлая долина»:			
	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса	17 860,47	94,00	2,00
3	ЖК «Лето»:			
	Строительство дорог	139 501,86	100,00	30,00
	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения	31 280,69	100,00	5,00
	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения	961,73	100,00	0,00
4	ЖК «Брайт Парк»:			
	Строительство автомобильной дороги	153 321,65	100,00	25,00
5	ЖК «Весна»:			
	Дорога по ул. А.Аббасова	72 765,16	100,00	8,00

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 817 699,51	84,68	23,07
ИТОГО		1 817 699,51	84,68	23,07



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	732 860,00	98,76	0,20



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	85,00	15,00
ИТОГО по 49 объектам		1 452 960,79	99,45	5,37



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	88,00	8,00
2	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	50 000,00	96,00	1,00
3	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	79 600,00	98,00	0,00
ИТОГО		488 300,00	98,04	3,67
4	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	69 650,00	100,00	2,00
5	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	50 000,00	100,00	5,00
6	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	50 000,00	100,00	0,00
7	Азнакаевский, Набережная реки Черная	69 650,00	100,00	0,00
8	Буинский, Центральная площадь	69 650,00	100,00	0,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ НУРЛАТСКИЙ РАЙОН, «ПАРК «КОНДУРЧА»



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 974,01	97,00	1,00
2	Атнинский МР, Дусюмский	3 974,00	98,00	6,00
3	Сабинский МР, Миченбашский	3 974,01	99,00	1,00
ИТОГО по 42 объектам		165 284,33	99,86	2,67

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, АТНИНСКИЙ РАЙОН, ДУСЮМСКИЙ



ЛЕТ 100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 368,39	97,00	2,00
2	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 368,39	98,00	0,00
ИТОГО		55 171,12	98,79	1,00
3	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 217,17	100,00	-
4	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 217,17	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ НУРЛАТСКИЙ РАЙОН, СТАРО-ЧЕЛНИНСКИЙ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.140б	68 403,07	99,00	0,00
ИТОГО		278 296,72	99,76	0,48
2	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	66 768,10	100,00	2,00
3	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	68 012,58	100,00	-
4	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	75 112,97	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Г.АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ.ШЕВЧЕНКО, Д.136



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	65,00	10,00
2	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	75,00	14,00
ИТОГО		380 273,06	79,58	5,16
3	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	87,00	7,00
4	Строительство ДОЛ «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Камско-Устьинского муниципального района	30 118,12	100,00	-
5	Строительство МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 517,02	100,00	-
6	Строительство ДОЛ «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	77 051,25	100,00	-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛ «ФАКЕЛ» МБУ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЖАГАН», НОВОШЕШМИНСКОГО МР




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

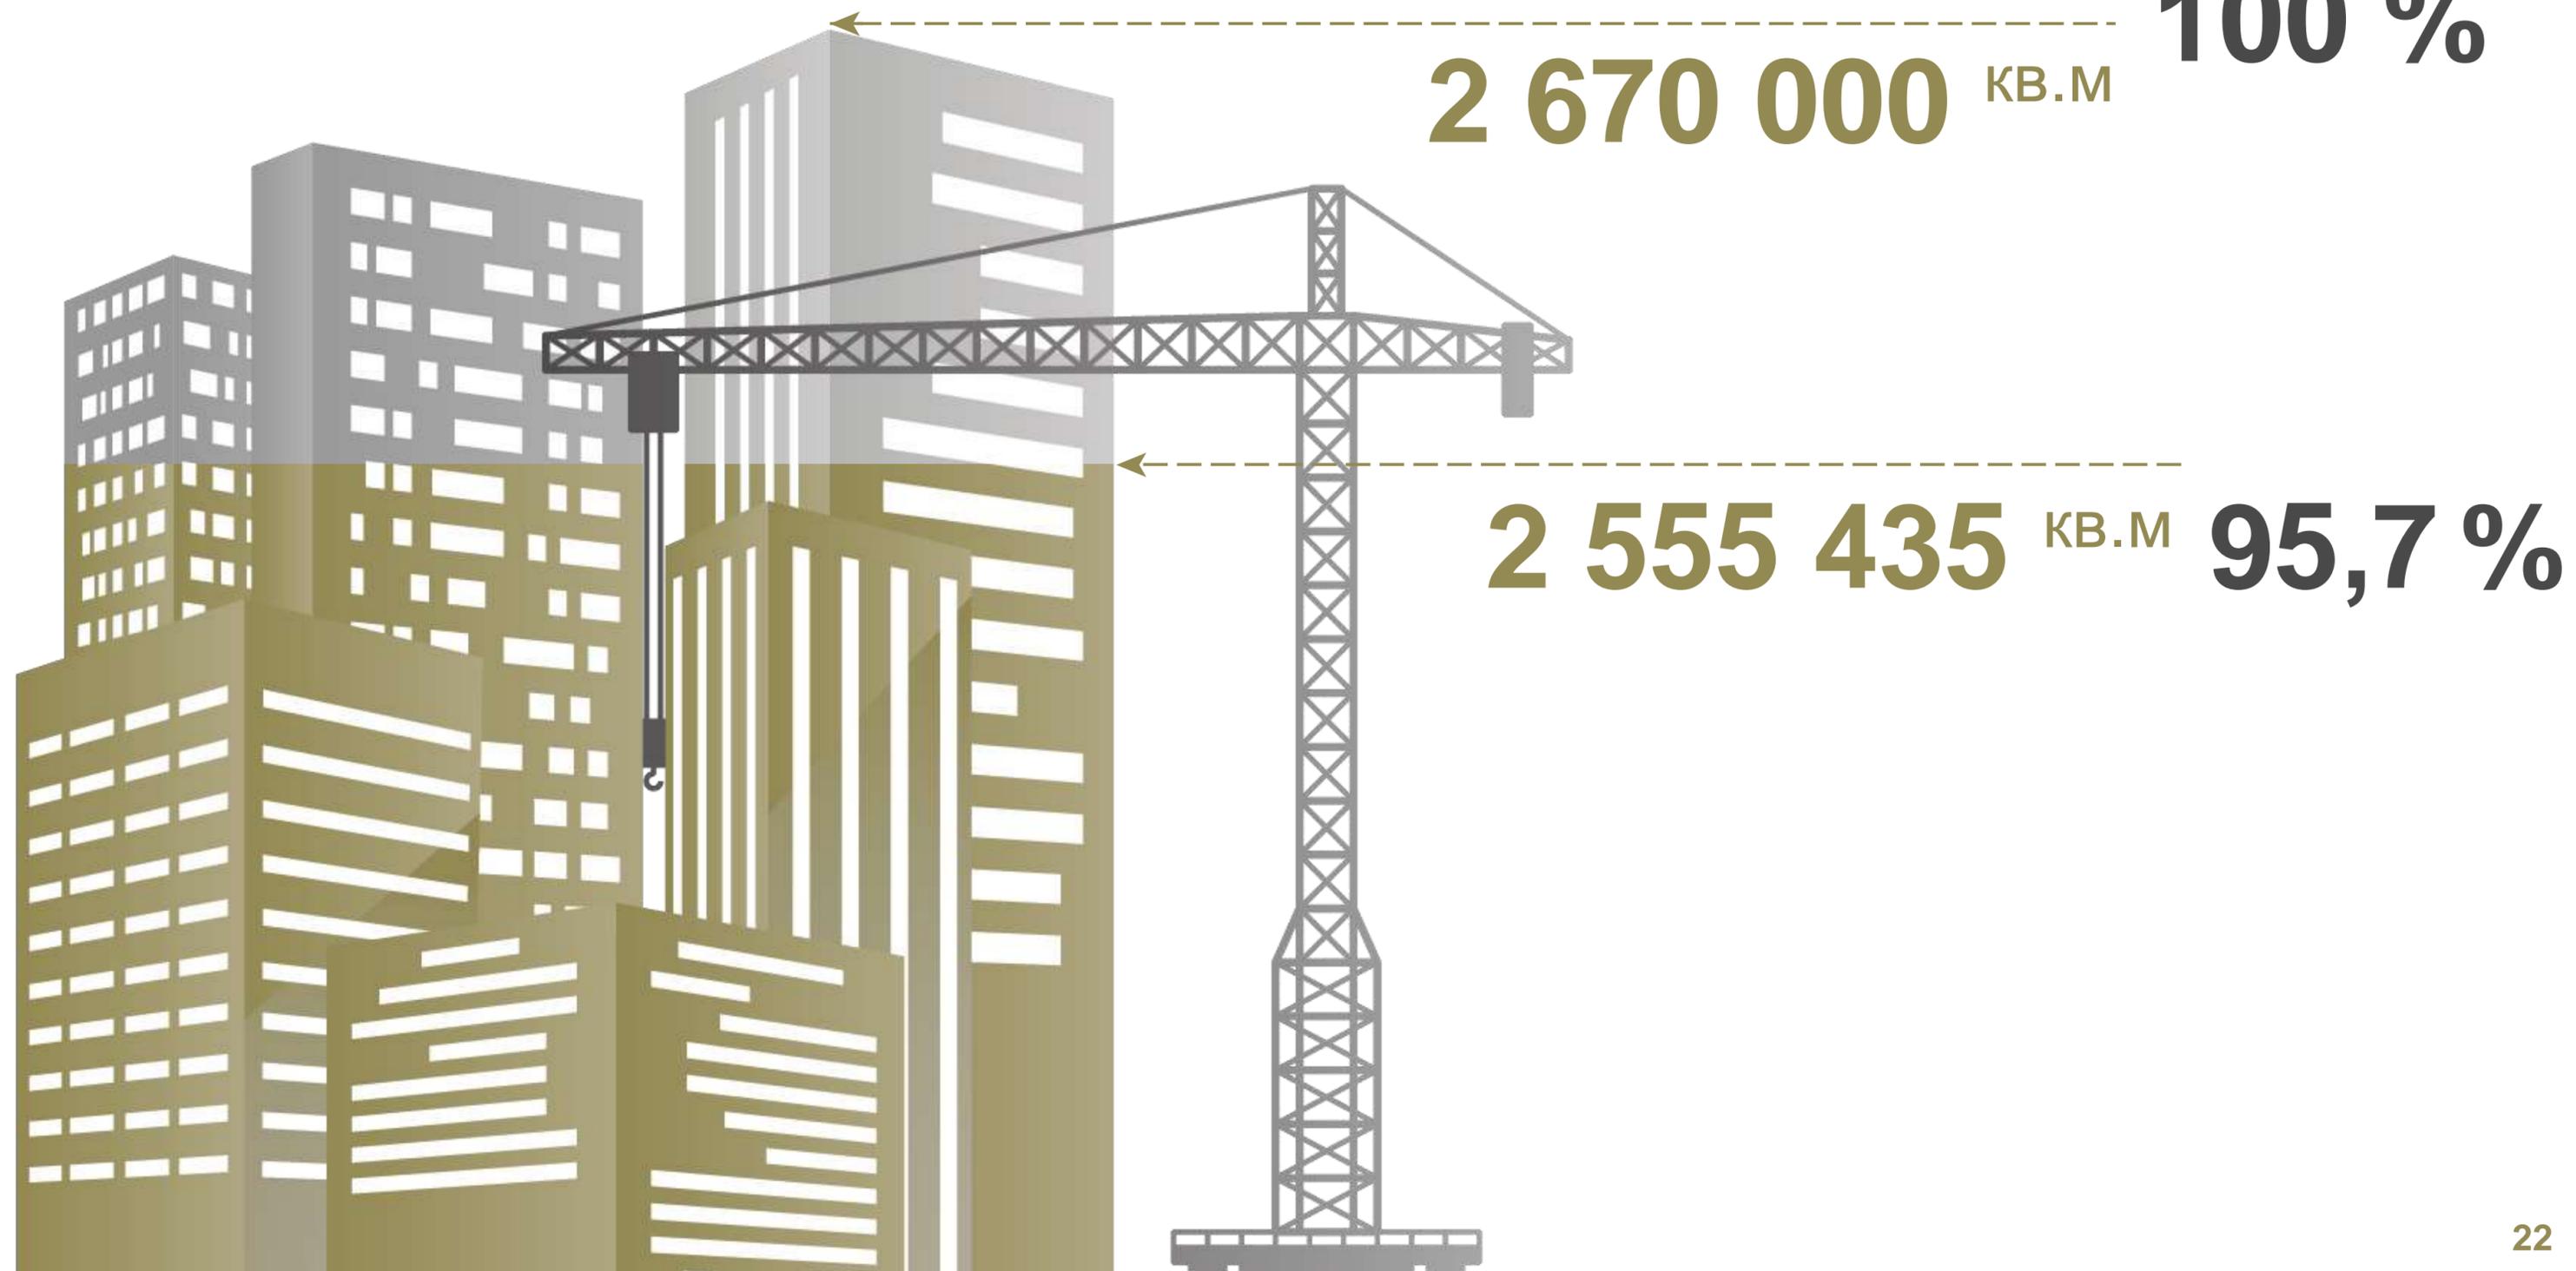

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Лениногорский	25 000	8 715	34,9	16 285
2	Менделеевский	13 000	8 771	67,5	4 229
3	Муслюмовский	10 000	6 958	69,6	3 042
4	Чистопольский	22 000	16 127	73,3	5 873
5	Азнакаевский	22 000	16 578	75,4	5 422
6	Альметьевский	120 000	91 367	76,1	28 633
7	Нурлатский	17 000	13 434	79,0	3 566
8	Новошешминский	5 000	3 961	79,2	1 039
9	Агрызский	18 000	14 521	80,7	3 479
10	Нижнекамский	70 000	60 328	86,2	9 672
11	Аксубаевский	8 000	7 056	88,2	944
12	Сабинский	22 000	19 495	88,6	2 505
13	Бавлинский	15 000	13 591	90,6	1 409
14	Апастовский	8 000	7 308	91,4	692
15	Актанышский	15 000	13 748	91,7	1 252
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 555 435	95,7	114 565

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	г.Наб.Челны	320 000	294 375	92,0	25 625
17	Кукморский	27 000	24 848	92,0	2 152
18	Тетюшский	10 000	9 267	92,7	733
19	Бугульминский	35 000	32 511	92,9	2 489
20	Буинский	16 000	15 104	94,4	896
21	Алексеевский	16 000	15 181	94,9	819
22	Кайбицкий	5 000	4 749	95,0	251
23	Р-Слободский	15 000	14 364	95,8	636
24	Мензелинский	14 000	13 475	96,3	525
25	В-Услонский	35 000	33 745	96,4	1 255
26	г .Казань	930 000	902 585	97,1	27 415
27	Алькеевский	8 000	7 808	97,6	192
28	Мамадышский	20 000	19 549	97,7	451
29	Ютазинский	13 000	12 764	98,2	236
30	Спасский	5 000	5 000	100,0	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 555 435	95,7	114 565

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Зеленодольский	90 000	90 019	100,0	0
32	Заинский	20 000	20 009	100,0	0
33	Арский	25 000	25 022	100,1	0
34	Балтасинский	15 000	15 017	100,1	0
35	Тукаевский	110 000	110 769	100,7	0
36	Дрожжановский	7 000	7 056	100,8	0
37	К-Устьинский	7 000	7 068	101,0	0
38	Пестречинский	190 000	192 379	101,3	0
39	Елабужский	60 000	60 807	101,3	0
40	Сармановский	10 000	10 189	101,9	0
41	Тюлячинский	7 000	7 235	103,4	0
42	Лайшевский	160 000	167 326	104,6	0
43	Черемшанский	6 000	6 345	105,8	0
44	Высокогорский	110 000	123 902	112,6	0
45	Атнинский	4 000	5 009	125,2	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 555 435	95,7	114 565

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



12 217 ДОМОВ

146,7 %




8 330 ДОМОВ

100 %

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

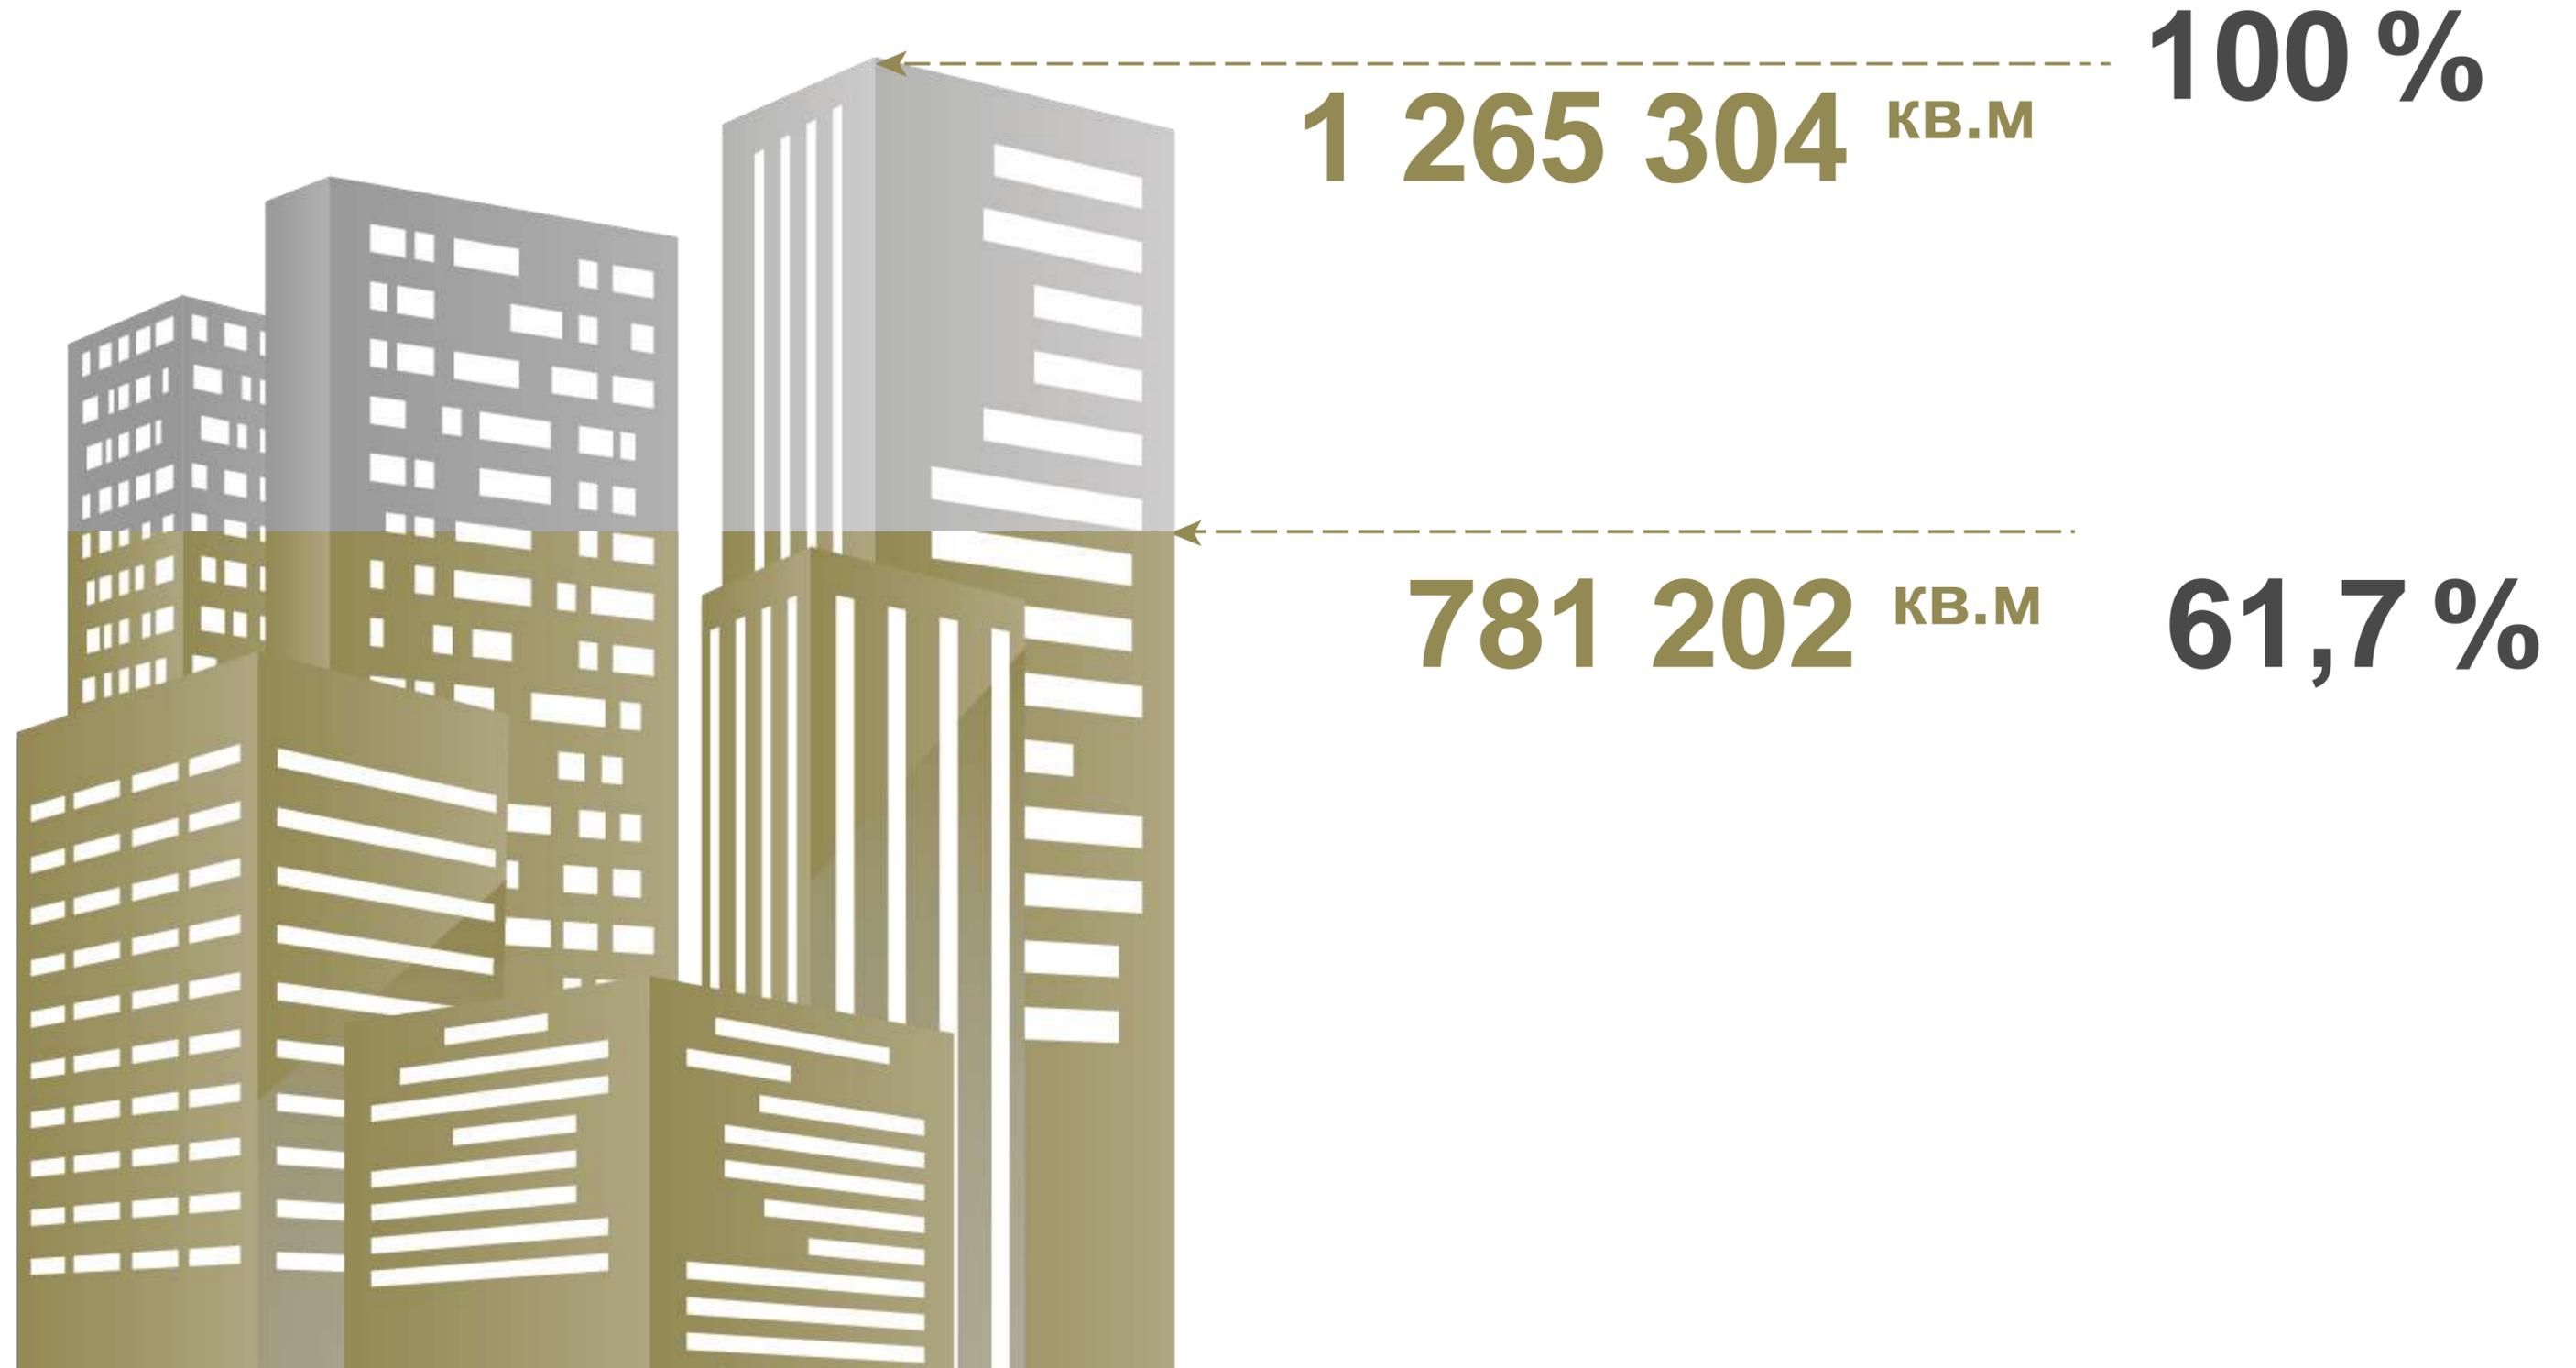

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-
2	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	3	4
3	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	-	1
4	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	2	2	-
5	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-
6	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	15	8	7
7	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	4	4	-
8	Г.КАЗАНЬ	32	26	6
ВСЕГО по РТ		63	45	18

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



280 496 КВ.М

100 %

124 890 КВ.М

44,5 %

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	116	74	3
2	Чистопольский	183	131	52	0
3	Кукморский	53	47	6	0
4	Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	74	2	0
ВСЕГО по РТ		1 102	965	137	3

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Земельные участки с ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	г.Казань	3
4	Кукморский	1
	ВСЕГО по РТ	71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не снесены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский			22	23	11	56
2	Кукморский	2	1			2	5
3	Чистопольский			3			3
4	Высокогорский					2	2
ВСЕГО по РТ		2	1	25	23	15	66

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	8	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	6,87	6,87	-
ИТОГО:	740	1 196,65	100,28	1 096,37

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
1	АКТАНЫШСКИЙ	4		4
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8		8
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18		18
4	АРСКИЙ	14	1	13
5	АТНИНСКИЙ	1		1
6	БАВЛИНСКИЙ	8		0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4		4
8	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6		6
9	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8		0
10	ДРОЖЖАНОВСКИЙ	4		4
ИТОГО:		636	42	382

* 27 ставятся на кадастровый учет и проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 185 помещений в незавершенных строительстве домах.

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
11	МАМАДЫШСКИЙ	16		16
12	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	15		0
13	НИЖНЕКАМСКИЙ	28		28
14	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4		0
15	НУРЛАТСКИЙ	13	2	11
16	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1		1
17	САРМАНОВСКИЙ	1		1
18	ТЕТЮШСКИЙ	4	4	0
19	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1	0
20	ЮТАЗИНСКИЙ	1		1
21	Г.НАБ.ЧЕЛНЫ	80		0
22	Г.КАЗАНЬ	397	34	266
ИТОГО:		636	42	382

* 27 ставятся на кадастровый учет и проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 185 помещений в незавершенных строительстве домах.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей	№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1	15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	1	16	МАМАДЫШСКИЙ	1	1
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	1	17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	1
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	2	19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	2
6	БАВЛИНСКИЙ	1	1	20	НУРЛАТСКИЙ	3	3
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	3	21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	2	22	САБИНСКИЙ	1	1
9	БУИНСКИЙ	1	1	23	САРМАНОВСКИЙ	1	1
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	5	24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1	25	Г.КАЗАНЬ	2	2
12	ЗАИНСКИЙ	1	1	26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	6
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4		ИТОГО:	47	44
14	КУКМОРСКИЙ	1	1				

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН




№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	4	1	1	1
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
1.3	<i>Менделеевский</i>	1	0	-	-
1.4	<i>Нижнекамский</i>	1	0	-	-
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	2	2	2
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	2	2	1
3.1	<i>Буинский</i>	1	1	1	-
3.2	<i>Тетюшский</i>	1	1	1	1
	ВСЕГО по РТ	8	5	5	4

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



Реконструкция объекта «Многофункциональный центр бытового обслуживания населения» по ул. Юности, г. Нижнекамск



**Котлован
не оборудован защитными и
сигнальными ограждениями**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «НИЖНЕКАМСКИЕ ТЕРМЫ»
Генподрядчик: ООО «ЮнионСтрой Плюс»**

Строительство молочно-товарной фермы вблизи д. Ялтау в Лениногорском районе



В бытовых помещениях отсутствуют аптечки с медикаментами и средства для оказания первой медицинской помощи

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Август-Лениногорск»
Генподрядчик: ООО «Строительная компания «АГРОБАУ АРСК»**

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	1 577	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	100	5 618,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	31	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	46	4 397,0
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	23	1 221,0

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	1 888
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	987
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	1 110
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	425
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	231
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	121
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	333

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	589
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	1 034
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	1 012
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	299

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	137	313	291	93
2	г.Набережные Челны	38	38	38	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	6	2	2	100
7	Алексеевский	13	24	24	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	17	96	96	100
10	Апастовский	20	28	28	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	1	2	2	100
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	14	13	13	100
ВСЕГО по РТ		589	1 034	1 012	98

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	2	12	12	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	13	19	19	100
20	Елабужский	26	23	23	100
21	Заинский	4	20	20	100
22	Зеленодольский	14	34	34	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	6	11	11	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	22	49	49	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
ВСЕГО по РТ		589	1 034	1 012	98

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	38	23	23	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	9	8	8	100
35	Пестречинский	5	82	82	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	6	9	9	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	9	5	5	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	3	13	13	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
ВСЕГО по РТ		589	1 034	1 012	98

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2022 ГОДУ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ



ПО
1

ПРОГРАММЕ
УТВЕРЖДЕНО
РКМ РТ



ПО
3

ПРОГРАММАМ
ПРОЕКТЫ РКМ РТ
ВНЕСЕНЫ В КМ РТ



ПО
10

ПРОГРАММАМ
ПРОЕКТ РКМ РТ
НАХОДИТСЯ НА
СОГЛАСОВАНИИ



ПО
15

ПРОГРАММАМ
ВЕДЕТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
РАБОТА

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Ответственное министерство	Примечание
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
1	Капитальный ремонт стационарных организаций соц.обслуживания	191 500,00	191 500,00	-	Минтруд РТ	№2390-р от 19.11.2021
Проекты РКМ РТ зашедшие в Кабинет Министров РТ						
1	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газораспределения, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (газ)	162 200,00	150 850,00	11 350,00	МСАиЖКХ РТ	вх. КМ РТ №68708 от 13.11.2021
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан (освещение)	225 000,00	222 772,28	2 227,72	МСАиЖКХ РТ	вх. КМ РТ №68023 от 11.11.2021
3	Реконструкция и капремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой б/м котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений	69 900,00	68 142,00	1 758,00	МСАиЖКХ РТ	вх. КМ РТ №71262 от 24.11.2021

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Ответственное министерство	Примечание
		Всего	СМР	ПИР		
Проекты РКМ РТ направленные на межведомственное согласование						
1	Строительство универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений (УСП, ЛБ, манеж)	500 000,00	487 899,71	12 100,29	Минспорт РТ	согл-11538228-4 от 12.11.2021
2	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,00	486 121,90	13 878,10	Минспорт РТ	согл-11559314-4 от 17.11.2021
3	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	330 000,00	320 062,62	9 937,38	Минздрав РТ	согл-11559399-2 от 17.11.2021
4	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	48 563,80	1 436,20	Госкомитет РТ по архивному делу	согл-11522084-3 от 10.11.2021
5	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений (Исполкомы)	100 000,00	97 734,79	2 265,21	МСАиЖКХ РТ Совет МО РТ	согл-11522948-5 от 10.11.2021
6	Обеспечение населения питьевой водой	1 300 000,00	1 153 879,75	146 120,25	МСАиЖКХ РТ	согл-11542315-3 от 15.11.2021
7	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации (сети)	498 801,17	445 696,60	53 104,57	МСАиЖКХ РТ	согл-11563869-3 от 18.11.2021

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Ответственно е министерство	Примечание
		Всего	СМР	ПИР		
Проекты РКМ РТ направленные на межведомственное согласование						
8	Капремонт зданий ветеринарных объединений и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	50 000,00	50 000,00	-	Минсельхоз РТ	согл-11566163-2 от 18.11.2021
9	Строительство пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	47 552,23	2 447,77	Минсельхоз РТ	согл-11571654-1 от 19.11.2021
10	Капитальный ремонт объектов культурного назначения (СДК)	300 000,00	293 201,88	6 798,12	Минкульт РТ	согл-11580404-4 от 22.11.2021

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
На стадии формирования				
1	Капремонт объектов образования (ДОУ, школы (в т.ч. коррекционные), точки роста)	3 000 000,00	Минобр РТ	Учитывая, что лимит определен с софинансированием по фед. программе капремонта школ, ожидается согласование заявки и суммы софинансирования
2	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,00	Минобр РТ	МОиН РТ направлено обращение о согласовании подхода по формированию мероприятий с руководством республики
3	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,78	Минобр РТ	
4	Капитальный ремонт пищеблоков	1 000 000,00	Минобр РТ	Ведется сбор документации от районов

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
На стадии формирования				
5	Капремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,00	Минмол РТ	Ведется доработка перечня объектов
6	Капитальный ремонт молодежных центров	363 000,00	Минмол РТ	Ожидается выход заключений экспертизы
7	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	Минмол РТ	Ожидается выход заключений экспертизы
8	Капитальный ремонт и строительство стационаров	2 600 000,00	Минздрав РТ	Ведется работа по обоснованию увеличения лимита финансирования

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
На стадии формирования				
9	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (ДШИ)	150 000,00	Минкульт РТ	Ведется определение перечня отраслевым министерством
10	Капитальный ремонт коровников (100 и 200 голов)	300 000,00	Минсельхоз РТ	Направлено обращение о перераспределении согласованного лимита на другие программы в адрес руководства республики. Письмо на рассмотрении у министерств по резолюции
11	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах	150 000,00	Минсельхоз РТ	Подготовлено обращение в адрес руководства республики о выделении средств в виде субсидии
12	Капитальный ремонт подведомственных зданий (Лесхозы)	70 500,00	Минлесхоз РТ	Ведется расчет стоимости ПИР для подготовки проекта РКМ

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
На стадии формирования				
13	Формирование комфортной городской среды (общественные пространства)	1 000 000,00	МСАиЖКХ РТ	Направлено обращение об увеличении лимита финансирования в адрес руководства республики на сумму 1 231 764,654 тыс.рублей
14	Капитальный ремонт зданий Мировых судей	51 181,90	Минюст РТ	Проекты РКМ РТ будут направлены на межведомственное согласование после утверждения Закона о бюджете на 2022 год
15	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, защиты населения и объектов инфраструктуры в период весеннего половодья	312 789,54	Минэкологии	Проекты РКМ РТ будут направлены на межведомственное согласование после утверждения Закона о бюджете на 2022 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
