



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

11 декабря 2021 г.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД



17 программ, из них:

1 072 объекта на 8 866,12 млн.руб.

9 программ реализовано

303 объекта на 1 802,34 млн.руб.

8 программ в работе

*Всего в них входит 769 объектов на 7 063,78 млн.руб.,
осталось завершить 12 объектов на 1 016,2 млн.руб.*

Общий СМР составляет 96 %



До завершения года остается чуть более двух недель, и на данном этапе объем выполнения 17-ти республиканских программ строительства объектов социально-культурной сферы достигло 96%.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА



№	Наименование программ	Сумма, млн.рублей	Кол-во объектов	СМР, %
				Факт
1	Обеспечение жильем молодых семей	59,79	49	100
2	Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	72,78	13	100
3	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	67,52	16	100
4	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	107,56	7	100
5	Обеспечение населения питьевой водой	650,00	129	100
6	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах РТ	130,54	20	100
7	Обеспечение жильем категорий граждан	21,39	7	100
8	Строительство ФАПов и капремонт объектов здравоохранения	329,21	47	100
9	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	363,55	15	100
ИТОГО:		1 802,34	303	100,00

Финансовый объем завершенных 9-ти программ, в которые входят 303 объекта, составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



6 национальных проектов

12 федеральных проектов

100 объектов (**89** объектов завершены)

3,77 тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 12 056,86 млн рублей
(освоено 10 339,83 млн рублей)*

Общий СМР составляет 97,7 %



Если говорить о Национальных проектах, курируемых нашим министерством – а их, напомню, 6 - степень их выполнения мы оцениваем в 97,7%. Из 100 объектах общей сметной стоимостью 12 млрд 57 млн руб. готовы 89.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		Факт	Динамика за 2 недели
ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	91,00	1,00
ИТОГО по 16 объектам	3 791 699,38	98,84	1,50



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	Динамика за 2 недели
1	ЖК «Усадьба Царева»:			
	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации	96 465,25	70,00	18,00
2	ЖК «Светлая долина»:			
	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса	17 860,47	96,00	2,00
3	ЖК «Лето»:			
	Строительство дорог	139 501,86	100,00	0,00
	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения	31 280,69	100,00	0,00
	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения	961,73	100,00	0,00
4	ЖК «Брайт Парк»:			
	Строительство автомобильной дороги	153 321,65	100,00	0,00
5	ЖК «Весна»:			
	Дорога по ул. А.Аббасова	72 765,16	100,00	0,00

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		Факт	Динамика за 2 недели
Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	93,00	8,00
ИТОГО по 49 объектам	1 452 960,79	99,74	8,00

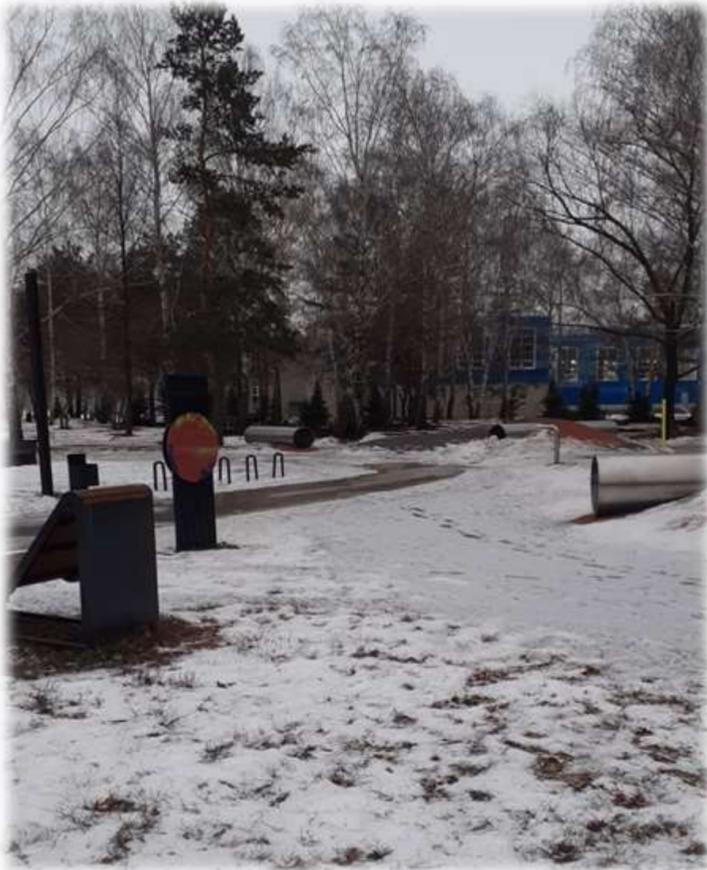

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	92,00	4,00
ИТОГО по 8 объектам		488 300,00	99,18	3,33

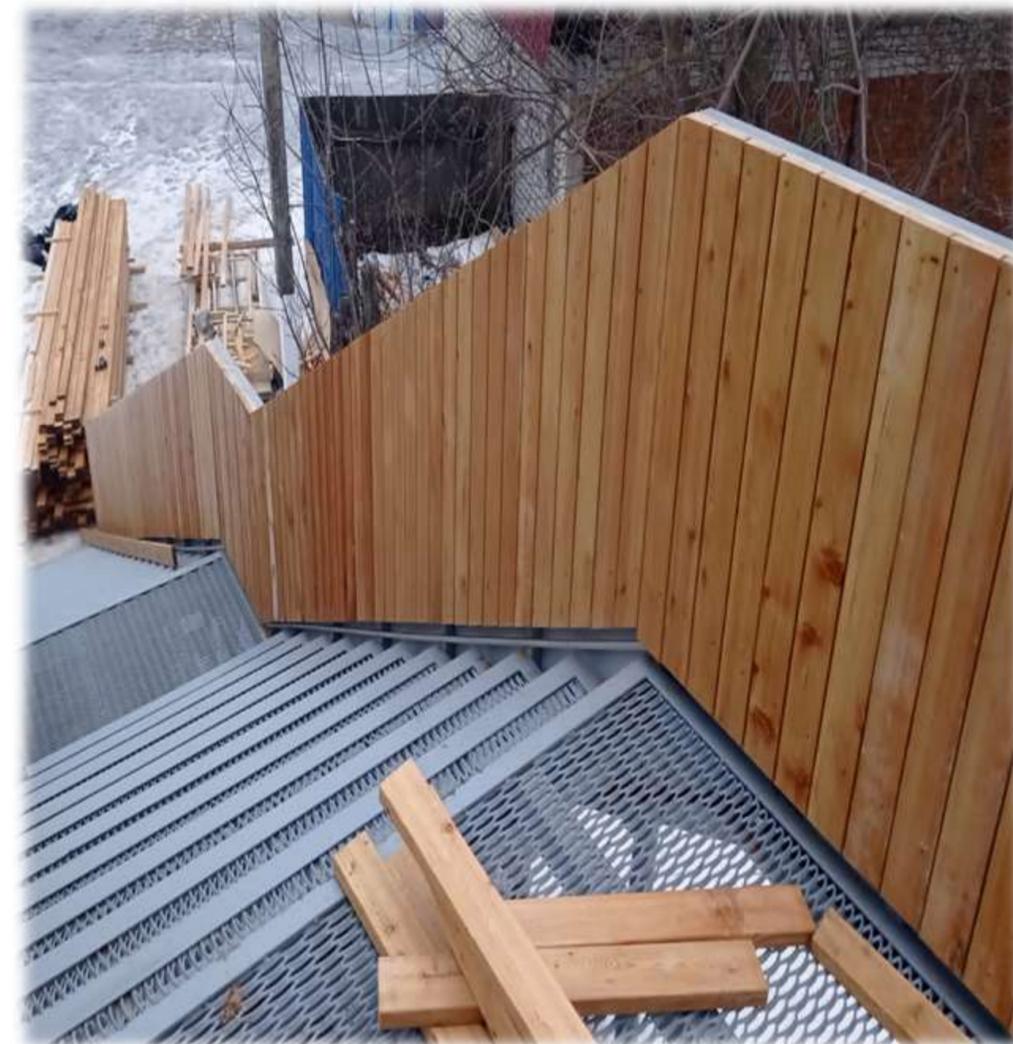

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	732 860,00	98,76	0,20



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Реконструкция БОСК г.Казани	1 817 699,51	100,00	15,32
ИТОГО	1 817 699,51	100,00	15,32



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	72,00	7,00
ИТОГО		380 273,06	84,59	10,00
2	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	92,00	17,00
3	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	93,00	6,00

СТРОИТЕЛЬСТВО МБУ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЗВЕЗДИЕ» ЗАИНСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН




100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ САБИНСКИЙ РАЙОН



ЛЕТ 100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

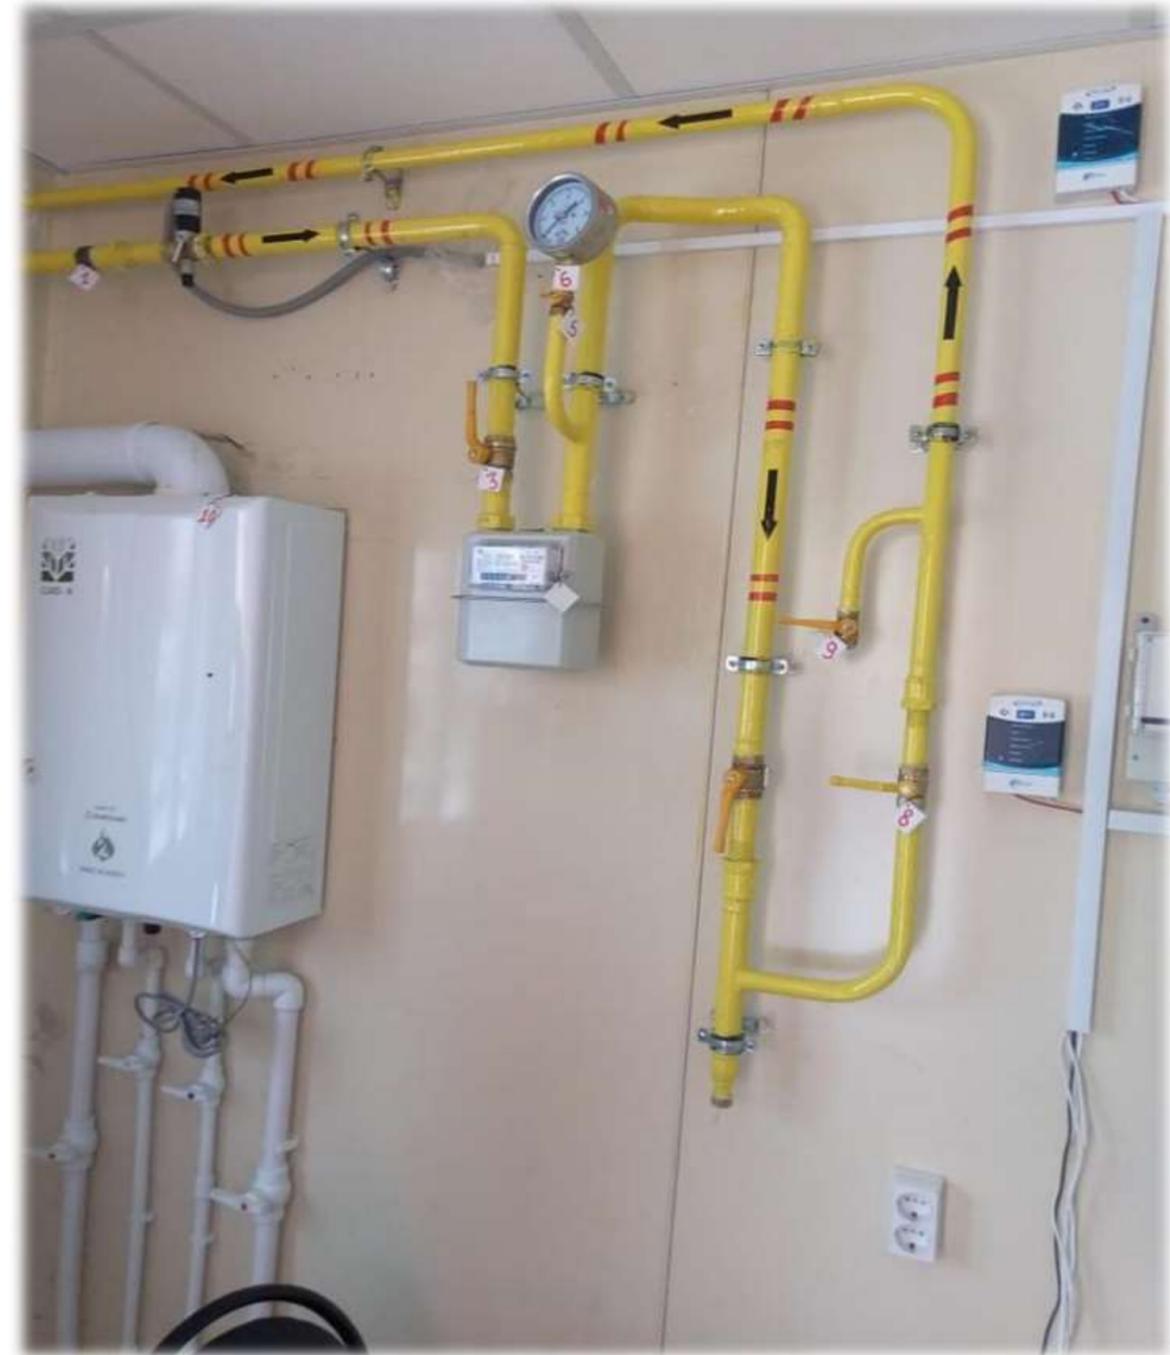

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ НУРЛАТСКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ СПАССКИЙ РАЙОН



100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		Факт	Динамика за 2 недели
Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.140б	68 403,07	100,00	1,00



ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1.	Лениногорский	25 000	11 630	46,5	13 370
2.	Менделеевский	13 000	9 758	75,1	3 242
3.	Азнакаевский	22 000	16 578	75,4	5 422
4.	Чистопольский	22 000	16 943	77,0	5 057
5.	Муслюмовский	10 000	8 091	80,9	1 909
6.	Новошешминский	5 000	4 163	83,3	837
7.	Альметьевский	120 000	101 341	84,5	18 659
8.	Сабинский	22 000	21 108	95,9	892
9.	Апастовский	8 000	7 699	96,2	301
10.	г.Казань	930 000	904 874	97,3	25 126
11.	Аксубаевский	8 000	7 813	97,7	187
12.	Р-Слободский	15 000	14 935	99,6	65
13.	Спасский	5 000	5 000	100,0	0
14.	Зеленодольский	90 000	90 019	100,0	0
15.	Бугульминский	35 000	35 011	100,0	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 636 725	98,8	33 275

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16.	Кукморский	27 000	27 009	100,0	0
17.	Заинский	20 000	20 009	100,0	0
18.	В-Услонский	35 000	35 021	100,1	0
19.	Алькеевский	8 000	8 005	100,1	0
20.	Мензелинский	14 000	14 009	100,1	0
21.	Мамадышский	20 000	20 013	100,1	0
22.	Арский	25 000	25 022	100,1	0
23.	Балтасинский	15 000	15 017	100,1	0
24.	Кайбицкий	5 000	5 009	100,2	0
25.	Нурлатский	17 000	17 036	100,2	0
26.	Ютазинский	13 000	13 040	100,3	0
27.	Алексеевский	16 000	16 059	100,4	0
28.	Тукаевский	110 000	110 769	100,7	0
29.	Актанышский	15 000	15 113	100,8	0
30.	Агрызский	18 000	18 144	100,8	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 636 725	98,8	33 275

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.




№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31.	Дрожжановский	7 000	7 056	100,8	0
32.	г.Наб.Челны	320 000	322 660	100,8	0
33.	Буинский	16 000	16 150	100,9	0
34.	Тетюшский	10 000	10 097	101,0	0
35.	К-Устьинский	7 000	7 068	101,0	0
36.	Нижнекамский	70 000	70 783	101,1	0
37.	Пестречинский	190 000	192 379	101,3	0
38.	Елабужский	60 000	60 807	101,3	0
39.	Бавлинский	15 000	15 223	101,5	0
40.	Сармановский	10 000	10 189	101,9	0
41.	Тюлячинский	7 000	7 235	103,4	0
42.	Лаишевский	160 000	167 326	104,6	0
43.	Черемшанский	6 000	6 345	105,8	0
44.	Высокогорский	110 000	123 902	112,6	0
45.	Атнинский	4 000	5 267	131,7	0
ВСЕГО по РТ		2 670 000	2 636 725	98,8	33 275

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

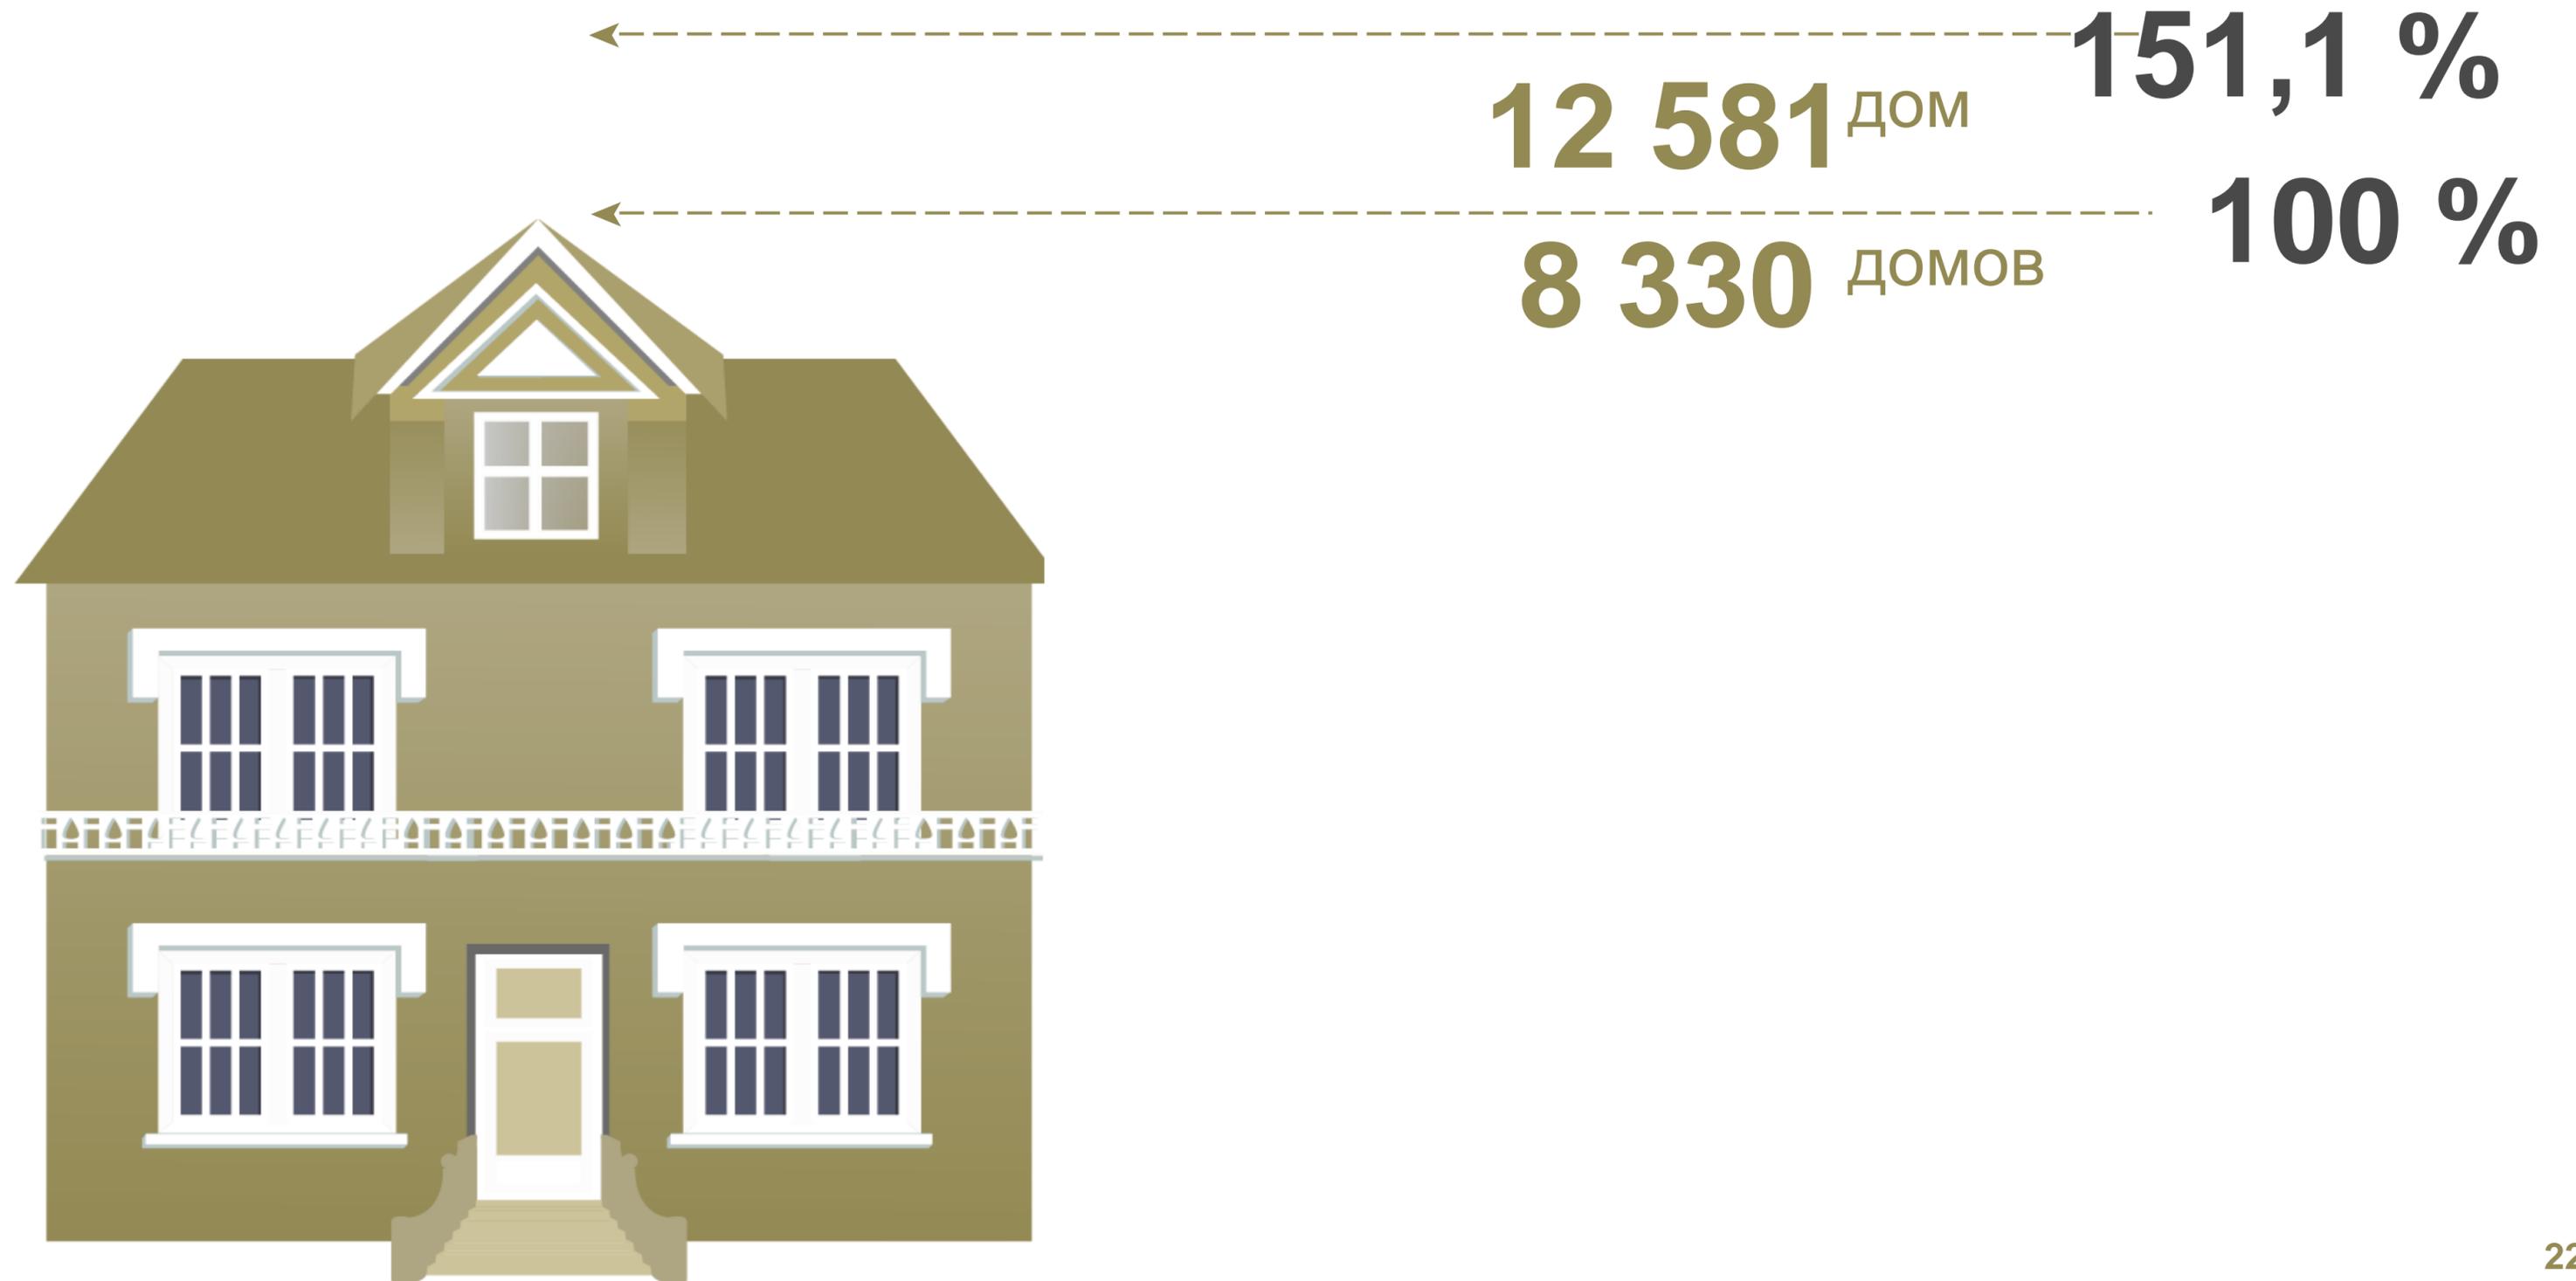

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

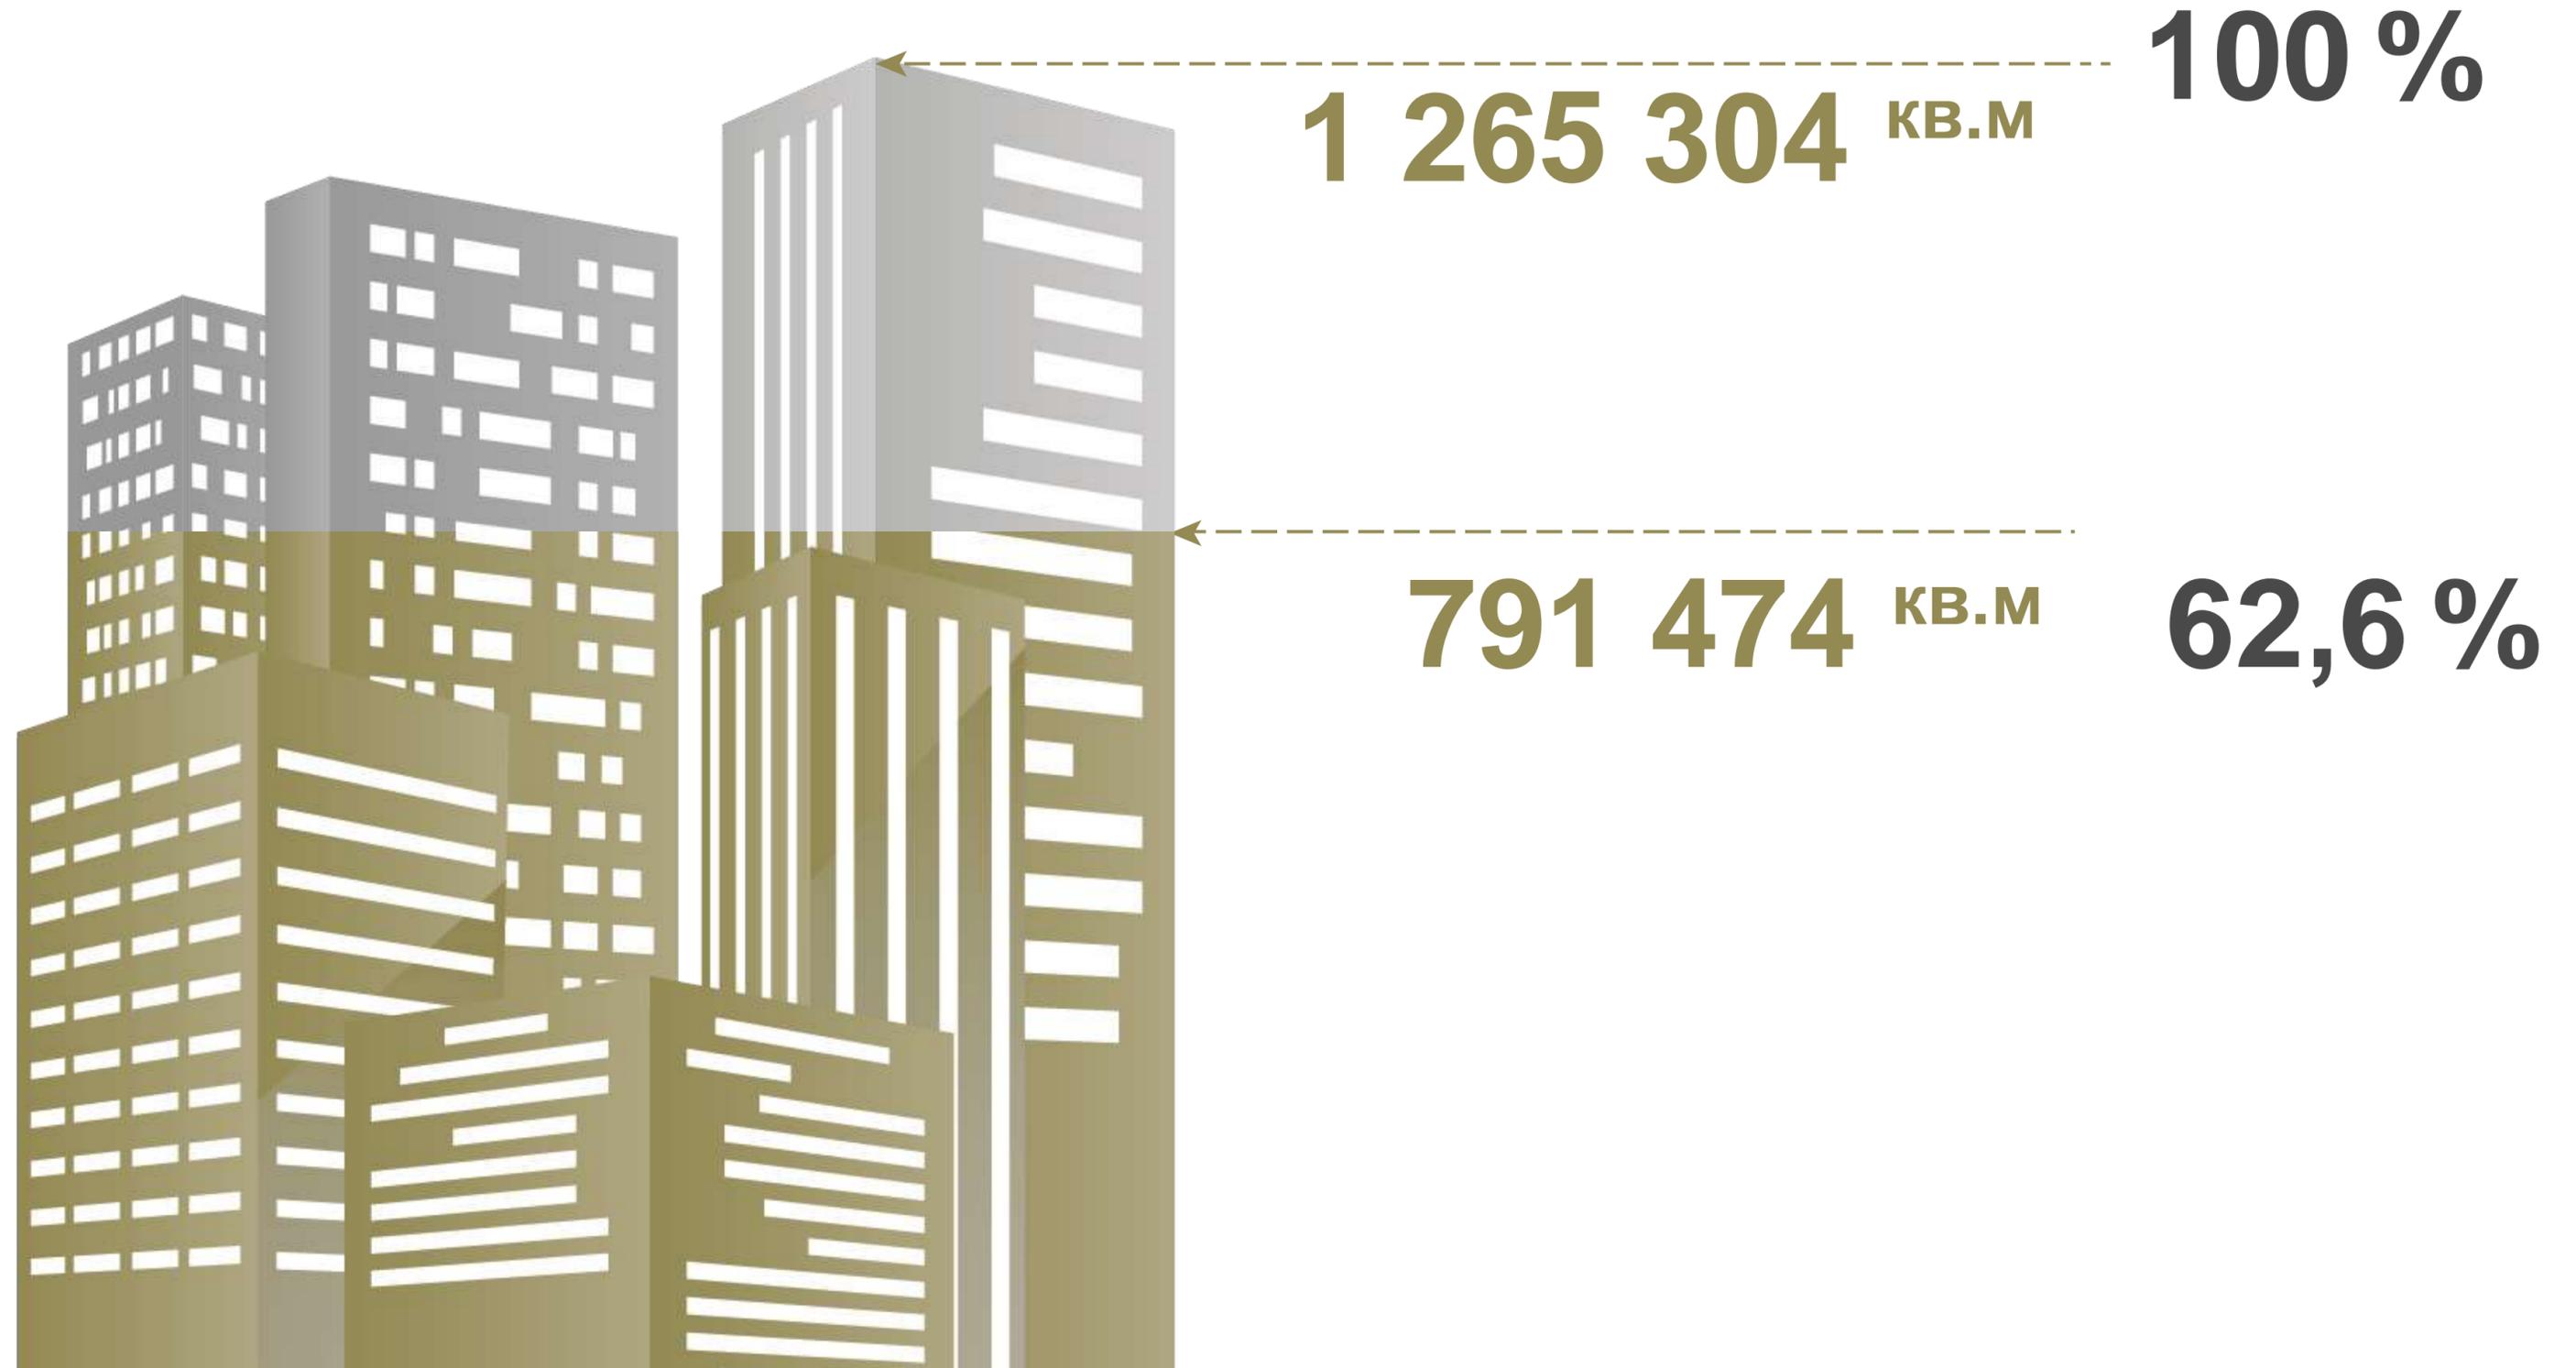


МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности
			Высокая (70-100%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1
2	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	3	3
3	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	2	2
4	НУРЛАТСКИЙ	1	1
5	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	8	8
6	Г.КАЗАНЬ	26	26
ВСЕГО по РТ		41	41

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



280 496 КВ.М 100 %

146 824 КВ.М 52,3 %

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	7	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	6,87	6,87	-
ИТОГО:	739	1 196,65	100,28	1 096,37

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
1	АКТАНЫШСКИЙ	4		4
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8		8
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18		18
4	АРСКИЙ	14		14
5	АТНИНСКИЙ	1		1
6	БАВЛИНСКИЙ	8		0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4		4
8	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6		6
9	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8		0
10	ДРОЖЖАНОВСКИЙ	4		4
ИТОГО:		636	6	422

* 23 проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 88 ставятся на кадастровый учет

* 97 помещений в незавершенном строительстве доме.

ДЕТИ-СИРОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ
11	МАМАДЫШСКИЙ	16		16
12	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	15		0
13	НИЖНЕКАМСКИЙ	28		28
14	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4	4	0
15	НУРЛАТСКИЙ	13	1	12
16	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	1		1
17	САРМАНОВСКИЙ	1		1
18	ТЕТЮШСКИЙ	4		4
19	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1	0
20	ЮТАЗИНСКИЙ	1		1
21	Г.НАБ.ЧЕЛНЫ	80		0
22	Г.КАЗАНЬ	397		300
ИТОГО:		636	6	422

* 23 проходят процедуру регистрации права собственности Государственного жилищного фонда

* 88 ставятся на кадастровый учет

* 97 помещений в незавершенном строительстве доме.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей	№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1	15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	1	16	МАМАДЫШСКИЙ	1	1
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	1	17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	1
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	2	19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	2
6	БАВЛИНСКИЙ	1	1	20	НУРЛАТСКИЙ	3	3
7	БАЛТАСИСКИЙ	4	4	21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	1
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	2	22	САБИСКИЙ	1	1
9	БУИСКИЙ	1	1	23	САРМАНОВСКИЙ	1	1
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	5	24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1	25	Г.КАЗАНЬ	2	2
12	ЗАИСКИЙ	1	1	26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	6
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4		ИТОГО:	47	47
14	КУКМОРСКИЙ	1	1				

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН



№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	3	3	1	1
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	1	0	0
1.3	<i>Нижнекамский</i>	1	1	0	0
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	2	2	2
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	2	2	2	1
3.1	<i>Буинский</i>	1	1	1	-
3.2	<i>Тетюшский</i>	1	1	1	1
	ВСЕГО по РТ	7	7	5	4

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2022 ГОДУ



ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ **30** ПРОГРАММ



ПО
4

ПРОГРАММАМ
УТВЕРЖДЕННЫ
РКМ РТ



ПО
11

ПРОГРАММАМ
ПРОЕКТЫ РКМ РТ
ВНЕСЕНЫ В КМ РТ



ПО
10

ПРОГРАММАМ
ПРОЕКТ РКМ РТ
НАХОДИТСЯ НА
СОГЛАСОВАНИИ



ПО
5

ПРОГРАММАМ
ВЕДЕТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
РАБОТА

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Ответственное министерство	Примечание
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
1	Капитальный ремонт стационарных организаций соц.обслуживания	191 500,00	188 023,00	3 477,00	Минтруд РТ	№2390-р от 19.11.2021
2	Реконструкция и капремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой б/м котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений	69 900,00	68 142,00	1 758,00	МСАиЖКХ РТ	№2473-р от 30.11.2021
3	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газораспределения, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (газ)	162 200,00	150 850,00	11 350,00	МСАиЖКХ РТ	№2590-р от 09.12.2021
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан (освещение)	225 000,00	222 772,28	2 227,72	МСАиЖКХ РТ	№ 2537-р от 07.12.2021

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
Проекты РКМ РТ зашедшие в Кабинет Министров РТ				
1	Капремонт зданий ветеринарных объединений и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	50 000,00	Минсельхоз РТ	вх. КМ РТ №73243 от 02.12.2021 (на подписи)
2	Строительство универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений (УСП, ЛБ, манеж)	500 000,00	Минспорт РТ	вх. В КМ РТ №74678 от 08.12.2021 (на подписи)
3	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений (Исполкомы)	100 000,0	МСАиЖКХ РТ Совет МО РТ	вх. В КМ РТ №74714 от 08.12.2021 (на подписи)
4	Строительство пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	Минсельхоз РТ	вх. в КМ РТ №74022 от 06.12.2021 (на подписи)
5	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,0	Минспорт РТ	вх. КМ РТ №75216 от 09.12.2021 (на подписи)

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
Проекты РКМ РТ зашедшие в Кабинет Министров РТ				
6	Капремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,00	Минмол РТ	вх. КМ РТ № 75196 от 10.12.2021 (на подписи)
7	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, защиты населения и объектов инфраструктуры в период весеннего половодья	312 789,54	Минэкологии	вх. КМ РТ № 74727 от 08.12.2021 (на подписи)
8	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	Госкомитет РТ по архивному делу	вх. КМ РТ № 75527 от 10.12.2021
9	Капитальный ремонт объектов культурного назначения (СДК)	300 000,00	Минкульт РТ	вх. КМ РТ №75539 от 10.12.2021
10	Капитальный ремонт зданий центров психолого-педагогической помощи	304 957,70	Капитальный ремонт зданий центров психолого-педагогической помощи	№ 6307/исх-ТС от 10.12.2021
11	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	498 801,17	МСАиЖКХ РТ	исх.01-09-1837 от 10.12.2021

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание	Стадии согласования по ведомствам
Проекты РКМ РТ направленные на межведомственное согласование					
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	330 000,00	Минздрав РТ	согл-11559399-10 от 17.11.2021	В Минфине РТ
2	Обеспечение населения питьевой водой	1 300 000,00	МСАиЖКХ РТ	согл-11665451-1 от 08.12.2021	В Минстрое РТ, ГУИС РТ
3	Капитальный ремонт зданий мировых судей	51 181,90	Минюст РТ	согл-11681058-1 от 10.12.2021	В Минюсте РТ
4	Кап.ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (ДШИ)	150 000,00	Минкульт РТ	согл-11674277-3 от 09.12.2021	В Минфине РТ, Минэкономике РТ, Минюсте РТ
5	Капитальный ремонт молодежных центров	363 000,00	Минмол РТ	согл-11640207-2 от 03.12.2021	В Минфине РТ

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание	Стадии согласования по ведомствам
Проекты РКМ РТ направленные на межведомственное согласование					
6	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	Минмол РТ	согл-11640227-1 от 03.12.2021	В Минмоле РТ
7	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,00	Минобр РТ	согл-11641576-2 от 03.12.2021	В Минобре РТ
8	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,80	Минобр РТ	согл-11641847-2 от 03.12.2021	В Минфине РТ, Минэкономике РТ
9	Капитальный ремонт подведомственных зданий (Лесхозы)	70 500,00	Минлесхоз РТ	согл-11675056-2 от 09.12.2021	В Минфине РТ, Минэкономике РТ
10	Капитальный ремонт и строительство стационаров	2 600 000,00	Минздрав РТ	Согл-11681552-1 от 10.12.2021	В Минфине РТ

Формирование государственных программ на 2022 год



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
На стадии формирования				
1	Капремонт объектов образования	1 000 000,00	Минобр РТ	Ведется работа по определению перечня под лимит
2	Капитальный ремонт пищеблоков	1 000 000,00	Минобр РТ	Ведется сбор документации от районов*
3	Капитальный ремонт коровников (100 и 200 голов)	300 000,00	Минсельхоз РТ	Направлено обращение о перераспределении согласованного лимита на другие программы в адрес руководства республики. Письмо на рассмотрении у министерств по резолюции
4	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в СНТ	150 000,00	Минсельхоз РТ	Подготовлено обращение в адрес руководства республики о выделении средств в виде субсидии
5	Формирование комфортной городской среды (общественные пространства)	1 000 000,00	МСАиЖКХ РТ	Направлено обращение об увеличении лимита финансирования в адрес руководства республики на сумму 1 231 764,654 тыс.рублей

* документация представлена частично следующими районами: Высокогорский МО – по 1 из 3; Лаишевский МО – по 3 из 4; Менделеевский МО – 0 из 6; Нурлатский МО – 0 из 4; Пестречинский МО – 0 из 3; г. Наб.Челны - 0 из 9.

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	124	66	8
2	Чистопольский	183	131	52	0
3	Кукморский	53	47	6	0
4	г.Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	74	2	0
ВСЕГО по РТ		1 102	973	129	8

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



Земельные участки с ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	г.Казань	3
4	Кукморский	1
	ВСЕГО по РТ	71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)




Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не снесены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский			15	24	9	48
2	Кукморский	2	1			2	5
3	Чистопольский			3			3
4	Высокогорский					2	2
ВСЕГО по РТ		2	1	18	24	13	58

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

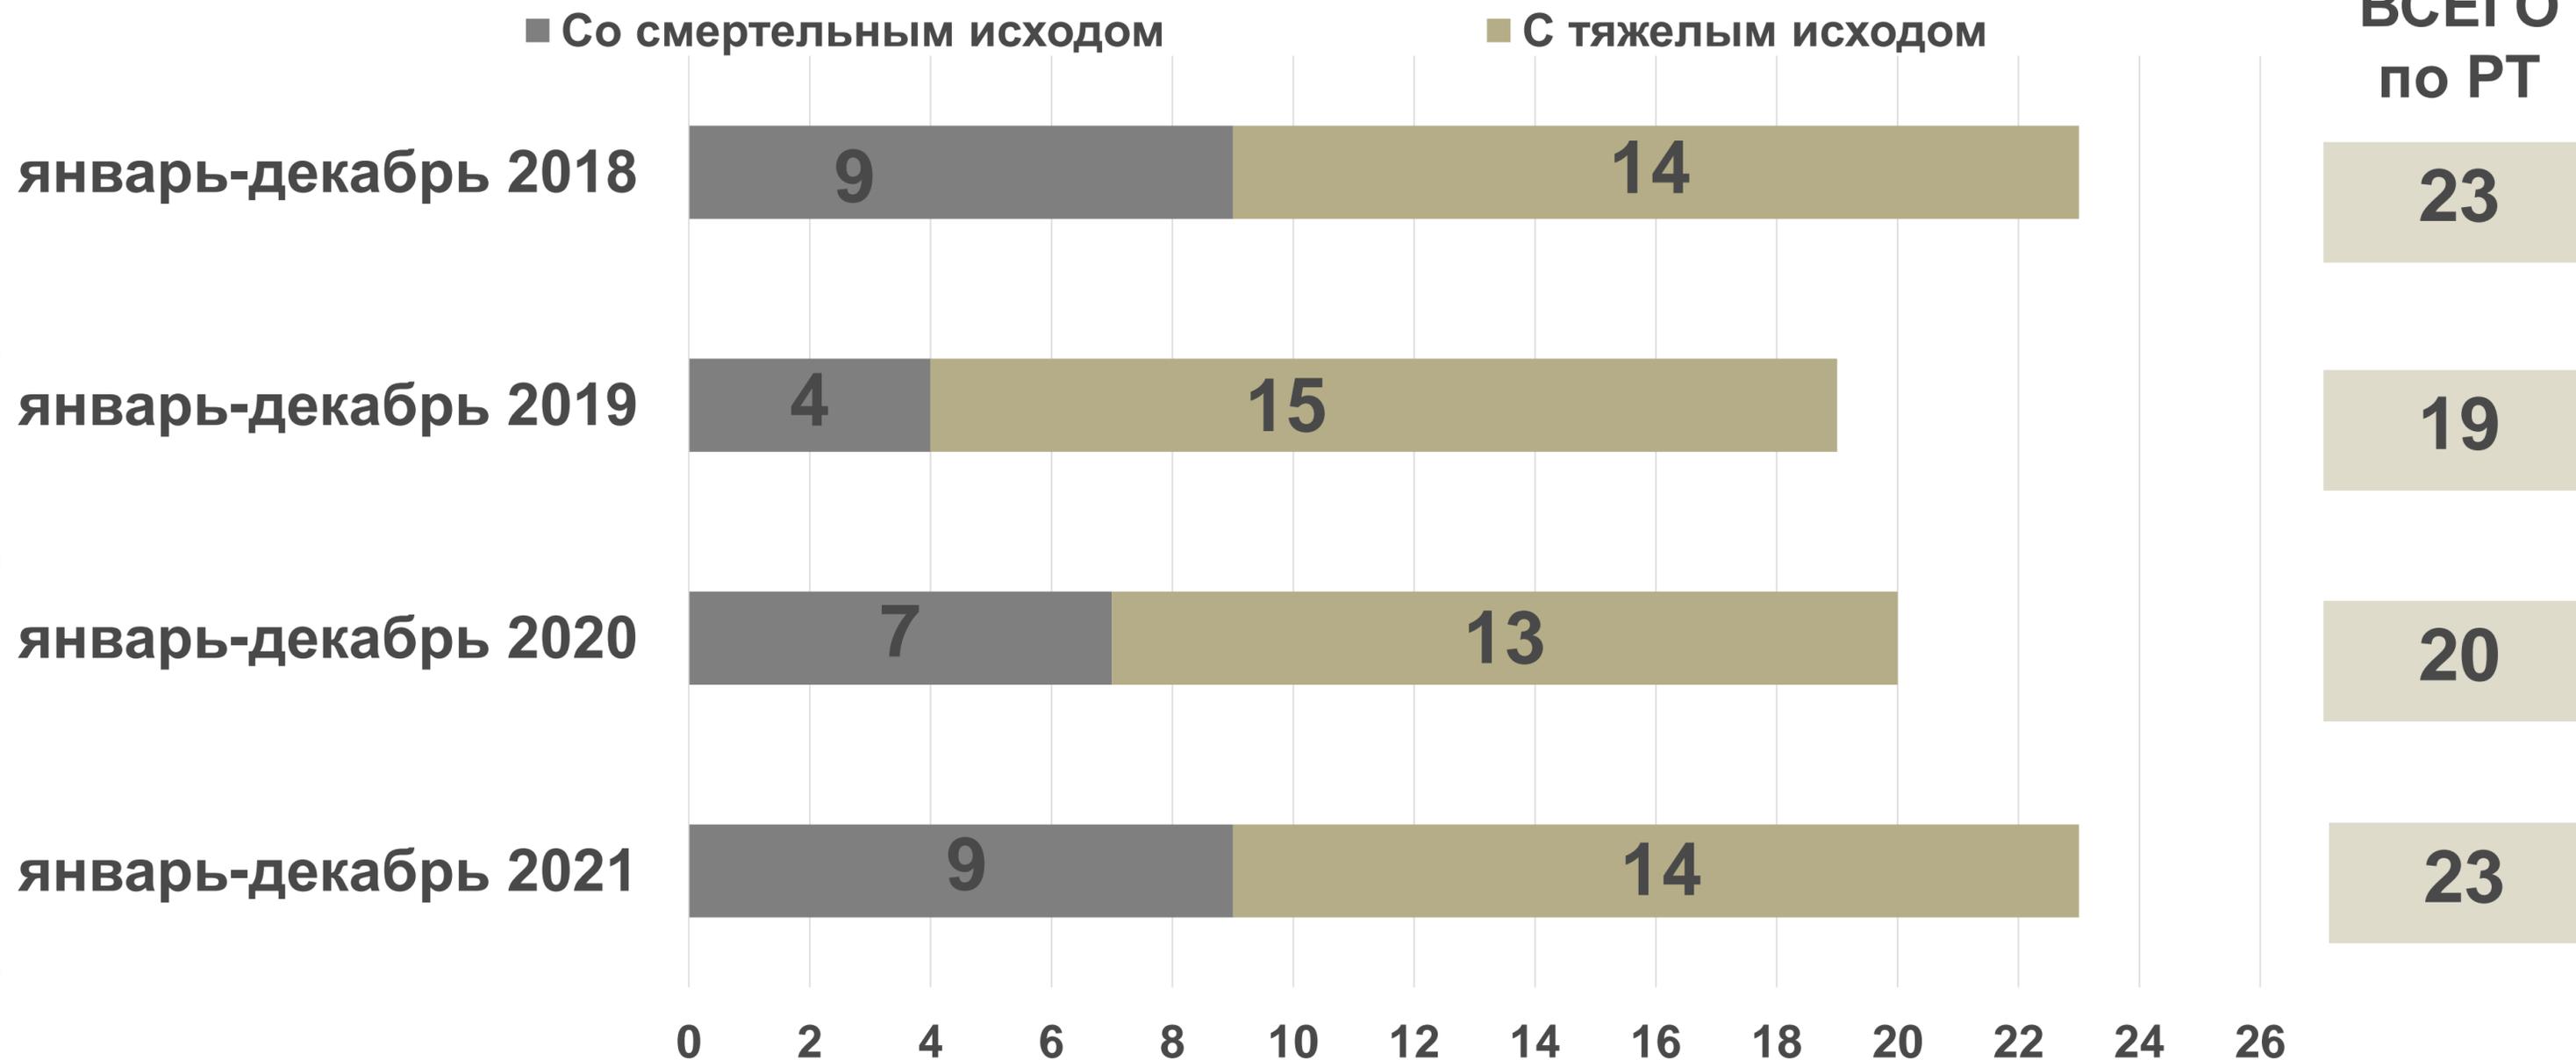

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	1 710	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	100	5 618,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	31	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	48	4 527,0
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	21	1 091,0

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	1 963
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 031
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	1 146
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	445
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	243
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	122
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	336

**КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РТ»**



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	597
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	1 071
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	1 045
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	307

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	140	340	314	92
2	г.Набережные Челны	38	38	38	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	6	2	2	100
7	Алексеевский	16	30	30	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	17	96	96	100
10	Апастовский	20	28	28	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	1	2	2	100
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	14	13	13	100
ВСЕГО по РТ		597	1 071	1 045	98

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	3	14	14	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	13	19	19	100
20	Елабужский	26	23	23	100
21	Заинский	4	20	20	100
22	Зеленодольский	15	36	36	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	6	11	11	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	22	49	49	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
ВСЕГО по РТ		597	1 071	1 045	98

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	38	23	23	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	9	8	8	100
35	Пестречинский	5	82	82	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	6	9	9	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	9	5	5	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	3	13	13	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
ВСЕГО по РТ		597	1 071	1 045	98



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
