




МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

12 февраля 2022 г.

Сегодняшний доклад посвящен программам жилищного строительства, обеспечения жильем отдельных категорий граждан, реализации национальных проектов и государственных программ.

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

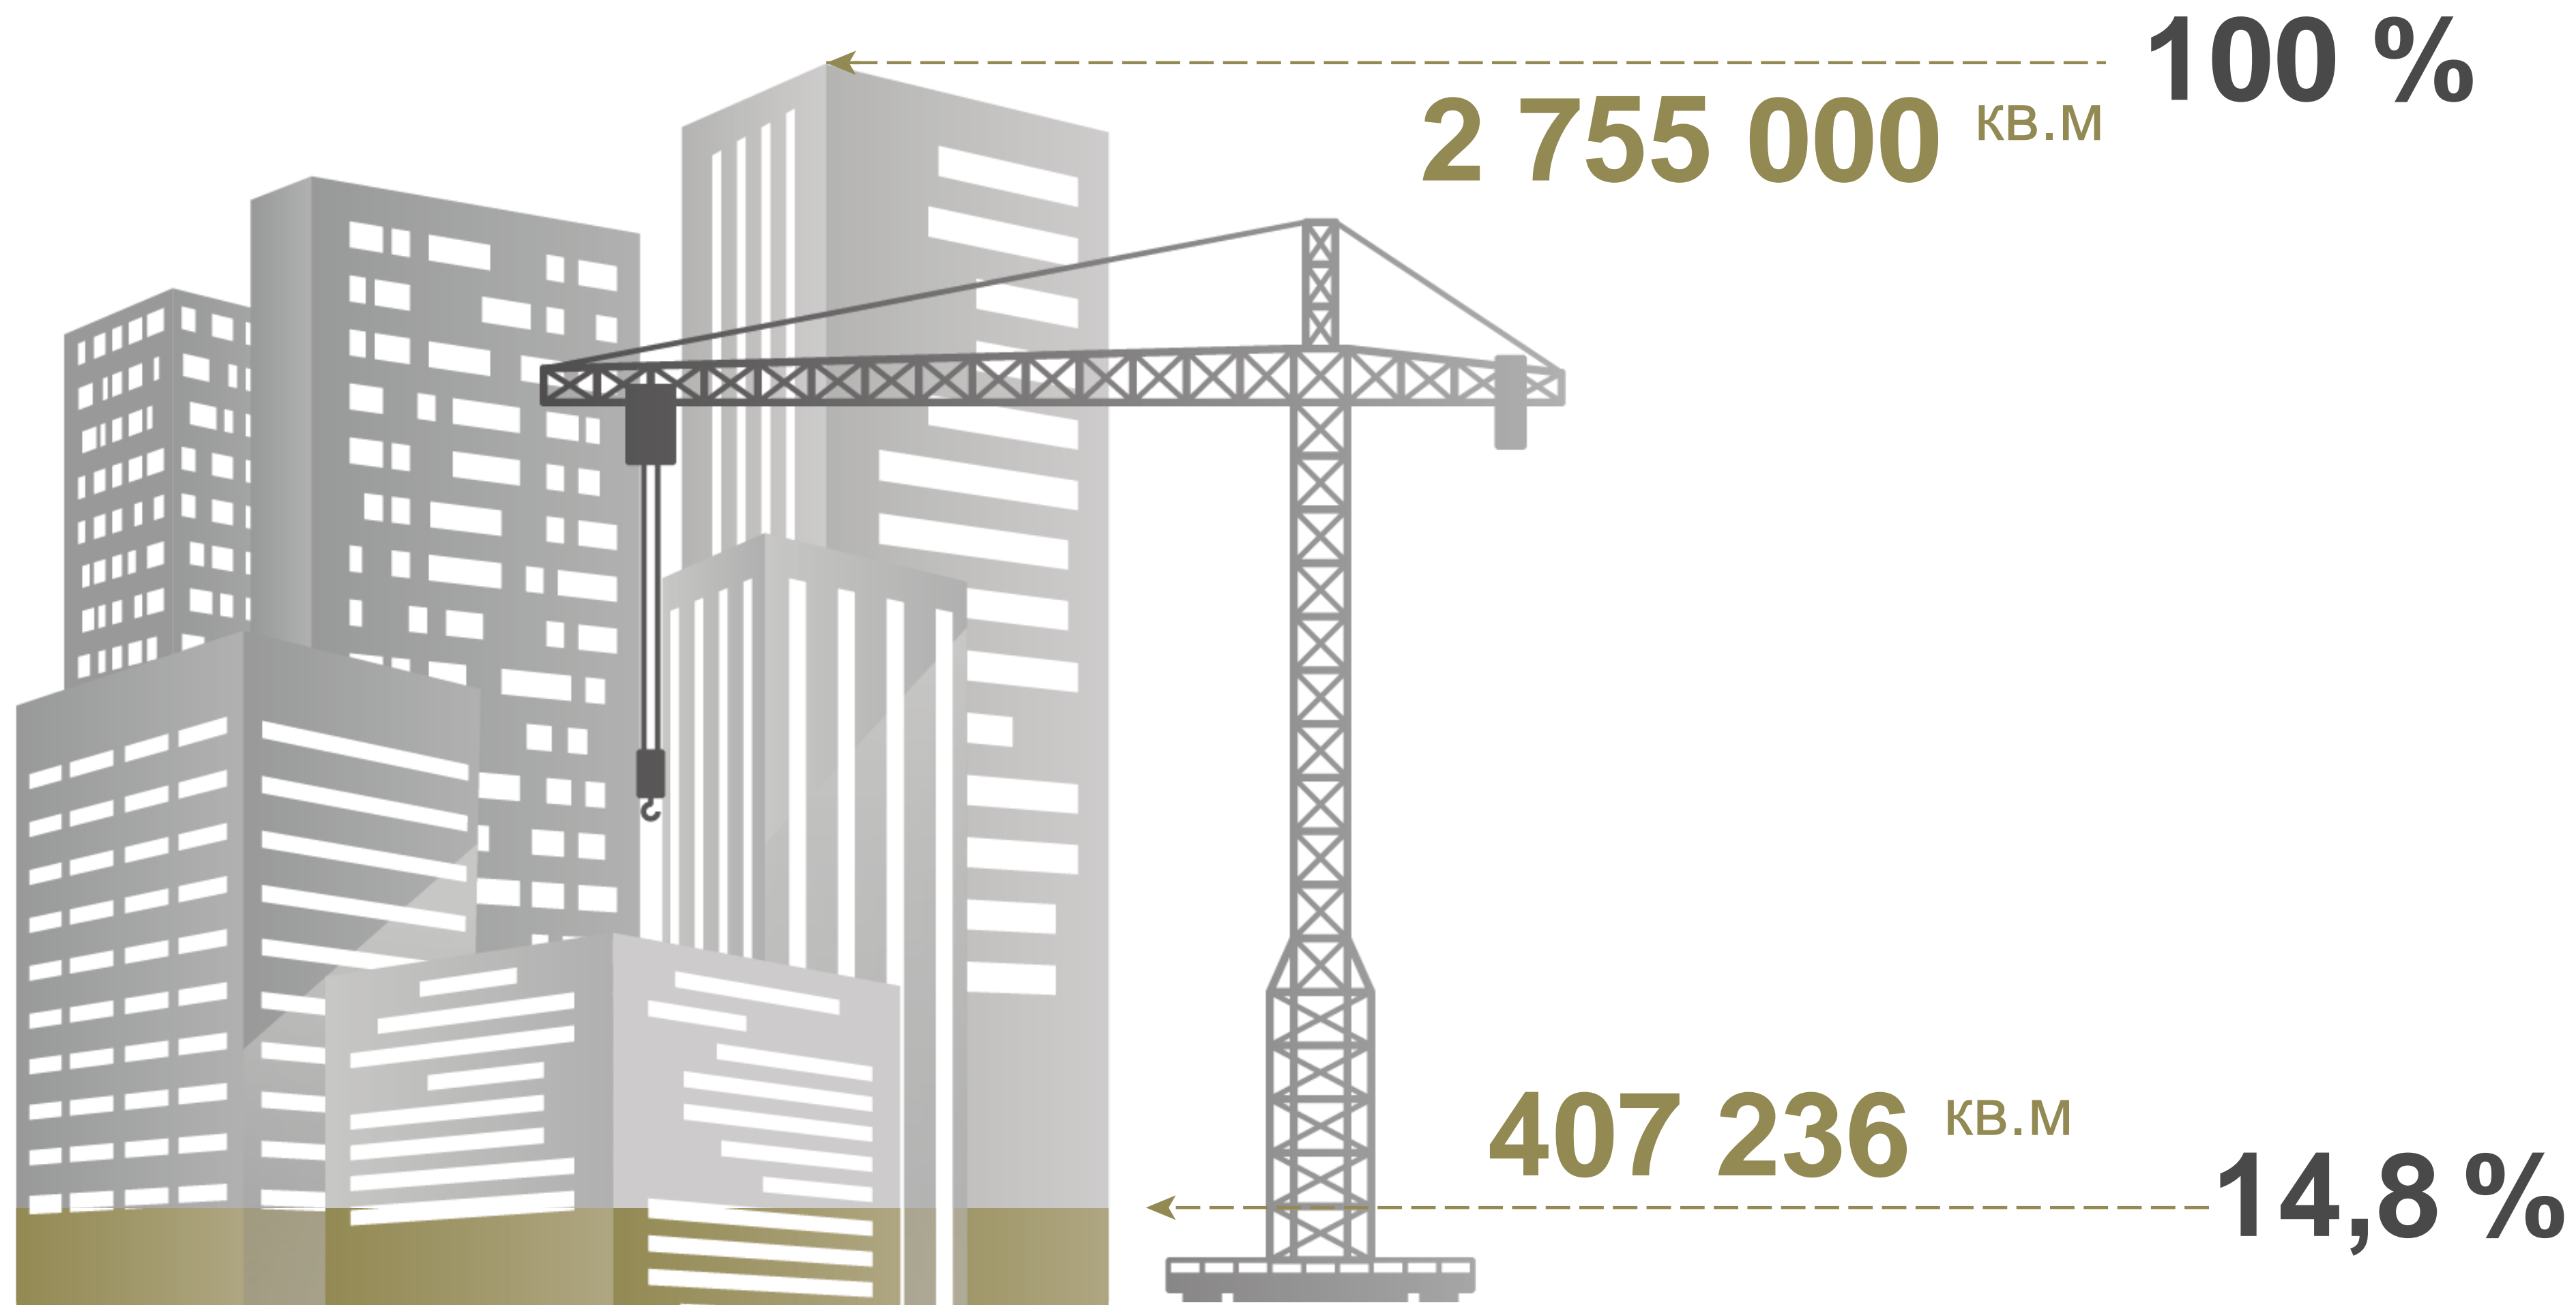

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Дрожжановский	7 000	0	0,0	7 000
2	Тетюшский	10 000	142	1,4	9 858
3	Аксубаевский	8 000	170	2,1	7 830
4	Мамадышский	20 000	485	2,4	19 515
5	Кайбицкий	5 000	126	2,5	4 874
6	Бугульминский	35 000	981	2,8	34 019
7	Апастовский	8 000	298	3,7	7 702
8	Агрызский	18 000	834	4,6	17 166
9	Буинский	16 000	755	4,7	15 245
10	Новошешминский	4 000	194	4,9	3 806
11	Спасский	5 000	246	4,9	4 754
12	Бавлинский	15 000	754	5,0	14 246
13	Актанышский	15 000	831	5,5	14 169
14	Рыбно-Слободский	15 000	834	5,6	14 166
15	Атнинский	4 000	228	5,7	3 772
ВСЕГО по РТ		2 755 000	407 236	14,8	2 347 764

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Ютазинский	13 000	798	6,1	12 202
17	Камско-Устьинский	5 000	321	6,4	4 679
18	Алексеевский	16 000	1 036	6,5	14 964
19	Заинский	22 000	1 440	6,5	20 560
20	Черемшанский	6 000	407	6,8	5 593
21	Менделеевский	13 000	933	7,2	12 067
22	Алькеевский	7 000	506	7,2	6 494
23	Арский	25 000	1 856	7,4	23 144
24	Балтасинский	15 000	1 256	8,4	13 744
25	г.Казань	956 000	86 578	9,1	869 422
26	Елабужский	60 000	5 510	9,2	54 490
27	Альметьевский	120 000	11 364	9,5	108 636
28	Кукморский	29 000	2 885	9,9	26 115
29	Азнакаевский	15 000	1 509	10,1	13 491
30	Чистопольский	20 000	2 665	13,3	17 335
ВСЕГО по РТ		2 755 000	407 236	14,8	2 347 764


ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Сармановский	10 000	1 344	13,4	8 656
32	Зеленодольский	100 000	15 245	15,2	84 755
33	Верхнеуслонский	35 000	5 431	15,5	29 569
34	Нурлатский	17 000	2 791	16,4	14 209
35	Нижнекамский	70 000	12 031	17,2	57 969
36	Муслюмовский	10 000	1 765	17,7	8 235
37	Мензелинский	14 000	2 518	18,0	11 482
38	Тукаевский	115 000	21 412	18,6	93 588
39	Сабинский	22 000	4 174	19,0	17 826
40	г.Набережные Челны	330 000	64 184	19,4	265 816
41	Лаишевский	180 000	41 907	23,3	138 093
42	Высокогорский	120 000	29 910	24,9	90 090
43	Пестречинский	205 000	66 239	32,3	138 761
44	Тюлячинский	5 000	1 912	38,2	3 088
45	Лениногорский	15 000	10 431	69,5	4 569
ВСЕГО по РТ		2 755 000	407 236	14,8	2 347 764

ПРОГРАММА ГЖФ РТ

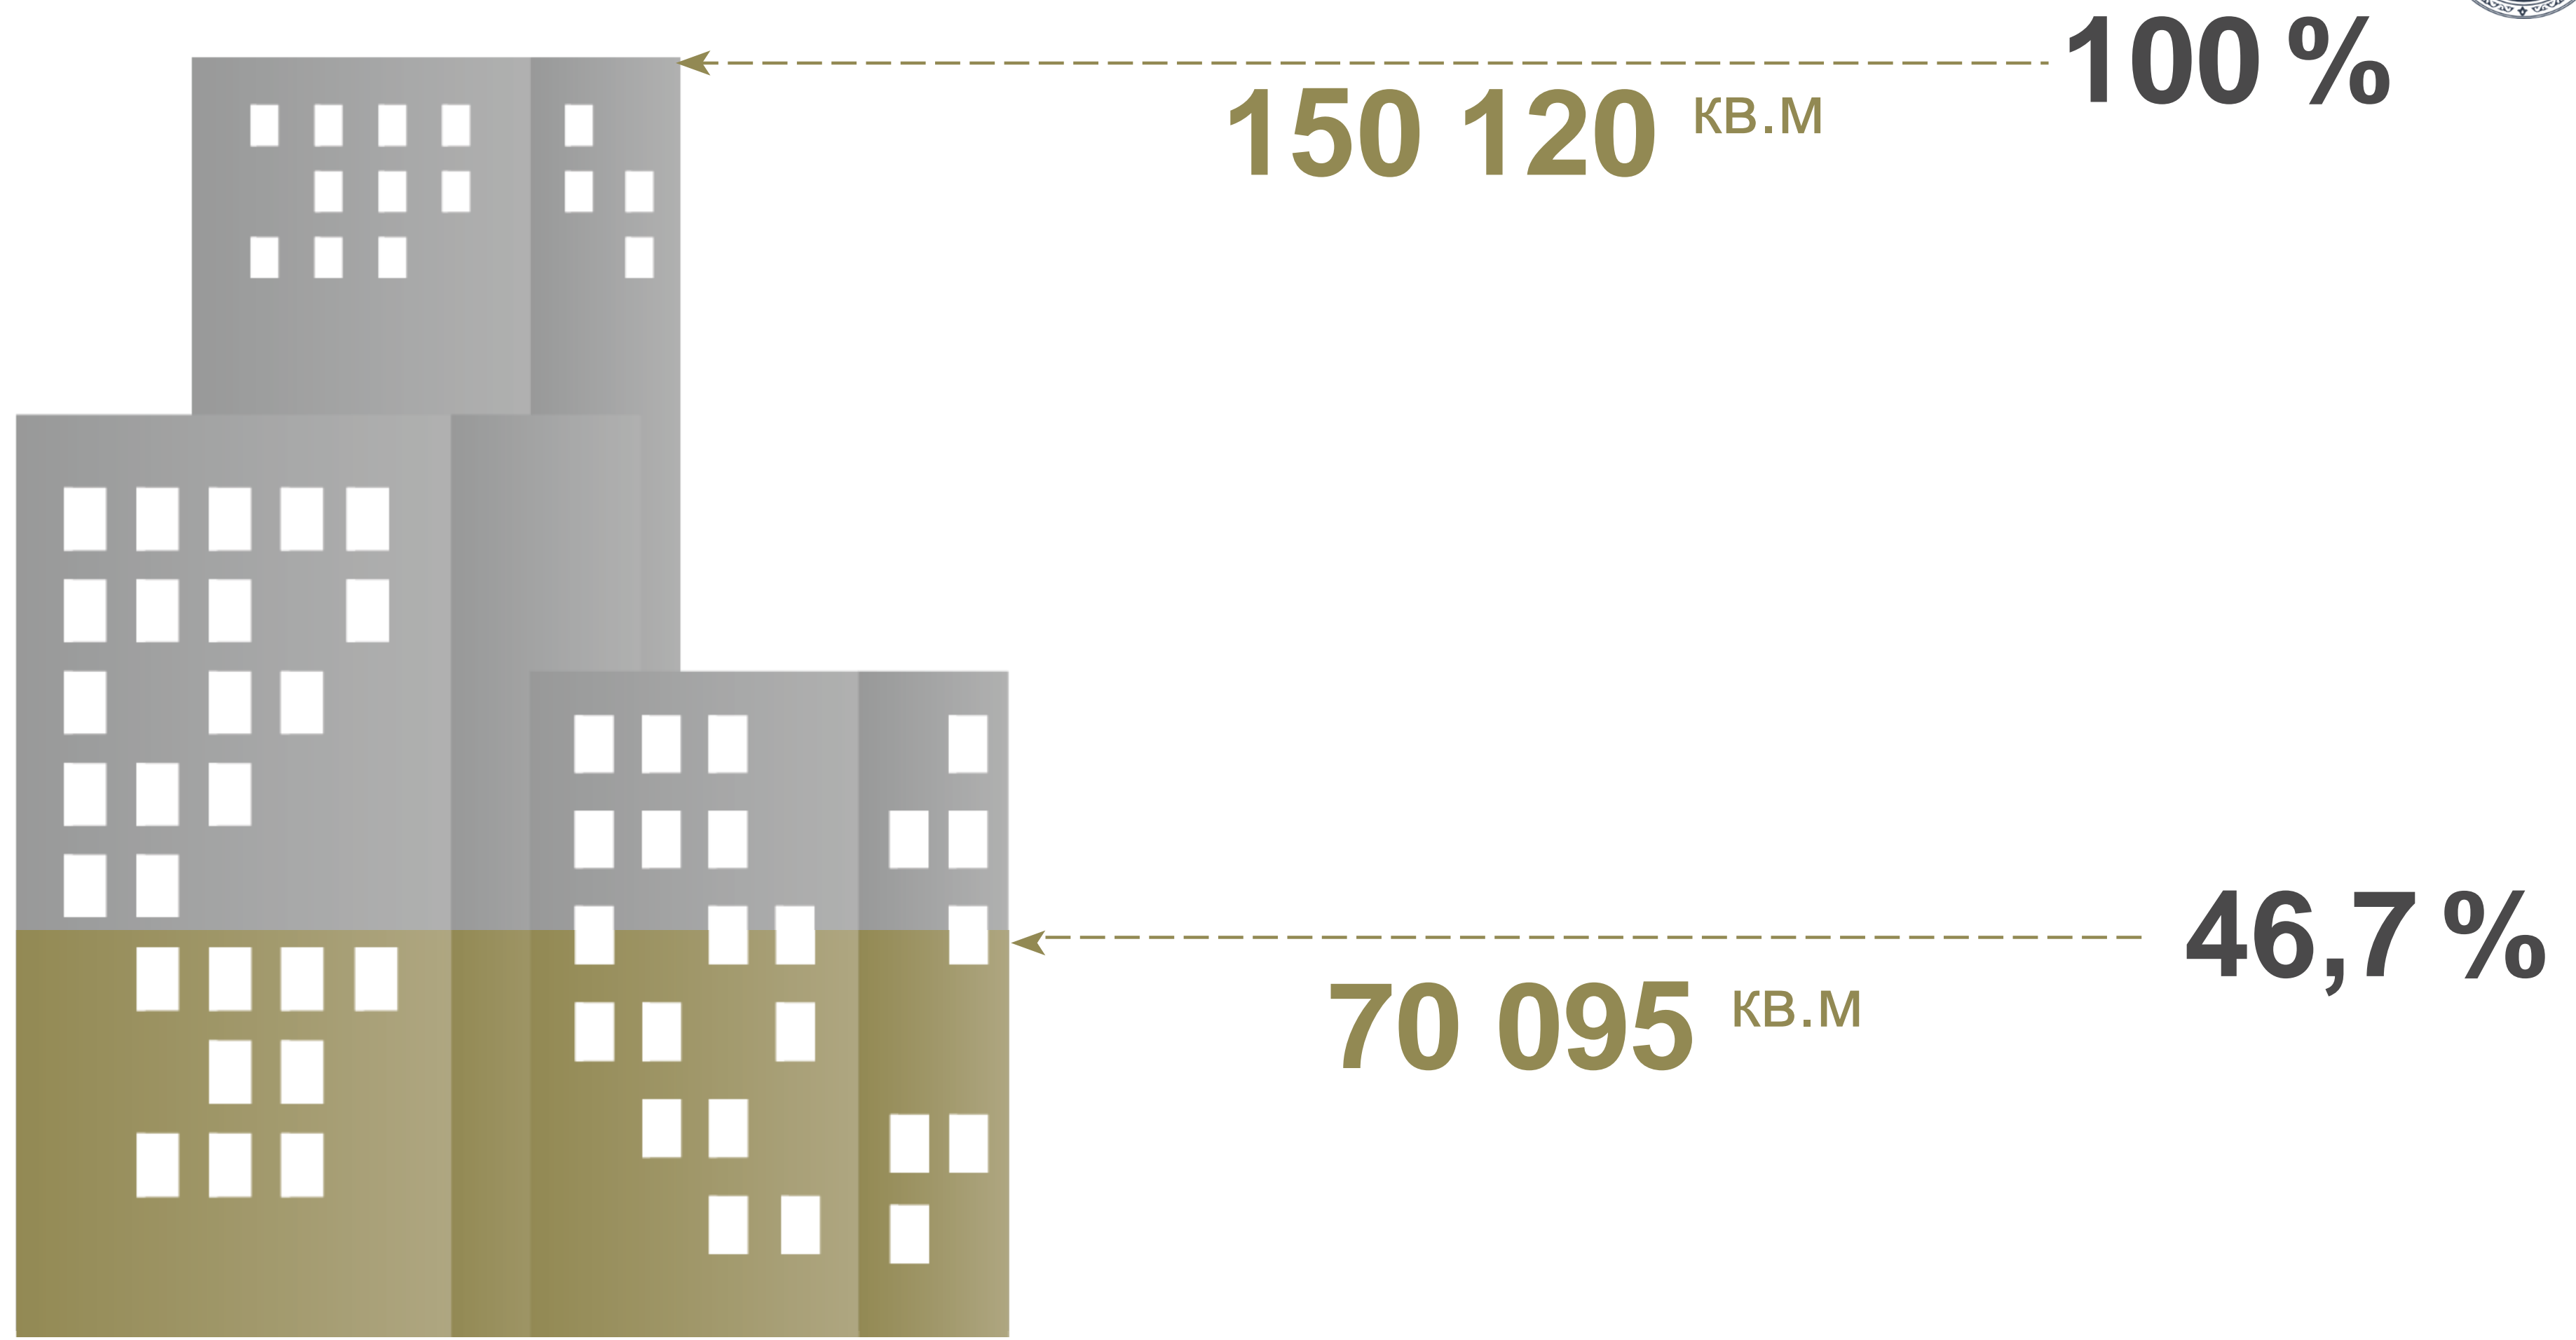

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за неделю		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	56	14	0	42	24	11	7
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	2 743	1 271	0	1 472	1 392	50	30
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	150,12	70,1	0	80,02	75,52	2,8	1,7

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1 681,3 ТЫС.КВ.М

100 %


12 454 дома

228,7 ТЫС.КВ.М

13,6 %

1 694 дома

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ

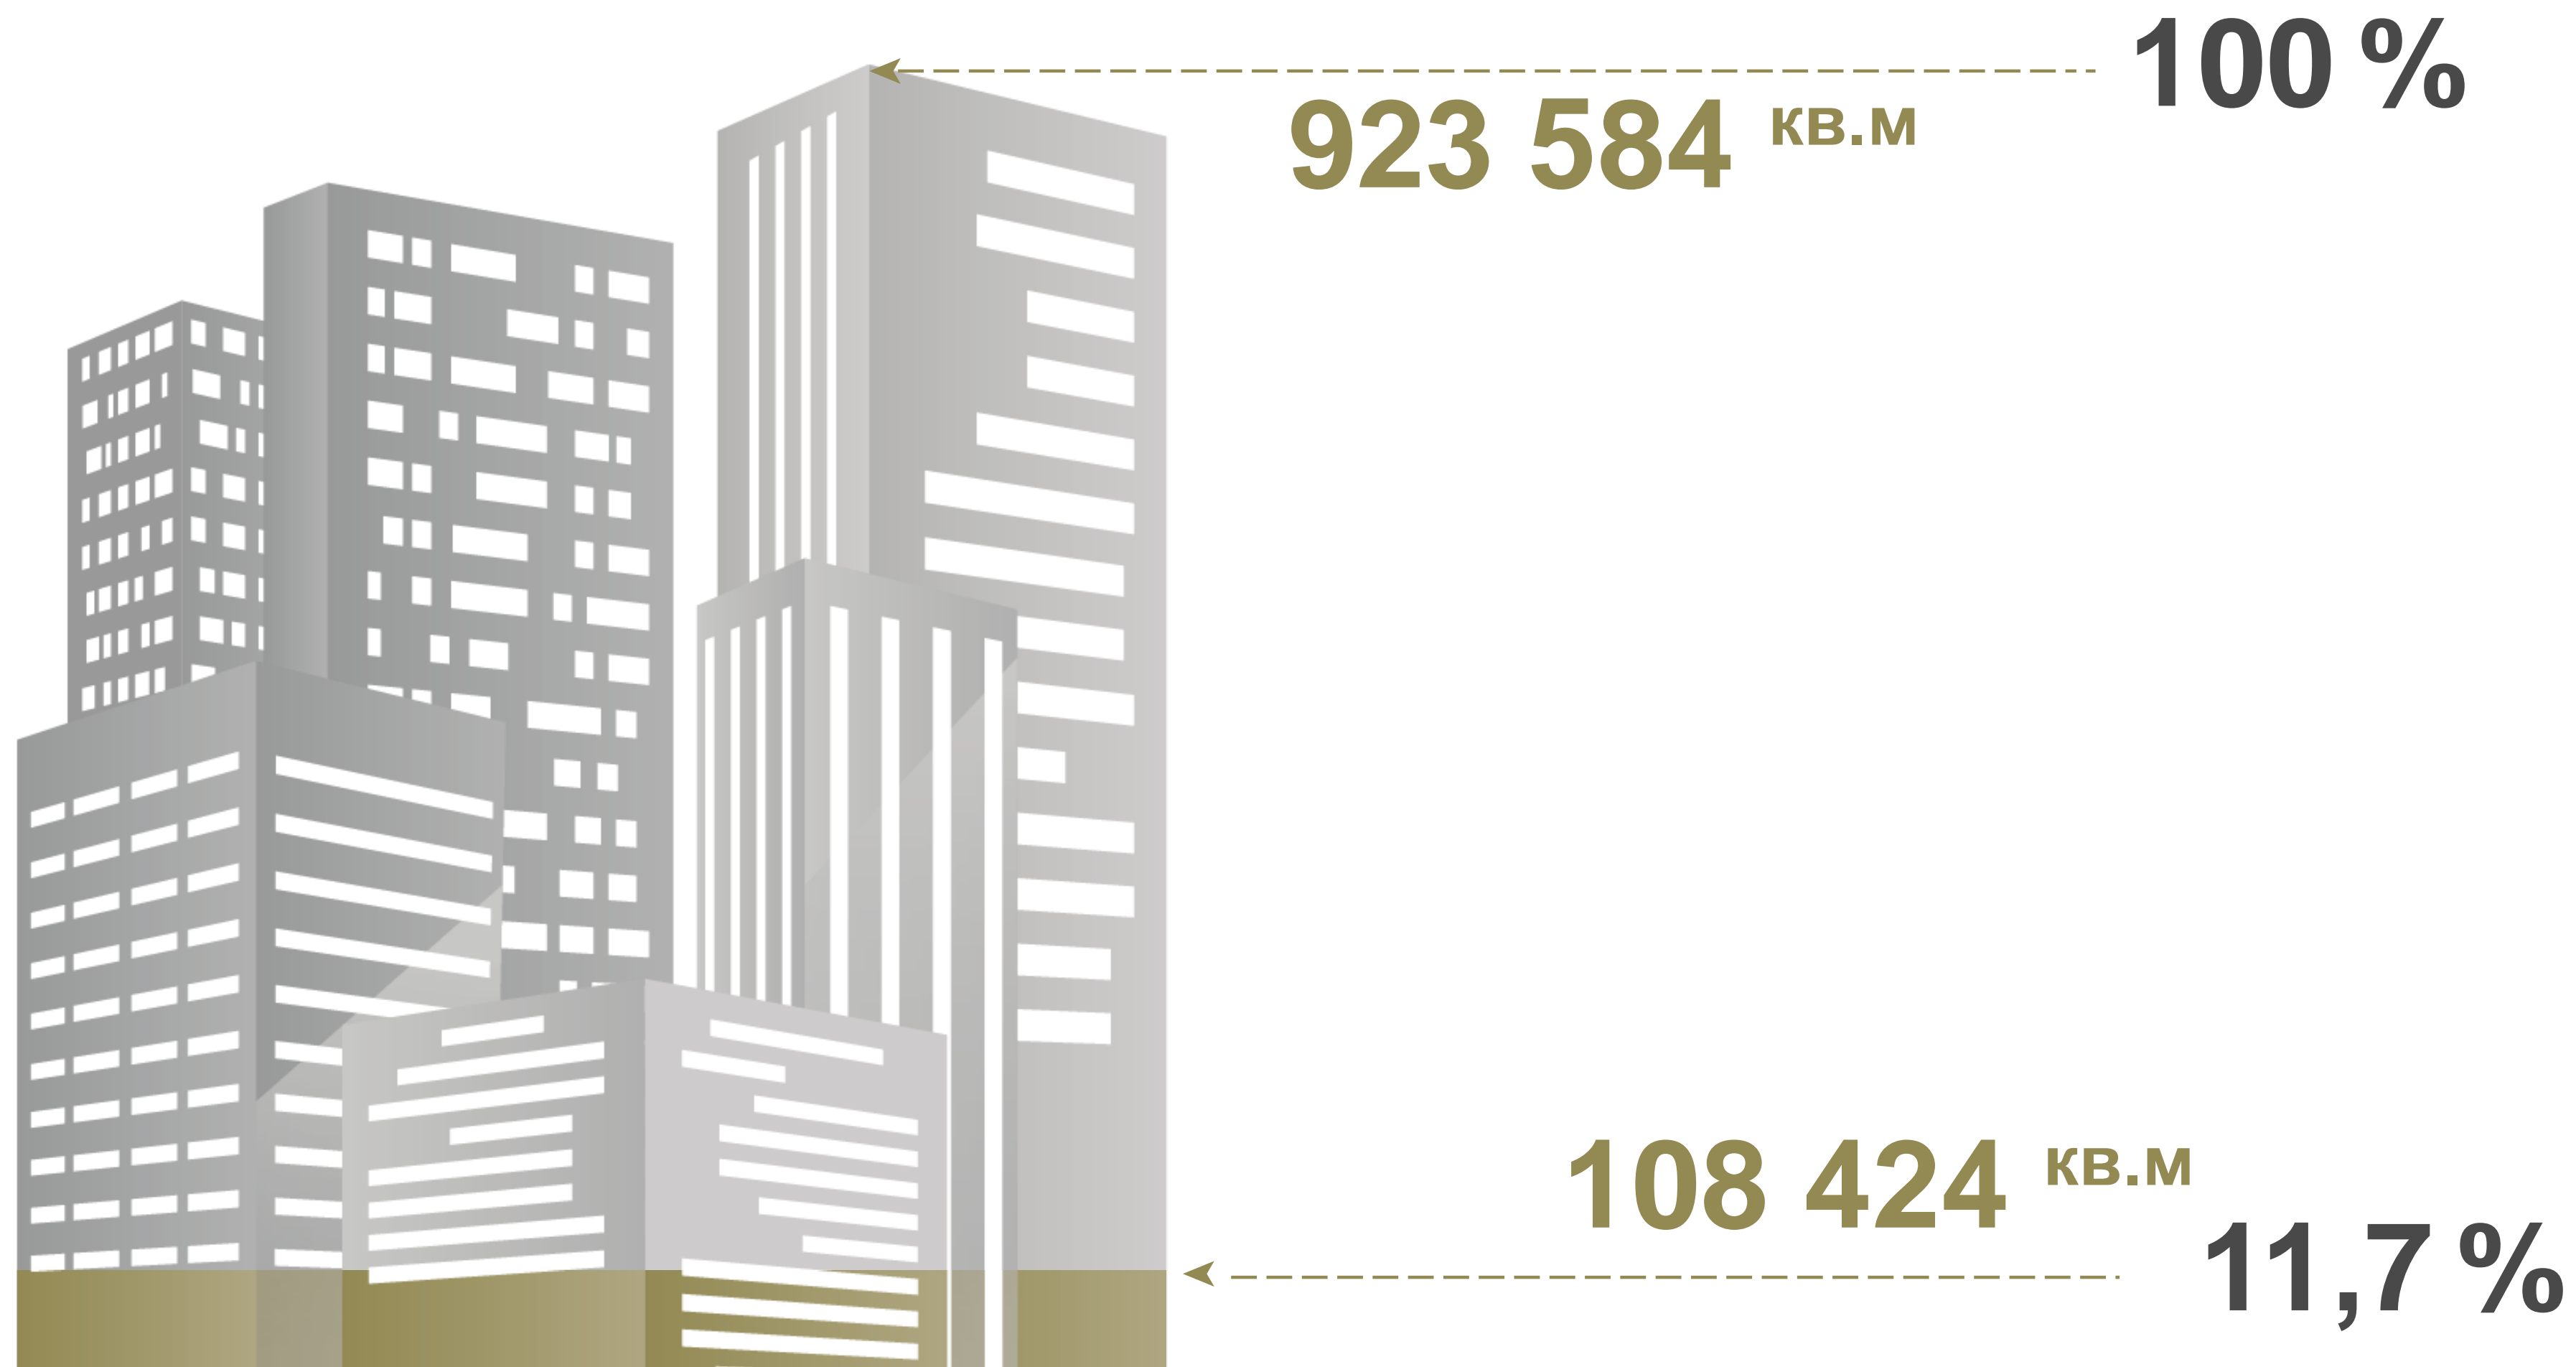

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ		
			ВЫСОКАЯ (70-100%)	СРЕДНЯЯ (30-70%)	НИЗКАЯ (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Алексеевский	2	-	1	1
3	Альметьевский	3	1	2	-
4	Арский	3	-	-	3
5	Буинский	6	2	3	1
6	Верхнеуслонский	8	3	4	1
7	Высокогорский	13	-	-	13
8	Елабужский	3	1	-	2
9	Зеленодольский	4	2	1	1
10	Кукморский	1	-	-	1
11	Лаишевский	1	-	1	-
12	Лениногорский	1	-	-	1
13	Нижнекамский	4	-	-	4
14	Нурлатский	1	1	-	-
15	Пестречинский	14	7	7	-
16	Ютазинский	1	-	-	1
17	г.Набережные Челны	23	16	7	-
18	г.Казань	30	13	11	6
ВСЕГО ПО РТ		119	47	37	35

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ НА 2022 ГОД

	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	600	959,64	56,08	903,56
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	22	229,18	-	229,18
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	50	67,79	17,79	50,00

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	5	26,18	26,18	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	20,83	20,83	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	2,91	2,91	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	2,44	2,44	-
ИТОГО:	677	1 282,79	100,05	1 182,74

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ
1	Альметьевский	2
2	Арский	1
3	Балтасинский	4
4	Высокогорский	1
5	Елабужский	1
6	Кукморский	1
7	Лаишевский	1
8	Лениногорский	1
9	Мамадышский	1
10	Мензелинский	1
11	Нижнекамский	1
12	Рыбно-Слободский	1
13	Тукаевский	1
14	г.Казань	3
15	г.Набережные Челны	2
ИТОГО ПО РТ:		22

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	Кол-во семей
1	Азнакаевский	2
2	Алексеевский	1
3	Апастовский	1
4	Арский	2
5	Бавлинский	3
6	Балтасинский	2
7	Бугульминский	1
8	Буинский	1
9	Высокогорский	1
10	Дрожжановский	1
11	Елабужский	1
12	Зеленодольский	3

№	МО РТ	Кол-во семей
13	Мамадышский	1
14	Нижнекамский	3
15	Нурлатский	1
16	Пестречинский	1
17	Сабинский	2
18	Черемшанский	1
19	Чистопольский	1
20	Ютазинский	1
21	г.Набережные Челны	6
22	г.Казань	14
ИТОГО ПО РТ:		50

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

№	МО РТ	Количество получателей
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	3
1.1	Азнакаевский	1
1.2	Кукморский	1
1.3	Пестречинский	1
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1
2.1	г.Казань	1
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1
3.1	г.Казань	1
ВСЕГО ПО РТ		5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	г.Казань	Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	Контракт в феврале 2022г.
2	Пестречинский	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево", с увеличением производительности от 2500 куб.м/сут до 4000 куб.м/сут	140 804,81	
3	г. Набережные Челны	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе "Замелекесье"(продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	
ИТОГО:			208 420,49	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Азнакаевский	Набережная р.Черной, 2 очередь	32 081,89	Контракт в марте 2022г.
2	Аксубаевский	Сквер по ул.Мазилина, 4 очередь	14 951,50	
3	Актанышский	Благоустройство набережной оз.Иске Идель, 1 очередь	27 094,79	
4	Альметьевский	Бульвар по ул.Ризы Фахретдина, 2 очередь	56 588,51	
5	Альметьевский	Внутриквартальный бульвар мкр.Западные Ворота, 2 очередь	56 588,51	
6	Арский	Площадь Советская и ул.Большая, 5 очередь	20 000,00	
7	Бугульминский	Благоустройство прилегающей территории по ул.М.Джалиля к центральному водоему, 2 очередь	55 021,37	
8	Буинский	Центральная площадь, 3 очередь	72 160,80	
9	Елабужский	Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул.Марджани, 2 очередь	41 930,96	
10	г.Казань	Парк у жилого комплекса «Салават Купере», 2 очередь	500 539,14	
11	Кукморский	Набережная р.Нурминки, 3 очередь	78 000,00	
12	Лениногорский	Парк «Мэхэббэт», 2 очередь	43 628,30	
13	Мамдышский	Набережная р.Вятки, 3 очередь	22 380,49	
ИТОГО:			1 444 050,99	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
14	Менделеевский	Бульвар Интернационалистов, 2 очередь	16 134,20	Контракт в марте 2022г.
15	Мензелинский	Парк им.В.И.Ленина, 2 очередь	14 869,39	
16	Муслюмовский	Парк Спортивный, 2 очередь	10 384,92	
17	г.Набережные Челны	Парк «Прибрежный», 1 очередь	155 214,42	
18	Нижнекамский	Экстрим-парк, 2 очередь	48 000,00	
19	Нижнекамский	Школьный бульвар, 2 очередь	20 000,00	
20	Нурлатский	Парк «Кондурча», 2 очередь	29 589,79	
21	Пестречинский	Детский городок, 2 очередь	26 787,74	
22	Сабинский	Парк по ул.З.Юсупова, 3 очередь	16 644,80	
23	Сармановский	Сквер «100-летия ТАССР», 2 очередь	18 413,68	
24	Тетюшский	«320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 2 очередь	11 451,80	
25	Тюлячинский	Пруд в с.Баландыш, 2 очередь	5 000,00	
26	Черемшанский	Улица Советская, 2 очередь	9 979,27	
27	Чистопольский	Центральная площадь, 2 очередь	40 614,73	
ИТОГО:			1 444 050,99	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Агрызский	Благоустройство улицы Карла Маркса, г.Агрыз	50 000,00	Контракт в марте 2022г.
2	Алексеевский	Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", г.Билярск	56 250,00	
3	Арский	Татарские предания-в город старой дороги	70 000,00	
4	Бавлинский	Благоустройство общественных пространств 27 микрорайона г.Бавлы	70 000,00	
5	Кукморский	Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц	50 000,00	
6	Чистопольский	Городская набережная реки Кама "Наречье", г.Чистополь	80 000,00	
ИТОГО:			376 250,00	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Нурлатский	Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом	279 081,36	Контракт в феврале 2022г.
ИТОГО:			279 081,36	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»



ЭТАП	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
	ПЛАНИРУЕТСЯ РАССЕЛИТЬ	АВАРИЙНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М.
Этап 2021-2022			
План в 2022 г.	78	21	826,83
Этап 2022-2023			
План в 2022 г.	462	185	7 643,77
ИТОГО:	540	206	8 470,6

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЗУ	ЗУ ПЕРЕДАНЫ	ЗУ НЕ ПЕРЕДАНЫ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Чистопольский	183	132	51	0
2	Зеленодольский	190	146	44	2
3	Кукморский	53	48	5	0
4	г.Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	75	1	0
ВСЕГО ПО РТ:		1 102	998	104	2

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	г.Казань	3
4	Кукморский	1
ВСЕГО ПО РТ:		71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



ПЕРЕДАЧА ЗУ БЕЗ ЗАМЕНЫ

№	МО РТ	МКД не снесены	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский		6	12	8	26
2	Кукморский	2			2	4
3	Чистопольский		2			2
4	Высокогорский				1	1
ВСЕГО ПО РТ:		2	8	12	11	33

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Рекультивация иловых полей БОС г.Казани	3 300 814,69	Контракт в март-апрель 2022г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОС г.Казани	1 855 062,22	27,36	0,28



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, ТЫС. РУБ.	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Рекультивация Самосыровского полигона г. Казани	200 000,00	34,07	0,02



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Тукаевский	Строительство общеобразовательной организации на 100 мест	63 016,00	Контракт в марте 2022г.
ИТОГО:			63 016,00	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Апастовский	МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	1 639,14	Контракт в марте 2022г.
2	Бавлинский	МБОУ «Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа»	1 275,06	Контракт в марте 2022г.
ИТОГО:			2 914,20	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Азнакаевский	Сухояшевский ФАП ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница"	6 766,74	Контракт в феврале-марте 2022г.
2	Актанышский	Актанышбашский ФАП ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница"	6 766,74	
3	Алексеевский	Краснобаранский ФАП ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница"	6 766,74	
4	Альметьевский	Строительство центра ВОП и педиатра	49 920,65	
5	Альметьевский	Молодежный ФАП ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	8 190,36	
6	Апастовский	Чуру-Барышевский ФАП ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница"	6 766,74	
7	Арский	Урнякский ФАП ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	8 190,36	
8	Бавлинский	Потапово-Тумбарлинский ФАП ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница"	6 766,74	
9	Балтасинский	Бурнакский ФАП ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница"	6 766,74	
10	Бугульминский	Прогрессский ФАП ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	6 766,74	
11	Верхнеуслонский	Октябрьский ФАП ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница"	6 766,74	
12	Высокогорский	Дачный ФАП ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница"	6 766,74	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
13	Заинский	Новоспасский ФАП ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"	6 766,74	Контракт в феврале-марте 2022г.
14	Зеленодольский	Многопрофильная поликлиника ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	227 639,86	
15	Зеленодольский	Больше-Ходяшевский ФАП ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	6 766,74	
16	г.Казань	Филиал детской поликлиники ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	382 759,74	
17	Кайбицкий	Чутеевский ФАП ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"	6 766,74	
18	Камско-Устьинский	Азимово-Курлибашский ФАП ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная больница"	6 766,74	
19	Лениногорский	Старо-Кувакская ВА ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	26 302,83	
20	Лениногорский	Тимяшевский ФАП ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	8 190,36	
21	Мамадышский	Нижнесуньский ФАП ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница"	6 766,74	
22	Мензелинский	Юртовский ФАП ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница"	6 766,74	
23	г.Набережные Челны	Залесный ФАП ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	8 190,36	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
СТРОИТЕЛЬСТВО					
24	Нижнекамский	Верхне-Уральский ФАП ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"	8 190,36	Контракт в феврале-марте 2022г.	
25	Новошешминский	Слобода-Екатерининский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 766,74		
26	Новошешминский	Красно-Октябрьский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 766,74		
27	Нурлатский	Ново-Иглайкинский ФАП ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница"	6 766,74		
28	Пестречинский	Врачебная амбулатория ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница"	204 538,87		
29	Рыбно-Слободский	Бердибяковский ФАП ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница"	6 766,74		
30	Сабинский	Юлбатский ФАП ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"	6 766,74		
31	Сармановский	Сарайлинский ФАП ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница"	5 031,64		
32	Тукаевский	Мусабай-Заводский ФАП ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница"	8 190,36		
33	Тюлячинский	Аланский ФАП ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница"	6 766,74		
34	Чистопольский	Нижне-Кондратинский ФАП ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница"	6 766,74		
ИТОГО:			1 341 157,02		

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
35	Аксубаевский	ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница", поликлиника	30 298,61	Контракт в феврале-марте 2022г.
36	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", поликлиника	15 042,14	
37	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", клиничко-диагностическая поликлиника	10 465,90	
38	Верхнеуслонский	ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница", поликлиника	11 300,23	
39	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", поликлиника	300,00	
40	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", женская консультация	5 162,10	
41	Зеленодольский	ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница", поликлиника №1	14 000,28	
42	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", поликлиника	466,80	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
43	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", женская консультация, с.Б.Кайбицы	911,69	Контракт в феврале-марте 2022г.
44	Кукморский	ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница", поликлиника, г. Кукмор	12 445,56	
45	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", здание поликлиники медико-санитарной части, г.Лениногорск	20 170,28	
46	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", гериатрическое отделение, с. Шугурово	51 015,00	
47	Мамадышский	ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница", поликлиника, г.Мамадыш	23 181,95	
48	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", поликлиника, с.Тюлячи	45 430,83	
49	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", детская поликлиника, с.Тюлячи	6 761,63	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Арский	Строительство сельского дома культуры в с.Штырь	12385,66	Контракты в феврале 2022г.
2	Бавлинский	Строительство сельского дома культуры в д.Уба	12385,66	Контракты в феврале 2022г.
3	Дрожжановский	Строительство многофункционального центра в д. Старая Задоровка	12385,66	Контракты в феврале 2022г.
4	Зеленодольский	Строительство сельского дома культуры в п.Октябрьский	34693,86	Контракты в феврале 2022г.
5	Мамадышский	Строительство культурно-досугового центра с.Катмыш	34693,86	Контракты в феврале 2022г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ				
6	Арский	Здание муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Арская детская школа искусств»	19 919,00	Контракты в феврале 2022г.
7	Нижнекамский	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя	352 969,60	Контракт в марте 2022г.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
8	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Байлангар	35 000,00	Контракты в феврале 2022г.
9	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Ядыгерь	35 000,00	Контракты в феврале 2022г.
10	Лаишевский	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина»	29 697,14	Контракты в феврале 2022г.
ИТОГО:			579 130,44	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	г.Казань	Дошкольная образовательная организация на 220 мест	71 986,30	Контракт в феврале 2022г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Верхнеуслонский	Благоустройство территории вблизи объекта "Тюбетей тауер"	243 113,10	Контракт в феврале 2022г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Агрызский	МБОУ «СОШ № 2» г.Агрыз	69 998,17	Контракт в марте 2022г.
2	Агрызский	МБОУ «СОШ № 3 имени Тази Гиззата» г.Агрыз	22 203,83	
3	Агрызский	МБОУ «Кучуковская СОШ» с.Нижнее Кучуково	32 838,67	
4	Алексеевский	МБОУ «Ялкынская основная общеобразовательная школа» д.Ялкын	77 388,00	
5	Алексеевский	МБОУ «Реченская основная общеобразовательная школа», с.Речное	64 111,17	
6	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 21 - образовательный центр «Дай 5» г.Альметьевск	35 062,67	
7	Альметьевский	МАОУ «СОШ № 17» г.Альметьевск	40 166,83	
8	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 12» г.Альметьевск	35 318,33	
9	Альметьевский	МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Альметьевск	39 379,17	
10	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 1 им.М.К.Тагирова» г.Альметьевск	35 273,83	
11	Альметьевский	МБОУ «Кульшариповская СОШ» с.Кульшарипово	35 288,00	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
12	Альметьевский	МАОУ «Лицей № 2» г.Альметьевск	59 757,33	Контракт в марте 2022г.
13	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 3» г.Альметьевск	35 025,00	
14	Альметьевский	МБОУ «Калейкинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» с.Калейкино	83 470,83	
15	Альметьевский	МБОУ «Старомихайловская СОШ» д.Ирекле	33 218,00	
16	Альметьевский	МБОУ «Кичуйская СОШ» с.Кичуй	31 708,33	
17	Альметьевский	МБОУ «Миннибаевская СОШ» с.Миннибаево	39 623,33	
18	Альметьевский	МБОУ «Маметьевская ООШ» с.Маметьево	28 378,00	
19	Альметьевский	МБОУ «Урсалинская ООШ» г.Альметьевск	35 344,17	
20	Апастовский	МБОУ «Среднебалтаевская ООШ имени Героя Советского Союза Абзалова Рема Абзаловича» с.Среднее Балтаево	49 608,00	
21	Апастовский	МБОУ «Сатламышевская ООШ» с.Сатламышево	45 152,67	
22	Апастовский	МБОУ «Староюмралинская СОШ» с.Старый Юмралы	64 288,83	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
23	Апастовский	МБОУ «Деушевская ООШ» с.Деушево, ул.Просвещения, д.5	48 424,50	Контракт в марте 2022г.	
24	Апастовский	МБОУ «Чуру-Барышевская ООШ» с.Чуру-Барышево, ул.Гагарина, д.4	78 629,00		
25	Дрожжановский	МБОУ «Марсовская СОШ» с.Нижний Каракитан, ул.Школьная, д.1	32 930,33		
26	Дрожжановский	МБОУ «Староишлинская СОШ» д.Старые Ишли, ул.Центральная, д.16	41 736,67		
27	Зеленодольский	МБОУ «Гимназия № 5» г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.60	127 875,17		
28	Зеленодольский	МБОУ «Васильевская СОШ № 2 имени Героя Советского Николая Соболева» пгт.Васильево, ул.Праздничная, д.9	124 660,83		
29	г.Казань	МАОУ «Лицей № 131» г.Казань, ул.Бутлерова, д.54	32 457,17		
30	г.Казань	МБОУ «Школа № 173» г.Казань, ул.Мира, д.2А	101 205,33		
31	г.Казань	МБОУ «Гимназия № 18» г.Казань, ул.Кул Гали, д.13	77 249,67		
32	Кайбицкий	МБОУ «Старотябердинская СОШ имени М.К.Кузьмина» с.Старое Тябердино, ул.Советская, д.27	64 137,50		
33	Кукморский	МБОУ «Кукморская средняя школа № 3» пгт.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.40	61 122,67		
ИТОГО:			3 798 036,67		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
34	Кукморский	МБОУ «Нырбинская средняя школа» с.Нырья	110 314,17	Контракт в марте 2022г.	
35	Лаишевский	МБОУ «Кирбинская СОШ»	72 288,67		
36	Мамадышский	МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» с.Дюсьметьево	57 074,83		
37	Мамадышский	МБОУ «Кемеш-Кульская ООШ» с.Кемеш-Куль	57 074,83		
38	Мамадышский	МБОУ «Кляушка СОШ» с.Кляуш	66 248,67		
39	Мензелинский	МБОУ «Верхнетакерменская ООШ имени Габделхая Сабитова» с.Верхний Такермен	33 382,17		
40	Мензелинский	МБОУ «Николаевская ООШ» с.Николаевка	51 693,33		
41	Мензелинский	МБОУ «Екатерининская ООШ» с.Николаевка	38 304,50		
42	Муслюмовский	МБОУ «Салауз-Муханская ООШ» д.Салауз-Мухан	28 977,00		
43	Нижнекамский	МАУО «Надежда» г.Нижнекамск	77 737,67		
44	Нижнекамский	МАУО «Надежда» г.Нижнекамск	69 751,83		
ИТОГО:			3 798 036,67		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
45	Нижнекамский	МБОУ «Красноключинская СОШ» Красноключинское СП, пос. Красный	83 151,33	Контракт в марте 2022г.
46	Нижнекамский	МБОУ «СОШ № 28» г.Нижнекамск	101 576,83	
47	Нижнекамский	МБОУ «СОШ № 26» г.Нижнекамск	101 768,33	
48	Нижнекамский	МБОУ «Кармалинская СОШ» с.Кармалы	51 202,33	
49	Нижнекамский	МБОУ «Верхнечелнинская СОШ» с.Верхние Челны	54 902,17	
50	Новошешминский	МБОУ «Утяшкинская ООШ» с.Татарское Утяшкино	60 682,00	
51	Новошешминский	МБОУ «Архангельская ООШ» с.Слобода Архангельская	52 437,83	
52	Нурлатский	МАОУ «СОШ № 1» г.Нурлат	65 414,00	
53	Нурлатский	МАОУ «Нурлатская гимназия им.М.Е.Сергеева» г.Нурлат	25 706,00	
54	Нурлатский	МБОУ «Якушкинская СОШ» с.Якушкино	64 837,00	
55	Нурлатский	МБОУ «Мамыковская СОШ» с.Мамыково	54 693,17	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
56	Нурлатский	МБОУ «Тимерликовская ООШ им.героя Советского Союза Козлова Н.А.» с.Чувашский Тимерлек	42 746,33	Контракт в марте 2022г.
57	Рыбно-Слободский	МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия № 1» пгт.Рыбная Слобода	39 238,00	
58	Спасский	МБОУ «БСОШ № 1» г.Болгар	70 035,50	
59	Спасский	МБОУ «Трехозерская СОШ» с.Три Озера	81 870,67	
60	Черемшанский	МБОУ «Черемшанский лицей» с.Черемшан	82 954,00	
61	Черемшанский	МБОУ «Шешминская ООШ» с.Шешминская Крепость	44 120,33	
62	Ютазинский	МБОУ «Уруссинская СОШ № 3» пгт.Уруссу	68 035,83	
63	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» пгт.Уруссу	48 644,67	
64	Ютазинский	МБОУ «Каразерикская СОШ им.Г.Вильданова» с.Старый Каразерик	60 245,33	
65	Ютазинский	МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» с.Старые Уруссу	47 831,17	
66	Ютазинский	МБОУ «Дым-Тамакская ООШ» с.Дым-Тамак	50 064,17	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	г. Набережные Челны	Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г.Набережные Челны	897 268,50	Контракт в феврале 2022г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Кукморский	Строительство водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз	13 404,69	Контракт в феврале 2022г.
2	Кукморский	Строительство сетей водоснабжения в н.п.Балыклы	39 673,21	
3	Лаишевский	Строительство системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	17 295,19	
4	Лаишевский	Строительство системы газоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	45 913,21	
5	Мамадышский	Строительство линии канализации и теплотрассы по ул.Советской	13 180,00	
ИТОГО:			129 466,30	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Кукморский	Строительство начальной школы на 15 мест в н.п.Балыклы	42 053,33	Контракт в феврале 2022г.
2	Мамадышский	Строительство школы-сада на 240/120 мест	223 909,14	
3	Сабинский	Строительство школы на 500 мест в н.п.Богатые Сабы	212 409,88	
4	Кукморский	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Олуяз	46 795,43	
ИТОГО:			525 167,78	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Новотроицкое" на 636 домов (газоснабжение)	1 900,00	Контракт в феврале 2022г.
2	Кукморский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку в д.Балыклы) (автомобильная дорога)	12 345,68	
3	Лаишевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в н.п. Песчаные Ковали (автомобильная дорога)	18 518,52	
4	Пестречинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Конь (дорога)	5 859,63	
5	Сабинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 25 жилых домов в н.п.Богатые Сабы (благоустройство)	12 345,68	
6	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Новотроицкое(благоустройство)	10 445,68	
7	Черемшанский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку с.Черемшан (автомобильная дорога)	34 072,10	
ИТОГО:			95 487,28	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Камско-Устьинский	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища с .Камское –Устье	126 164,90	Контракт заключен

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Высокогорский	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Садилово	7 698,23	Контракт в феврале 2022г.
2	Елабужский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Татарский Дюм-Дюм	7 698,23	
3	Елабужский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз	7 698,23	
4	Зеленодольский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Бузаево	7 698,23	
5	Зеленодольский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Большие Яки	7 698,23	
6	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш	7 698,23	
7	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Арташка	7 698,23	
ИТОГО:			107 775,20	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
8	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Сартык	7 698,23	Контракт в феврале 2022г.
9	Пестречинский	Капитальный ремонт ГТС пруда у п.Ушня	7 698,28	
10	Пестречинский	Капитальный ремонт ГТС пруда на правом притоке р.Ушня у д.Салкын Чишма	7 698,23	
11	Сабинский	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Мичанбаш	7 698,23	
12	Черемшанский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.Девичья Поляна	7 698,23	
13	Черемшанский	Капитальный ремонт ГТС пруда № 2 в с.Новое Ильмово	7 698,23	
14	Чистопольский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Каргали	7 698,23	
ИТОГО:			107 775,20	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Верхнеуслонский	Могила летчика Шпигуна Д.А., погибшего при перегоне военного самолета из г.Свердловска на фронт	140,86	Контракт в марте 2022г.
2	Верхнеуслонский	Братская могила летчиков Евсеева В.П., Завьялова А.И., Сурова А.А. – погибших 16.02.1942 при перелете из г.Чистополя на фронт	140,86	
3	Верхнеуслонский	Могила младшего сержанта Труханова Василия Сергеевича с.Майдан (ремонт, реставрация, благоустройство)	72,04	
4	г.Казань	Воинские захоронения на кладбище «Арское»	12 043,24	
ИТОГО:			12 397,00	

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	39	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	-	-
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	-	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	-	-
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	-	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	143
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	70
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	64
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	23
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	18
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	2
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	21

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	286
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	68
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	58
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	16

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	72	25	15	60
2	г.Набережные Челны	20	0	0	-
3	Агрызский	-	-	-	-
4	Азнакаевский	5	0	0	-
5	Аксубаевский	1	0	0	-
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	16	2	2	100
8	Алькеевский	2	2	2	100
9	Альметьевский	16	6	6	100
10	Апастовский	6	3	3	100
11	Арский	5	0	0	-
12	Атнинский	2	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	-	-	-	-
15	Бугульминский	4	2	2	100
16	Буинский	5	2	2	100
ВСЕГО по РТ		286	68	58	85

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	8	2	2	100
18	Высокогорский	2	0	0	-
19	Дрожжановский	5	0	0	-
20	Елабужский	6	4	4	100
21	Заинский	-	-	-	-
22	Зеленодольский	13	2	2	100
23	Кайбицкий	5	3	3	100
24	Камско-Устьинский	4	0	0	-
25	Кукморский	3	0	0	-
26	Лаишевский	2	0	0	-
27	Лениногорский	2	0	0	-
28	Мамадышский	-	-	-	-
29	Менделеевский	-	-	-	-
30	Мензелинский	2	0	0	-
31	Муслюмовский	2	0	0	-
ВСЕГО по РТ		286	68	58	85

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	18	2	2	100
33	Новошешминский	3	-	-	-
34	Нурлатский	2	-	-	-
35	Пестречинский	3	2	2	100
36	Рыбно-Слободский	1	-	-	-
37	Сабинский	9	-	-	-
38	Сармановский	5	11	11	100
39	Спасский	1	-	-	-
40	Тетюшский	15	-	-	-
41	Тукаевский	8	-	-	-
42	Тюлячинский	-	-	-	-
43	Черемшанский	6	-	-	-
44	Чистопольский	4	-	-	-
45	Ютазинский	-	-	-	-
ВСЕГО по РТ		286	68	58	85

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РТ» В 2021 ГОДУ



№	НОМИНАЦИЯ
I	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ГОДОВЫМ ОБЪЕМОМ РАБОТ: до 50 млн. рублей; от 50 до 500 млн. рублей; свыше 500 млн. рублей
II	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ГОДОВЫМ ОБЪЕМОМ РАБОТ: до 50 млн. рублей; от 50 до 500 млн. рублей; свыше 500 млн. рублей
III	ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ: до 100 человек; свыше 100 человек

В настоящее время идет подготовка к ежегодному республиканскому конкурсу «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли Республики Татарстан». Победители определяются по 8-ми номинациям. Необходимо как можно скорее определиться с кандидатами для участия в конкурсе на республиканском уровне – письма соответствующего содержания в муниципалитеты нами уже направлены.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
