



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2014 года	27	9	18
январь - май 2015 года	17	5	12
январь - май 2016 года	6	3	3



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	430	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	150	5 926,0
Взыскано всего	40	1 400,5
Не истек срок оплаты	64	3 435,5
Направлено в службу судебных приставов	7	670,0
Обжалуются в суде	4	405,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	349
- с выездом на объекты строительства	77
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	148
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	48
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	11



Альметьевский муниципальный район,
г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д. 46
Подрядчик: ООО «Солидум»

Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001. Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.



Альметьевский муниципальный район,
г. Альметьевск, ул.Белоглазова, д.137
Подрядчик: ООО «СтройСервис»

Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001. Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.





**Бугульминский муниципальный район,
г.Бугульма, 9-ый переулок д.2**

Управляющая организация – непосредственное управление

Подрядчик: ООО «Теплогазмонтаж

Вид работы: ремонт фасада

Нарушение техники безопасности: высотные работы проводятся без предохранительного пояса и страховочного каната. Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.

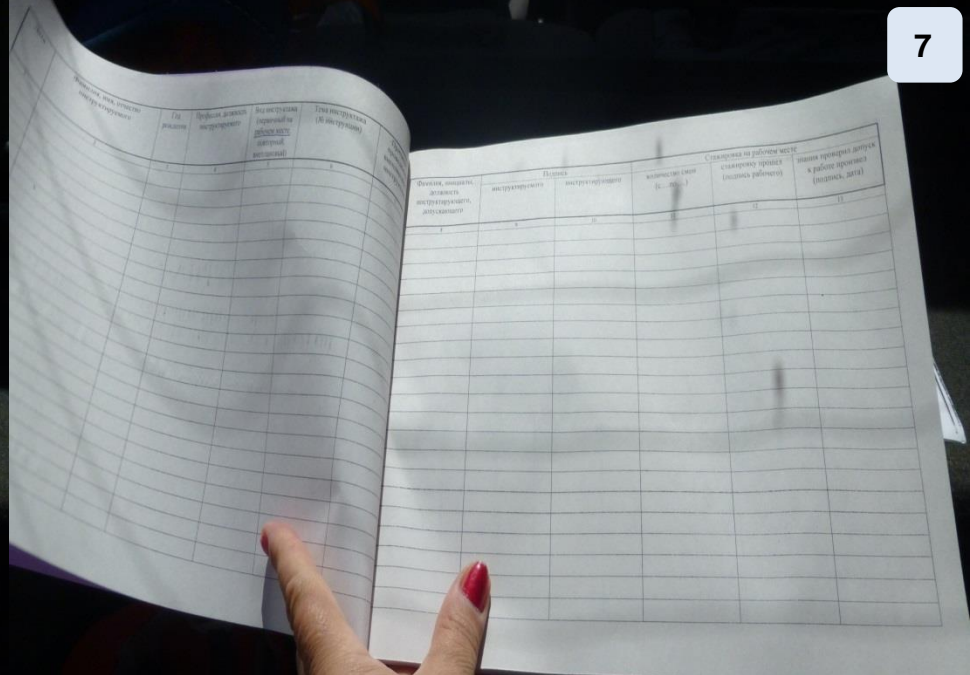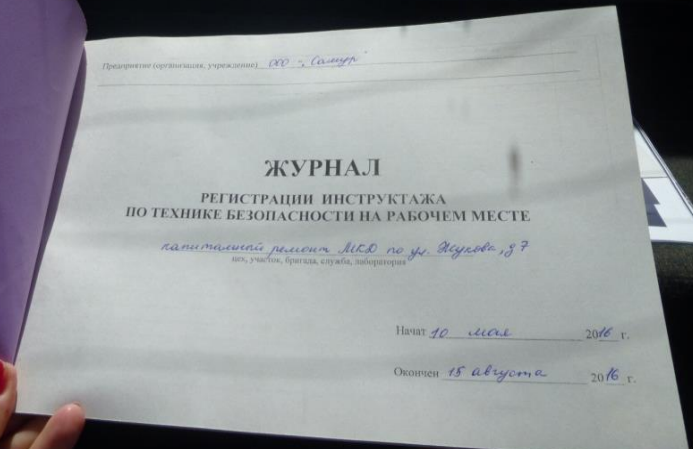

**Заинский муниципальный район,
г.Заинск, ул.Жукова, д.7, 27.05.16г.
Управляющая компания: ТСЖ «Доверие»
Подрядчик: ООО «Самур».**

Вид работы: ремонт инженерных систем, ремонт фасада

Нарушение техники безопасности: отсутствует наряд-допуск, не заполнен журнал проведения инструктажа. Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373, 13	1 072, 56	2 279, 31	4 725,0



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Чулман, д. 42, г. Набережные Челны

После ремонта



Подрядная организация: МУП «УКК ЖКТУ»

Сумма работ: 14,3 млн. руб.

Вид работы: ремонт фасада, инж.система ГВС, ХВС, теплоснабжение

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Октябрьская, д.3, с.Габишево, Лаишевский МР

После ремонта



Подрядная организация: ООО «Стройконтактэнергоплюс»

Сумма работ: 2,3 млн. руб.

Вид работы: ремонт крыши

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Свердлова, д.130, г.Тетюши

После ремонта



Подрядная организация: ООО «Строительные технологии»

Сумма работ: 2,4 млн. руб.

Вид работы: ремонт фасада

МО, по которым **не зарегистрированы** договоры на СМР ГЖИ РТ



№	МО	Кол-во домов	Количество договоров, не предъявленных ГЖИ РТ
1	Альметьевский	25	3
2	г. Казань	158	1
3	г.Набережные Челны	150	3
4	Сармановский	13	1
	Итого:	830	8



Программа капремонта МКД 2016г.

13

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
1	Альметьевский	25	224 261,42	20	18,67
2	Новошешминский	3	4 336,65	1	19,52
3	Менделеевский	9	43 606,52	6	23,96
4	Муслюмовский	5	6 529,38	4	25,04
5	Бавлинский	8	33 543,46	8	27,59
6	Азнакаевский	28	81 633,53	25	29,00
7	Лениногорский	12	101 656,43	12	37,95
8	Кукморский	5	17 236,30	5	38,49
9	Алексеевский	6	9 140,16	4	39,00
10	Бугульминский	70	191 545,03	55	39,60
11	Зеленодольский	35	232 509,40	35	39,88
12	К.-Устьинский	9	8 296,42	9	41,47
13	Высокогорский	12	28 542,73	12	42,81
14	г. Казань	158	1 489 428,62	139	44,91
16	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	763	46,05



Программа капремонта МКД 2016г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
15	Елабужский	21	105 243,48	21	45,72
16	Нижнекамский	97	496 815,74	97	45,84
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	763	46,05
17	Сармановский	13	34 981,77	12	46,19
18	г. Наб. Челны	150	1 164 030,58	136	50,71
19	Заинский	13	61 260,79	13	54,06
20	Пестречинский	5	13 552,58	5	54,20
21	Мензелинский	5	20 274,73	5	55,00
22	Нурлатский	15	46 884,33	15	55,56
23	Агрызский	10	25 156,05	10	57,27
24	Аксубаевский	6	6 132,62	6	57,83
25	Тюлячинский	2	1 191,45	2	61,27
26	Чистопольский	15	97 451,00	15	63,61
27	Верхнеуслонский	3	5 074,42	2	63,68
28	Черемшанский	5	2 338,09	5	64,50

Программа капремонта МКД 2016г.



	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
29	Мамадышский	10	15 914,92	10	65,47
30	Лаишевский	8	18 738,86	8	70,27
31	Арский	6	18 874,00	6	70,93
32	Апастовский	2	3 033,05	2	71,37
33	Ютазинский	14	20 895,44	14	74,68
34	Спасский	6	6 604,07	5	77,54
35	Актанышский	2	8 322,34	2	82,18
36	Тукаевский	8	26 726,58	8	87,06
37	Тетюшский	8	10 340,63	8	89,81
38	Балтасинский	2	4 194,08	2	95,73
39	Сабинский	5	11 997,45	5	96,63
40	Буинский	11	20 742,91	11	97,09
41	Рыбно-Слободский	3	5 965,76	3	97,47
16	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	763	46,05



МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Бугульминский	4	Ремонт фасада
2	Казань	2	Ремонт фасада, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение
3	Муслюмовский	2	Ремонт фасада, крыши
Итого:		8	



МО, в систему МЖФ вносятся **не достоверные** данные

17



Муслюмовский муниципальный район,
с. Муслюмово, ул. Пушкина, д.82, дата 31.05.2016г.

Подрядная организация: ООО "СтройМед"

Вид работы: ремонт крыши, ремонт фасада

Нарушение: начало работ по графику производства работ - 10.05.2016г.,
в ИАС МЖФ выполнение составляет 20%.

Фактически работы не начаты.



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Алексеевский	1 923,00	0,00	0,00
2	Муслюмовский	1 915,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Камско-Устьинский	19 294,3	39,0	7,0
2	Елабужский	41 742,0	43,5	2,1
3	Чистопольский	38 368,8	45,5	2,4
4	Атнинский	23 880,8	50,8	3,9
5	Нурлатский	15 189,1	53,7	5,8
6	Кукморский	51 043,7	57,4	6,9
7	Сабинский	28 531,6	59,0	2,6
8	Азнакаевский	30 188,8	68,2	4,2
9	Мензелинский	8 400,0	73,6	2,4
10	г. Казань	417 165,6	74,3	8,2
11	Тюлячинский	16 330,4	75,4	6,1
12	Бавлинский	21 494,4	76,6	6,6
13	Тукаевский	31 212,1	76,8	2,3
	Итого по РТ	1 482 550,9	77,9	5,3
14	Актанышский	31 437,2	82,2	4,6
15	г. Наб. Челны	310 059,3	85,9	3,9



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 482 550,9	77,9	5,3
16	Бугульминский	62 234,3	86,0	4,8
17	Альметьевский	52 034,8	86,8	4,0
18	Арский	58 098,4	86,9	6,3
19	Нижнекамский	43 968,0	91,5	3,5
20	Дрожжановский	26 440,0	92,9	3,7
21	Мамадышский	62 249,6	93,2	5,3
22	Ютазинский	5 141,5	93,5	3,3
23	Буинский	7 259,0	95,0	5,0
24	Черемшанский	13 150,4	96,1	0,8
25	Сармановский	19 806,8	97,0	0,0
26	Алькеевский	21 255,0	98,2	6,1
27	Лаишевский	13 888,0	99,6	1,0
28	Тетюшский муниципальный район	12 687,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	25,8	3,2
2	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	37,6	3,1
3	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	70,1	0,5
4	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	81,6	3,2
5	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	83,6	20,0
6	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	83,9	4,1
	Итого по РТ	404 207,3	84,3	7,0
7	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	84,5	4,2



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	404 207,3	84,3	7,0
8	Альметьевский, ГООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	85,5	0,3
9	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	91,3	7,8
10	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида"	9 202,4	93,0	2,0
11	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	97,1	8,6
12	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	98,0	0,0
13	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	99,0	0,0
14	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	100,0	0,0
15	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	100,0	12,1



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
		624 605,8	72,4	7,1
1	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,6	4,0	1,0
2	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,0	6,0	2,0
3	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,6	17,0	15,0
4	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,0	22,0	6,0
5	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,0	29,0	6,0
6	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	29,0	6,0
7	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,0	30,9	4,8
8	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкай"	4 014,0	44,2	3,7
9	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,8	47,3	6,3
10	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,0	50,0	10,0
11	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,7	51,1	6,8
12	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,0	53,1	12,4
13	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,0	54,7	11,6



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
14	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,0	55,0	8,0
15	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,0	57,9	11,6
16	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,8	57,9	23,7
17	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,3	60,0	4,0
18	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,1	64,6	11,8
19	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная,11	24 570,7	65,0	5,0
20	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкой"	18 566,9	65,0	7,0
21	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,0	66,6	8,2
22	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2	9 140,4	68,0	2,1
23	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,0	71,8	3,8
	Итого по РТ	624 605,8	72,4	7,1
24	Рыбно-Слободский, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,2	72,0	10,0
25	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,4	79,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	72,4	7,1
26	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,7	79,7	4,3
27	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,5	80,0	2,8
28	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,3	80,0	35,0
29	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,0	80,2	4,3
30	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,4	80,8	7,5
31	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,8	81,5	1,0
32	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,1	82,0	12,0
33	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,1	82,4	13,7
34	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад № 1"	8 640,2	87,0	9,0
35	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,4	87,0	0,0
36	Ютазинский, МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,0	90,5	9,6
37	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,0	93,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	72,4	7,1
38	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,0	94,0	1,0
39	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,0	95,0	5,0
40	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,0	96,0	17,0
41	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,7	96,0	2,0
42	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,0	96,6	17,0
43	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,2	98,0	0,0
44	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,6	98,0	0,0
45	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,1	99,9	0,0
46	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	72,4	7,1
47	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,7	100,0	0,0
48	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,0	100,0	1,0
49	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,0	100,0	0,0
50	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкай"	2 799,9	100,0	0,0
51	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,2	100,0	0,0
52	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,9	100,0	0,0
53	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	51 100,0	100,0	0,0
1	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	0,0
2	Альметьевский, Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
3	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	0,0
4	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0
5	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	0,0
6	Муслюмовский, Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
7	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	0,0
8	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	100,0	0,0
9	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский МР

После ремонта



Подрядчик: ООО СК «Вертикаль»
Сумма работ: 8,00 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,5	18,0	3,0
2	г. Казань, ГАПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,0	35,0	3,0
3	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,9	37,0	2,0
	Итого по РТ	671 158,5	44,7	5,6
4	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,4	50,0	15,0
5	г. Наб. Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,4	50,0	11,0
6	г. Наб. Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,1	55,0	11,0
7	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,0	68,0	3,0
8	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,2	69,0	4,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
1	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,5	50,0	5,0
2	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,9	60,0	11,0
3	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,2	64,0	11,0
4	Спасский Никольский СДК	8 710,3	69,0	9,0
5	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,4	72,0	12,0
6	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,0	75,0	15,0
7	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,2	85,0	10,0
8	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,9	85,0	17,0
9	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,3	86,0	2,0
10	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,3	88,0	2,0
11	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,6	89,0	3,0
12	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,3	90,0	6,0
13	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,9	90,0	8,0
	Итого по РТ	329 148,3	92,0	4,0
14	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,4	93,0	2,0
15	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,7	93,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	92,0	4,0
16	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,7	93,0	5,0
17	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,7	95,0	1,0
18	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,0	96,0	1,0
19	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,0	96,0	4,0
20	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,8	98,0	6,0
21	Балтасинский, Нуринерский СДК	11 998,3	99,0	11,0
22	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,7	99,0	1,0
23	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,7	100,0	0,0
24	Аксубавеский район, Старосаврушский СДК	4 819,4	100,0	10,0
25	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,5	100,0	0,0
26	Бугульминский, Прогрессский СДК	4 328,2	100,0	10,0
27	Буинский, Обособленное структурное подразделение №31 (Каменнобродский СДК) МБУ "Районный Дом культуры"	4 732,6	100,0	0,0
28	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,3	100,0	0,0
29	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	92,0	4,0
30	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,4	100,0	0,0
31	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,9	100,0	0,0
32	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,5	100,0	0,0
33	Кайбицкий район, Большеподберезьинский СДК	9 005,8	100,0	12,0
34	Кукморский район, Нижне-Искубашский СДК	7 208,5	100,0	0,0
35	Лаишевский район, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,9	100,0	2,0
36	Лениногорский район, Сугушлинский СДК	2 691,6	100,0	5,0
37	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,4	100,0	1,0
38	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,4	100,0	10,0
39	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК и библиотека	12 295,5	100,0	0,0
40	Новошешминский район, Утяшкинский СК	2 871,6	100,0	0,0
41	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,6	100,0	2,0
42	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,6	100,0	0,0
43	Ютазинский, Старо-Уруссинский СДК	2 139,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,0	48,0	6,0
2	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,0	80,0	6,0
	Итого по РТ	93 500,0	85,8	3,2
3	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,0	85,0	5,0
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,0	97,0	3,0
5	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,0	99,0	2,0
6	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,0	99,0	3,0
7	г.Наб. Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,0	99,0	0,0
8	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,0	99,0	0,0
9	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,0	99,0	0,0
10	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,0	99,0	0,0
11	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,0	99,0	0,0
12	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,0	99,0	0,0
13	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,0	100,0	2,0
14	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 500,0	85,8	3,2
15	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,0	100,0	2,0
16	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,0	100,0	2,0
17	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,0	100,0	0,0
18	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,0	100,0	0,0
19	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,0	100,0	0,0
20	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,0	100,0	8,0
21	Кукморский, МБУ «Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,0	100,0	0,0
22	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,0	100,0	0,0
23	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,0	100,0	7,0
24	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,0	100,0	1,0
25	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,0	100,0	0,0
26	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»	700,0	100,0	0,0
27	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подросткового молодежного объединения «Крылатый барс», Заинский МР

После ремонта



Подрядчик: ООО «Самур»
Сумма работ: 3,5 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	83,4	8,0
1	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,2	8,0	1,0
2	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара, д.66	1 608,5	15,0	1,0
3	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,0	16,0	1,0
4	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,3	17,0	1,0
5	Пестречинский, с. Кошачово, ул.Космонавтов, д.13	2 251,3	27,0	3,0
6	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,6	30,0	9,0
7	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул .Гагарина, д.7	1 576,8	32,0	10,0
8	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина, д.5	1 510,7	45,0	7,0
9	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,8	45,0	7,0
10	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,4	55,0	10,0
11	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,4	55,0	10,0
12	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,4	55,0	9,0
13	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,6	69,0	2,0
14	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,0	73,0	1,0
15	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,6	73,0	6,0
16	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,7	75,0	9,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,7	80,0	10,0
18	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,8	80,0	20,0
19	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,7	80,0	31,0
	Итого по РТ	94 975,2	83,4	8,0
20	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,7	83,0	28,0
21	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,4	84,0	9,0
22	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,4	85,0	24,0
23	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная, д.31	1 035,4	85,0	23,0
24	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая, д.28а	698,1	85,0	1,0
25	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,3	86,0	1,0
26	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,0	87,0	3,0
27	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,8	87,0	67,0
28	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,1	89,0	14,0
29	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина, д.50	1 396,5	90,0	18,0
30	Сабинский, с. Старый Мичан, ул.Школьная, д.12	924,2	91,0	1,0
31	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,4	91,0	17,0
32	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,2	92,0	12,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	83,4	8,0
33	Нижнекамский, д. Благодатная, ул. Мира, д. 64	800,0	93,0	0,0
34	Тукаевский, с. Биклянь, ул. Чкалова, д. 30а	1 385,8	95,0	3,0
35	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул. Мира, д. 40	2 251,3	96,0	2,0
36	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул. Центральная, д. 46	974,8	97,0	77,0
37	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул. Школьная, д. 17А	250,5	97,0	3,0
38	Сармановский, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 26	2 493,4	97,0	2,0
39	Тукаевский, с. Иштеряково, ул. Центральная, д. 216А	945,3	97,0	2,0
40	Азнакаевский, с. Чалпы, ул. Центральная, д. 39	1 070,8	98,0	1,0
41	Альметьевский, с. Клементейкино, ул. Советская, д. 91/2	1 098,2	98,0	1,0
42	Альметьевский, с. Маметьево, ул. Советская, д. 1	888,1	98,0	1,0
43	Бугульминский, п. Березовка, ул. Центральная, д. 3А	751,7	99,0	4,0
44	Менделеевский, с. Ижевка, ул. Советская, д. 25	857,2	99,0	0,0
45	Мензелинский, с. Бикбулово, ул. Ленина, д. 54	1 255,1	99,0	2,0
46	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул. Молодежная, д. 4	1 333,3	99,0	0,0
47	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул. Кооперативная, д. 2	624,2	100,0	2,0
48	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул. крайнова, д. 94	1 283,8	100,0	59,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	83,4	8,0
49	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,7	100,0	0,0
50	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,6	100,0	15,0
51	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,3	100,0	0,0
52	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,8	100,0	0,0
53	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,7	100,0	0,0
54	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,4	100,0	0,0
55	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,3	100,0	10,0
56	Верхнеуслонский, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,1	100,0	10,0
57	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,3	100,0	0,0
58	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,1	100,0	0,0
59	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,6	100,0	0,0
60	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы, д.31	397,3	100,0	3,0
61	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	1 975,1	100,0	0,0
62	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,3	100,0	1,0
63	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская, д.6	1 420,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	83,4	8,0
64	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,8	100,0	0,0
65	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,9	100,0	3,0
66	Лениногорский, с. Нижние Чершилы, ул.Центральная, д.105	1 112,0	100,0	15,0
67	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,0	100,0	0,0
68	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,5	100,0	0,0
69	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,4	100,0	5,0
70	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,1	100,0	0,0
71	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,1	100,0	8,0
72	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,7	100,0	0,0
73	Спасский, с. Кузнечиха, ул.Советская, д.18	2 251,3	100,0	0,0
74	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная, д.1а	796,8	100,0	0,0
75	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,8	100,0	0,0
76	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина, д.50	992,6	100,0	6,0
77	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,1	100,0	1,0
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

на 2016 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	77,8	5,2
1	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,7	0,0	0,0
2	Мамадышский, ГАУСО «Мамадышский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 167,8	19,0	1,0
3	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,0	31,0	9,0
4	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,6	52,0	4,0
5	г.Наб. Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,1	58,0	6,0
6	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,3	60,0	3,0
7	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,2	67,0	17,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 45 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
8	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,2	75,0	15,0
Итого по РТ		115 081,7	77,8	5,2
9	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,7	80,0	8,0
10	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,4	81,0	1,0
11	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,2	82,0	4,0
12	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	1 635,2	82,0	4,0
13	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,0	90,0	5,0
14	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,0	90,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2016 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	77,8	5,2
15	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	1 500,0	95,0	1,0
16	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,0	96,0	1,0
17	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,8	97,0	5,0
18	Наб. Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,5	98,0	0,0
19	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,0	98,0	3,0
20	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,0	100,0	0,0
21	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,8	100,0	5,0
22	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,0	100,0	5,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

47

на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	77,8	5,2
23	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	10,0
24	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,1	100,0	0,0
25	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,0	100,0	1,0
26	Новошешминский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,0	100,0	0,0
27	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0
28	Рыбно-слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,0	100,0	0,0
29	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,0	100,0	0,0

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Наименование Программы	Финансирование, млн.руб.	Объекты, шт.	Выполнение Программ
<p>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (РКМ от 08.10.2015 №2233-р)</p>	<p>162,2 в т.ч.: 156,5 – СМР 5,67 - ПД</p>	<p>254 - квартиры</p>	<p>Работы ведутся в 5 из 6 МО (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском районах) В Верхнеуслонском районе МО необходимо в недельный срок по 3 собственникам из 18 представить соответствующие документы</p>
<p>Ремонт котельных соц.назначения (РКМ от 12.09.2015 №2035-р)</p>	<p>69,9 в т.ч.: 67,5 – СМР, 2,4 - ПД</p>	<p>161 котел, 94 объекта</p>	<p>Во всех 94 объектах 43 МО приступили к работам по замене 161 котла</p>

Задолженность лизинговых платежей по программе установки индивидуальных систем отопления (ИСО) (с 2005г. по 2015г.)

МО	Оплата, %	МО	Оплата, %
Агрызский	86	Муслюмовский	94
Азнакаевский	86	Тюлячинский	83
Алькеевский	91	Чистопольский	92
Менделеевский	88	Ютазинский	94



Программа «Водообеспечение на селе»

(ПКМ от 16.09.2015 № 2064-р)



Мероприятие	План, год	План, на 1.06.2016	Выпол- нение	Выполнение графика, %
Строительство водопровода, км.	268,2	83,0	87,1	105 (динамика – 16,8%)
Бурение скважин, шт.	43	20	21	105 (динамика – 44,1%)
Установка водонапорных башен, шт.	45	13	13	100 (динамика – 22,2%)



Программа по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 г. (ПКМ от 18.09.2015 №2081-р)

Мероприятие	План, год	План, на 1.06.2016	Выпол- нение	Выполнение графика, %
Светильники, шт.	10 300	3 800	3 809	101 (динамика – 6,3%)
Щиты учета электроэнергии, шт.	437	82	82	100 (динамика – 14,2%)
Провода СИП-2А, км	382	127	136	107 (динамика – 22,7%)

В соответствии с графиком ведутся работы по установке светильников, монтажу щитов учета электроэнергии и линий электропередачи **в 38 МО.**



Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год (РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р)

№	Программа обустройства водоохраных зон	Лимит на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	1 150,493	
1	Строительно-монтажные работы	1 115,493	Начаты работы на 19 объектах, на 2 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	35,0	
3	Количество объектов	21	



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

53

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы	Сроки завершения работ
1	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	+	01.07.2016
2	Актанышский	Городской пруд в сквере с.Актаныш	30 537,45	+	01.07.2016
3	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	+	01.07.2016
4	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	101 875,00	+	01.07.2016
5	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	+	30.08.2016
6	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	+	01.07.2016
7	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	+	01.07.2016
8	Зеленодольский	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард»	57 750,00	+	30.08.2016
9	Кукморский	Набережная р. Нурминка, пгт. Кукмор	20 375,00	+	30.08.2016
10	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная,	47 750,00	+	01.07.2016



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

54

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы	Сроки завершения работ
11	Мамадышский	Набережная р.Ошма, г. Мамадыш	27 375,00	+	01.07.2016
12	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	+	01.07.2016
13	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	+	30.08.2016
14	Р.-Слободский	Набережная р.Кама, пгт. Р.Слобода	27 825,95	+	01.07.2016
15	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	+	30.08.2016
16	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек, с. Сарманово	18 500,00	+	01.07.2016
17	Спасский	1.Набережная р.Волга в районе БГИАМ 2. Береговая линия озера Рабига- куль	40 750,00	+ -	30.08.2016
18	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	+	01.07.2016
19	Наб. Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	+	30.08.2016
20	Казань	Набережная системы озер Кабан	216 250,00	-	30.08.2016



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ от 27.04.16 № 723-р)**

№	Программа «Парки и скверы»	План на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	849,506	
1	Строительно-монтажные работы	822,452	Начаты работы на 32 объектах, на 11 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	25,0	
3	Количество объектов	43	



Программа «Парки и скверы»

56

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	849 506,35	32
1	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	-
2	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	+
3	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	+
4	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	+
5	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2-я очередь	7 136,35	-
6	Апастовский	Парк отдыха	10 639,40	+
7	Арский	Парк экстремальных видов спорта	7 000,00	+
		Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	+
8	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	+
9	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	+
10	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан-туй»	15 703,70	-



Программа «Парки и скверы»

57

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	849 506,35	32
11	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская	13 000,00	+
12	Буинский	Центральный парк	13 559,45	+
13	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха	10 500,00	+
14	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева	7 745,85	-
15	Дрожжановский	Парк – аллея Героев	8 690,70	+
16	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	+
17	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	-
18	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова	16 500,00	-
19	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина»	13 351,40	+
20	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	-
21	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев»	15 266,85	+
22	Мензелинский	Парк Победы	8 577,45	+



Программа «Парки и скверы»

58

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	849 506,35	32
23	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	13 334,80	+
24	Нижнекамский	Центральный городской парк	86 500,00	+
25	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	+
26	Нурлатский	Городской парк	16 900,00	+
27	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	-
28	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	+
29	Спасский	Детский сквер	4 550,00	-
30	Тетюшский	Центральный парк	13 000,00	+
31	Тукаевский	Парк	8 500,00	+
		Парк в с.Круглое Поле	3 500,00	+
32	Черемшанский	Сквер в с.Черемшан, 2-я очередь	7 377,50	+



Программа «Парки и скверы»

59

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	849 506,35	32
33	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама	7 000,00	+
34	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	-
35	Наб.Челны	Парк «Победа»	86 500,00	+
36	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	+
		Парк «Черное озеро»	50 000,00	+
		Сквер по ул. Академика Парина (от ул. Хусаина Мавлютова до проспекта Победы)	45 000,00	+
		Парк «Урицкого»	50 000,00	+
		ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес)	115 000,00	+
		Лядской сад	10 000,00	-



Программа «Доступная среда» на 2016 г.

Общий лимит программы		56,49 млн. руб.
в т.ч. по источникам:		
	бюджет РФ	39,5 млн. руб.
	бюджет РТ	16,9 млн. руб.
Адаптация 46 объектов социальной сферы		

Программа «Доступная среда» на 2016 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	39 547,3	16 948,84	56 496,14
СМР	37 208,1	15 946,34	53 154,44
Спорт (10 объектов)	6 790,0	2 910,0	9 700,0
Социальная защита (3 объекта)	2 015,9	863,97	2 879,87
Здравоохранение (17 объектов)	9 590,0	4 110,0	13 700,0
Культура (6 объектов)	4 060,0	1 740,0	5 800,0
Образование (Школы и ДОУ) (10 объектов)	14 752,2	6 322,37	21 074,57

Освещение муниципальными образованиями РТ реализации программ, реализуемых МСАЖКХ в 2016 году

№	МО РТ	(апрель)	(май)	Общее кол-во
1	Алексеевский	0	0	0
2	Алькеевский	0	0	0
3	Арский	0	0	0
4	Атнинский	0	0	0
5	Кайбицкий	0	0	0
6	Кукморский	0	0	0
7	Лаишевский	0	0	0
8	Лениногорский	0	0	0
9	Мамадышский	0	0	0
10	Менделеевский	0	0	0
11	Новошешминский	0	0	0
12	Пестречинский	0	0	0
13	Рыбно-Слободский	0	0	0
14	Сармановский	0	0	0
15	Тукаевский	0	0	0
16	Ютазинский	0	0	0
17	г.Казань*	0	0	0

г.Казань *На № 01-09-6148 от 07.04.2016 Аппарат Исполнительного комитета г.Казани сообщает, что деятельность органов местного самоуправления г.Казани осуществляется на основании плана мероприятий, подготовленного организационным управлением Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, и освещается на официальном портале органов местного самоуправления города Казани www.kzn.ru. В свою очередь, отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата Казанской городской Думы готов оказать необходимое содействие в рамках своей компетенции.



Освещение муниципальными образованиями РТ реализации программ, реализуемых МСАЖКХ в 2016 году

№	МО РТ	(апрель)	(май)	Общее количество
18	Аксубаевский	1	0	1
19	Актанышский	1	0	1
20	Дрожжановский	1	0	1
21	Зеленодольский	1	0	1
22	Нижнекамский	1	0	1
23	Мензелинский	0	1	1
24	Тюлячинский	0	1	1
25	Апастовский	0	2	2
26	Балтасинский	2	0	2
27	Верхнеуслонский	1	2	3
28	Камско-Устьинский	0	3	3
29	Муслюмовский	3	0	3
30	Бугульминский	0	4	4
31	Высокогорский	2	2	4
32	Спасский	4	0	4
33	Нурлатский	3	1	4



Освещение муниципальными образованиями РТ реализации программ, реализуемых МСАЖКХ в 2016 году

№	МО РТ	(апрель)	(май)	Общее количество
34	Агрызский	1	4	5
35	Заинский	2	3	5
36	Сабинский	4	1	5
37	Азнакаевский	4	2	6
38	Альметьевский	0	6	6
39	Буинский	2	4	6
40	Чистопольский	5	2	7
41	Бавлинский	4	4	8
42	Тетюшский	0	9	9
43	Черемшанский	10	1	11
44	г.Набережные Челны	3	10	13
45	Елабужский	7	6	13

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»		
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена		
Начало строительства		Апрель 2015 г.		
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.		
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 28.05.16 по 03.06.16		Остаток
936,83	589,61	0,00		347,22
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.05.2016г. – 03.06.2016г.)		10,11	10,15	100,40
СМР		10,11	10,15	100,40
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 31.05.2016г.)		34,00	35,30	103,82
СМР		34,00	35,30	103,82
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.06.2016г.)		600,20	602,22	100,34

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.05.2016г. – 03.06.2016г.)	7,90	7,92	100,25
СМР	7,90	7,92	100,25
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 31.05.2016г.)	35,61	35,79	100,51
СМР	35,61	35,79	100,51
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.06.2016г.)	186,76	187,93	100,62

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.05.2016г. – 03.06.2016г.)	7,25	7,29	100,55
СМР	7,25	7,29	100,55
Оборудование			
МЕСЯЦ МАИ (01.05.2016 г. – 31.05.2016г.)	31,33	31,48	100,48
СМР	31,33	31,48	100,48
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.06.2016г.)	121,52	123,29	101,46

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ		
Объем финансирования, млн. руб.		209,01		
		ПИР 4,57	СМР 138,51	Обор-е 65,93
Начало строительства		2015		
Срок завершения строительства		Август 2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (28.05.2016г. – 03.06.2016г.)	7,01	7,05	100,57	
СМР	7,01	7,05	100,57	
Оборудование				
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 31.05.2016г.)	31,67	31,93	100,82	
СМР	31,67	31,93	100,82	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.06.2016г.)	118,49	121,25	102,33	
