



**пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. А,
дата: 14.03.2017г.**

**Подрядчик: ООО «Стройдорсервис+»
Вид работы: ремонт/утепление фасада**

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).



**г.Казань, Советский район, ул.Даурская, д.29,
дата: 21.03.2017г.**

**Подрядчик: ООО «Билд Строй»
Вид работы: ремонт крыши**

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).




**г.Казань, Советский район, ул.Пионерская, д.3,
дата: 21.03.2017г.**

Подрядчик: ООО «Билд Строй»

Вид работы: ремонт крыши

Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001

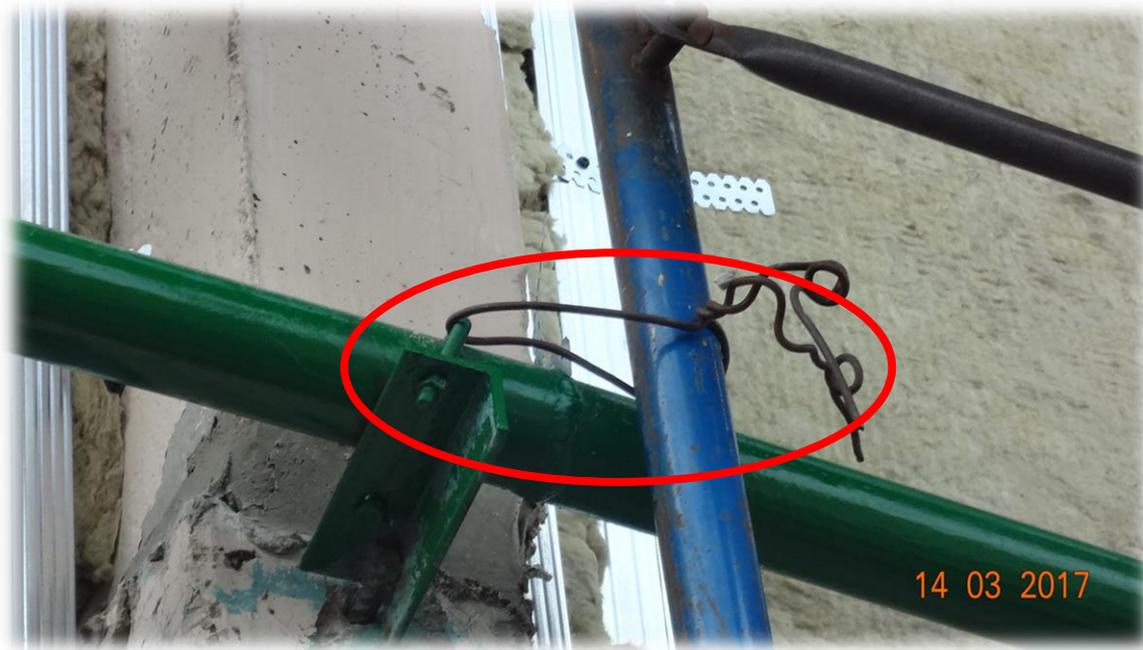

**пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. А,
дата: 14.03.2017г.**

Подрядчик: ООО «Стройдорсервис+»

Вид работы: ремонт фасада

**Нарушение техники безопасности: вертикальные
стойки лесов закреплены на газопроводных трубах**



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

5

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Программа капремонта МКД 2017г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
1	Агрызский	9	23 741,76	9
2	Азнакаевский	30	83 906,69	13
3	Аксубаевский	5	7 460,11	2
4	Актанышский	2	9 942,44	2
5	Алексеевский	4	9 581,62	4
6	Алькеевский	3	3 022,72	1
7	Альметьевский	62	299 074,79	22
8	Апастовский	3	5 367,72	2
9	Арский	7	18 720,06	7
10	Атнинский	1	1 241,42	1
11	Бавлинский	7	38 493,26	6
12	Балтасинский	3	5 148,29	1
13	Бугульминский	57	207 947,49	24
14	Буинский	7	24 533,95	7
15	Верхнеуслонский	1	5 074,42	1
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	494



Программа капремонта МКД 2017г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
16	Высокогорский	15	36 343,65	15
17	г.Казань	245	1 509 241,13	84
18	г.Набережные Челны	147	1 207 573,20	72
19	Елабужский	32	123 708,60	17
20	Заинский	17	64 205,94	10
21	Зеленодольский	33	247 891,15	16
22	Камско-Устьинский	10	9 695,35	5
23	Кукморский	5	17 236,30	5
24	Лаишевский	7	22 156,10	4
25	Лениногорский	21	126 677,55	9
26	Мамадышский	9	14 527,10	5
27	Менделеевский	10	47 506,95	6
28	Мензелинский	5	19 678,48	4
29	Муслюмовский	5	7 633,71	1
30	Нижнекамский	128	559 401,53	64
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	494



Программа капремонта МКД 2017г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
31	Новошешминский	5	4 633,11	
32	Нурлатский	14	49 132,34	13
33	Пестречинский	6	15 923,68	4
34	Рыбно-Слободский	4	7 328,02	4
35	Сабинский	7	12 327,80	4
36	Сармановский	15	39 430,27	5
37	Спасский	6	7 552,87	4
38	Тетюшский	8	12 866,47	7
39	Тукаевский	8	27 358,13	6
40	Тюлячинский	1	1 545,26	
41	Черемшанский	2	2 292,34	2
42	Чистопольский	16	96 391,86	16
43	Ютазинский	14	21 752,29	10
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	494



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

9

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
1	Мензелинский	5	19 678,48	0,00	0,00
2	Новошешминский	5	4 633,11	0,00	0,00
3	Пестречинский	6	15 923,68	0,00	0,00
4	Сармановский	15	39 430,27	0,00	0,00
5	Тюлячинский	1	1 545,26	0,00	0,00
6	Черемшанский	2	2 292,34	0,00	0,00
7	Ютазинский	14	21 752,29	0,00	0,00
8	Муслюмовский	5	7 633,71	134,62	1,76
9	Аксубаевский	5	7 460,11	145,62	1,95
10	Бавлинский	7	38 493,26	935,25	2,43
11	Мамадышский	9	14 527,10	558,59	3,85
12	Верхнеуслонский	1	5 074,42	216,00	4,26
13	Бугульминский	57	207 947,49	10 957,75	5,27
14	Лениногорский	21	126 677,55	6 761,69	5,34
15	Итого по РТ	996	5 055 267,94	415 254,42	8,26



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

10

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
15	Зеленодольский	33	247 891,15	13 970,78	5,64
16	Нурлатский	14	49 132,34	2 935,10	5,97
17	Азнакаевский	30	83 906,69	5 183,93	6,18
18	Заинский	17	64 205,94	4 316,42	6,72
19	Алькеевский	3	3 022,72	205,24	6,79
20	Альметьевский	62	299 074,79	20 673,00	6,91
21	Лаишевский	7	22 156,10	1 548,41	6,99
22	г. Казань	245	1 509 241,13	68 839,33	8,00
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	415 254,42	8,26
23	Нижнекамский	128	559 401,53	46 730,15	8,35
24	Высокогорский	15	36 343,65	3 187,39	8,77
25	Менделеевский	10	47 506,95	4 387,02	9,23
26	Балтасинский	3	5 148,29	659,70	12,81
27	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	158 536,55	13,13
28	Кукморский	5	17 236,30	2 264,77	13,14



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

11

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
29	Сабинский	7	12 327,80	1 689,17	13,70
30	Спасский	6	7 552,87	1 043,80	13,82
31	К.-Устьинский	10	9 695,35	1 483,37	15,30
32	Елабужский	32	123 708,60	25 056,41	20,25
33	Апастовский	3	5 367,72	1 242,13	23,14
34	Тукаевский	8	27 358,13	7 471,26	27,31
35	Чистопольский	16	96 391,86	32 467,29	33,68
36	Буинский	7	24 533,95	10 169,73	41,45
37	Р.-Слободский	4	7 328,02	3 096,00	42,25
38	Алексеевский	4	9 581,62	4 658,16	48,62
39	Агрызский	9	23 741,76	14 089,10	59,34
40	Тетюшский	8	12 866,47	7 781,43	60,48
41	Арский	7	18 720,06	11 868,57	63,40
42	Атнинский	1	1 241,42	827,00	66,62
43	Актанышский	2	9 942,44	6 699,63	67,38
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	415 254,42	8,26



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **не введены**

12

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых не введены				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
1	Агрызский	178		71		
2	Азнакаевский	338		4		
3	Аксубаевский	108		1		
4	Актанышский	76		27		
5	Алексеевский	108		51		
6	Алькеевский	14				
7	Альметьевский	993	50	117		
8	Апастовский	36		6		
9	Арский	197		2		
10	Атнинский	3				
11	Бавлинский	10		2		
12	Балтасинский	41		17		
13	Бугульминский	856	13	4		
14	Буинский	162		29		
15	Верхнеуслонский	63		40		



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **не введены**

13

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых не введены				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
16	Высокогорский	238		29		
17	Казань в т.ч.	5369	835	1347	3	
18	г. Наб. Челны	1254	97	37		1
19	Дрожжановский	17				
20	Елабужский	432	7	8		
21	Заинский	218	5	6		
22	Зеленодольский	850	56	215		
23	Кайбицкий	2				
24	К.-Устьинский	82		1		
25	Кукморский	126				
26	Лаишевский	210	1	3	1	1
27	Лениногорский	503	1	840	1	
28	Мамадышский	127				
29	Менделеевский	132	6	2		
30	Мензелинский	160				



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **не введены**

14

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых не введены				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
31	Муслюмовский	54				
32	Нижнекамский	941	57	20		
33	Новошешминский	43				
34	Нурлатский	350		9	1	
35	Пестречинский	165		7	1	
36	Р.-Слободский	62				
37	Сабинский	104				
38	Сармановский	151				
39	Спасский	68				
40	Тетюшский	86				
41	Тукаевский	255		139		
42	Тюлячинский	23				
43	Черемшанский	30		12		
44	Чистопольский	447		29		
45	Ютазинский	185				



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **введены не корректно**

15

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых введены не корректно				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
1	Агрызский	53		12	14	11
2	Азнакаевский	12			14	
3	Аксубаевский	27			8	
4	Актанышский	7			20	
5	Алексеевский	5		3		
6	Алькеевский	1				
7	Альметьевский	112	3	7	9	6
8	Апастовский	1				
9	Арский	8				
10	Атнинский	1				
11	Бавлинский	22			1	
12	Балтасинский	12			4	
13	Бугульминский	30				1
	Итого по РТ	928	72	367	358	303



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **введены не корректно**

16

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых введены не корректно				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
14	Буинский	26		3		
15	Верхнеуслонский	1		1	95	
16	Высокогорский	7		10		1
17	г. Казань	264	57	144	58	52
18	г. Наб. Челны	13	2	14	22	17
19	Елабужский	64		52	3	50
20	Заинский	7		6	3	7
21	Зеленодольский	40	6	22	9	16
22	К.-Устьинский	12		2		1
23	Лаишевский	6		1	1	2
24	Лениногорский	11		5		19
25	Мамадышский	3		11		
26	Менделеевский	6		1		3
	Итого по РТ	928	72	367	358	303



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД введены не корректно

17

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых введены не корректно				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
27	Мензелинский	11		15		19
28	Муслюмовский	1			1	1
29	Нижнекамский	14	4	2	3	8
30	Нурлатский	9		8	8	9
31	Пестречинский	5		13	74	63
32	Р.-Слободский	7		2		6
33	Сабинский	13			1	
34	Сармановский			3		1
35	Спасский	4		1		
36	Тетюшский	13		4		
37	Тукаевский	26		4	9	2
38	Тюлячинский	6				1
39	Чистопольский	49		19	1	7
40	Ютазинский	19		2		
	Итого по РТ	928	72	367	358	303



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	32,3	6,2
1	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	0,0	0,0
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	0,0	0,0
3	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	1,0	0,0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	3,0	2,0
5	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	6,6	2,6
6	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	11,3	4,6
7	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	18,0	5,3
8	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	19,8	6,2
9	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	19,9	2,5
10	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	21,2	10,4
11	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	22,0	10,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	23,2	2,3
13	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	23,4	5,8
14	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	23,5	4,6
15	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2", Рыбно-Слободский	29 656,4	26,0	2,0
16	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	30,0	16,0
	Итого по РТ	718 703,1	32,3	6,2
17	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	34,0	7,0
18	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	36,6	6,7
19	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	39,0	6,0
20	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	39,0	9,4



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	32,3	6,2
21	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	40,0	23,0
22	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	45,7	11,9
23	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	46,3	4,3
24	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	55,0	17,7
25	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	58,1	5,5
26	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	59,5	1,9
27	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	68,0	5,0
28	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа""", Арский	12 687,1	73,2	14,1
29	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	81,5	3,6



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	16,0	4,0
2	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	19,7	3,8
3	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова" Московский р-н	39 186,6	30,3	10,9
	Итого по РТ	145 758,0	30,9	7,4
4	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	34,0	7,2
5	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	37,5	2,5
6	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	45,0	10,0
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	55,1	18,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	33,0	8,4
1	Кайбицкий	7 150,5	8,4	3,9
2	Атнинский	29 660,0	8,9	3,5
3	Высокогорский	20 189,1	10,7	7,4
4	Камско-Устьинский	19 417,5	14,2	3,0
5	Нурлатский	13 433,1	15,3	4,5
6	Заинский	44 568,4	16,0	1,0
7	г. Казань	198 797,5	17,8	3,6
8	Елабужский	23 810,7	18,0	7,0
9	Дрожжановский	13 031,4	18,2	3,6
10	Верхнеуслонский	14 854,7	20,7	20,7
11	Арский	26 395,5	21,2	4,7
12	Аксубаевский	8 079,9	22,5	5,8
13	Тюлячинский	18 001,5	23,5	4,0
14	Бавлинский	35 761,9	23,6	4,4



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Алексеевский	25 008,4	24,0	2,0
16	Чистопольский	41 029,5	25,0	10,3
17	Алькеевский	23 680,2	25,0	9,1
18	Альметьевский	47 776,0	25,4	14,8
19	Бугульминский	72 621,9	26,5	5,1
20	Тукаевский	15 918,9	27,0	2,0
21	Ютазинский	14 739,6	27,4	3,9
22	Муслюмовский	42 604,4	27,4	3,9
23	Азнакаевский	50 547,9	31,1	14,2
	Итого по РТ	1 624 868,8	33,0	8,4
24	Мамадышский	77 063,6	34,3	9,6
25	Сабинский	37 438,7	34,7	3,2
26	Зеленодольский	28 315,5	35,0	2,4
27	Менделеевский	7 343,7	35,0	10,0
28	Мензелинский	20 895,0	35,8	10,8



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	33,0	8,4
29	Актанышский	25 533,5	37,0	7,0
30	Сармановский	13 700,9	41,0	24,0
31	г. Наб. Челны	269 210,4	41,9	12,9
32	Нижнекамский	150 000,0	42,9	6,2
33	Спасский	11 085,7	44,4	12,5
34	Кукморский	38 766,2	44,9	4,3
35	Лаишевский	11 559,8	45,0	5,3
36	Лениногорский	39 753,5	54,5	6,9
37	Пестречинский	10 688,4	60,2	13,3
38	Буинский	15 405,3	61,0	16,4
39	Балтасинский	25 386,5	75,4	13,5
40	Черемшанский	10 301,9	75,6	59,3
41	Новошешминский	7 724,7	77,5	60,3
42	Агрызский	8 390,9	88,9	8,0
43	Апастовский	9 226,5	98,2	19,2



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	40,0	15,0
2	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	42,0	7,0
	Итого по РТ	30 155,0	69,3	7,8
3	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	75,0	10,0
4	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	93,0	4,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

28

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	8,0	3,0
2	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	11,0	6,0
3	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	11,0	1,0
4	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	13,0	3,0
5	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	14,0	3,0
6	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	15,0	2,0
	Итого по РТ	671 158,5	16,8	3,9
7	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	17,0	5,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	40,0	10,0
9	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	40,0	10,0
10	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	42,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

30

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	29,6	6,4
1	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,1	2,0	2,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная,д.27/1	1 201,3	2,0	1,0
3	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д.11	8 425,5	4,0	1,0
4	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,1	4,0	0,0
5	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,4	5,0	0,0
6	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,9	6,0	0,0
7	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д.15	3 128,1	6,0	3,0
8	Камско-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,3	7,0	4,0
9	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино, ул.Центральная,д.21	3 828,0	7,5	2,5
10	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,1	10,0	4,0
11	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,9	10,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	29,6	6,4
12	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,3	12,0	3,0
13	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,1	13,0	12,0
14	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,4	15,0	13,0
15	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,4	15,0	7,0
16	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,5	16,0	10,0
17	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,3	17,0	5,0
18	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,1	17,0	7,0
19	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,3	17,0	7,0
20	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,8	18,0	1,0
21	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,5	20,0	2,0
22	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,1	20,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
23	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,6	22,0	6,0
24	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,9	27,0	5,0
25	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,1	27,0	7,0
26	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,2	28,0	5,0
27	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,2	28,0	4,0
	Итого по РТ	334 871,7	29,6	6,4
28	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,5	30,0	5,0
29	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,9	32,0	16,0
30	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,5	36,0	5,0
31	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,0	38,0	13,0
32	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,1	42,0	9,0
33	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная,д.85	3 502,4	43,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	29,6	6,4
34	Актанышский, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная,д.85	3 661,2	47,0	2,0
35	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,3	50,0	37,0
36	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,9	50,0	10,0
37	Муслюмовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.19б	6 275,0	60,0	28,0
38	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,5	65,0	25,0
39	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина,д.1б	9 015,0	67,0	5,0
40	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная,д.12	11 816,4	78,0	6,0
41	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого,д.35	4 040,7	80,0	0,0
42	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького,д.84	1 797,9	80,0	24,0
43	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,0	85,0	0,0
44	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная,д.32	10 541,1	89,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

35

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Спарта", г.Казань	3 400,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,0	35,0	8,0
3	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	35,0	10,0
4	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	42,0	16,0
5	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	45,0	5,0
6	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	45,0	4,0
7	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	46,0	4,0
8	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	50,0	3,0
9	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	50,0	11,0
10	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	55,0	30,0
11	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	60,0	7,0
12	Подростковый клуб "Снайпер",	1 200,0	65,0	12,0
	Итого по РТ	93 000,0	67,3	10,3
13	Подростковый клуб "Отечество", Елабужский	3 300,0	70,0	20,0
14	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот", Лаишевский	3 050,0	74,0	19,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	67,3	10,3
15	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	77,0	3,0
16	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	78,0	4,0
17	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	78,0	5,0
18	Подростковый клуб "Эврика", г.Набережные Челны	2 050,0	89,0	0,0
19	Подростковый клуб "Юность", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	0,0
20	Подростковый клуб "Радуга", г.Набережные Челны	2 050,0	92,0	0,0
21	Подростковый клуб "Чайка", г.Набережные Челны	1 300,0	92,0	0,0
22	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	92,0	42,0
23	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	0,0
24	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	95,0	0,0
25	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	95,0	10,0
26	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	95,0	0,0
27	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	95,0	10,0
28	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	96,0	18,0
29	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	20,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	38,3	11,2
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	1,0	1,0
2	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	3,0	3,0
3	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	3,0	3,0
4	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	6,0	4,0
5	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	8,0	3,0
6	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	8,0	4,0
7	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	8,0	3,0
8	Лениногорский р, с.Куакбаш	924,1	9,0	4,0
9	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	10,0	1,0
10	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	12,0	10,0
11	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	15,0	5,0
12	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	18,0	3,0
13	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	18,0	3,0
14	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	19,0	4,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	19,0	4,0
16	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	20,0	3,0
17	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	21,0	2,0
18	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	24,0	5,0
19	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	27,0	9,0
20	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	28,0	21,0
21	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	30,0	22,0
22	Арский, п. Урняк	1 727,4	30,0	12,0
23	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	30,0	12,0
24	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	32,0	11,0
25	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	34,0	23,0
26	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	35,0	10,0
27	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	36,0	11,0
	Итого по РТ	50 828,4	38,3	11,2
28	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	40,0	5,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	38,3	11,2
29	Бугульминский, с.Спасское	904,8	40,0	5,0
30	Апастовский, с. Куштово	909,0	45,0	20,0
31	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	45,0	8,0
32	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	45,0	10,0
33	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	55,0	32,0
34	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	74,0	9,0
35	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	75,0	58,0
36	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	75,0	10,0
37	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	77,0	7,0
38	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	90,0	15,0
39	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	91,0	21,0
40	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	99,0	9,0
41	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	25,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	51,5	6,6
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,0	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,9	0,0	0,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г. Набережные Челны	2 540,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	27,0	0,0
6	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	30,0	7,0
7	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	34,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	38,0	3,0
9	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	38,0	6,0
10	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	42,0	4,0
11	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,0	45,0	20,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 700,0	46,0	11,0
13	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	50,0	23,0
	Итого по РТ	116 500,0	51,5	6,6
14	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	60,0	15,0
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	62,0	16,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	51,5	6,6
16	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	70,0	0,0
17	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	78,0	8,0
18	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	80,0	7,0
19	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,0	85,0	20,0
20	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,0	85,0	0,0
21	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	87,0	3,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	51,5	6,6
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья», Бавлинский	2 000,0	90,0	10,0
23	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	91,0	3,0
24	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	97,0	2,0
25	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	97,0	3,0
26	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	98,0	8,0
27	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	2,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

47

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	52,7	11,0
1	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	0,0	0,0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	0,0	0,0
3	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	2,0	0,0
4	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	15,0	5,0
5	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	22,0	2,0
6	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	33,0	8,0
7	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	35,0	17,0
8	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	35,0	8,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	35,0	13,0
10	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	48,0	8,0
	Итого по РТ	50 000,0	52,7	11,0
11	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	60,0	15,0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	68,0	37,0
13	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	72,0	6,0
14	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	75,0	5,0
15	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	84,0	9,0
16	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	98,0	81,0
17	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	93,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

50

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	1 557	45,1%	6,1%
МКД	3 191	1 268	39,7%	2,5%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	169, в т.ч.: 43 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	67,6%	4,0%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения в пгт. Уруссу

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за март	План на 2017 г.
	ПЛАН март	ФАКТ март		апрель
3 441	3 151	1 557	49,4% (динамика – 6,7%)	290



Распределение объектов г.Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 282	401
взносы на счете Рег.оператора	930	304
взносы на своих счетах	182	58
Бюджетные учреждения	170	39



График разработки ПСД

Наименование организации	Всего объектов, шт.	Предоставление заказных спецификаций	Согласование ПСД в КТС и ВК	Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости
АО УКС	1 282	до 1 апреля	до 1 мая	до 1 июня



График изготовления ИТП, шт. (объектов)

Наименование организации	Всего объектов, шт.	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
АО УКС	1 282	20	200	400	400	262



График монтажа ИТП, шт.(объектов)

Ген.подрядчик	АО УКС	Всего объектов, шт.	Май	Июнь	Июль	Август	15 Сентября
МОНТАЖ		1 282	50	345	371	371	145
врезка и пуско-наладка				250	344	360	328



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	331	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	согласован
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	согласован
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Улица Гагарина, новый объект	100 237,52	согласован
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	на коррек-ке
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк на выезде из города	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул. Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им. Р.Ш. Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	согласован
		Парк за ДК «Родина», новый объект		согласован
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», новый		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 000 000,0	57
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (3)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	согласован
		Шишкинский бульвар, новый объект		согласован
		Площадь Азатлык, новый объект		на коррект-ке
45	Казань (8)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	согласован
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		согласован
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		согласован
		ООПТ «Лебяжье», новый		согласован
		Парк Победы, 2-я очередь		согласован
		Сквер по ул. Сыртлановой, новый		согласован



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(ПКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, ПКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
55	2	0	57



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	
6	н.п. Шегурча	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	-	
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	-	
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	-	
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	+	+	+	
14	д. Керосиново	+	+	+	
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	
18	г.Лаишево	+	+	+	
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	
28	н.п. Мамыково	+	+	+	
29	н.п. Пушкино	+	+	+	
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	До 27.03.2017	
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	До 27.03.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	До 27.03.2017	
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	До 27.03.2017	
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	До 27.03.2017	
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	До 27.03.2017	
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	До 27.03.2017	
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	До 27.03.2017	
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	До 27.03.2017	
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	До 27.03.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	До 27.03.2017	
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	До 27.03.2017	
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	До 27.03.2017	
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	До 27.03.2017	
59	ГГРП Коццаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	До 27.03.2017	
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	До 27.03.2017	
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	64,83	64,98	100,40
СМР	64,83	64,98	101,40
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	116,39	117,08	100,59
СМР	116,39	117,08	100,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	1 679,08	1 680,22	100,06
СМР	1 679,08	1 680,22	100,06
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		1 252,36	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	19,79	19,98	100,96
СМР	19,79	19,98	100,96
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	76,64	77,93	101,68
СМР	76,64	77,93	101,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	1 070,77	1 085,90	101,41
СМР	1 070,77	1 085,90	101,41
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	3,55	3,31	93,24
СМР	3,55	3,31	93,24
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	11,66	10,71	91,85
СМР	11,66	10,71	91,85
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	56,84	56,16	98,80

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		904,30	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	30,99	31,38	101,25
СМР	30,99	31,38	101,25
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	94,03	94,56	100,56
СМР	94,03	94,56	100,56
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	367,70	372,20	101,22

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		25,05		
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	0,98	1,01	103,06	
СМР	0,98	1,01	103,06	
Оборудование				
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	1,73	1,79	103,46	
СМР	1,73	1,79	103,46	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	24,09	24,55	101,90	

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		824,63	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	5,21	5,26	100,96
СМР	5,21	5,26	100,96
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. –23.03.2017г.)	19,14	19,31	100,88
СМР	19,14	19,31	100,88
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	225,92	232,20	102,78

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

		Подрядчик	ООО «Ак Таш»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (17.03.2017г. – 23.03.2017г.)	7,73	8,92	115,39	
СМР	7,73	8,92	115,39	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 23.03.2017г.)	28,71	30,51	106,27	
СМР	28,71	30,51	106,27	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.03.2017г.)	177,98	194,63	109,36	
