



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - декабрь 2015 года	43	16	27
январь - декабрь 2016 года	28	11	17
январь – декабрь 2017 года	26	9	17
январь – декабрь 2018 года	20	8	12



Строительство жилого дома по ул. Павлюхина в г. Казани



На лестничных клетках
отсутствуют ограждения
лестничных маршей

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО СК «Бриз»
Генподрядчик: ООО «Артель»



Строительство автозаправочной станции по ул. Индустриальная, г. Альметьевск



На месте работы крана
опасные зоны не выделены
предупредительными знаками

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
Генподрядчик: ООО «Портал»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 400	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	418 102	16 508,0 -
Взыскано всего	236	11 737,0
Не истек срок оплаты	79	4 471,0
Отменено решением суда	1	300,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	2 105
- с выездом на объекты строительства	190
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 594
- выдано предписаний	611
- приостановлено право осуществлять строительство	504
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	137
- выдано предупреждений	342



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 07 декабря 2018 года**

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 146 834	89,3	256 166
1	Апастовский	12 000	6 578	54,8	5 422
2	Нижекамский	110 000	63 063	57,3	46 937
3	Альметьевский	155 000	95 734	61,8	59 266
4	Атнинский	4 000	2 603	65,1	1 397
5	Азнакаевский	25 000	16 345	65,4	8 655
6	В-Услонский	49 000	36 134	73,7	12 866
7	Зеленодольский	120 000	95 635	79,7	24 365
8	Бугульминский	40 000	32 138	80,3	7 862
9	г.Наб.Челны	300 000	247 865	82,6	52 135
10	Буинский	15 000	12 401	82,7	2 599
11	К-Устьинский	10 000	8 538	85,4	1 462
12	Нурлатский	18 000	15 761	87,6	2 239
13	г.Казань	800 000	708 693	88,6	91 307
14	Аксубаевский	8 000	7 228	90,4	772
15	Муслюмовский	8 000	7 271	90,9	729



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 07 декабря 2018 года**

7

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 146 834	89,3	256 166
16	Черемшанский	4 500	4 126	91,7	374
17	Сабинский	18 000	16 648	92,5	1 352
18	Бавлинский	17 000	15 892	93,5	1 108
19	Новошешминский	5 000	4 699	94,0	301
20	Алексеевский	14 000	13 259	94,7	741
21	Балтасинский	14 000	13 452	96,1	548
22	Дрожжановский	6 000	5 804	96,7	196
23	Актанышский	14 000	13 583	97,0	417
24	Тетюшский	10 000	9 709	97,1	291
25	Мензелинский	16 000	15 535	97,1	465
26	Агрызский	20 000	19 530	97,7	470
27	Алькеевский	6 500	6 453	99,3	47
28	Лениногорский	25 000	24 945	99,8	55
29	Высокогорский	70 000	70 026	100,0	-
30	Мамадышский	16 000	16 008	100,1	-



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 07 декабря 2018 года**

8

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 146 834	89,3	256 166
31	Спасский	8 000	8 005	100,1	-
32	Р-Слободский	13 000	13 018	100,1	-
33	Чистопольский	35 000	35 068	100,2	-
34	Сармановский	10 000	10 028	100,3	-
35	Заинский	17 000	17 060	100,4	-
36	Ютазинский	10 000	10 041	100,4	-
37	Тукаевский	90 000	90 495	100,6	-
38	Менделеевский	10 000	10 070	100,7	-
39	Кайбицкий	4 800	4 855	101,1	-
40	Кукморский	25 000	25 334	101,3	-
41	Елабужский	50 000	51 055	102,1	-
42	Тюлячинский	7 500	7 678	102,4	-
43	Лаишевский	90 000	93 900	104,3	-
44	Арский	24 000	26 057	108,6	-
45	Пестречинский	120 000	138 514	115,4	-



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию




Лаишевский р-н, с.Габишево 60-кв. жилой дом № 5 по ул.Северная
Подрядчик – ООО «Стройком +»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию

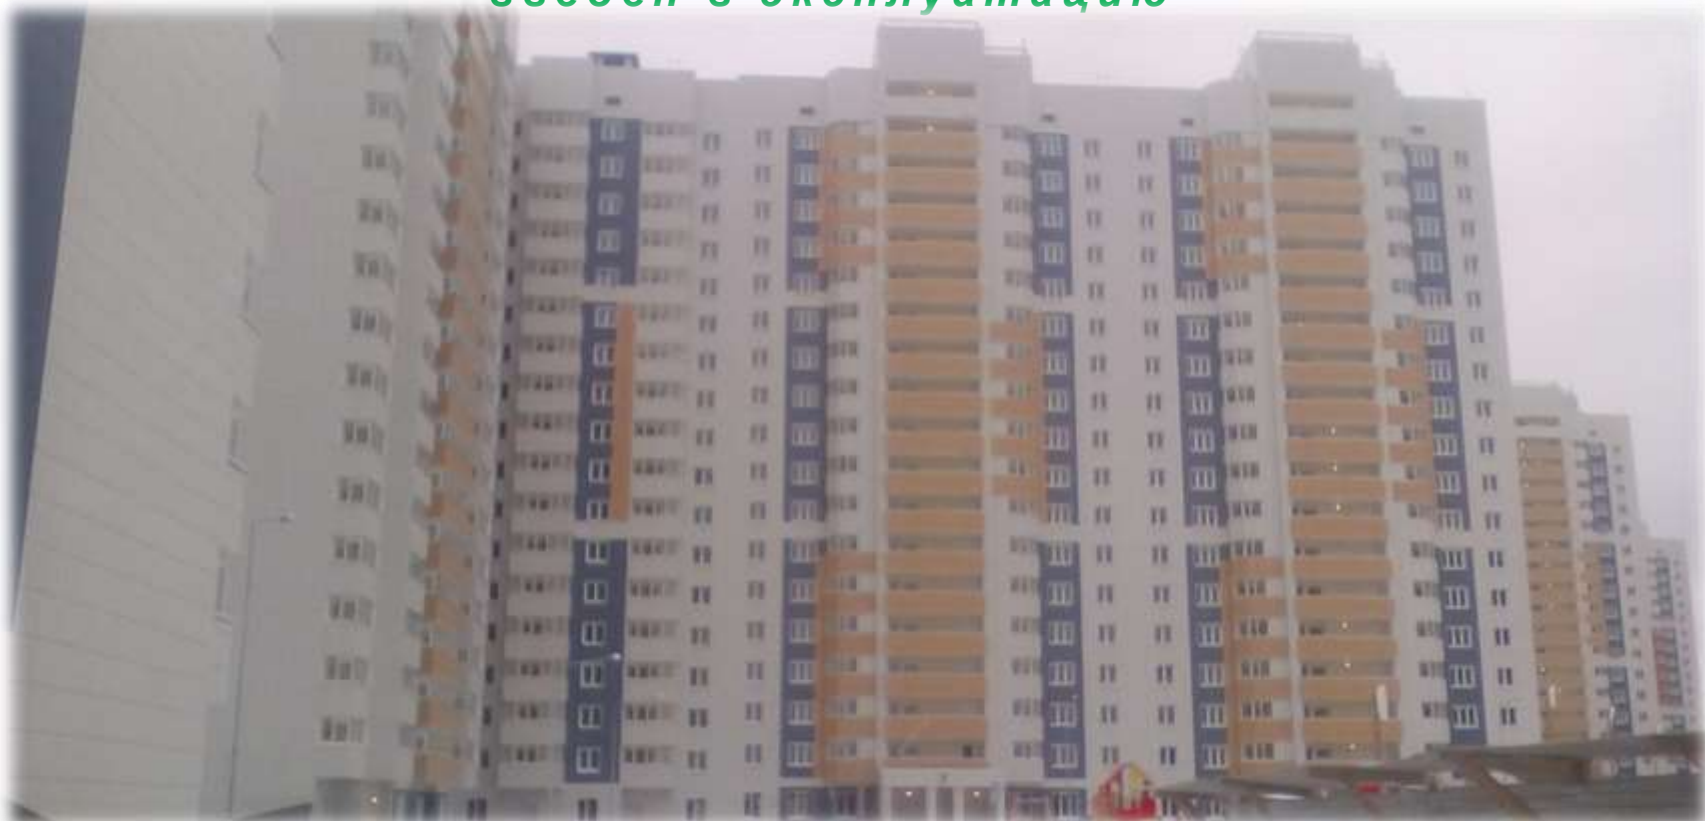

г.Казань 340-кв. ж.д. №8-2 ж/р «Салават Купере»
Подрядчик - ООО «Ак таш»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

11

на 07.12.2018

	План	Введено		Остаток	Степень готовности	
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	242	192	24	50	37	13
Количество квартир	9 323	6 169	481	3 154	3 023	131
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,2	348,2	30,3	179,0	170,0	9,0



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

Завершены строительством

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
1	90 кв.5-ти этажный ж/д поз.6 в Юго-Восточном мкрн. г.Азнакаево	ПАО Татнефть	Арслан
2	102-кв ж/д №8-5 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
3	102-кв ж/д №8-6 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
4	340-кв ж/д №8-3 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
5-12	8 Инд. ж/д ул.Б.Красная п.Секинесь, с.Рогозино Мамадышский р-н	Мамадышстрой	Народный дом
13	80 кв ж/д 49-4 мкр. 49 Нижнекамск	ЖИК-НК	ЖИК-НК



Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2018г.

Степень готовности	Договорная стоимость, тыс.руб.	Оперативное выполнение, тыс.руб.		Выполнение КС-2/КС-3, тыс.руб.		Оплата, тыс.руб.	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	18 423 094	17 523 766	557 331	14 950 413	432 888	17 785 961	300 332
введены в эксплуатацию	12 018 305	12 018 305	52 707	10 835 264	257 558	11 816 072	60 722
высокая 70-100%	6 154 660	5 341 794	483 107	3 968 988	171 162	5 821 874	238 971
средняя 30-70%	250 129	163 667	21 517	146 162	4 168	148 014	639



33 кв. ж/д ул.Ленина, д.10А пгт. Актюбинский Азнакаевский район

Заказчик: МУП УКС Азнакаевского МР

Подрядчик: ООО «Юнистрой»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
35 495	35 495	100	26 621	75	26 578	23 676	31.08.18	31	1 064	3,0

Ход строительства: Пуск тепла не осуществлен. За 2 недели завершено устройство кровли, утепление и оштукатуривание одной стороны фасада (400м2), стяжка 1-го этажа, монтаж фасадного газопровода, устройство стояков внутреннего газопровода на 3 подъездах.



12-кв. ж/д по ул.С.Батала, д.22, Алексеевского района

Заказчик: ГКУ ГИСУ

Подрядчик: ООО «Керамика-Маркет»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
15 516	15 516	100	9 929	64	9 833	9 817	07.11.18	6	0	0

Ход строительства: низкие темпы производства работ. Подрядная организация не приступала к устройству крыши, ведутся работы по устройству монолитного пояса парапетной части.



108-кв ж/д мкр. №7, Лениногорск со встр. опорным пунктом полиции

Заказчик: ПАО «Татнефть»

Подрядчик: ООО «Арслан»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
213 524	213 524	100	140 925	66	124 642	124 642	30.11.18	64	18 733	9

Ход строительства: Пуск тепла не осуществлен. Не завершены фасадные работы, стяжка пола, шпатлевка стен. Не начата оклейка стен обоями, укладка линолеума.



81-кв. ж/д №4-5-3б ул.Автомобилистов, г. Елабуга

17

Заказчик: ПАО «Татнефть»

Подрядчик: ООО «Стройинвест»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
151 213	151 213	100	123 994	82	123 846	125 851	30.11.18	81	6 477	4

Ход строительства: Не завершены фасадные работы, шпатлевка стен, потолков. Не начаты работы по установке межкомнатных дверей, по оклейке стен обоями, укладке линолеума



425-кв. ж/д №8-8 с нежилыми помещениями в ж/р "Салават Купере"

18

Заказчик: МКУ «УКСиР ИК МО г. Казани»

Подрядчик: ООО «СМК «Ак таш»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
892 641	892 641	100	624 849	70	544 285	797 407	30.11.18	120	35 706	4

Ход строительства: Запуск отопления не осуществлен. Завершены работы по оштукатуриванию стен, устройству стяжки полов. В стадии завершения работы по устройству керамогранита в МОП и монтажу вентилируемого фасада



120-кв. ж/д, поз.3, мкр. 34 г.Нижнекамск (с наружными инженерными сетями)

19

Заказчик/подрядчик: ООО «ЖИК-НК»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
238 935	215 041	90	198 316	83	159 005	238 932	28.12.18	63	11 366	5,0

Ход строительства: Не завершены работы по чистовой отделке стен, укладке линолеума, установке входных квартирных дверей, внутреннему газоснабжению, не завершен монтаж витражных конструкций на 2 секциях.



3 индивидуальных жилых дома по ул. Г.Тукая, с.Новошешминск

Заказчик: ГКУ ГИСУ

Подрядчик: ИП «Сабилов Ш.Ш.»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
5 243,24	5 243,24	100	2 936,21	56	3 251	3 251	31.10.18	12	157	3

Ход строительства: низкие темпы производства работ. Выполняются работы по устройству внутренних перегородок, разводка системы отопления, водоснабжения, электроснабжения



3 индивид. ж/д по ул. по ул.Дружбы, д.10, д.11, д.18 с. Ибраево Каргали, Черемшанский район

Заказчик: ГКУ ГИСУ

Подрядчик: ООО «ТатНефтеПромСтрой»



Договорная стоимость	Техническая готовность				Предъяв. по КС	Оплата	Срок ввода по графику	Кол-во рабочих	Выработка за 2 недели	
	По графику		По опер. данным						тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%						
5 243,24	5 243,24	100	2 936,21	56	3 251	3 251	31.10.18	12	157	3

Ход строительства: Не завершены работы по штукатурке стен, выполняется монтаж системы газоснабжения, разводка системы отопления, водоснабжения. Не начата чистовая отделка, укладка линолеума



Арендное жилье *введен в эксплуатацию*



118-кв. жилой дом № 17-2 кв.5 г. Иннополис Верхнеуслонского МР
Подрядчик – ООО ПСК «Ак Барс Строй»



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
В-Услонский, Иннополис, кв. 5 (17-3) – 1 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	90%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	88%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 9 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	85%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 9 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Татнефтепромстрой» «Строймонтажком»	77%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 3 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров»	64%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Высокая степень готовности объектов (70-100%)
Всего по РТ		3	5	3
1	Альметьевский	1	3	1
2	г. Казань	1	1	1
3	г. Наб.Челны	1	1	1



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выстав- лено для выбора	Из них:					Выстав- лено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Засе- лено				Право ГЖФ	Право РТ	Засе- лено
ИТОГО по РТ		297							199	169	169
1	Азнакаевский	18				11	Лаишевский	21			
2	Алексеевский	2				12	Мамадышский	2	1	1	1
3	Алькеевский	7	7	7	7	13	Нижнекамский	55	24	24	24
4	Апастовский	2	2	2	2	11	Новошешминский	2	2	2	2
5	Арский	2	2			15	Пестречинский	10	10	10	10
6	Бугульминский	13	13	13	13	16	Спасский	21	21	21	21
7	Высокогорский	1				17	Тукаевский	2	1	1	1
8	Елабужский	14	14	12	12	18	Тюлячинский	1	1	1	1
9	Зеленодольский	5	5	5	5	19	Чистопольский	39	16	16	16
10	Кам.-Устьинский	5	5	5	5	20	г. Казань	74	74	49	49
						21	г.Наб.Челны	1	1		



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

26

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					06.12.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Актанышский	4	4	4	4	
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	5	
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	1	
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	7	+1
12	Кукморский	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	46	+2



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

27

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					06.12.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	2	
14	Менделеевский	2	2	2	2	
15	Муслюмовский	1	1	1	1	+1
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	1	
20	Тукаевский	1	1	1	1	
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
ИТОГО		46	46	46	46	+2



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Бавлинский	1	1	8	Нижнекамский	11	11
3	Бугульминский	1	1	9	Нурлатский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Сабинский	2	2
5	Елабужский	1	1	11	Ютазинский	1	1
6	Зеленодольский	1	1	12	г.Н.Челны	16	17
				13	г.Казань	30	30
ИТОГО						69	69



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	2	2		2		2	+1
8	г.Казань	4	4	+1	4	+1	4	+1
ИТОГО по РТ		15	15	+1	15	+1	15	+2



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Актанышский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	1	1		1	+1	1	+1
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	
8	Елабужский	1	1		1		1	
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		2		2	
11	г.Н.Челны	3	3		3	+1	3	+1
12	Нижнекамский	1	1		1		1	
13	г.Казань	13	13		13	+2	13	+2
ИТОГО		28	28		28	+4	28	+4



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка
1	Бавлинский	1	1		0	0	0	0
2	Буинский	2	2		1	0	1	0
3	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
4	К.-Устьинский	1	1		1		1	
ИТОГО		5	5	+1	3	0	3	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка	06.12.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	5	X	X	X	X	5	
		Жилое помещение	3	3		1		1	+1
ИТОГО			10	3		1		8	+1



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Набережные Челны 117-кв. дом №84 по ул.Нур Баян
Застройщик – ООО «УКС Камгэсэнергострой»



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

34



г. Елабуга 177-кв. дом по ул.Автомобилистов в мкр. 4-5
Застройщик – ООО «Домкор»



Многоквартирное инвестиционное жилье

35

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		12	12
1	Бавлинский	1	1
2	г.Наб.Челны	5	5
3	г.Казань	6	6



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 170	7 995	175



Долевое строительство

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	99%
2	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	94%
Всего по РТ			8,9	



Сельские клубы

38

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	92,3	99,5	1,0
1	Сабинский, с.Корсабаш	100	12 178,5	66,1	95	10,0
2	г.Казань, МФЦ с библиот. п.Константиновка	300	16 883,2	76,2	95	8,0
3	Атнинский, с.Коморгузя	200	14 028,1	88,8	100	1,0
4	Мензелинский, п.совхоза им.Воровского	50	6 653,2	88,7	100	-
5	Нурлатский, д.Салдакаево	50	6 653,2	82,0	100	-
6	Алексеевский, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	90,0	100	-
7	Азнакаевский, д.Якты-Куль	50	6 653,2	95,0	100	-
8	Спасский, с.Измери	50	6 653,2	88,5	100	-
9	Агрызский, с.Салауши	100	12 178,5	89,9	100	-
10	Ютазинский, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	93,0	100	-



Сельские клубы

39

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	92,3	99,5	1,0
11	Елабужский, с.Большое Елово	50	6 653,2	91,4	100	1,0
12	Новошешминский, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	91,9	100	-
13	Арский, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	94,1	100	-
14	Мамадышский, с.Зюри	200	14 028,1	95,8	100	-
15	Сабинский, д.Тнекеево	50	6 653,2	96,3	100	1,0
16	Тетюшский, с.Бакрчи	50	6 653,2	96,3	100	-
17	Алькеевский, с.Старые Матаки	100	12 178,5	96,7	100	-
18	Актанышский, с.Такталачук	200	14 028,1	99,8	100	-
19	Бавлинский, д.Муртаза	50	6 653,2	99,8	100	-
20	Лаишевский, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	100	100	-



Сельские клубы

40

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	2 700	267 799,40	92,3	99,5	1,0
21	Кайбицкий, с.Большое Русаково	100	12 178,5	100	100	-
22	Дрожжановский, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	100	100	-
23	Арский, с.Средние Вережи	50	6 653,2	100	100	-
24	Заинский, с.Карманово	50	6 653,2	100	100	-
25	Кукморский, с.Старая Кня	50	6 653,2	100	100	-
26	Аксубаевский, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	100	100	-
27	Балтасинский, с.Янгулово	200	14 028,1	100	100	-
28	Рыбно-Слободский, с.Кукеево	100	12 178,5	100	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

41

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	99,9
1	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	99
2	г.Казань	9 000	100	100
3	г.Нижнекамск	500	100	100
4	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	100
5	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	100
6	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	100
7	Чистопольский, г.Чистополь	250	100	100
8	Агрызский, г.Агрыз	500	100	100
9	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	100
10	Актанышский, с.Актаныш	500	100	100
11	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	100
12	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	100
13	Арский, г.Арск	500	100	100
14	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	100



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

42

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	29 991,0	100	99,9
15	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	100
16	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	100
17	Буинский, г.Буинск	1000	100	100
18	Заинский, г.Заинск	1 500	100	100
19	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	100
20	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	100
21	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	100
22	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	100
23	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	100
25	Спасский, г.Болгар	500	100	100
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	100
27	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

43

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	95,7
1	г.Казань	1 500	100	66,6
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	68,4
3	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	86,0
4	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	98,0
5	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	99,7
6	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	100
7	Буинский, г.Буинск	800	100	100
8	Арский, г.Арск	900	100	100
9	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	100
10	Агрызский, г.Агрыз	700	100	100
11	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
12	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	100



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

44

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	19 994,0	100	95,7
13	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	100
14	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	100
15	Заинский, г.Заинск	400	100	100
16	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	100
19	Сармановский, с.Сарманово	350	100	100



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	Принято КС-2, %
	ИТОГО	42 282,0	100	99,2
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	100	92,4
2	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	100	100
3	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	100	100
4	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	100	100
5	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	100	100
6	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	100	100
7	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	100	100
8	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	100	100
9	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	100	100
10	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	100	100



Фельдшерско-акушерские пункты



Алексеевский муниципальный район, с. Степная Шентала
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

47

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Азнакаевский, Маняузский				
2	Актанышский, Азякульский				
3	Алексеевский, Степношенталинский				
4	Алькеевский, Аппаковский				
5	Альметьевский, Бутинский				
6	Апастовский, Деушевский				
7	Арский, Старо-Чурилинский				
8	Балтасинский, Мельничный				
9	Буинский, Аксунский				
10	Высокогорский, Казакларский				
11	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
12	Заинский, Бухарайский				
13	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
14	Менделеевский, Енабердинский				
15	Мензелинский, Гулюковский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

48

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
16	Нижнекамский, Больше-Атинский				
17	Новошешминский, Акбуринский				
18	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
19	Рыб.-Слободский, Масловский				
20	Тетюшский, Беденьговский				
21	Тукаевский, Старогардалинский				
22	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
23	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
24	Ютазинский, Старо-Уруссинский				
25	Аксубаевский, Тахталинский				
26	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				
27	Елабужский, Старо-Куклюкский				
28	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
29	Сармановский, Рантамакский				
30	Бугульминский, Батырский				

*- выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

49

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
31	Кукморский, Нижне-Куморский				
32	Верх.-Услонский, Печищинский				
33	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
34	Мамадышский, Большешиинский				
35	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
36	Атнинский, Комургузинский				
37	Агрызский, Девятернинский				
38	Лаишевский, Карадулинский				
39	Кайбицкий, Федоровский				
40	Сабинский, Туктарский				
41	Чистопольский, Муслюмкинский				
42	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
43	Спасский, Кимский				
44	г.Казань, Борисковский				

*- выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

50

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Модуль	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Лаишевский				
3	Нижнекамский				
4	Чистопольский				
5	Елабужский				
6	Кайбицкий				
7	Высокогорский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

*- выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

51

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	68 174,13	100	83,9
1	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	100	25,0
2	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	100	85,7
3	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	100	87,0
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	100	93,7
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	100	96,2
6	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	100	100
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	100	100



Универсальные спортивные площадки

52

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	99,3
1	Аксубаевский	3	100	89,3
2	г.Казань	15	100	91,1
3	Нурлатский	2	100	95,8
4	Елабужский	2	100	97,6
5	Сабинский	3	100	98,1
6	Муслюмовский	3	100	98,7
7	Алексеевский	2	100	99,2
8	Рыб.-Слободский	3	100	99,2
9	Чистопольский	2	100	99,3
10	Нижнекамский	4	100	100
11	Мензелинский	2	100	100
12	Алькеевский	3	100	100



Универсальные спортивные площадки

53

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	99,3
13	Мамадышский	1	100	100
14	г.Наб. Челны	6	100	100
15	Спасский	2	100	100
16	Агрызский	2	100	100
17	Актанышский	1	100	100
18	Альметьевский	3	100	100
19	Апастовский	1	100	100
20	Арский	2	100	100
21	Атнинский	2	100	100
22	Бавлинский	1	100	100
23	Балтасинский	3	100	100
24	Бугульминский	2	100	100
25	Буинский	2	100	100



Универсальные спортивные площадки

54

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	99,3
26	Верх.-Услонский	3	100	100
27	Высокогорский	2	100	100
28	Дрожжановский	3	100	100
29	Заинский	2	100	100
30	Зеленодольский	5	100	100
31	Кайбицкий	2	100	100
32	Кам.-Устьинский	2	100	100
33	Кукморский	2	100	100
34	Лаишевский	2	100	100
35	Лениногорский	2	100	100
36	Новошешминский	3	100	100
37	Пестречинский	1	100	100
38	Сармановский	1	100	100
39	Тетюшский	2	100	100



Универсальные спортивные площадки

55

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Общее СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	96 из 97	100	99,3
40	Тукаевский	2	100	100
41	Тюлячинский	3	100	100
42	Черемшанский	1	100	100
43	Ютазинский	3	100	100
44	Менделеевский	4	100	100
45	Азнакаевский	3	100	100



Строительство блочных модульных лыжных баз

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Принято КС-2, %
	ИТОГО	111 349,5	100	78,41
1	Алексеевский	6 959,30	100	0
2	Арский	6 959,30	100	0
3	Аксубаевский	6 959,30	100	73,5
4	Нижнекамский	6 959,30	100	78,6
5	Кайбицкий	6 959,30	100	78,5
6	Актанышский	6 959,30	100	79,5
7	Тетюшский	6 959,30	100	79,6
8	Лаишевский	6 959,30	100	79,7
9	Бугульминский	6 959,30	100	96,4
10	Черемшанский	6 959,30	100	97,3
11	Лениногорский	6 959,30	100	97,5
12	Азнакаевский	6 959,30	100	97,5
13	Балтасинский	6 959,30	100	100
14	Елабужский	6 959,30	100	100
15	Зеленодольский	6 959,30	100	100
16	Буинский	6 959,30	100	100



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %
	ИТОГО		1 135 207,35	100
1	Апастовский	ООО «Фортэкс»	140 899,67	100
2	Атнинский	ООО «Фортэкс»	139 249,67	100
3	Верхнеуслонский	ООО «Фортэкс»	145 369,67	100
4	Нижнекамский	ООО «Евростиль»	142 739,67	100
5	Мамадышский	ООО «Фортэкс»	152 109,66	100
6	Пестречинский	ООО «Фортэкс»	139 009,67	100
7	Тукаевский	ООО «Евростиль»	137 389,67	100
8	Тюлячинский	ООО «Фортэкс»	138 439,67	100



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %
	ИТОГО		517 002,95	100
1	Алексеевский	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,84	100
2	Апастовский	ООО «Стройсервис»	92 905,85	100
3	Дрожжановский	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	100
4	Лаишевский, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	100
5	Черемшанский	ООО «НЭО СТРОЙ»	110 802,56	100



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 07.12.2018**

59

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 724 911,40	24 086 939,65	78,40	0,99	6 637 971,75
1	Верхнеуслонский	1 133 223,59	487 359,21	43,01	0,00	645 864,38
2	Менделеевский	129 482,09	73 264,37	56,58	0,00	56 217,71
3	Наб.Челны	2 175 346,86	1 541 984,89	70,88	0,50	633 361,97
4	Казань	12 668 600,28	9 140 781,51	72,15	2,40	3 527 818,77
5	Кукморский	231 117,57	172 287,17	74,55	0,88	58 830,40
6	Елабужский	648 326,88	488 764,52	75,39	1,06	159 562,36
7	Высокогорский	588 487,54	444 844,70	75,59	1,31	143 642,84
8	Тукаевский	214 522,03	163 928,11	76,42	0,83	50 593,92
9	Алексеевский	178 967,31	137 759,84	76,97	0,00	41 207,47
10	Аксубаевский	121 668,12	93 851,59	77,14	0,00	27 816,52
11	Пестречинский	228 095,84	181 268,34	79,47	5,68	46 827,50
12	Нурлатский	187 963,08	151 163,75	80,42	1,02	36 799,33
13	Р.-Слободский	94 672,04	76 595,46	80,91	1,07	18 076,58
14	Муслюмовский	104 016,01	86 428,83	83,09	3,33	17 587,18
15	Актанышский	218 611,35	182 701,64	83,57	1,63	35 909,71



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 07.12.2018**

60

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 724 911,40	24 086 939,65	78,40	0,99	6 637 971,75
16	Тюлячинский	77 620,50	65 403,75	84,26	8,56	12 216,75
17	Сабинский	315 167,74	266 016,65	84,40	0,00	49 151,09
18	Лениногорский	688 511,43	585 897,44	85,10	0,51	102 613,98
19	Чистопольский	976 165,59	836 935,27	85,74	0,00	139 230,32
20	Арский	344 487,87	296 243,45	86,00	10,75	48 244,42
21	Спасский	155 466,48	134 755,63	86,68	0,00	20 710,84
22	Нижнекамский	2 619 810,34	2 283 172,39	87,15	0,00	336 637,95
23	Мамадышский	318 383,83	281 031,54	88,27	0,00	37 352,29
24	Зеленодольский	1 328 107,53	1 197 706,60	90,18	0,00	130 400,92
25	Балтасинский	241 443,75	217 846,60	90,23	1,67	23 597,15
26	Азнакаевский	634 063,66	580 746,97	91,59	0,00	53 316,69
27	Дрожжановский	106 302,37	97 563,94	91,78	0,00	8 738,43
28	Агрызский	69 778,18	64 482,03	92,41	1,74	5 296,16
29	Буинский	206 955,36	193 030,22	93,27	0,08	13 925,14
30	Тетюшский	187 461,74	175 055,28	93,38	0,00	12 406,46



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 07.12.2018**

61

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 724 911,40	24 086 939,65	78,40	0,99	6 637 971,75
31	Атнинский	75 927,54	70 971,44	93,47	0,49	4 956,10
32	Лаишевский	385 230,03	360 721,92	93,64	0,15	24 508,11
33	Новошешминский	90 214,18	85 091,83	94,32	0,30	5 122,35
34	Бугульминский	451 697,61	427 289,26	94,60	0,20	24 408,35
35	Мензелинский	175 574,84	166 377,19	94,76	3,04	9 197,64
36	Кайбицкий	73 868,54	70 239,91	95,09	0,46	3 628,63
37	Апастовский	116 365,27	111 292,05	95,64	0,09	5 073,22
38	Черемшанский	238 063,24	228 212,23	95,86	3,23	9 851,01
39	Заинский	201 194,08	193 550,52	96,20	0,68	7 643,56
40	Алькеевский	95 393,40	92 038,70	96,48	1,86	3 354,70
41	Ютазинский	194 125,68	187 739,89	96,71	0,00	6 385,80
42	Сармановский	237 171,60	229 528,95	96,78	0,55	7 642,65
43	Альметьевский	950 544,55	922 683,54	97,07	0,00	27 861,01
44	Бавлинский	135 446,17	132 968,11	98,17	0,00	2 478,06
45	Камско-Устьинский	111 267,73	109 362,39	98,29	0,00	1 905,34



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 07.12.2018**

62

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 214,42	7 868 357,64	71,76	1,60	3 095 856,78
1	Казань	2 389 668,84	1 195 725,84	50,04	1,93	1 193 943,00
2	Менделеевский	112 971,74	57 012,20	50,47	0,00	55 959,54
3	Н.Челны	1 394 937,01	815 093,76	58,43	0,79	579 843,25
4	Елабужский	332 711,12	200 663,13	60,31	0,17	132 047,99
5	Чистопольский	354 664,35	221 606,72	62,48	0,61	133 057,63
6	Нижнекамский	546 662,49	362 987,71	66,40	0,08	183 674,78
7	Кукморский	174 699,80	117 126,91	67,04	1,15	57 572,89
8	Сабинский	143 107,81	96 688,14	67,56	0,36	46 419,67
9	Зеленодольский	343 772,36	237 013,68	68,94	5,52	106 758,68
10	Пестречинский	156 893,13	110 155,12	70,21	8,25	46 738,01
11	Аксубаевский	92 322,02	65 525,78	70,98	0,00	26 796,24
12	Высокогорский	218 335,24	156 073,56	71,48	3,54	62 261,68
13	Тукаевский	192 599,40	142 027,57	73,74	0,00	50 571,83
14	Арский	179 507,19	132 750,16	73,95	20,63	46 757,03
15	Алексеевский	95 994,34	72 711,00	75,75	0,00	23 283,35



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 07.12.2018**

63

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 214,42	7 868 357,64	71,76	1,60	3 095 856,78
16	Мамадышский	104 660,52	80 056,79	76,49	0,00	24 603,73
17	Нурлатский	166 779,73	130 329,97	78,14	0,42	36 449,76
18	Актанышский	186 021,79	150 117,41	80,70	1,85	35 904,38
19	Дрожжановский	44 730,50	36 382,16	81,34	0,11	8 348,34
20	Тюлячинский	64 552,32	52 526,51	81,37	10,29	12 025,81
21	Рыбно- Слободский	58 549,31	48 341,64	82,57	1,73	10 207,67
22	Спасский	95 183,47	80 292,52	84,36	0,24	14 890,95
23	Муслюмовский	71 370,43	60 945,80	85,39	4,85	10 424,63
24	Верхнеуслонский	79 702,26	68 213,43	85,59	0,02	11 488,83
25	Буинский	142 357,57	128 446,86	90,23	0,11	13 910,71
26	Агрызский	54 600,40	49 335,01	90,36	0,00	5 265,39
27	Апастовский	58 308,62	53 248,93	91,32	0,17	5 059,69
28	Лаишевский	218 216,56	199 686,88	91,51	0,26	18 529,68
29	Мензелинский	110 801,40	101 652,04	91,74	0,08	9 149,35
30	Альметьевский	354 083,01	326 362,57	92,17	0,60	27 720,44



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 07.12.2018**

64

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 214,42	7 868 357,64	71,76	1,60	3 095 856,78
31	Атнинский	54 437,02	50 205,59	92,23	0,69	4 231,44
32	Тетюшский	147 094,33	136 906,81	93,07	0,00	10 187,52
33	Кайбицкий	60 501,70	56 875,99	94,01	0,56	3 625,71
34	Бугульминский	377 103,95	355 608,02	94,30	0,24	21 495,93
35	Азнакаевский	279 082,12	264 209,23	94,67	0,39	14 872,90
36	Балтасинский	173 341,32	164 560,91	94,93	0,91	8 780,40
37	Алькеевский	49 759,80	47 576,65	95,61	2,46	2 183,15
38	Ютазинский	74 688,22	71 621,75	95,89	0,00	3 066,47
39	Заинский	185 239,66	177 768,76	95,97	0,74	7 470,91
40	Новошешминский	71 029,71	68 252,30	96,09	0,38	2 777,41
41	Бавлинский	69 515,23	67 085,73	96,51	0,07	2 429,50
42	Черемшанский	186 362,70	180 518,81	96,86	3,63	5 843,89
43	Лениногорский	445 889,24	432 212,44	96,93	0,46	13 676,80
44	Сармановский	207 206,03	202 218,48	97,59	0,63	4 987,55
45	Камско-Устьинский	44 198,66	43 636,36	98,73	0,00	562,30



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 07.12.2018**

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 268 171,28	94,81	1,43	69 431,72
1	Муслюмовский	32 645,58	25 483,03	78,06	0,00	7 162,55
2	Рыбно-Слободский	36 122,73	28 253,82	78,22	0,00	7 868,91
3	Балтасинский	68 102,43	53 285,69	78,24	3,59	14 816,74
4	Сабинский	24 762,29	22 030,87	88,97	5,31	2 731,42
5	Казань	62 812,00	55 941,39	89,06	8,28	6 870,61
6	Бугульминский	30 849,06	27 942,35	90,58	0,00	2 906,71
7	Высокогорский	42 079,72	38 297,52	91,01	0,00	3 782,20
8	Сармановский	29 965,57	27 310,47	91,14	0,00	2 655,10
9	Верхнеуслонский	34 250,54	31 273,14	91,31	0,00	2 977,40
10	Алексеевский	17 739,28	16 353,92	92,19	0,00	1 385,36
11	Набережные Челны	36 955,00	34 368,39	93,00	0,00	2 586,61
12	Алькеевский	14 539,00	13 552,24	93,21	3,78	986,76
13	Камско-Устьинский	19 808,94	18 465,90	93,22	5,08	1 343,04
14	Тетюшский	40 367,40	38 148,46	94,50	0,00	2 218,94
15	Атнинский	16 963,71	16 239,04	95,73	0,00	724,67



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 07.12.2018**

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 268 171,28	94,81	1,43	69 431,72
16	Лаишевский	18 703,18	17 939,06	95,91	0,00	764,12
17	Кукморский	21 316,42	20 563,37	96,47	0,00	753,05
18	Аксубаевский	29 346,09	28 325,81	96,52	4,31	1 020,28
19	Арский	33 479,54	32 351,92	96,63	0,00	1 127,62
20	Новошешминский	11 786,23	11 432,89	97,00	0,00	353,34
21	Зеленодольский	35 193,84	34 303,45	97,47	0,00	890,40
22	Азнакаевский	17 588,42	17 250,14	98,08	0,53	338,28
23	Нурлатский	21 183,35	20 833,78	98,35	5,76	349,57
24	Тюлячинский	11 990,69	11 799,74	98,41	0,00	190,94
25	Менделеевский	16 510,34	16 252,17	98,44	0,00	258,17
26	Чистопольский	22 985,99	22 665,61	98,61	6,92	320,39
27	Мамадышский	83 681,55	82 734,68	98,87	0,00	946,87
28	Заинский	15 954,41	15 781,77	98,92	0,00	172,65
29	Альметьевский	19 741,26	19 600,69	99,29	0,00	140,57
30	Пестричинский	19 011,57	18 922,08	99,53	0,00	89,49



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 07.12.2018**

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 268 171,28	94,81	1,43	69 431,72
31	Елабужский	33 406,75	33 254,38	99,54	0,00	152,38
32	Дрожжановский	58 019,01	57 784,20	99,60	0,00	234,81
33	Бавлинский	12 343,73	12 295,18	99,61	0,00	48,55
34	Мензелинский	20 609,32	20 561,03	99,77	0,00	48,29
35	Агрызский	15 177,78	15 147,02	99,80	8,00	30,77
36	Лениногорский	29 098,62	29 042,99	99,81	4,98	55,63
37	Тукаевский	21 922,63	21 900,54	99,90	8,13	22,09
38	Черемшанский	35 970,84	35 946,61	99,93	0,00	24,23
39	Нижнекамский	23 340,00	23 324,68	99,93	0,00	15,32
40	Апастовский	23 184,10	23 170,57	99,94	0,00	13,53
41	Ютазинский	56 865,75	56 842,04	99,96	0,00	23,72
42	Актанышский	16 649,80	16 644,48	99,97	0,00	5,33
43	Спасский	26 613,89	26 606,91	99,97	0,00	6,98
44	Буинский	64 597,79	64 583,36	99,98	0,00	14,43
45	Кайбицкий	13 366,84	13 363,92	99,98	0,00	2,92



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 07.12.2018**

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 423 093,98	14 950 410,72	81,15	0,57	3 472 683,26
1	Верхнеуслонский	1 019 270,79	387 872,64	38,05	0,00	631 398,15
2	Лениногорский	213 523,57	124 642,01	58,37	0,00	88 881,56
3	Новошешминский	7 398,24	5 406,64	73,08	0,00	1 991,60
4	Алексеевский	65 233,69	48 694,93	74,65	0,00	16 538,76
5	Черемшанский	15 729,71	11 746,82	74,68	5,83	3 982,89
6	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	0,00	77 598,96
7	Казань	10 216 119,44	7 889 114,28	77,22	2,47	2 327 005,16
8	Спасский	33 669,12	27 856,21	82,74	0,00	5 812,91
9	Азнакаевский	337 393,12	299 287,60	88,71	0,00	38 105,52
10	Елабужский	282 209,01	254 847,01	90,30	2,25	27 362,00
11	Мамадышский	130 041,76	118 240,06	90,92	0,00	11 801,70
12	Нижнекамский	2 049 807,85	1 896 860,00	92,54	0,00	152 947,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 07.12.2018

69

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 423 093,98	14 950 410,72	81,15	0,57	3 472 683,26
13	Наб.Челны	743 454,85	692 522,74	93,15	0,00	50 932,11
14	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	0,00	3 295,61
15	Дрожжановский	3 552,86	3 397,58	95,63	1,35	155,28
16	Лаишевский	148 310,30	143 095,99	96,48	0,00	5 214,31
17	Зеленодольский	949 141,32	926 389,47	97,60	0,12	22 751,85
18	Кукморский	35 101,35	34 596,89	98,56	0,11	504,46
19	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	0,00	5 852,30
20	Алькеевский	31 094,60	30 909,81	99,41	0,00	184,79
21	Арский	131 501,13	131 141,36	99,73	0,00	359,77
22	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	0,00	5,71
23	Бавлинский	53 587,21	53 587,21	100,00	0,00	0,01
24	Актанышский	15 939,75	15 939,75	100,00	0,84	0,00



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 07.12.2018**

70

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 423 093,98	14 950 410,72	81,15	0,57	3 472 683,26
25	Альметьевский	576 720,28	576 720,28	100,00	0,00	0,00
26	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00	0,00
27	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00	0,00
28	Камско-Устьинский	47 260,13	47 260,13	100,00	0,82	0,00
29	Мензелинский	44 164,12	44 164,12	100,00	11,87	0,00
30	Пестречинский	52 191,14	52 191,14	100,00	0,00	0,00
31	Сабинский	147 297,64	147 297,64	100,00	0,00	0,00
32	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00	0,00

В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 06.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	687,9	533,8	154,1	487,3	200,6	71%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	106,6	19,8	84%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 06.12.2018, млн. рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн. рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	20,1	0,4	98%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	8,6	1,1	89%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	393,0	190,4	67%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	2,6	1,9	0	4,5	0%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 06.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	186,6	60,4	76%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	590,4	539,1	52%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	231,1	627,7	27%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 06.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	13,7	10,1	58%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	6,7	1,8	79%



Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 07.12.2018

Всего 40 программ

**Требуют утверждения
распоряжением и постановлением Кабинета
Министров РТ – 29 программ**

В настоящее время:

- утверждены распоряжения по 10 программам;
- по 7 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 6 программам проекты РКМ РТ находятся на межведомственном согласовании;
- по 6 программам формируются перечни объектов.



Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	от 29.10.2018 №2823-р
2	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	от 01.11.2018 №2892-р
3	Капремонт сети подростковых клубов	от 13.11.2018 №2968-р
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	от 16.11.2018 №2985-р
5	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	от 16.11.2018 №2992-р
6	Капитальный ремонт молодежных центров	от 20.11.2018 №3022-р
7	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	от 03.12.2018 № 3225-р



Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
8	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	от 03.12.2018 № 3224-р
9	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	от 01.12.2018 № 3218-р
10	Строительство силосно-сенажных траншей	от 01.12.2018 № 3222-р



Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
11	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Перечень формируется

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
12	Капремонт зданий подведомственных МВД по РТ	По представленному МВД РТ перечню ГКУ ГИСУ РТ ведется проверка сметной документации



Министерство образования и науки Республики Татарстан

79

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минэкон-ки РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
13	Капитальный ремонт объектов образования	+	-	-	-	-			Проект РКМ РТ от 03.12.2018 согл-7359890-4
14	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	-	-	-	-			Проект РКМ РТ от 03.12.2018 согл-7357444-6



Министерство спорта Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
15	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	+	+	Вх. №61138 от 23.10.2018	Проект РКМ РТ от 02.10.2018 согл-7145210-4

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
16	Доступная среда	На рассмотрении в КМ РТ. Вх.№65863 от 15.11.2018




№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 06.12.2018 согл-7110370-2
18	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 07.12.2018 согл-7376744-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
19	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх. №63472 от 02.11.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178109-1
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	-	+	+	Вх. №05/2-6935 01.12.2018	Проект РКМ РТ от 05.10.2018 согл-7157486-3





Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

84

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
23	Восстановление освещения	+	+	-	+	+	Вх. №60100 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
24	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	Вх. №60032 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
25	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	-	+	+	Вх. № 70285 от 05.12.2018	Проект РКМ РТ от 04.10.2018 согл-7154425-2
26	Водообеспечение	+	+	-	-	-		Проект РКМ РТ от 05.12.2018 согл-7366727-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечания
27	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	Перечень формируется
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	
29	Развитие общественных пространств	



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2019 год

86

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2018 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
37	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
38	Инвестиционное многоэтажное жилье		
39	Малоэтажное жилое строительство		
40	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

87

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 15.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
1	Камско-Устьинский	61	3	58
2	Зеленодольский	31	0	31
3	Нижнекамский	31	7	24
4	Мензелинский	29	6	23
5	Альметьевский	20	0	20
6	Пестречинский	25	8	17
7	Менделеевский	16	0	16
8	Балтасинский	14	0	14
9	Елабужский	10	0	10
10	г. Казань	8	0	8
11	Ютазинский	6	0	6
12	г. Наб. Челны	6	0	6
13	Лаишевский	7	3	4
14	Буинский	8	6	2

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

88

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 15.12.2018г.		
		Договоры аренды		
		Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
15	Бугульминский	2	0	2
16	Тетюшский	2	0	2
17	Агрызский	2	1	1
18	Бавлинский	1	0	1
19	Высокогорский	2	1	1
20	Аксубаевский	3	3	0
21	Актанышский	9	9	0
22	Кайбицкий	2	2	0
23	Сармановский	3	3	0
24	Спасский	4	4	0
25	Лениногорский	1	1	0
	Итого	303	50	253

Подписаны разрешения и договоры по 6 районам из 25
