



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа




Культура

2 программы

Иные социальные программы 5 программ



Финансирование программы на 2019 год

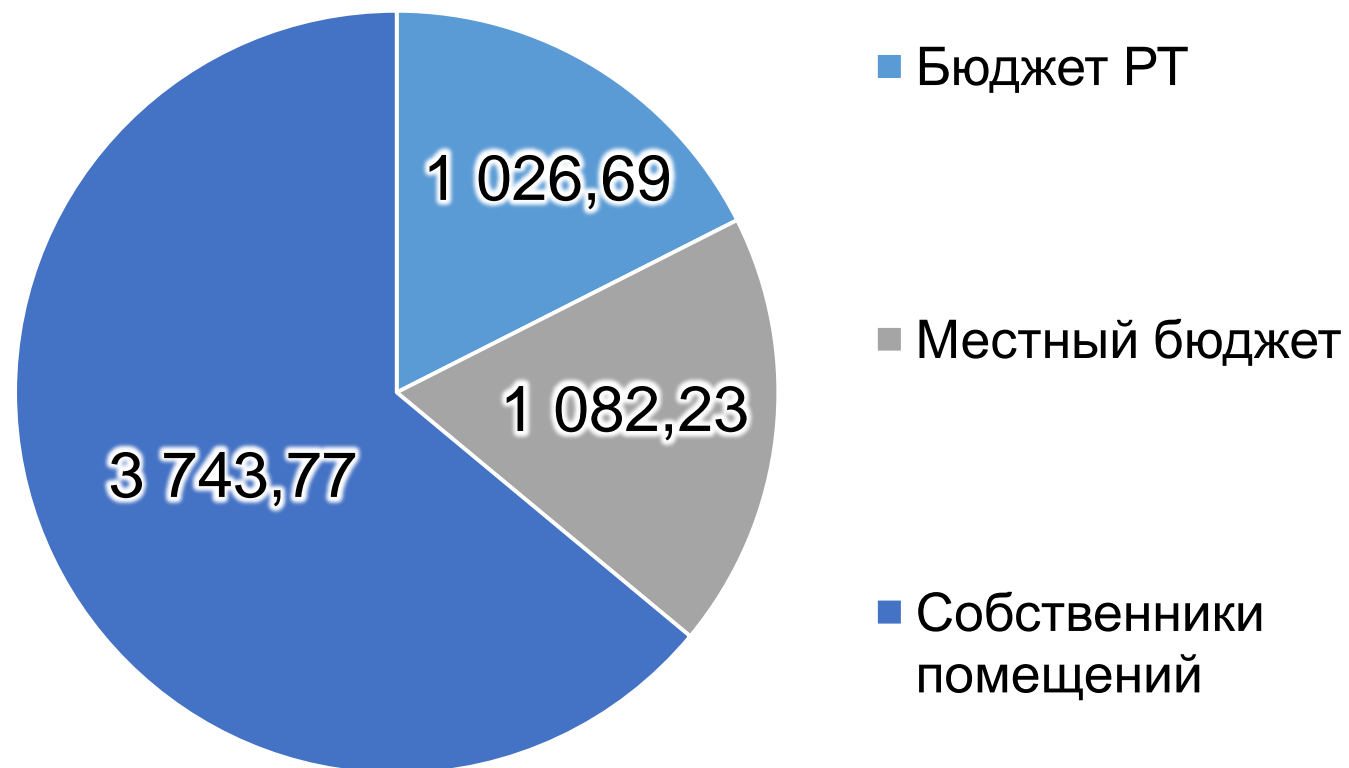

Всего: 5 852,7 млн рублей

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Алькеевский	1	1 830,56	1 721,29	94,03	19,68	0,00
2	Апастовский	5	3 741,41	3 560,40	95,16	5,31	0,00
3	Верхнеуслонский	2	5 814,53	5 125,11	88,14	0,00	0,00
4	Новошешминский	2	4 521,99	3 487,30	77,12	0,00	0,00
5	Высокогорский	19	39 540,04	35 457,66	89,68	11,59	2,06
6	Спасский	2	7 277,18	6 923,97	95,15	0,00	12,01
7	Арский	6	15 350,43	14 756,81	96,13	0,09	18,99
8	Черемшанский	1	2 342,54	2 252,45	96,15	3,90	23,51
9	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	1 093 676,01	88,60	7,32	27,79
10	Тетюшский	4	11 125,10	10 130,99	91,06	0,00	32,08
11	Балтасинский	2	4 221,64	4 065,75	96,31	2,79	32,72
12	Менделеевский	17	67 672,29	51 679,24	76,37	6,42	32,99
13	К.-Устьинский	5	7 838,76	5 956,98	75,99	5,03	33,52
14	Лаишевский	11	22 498,28	15 871,33	70,54	12,55	33,79
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	4 810 394,79	82,19	7,11	47,17

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
15	Муслюмовский	3	8 306,71	7 910,30	95,23	5,85	36,73
16	Мамадышский	3	24 481,34	23 709,71	96,85	2,11	40,06
17	Пестречинский	7	19 395,71	8 393,26	43,27	1,59	43,40
18	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	6 049,39	95,04	0,00	43,78
19	Ютазинский	13	19 565,18	18 565,00	94,89	3,51	45,44
20	Елабужский	21	160 323,73	135 621,99	84,59	1,88	45,58
21	Нурлатский	12	57 436,67	53 308,60	92,81	3,15	46,50
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	4 810 394,79	82,19	7,11	47,17
22	г. Казань	243	1 914 468,61	1 391 675,27	72,69	8,45	48,13
23	Зеленодольский	32	257 843,11	200 962,64	77,94	10,93	49,02
24	Бугульминский	47	206 892,12	170 142,08	82,24	4,66	49,67
25	Тукаевский	9	27 177,63	25 817,00	94,99	12,40	50,69
26	Нижнекамский	125	585 691,57	509 092,55	86,92	11,12	53,06
27	Альметьевский	63	438 169,83	418 040,89	95,41	3,74	55,56
28	Чистопольский	22	119 860,27	109 633,96	91,47	1,31	57,42

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% приня- тых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
29	Сабинский	2	13 606,70	10 601,96	77,92	0,32	59,65
30	Буинский	9	24 773,39	24 032,03	97,01	1,15	62,92
31	Агрызский	12	27 102,27	25 376,13	93,63	1,26	65,24
32	Кукморский	6	16 971,13	15 756,07	92,84	9,20	73,03
33	Бавлинский	10	37 414,29	35 590,94	95,13	0,44	73,77
34	Мензелинский	4	19 222,51	17 841,18	92,81	16,93	74,58
35	Азнакаевский	29	89 343,08	83 024,94	92,93	1,74	80,24
36	Сармановский	14	41 594,88	40 199,70	96,65	0,90	80,63
37	Тюлячинский	1	198,88	180,79	90,90		82,84
38	Алексеевский	5	10 067,86	9 515,57	94,51		84,51
39	Лениногорский	21	144 829,21	132 027,04	91,16	3,05	86,75
40	Заинский	15	75 556,39	69 231,09	91,63	3,79	89,28
41	Аксубаевский	5	6 865,61	6 409,86	93,36	0,29	100,00
42	Актанышский	2	9 344,56	7 019,57	75,12	5,83	100,00
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	4 810 394,79	82,19	7,11	47,17



	МО	К-во домов в программе	К-во домов с отставанием	Вид работ
1	Высокогорский	19	2	ремонт крыши, фасада
2	г. Казань	243	17	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
3	г. Наб.Челны	125	10	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
4	Зеленодольский	32	16	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
5	К.-Устьинский	5	1	ремонт фасада
6	Лаишевский	11	1	ремонт фасада
7	Новошешминский	2	1	ремонт фасада
8	Пестречинский	7	2	ремонт крыши, фасада
9	Сабинский	2	1	ремонт фасада
	Итого по РТ	942	51	



	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г.Казань	291 672,31	148 752,87	51,00
2	Зеленодольский	48 927,00	34 356,20	70,22
3	Менделеевский	12 919,00	9 689,25	75,00
4	Тукаевский	6 719,00	3 719,00	55,35
	Итого по РТ	1 082 235,99	917 808,05	84,80



№	МО	№	МО
1	Альметьевский	12	Лаишевский
2	Апастовский	13	Мамадышский
3	Арский	14	Мензелинский
4	Бавлинский	15	Набережные Челны
5	Балтасинский	16	Пестречинский
6	Верхнеуслонский	17	Рыбно-Слободский
7	Высокогорский	18	Тетюшский
8	Зеленодольский	19	Тукаевский
9	г.Казань,	20	Тюлячинский
10	Камско-Устьинский	21	Ютазинский
11	Кукморский		



Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство дошкольных образовательных организаций (29 объектов)	5 451 205,68	93,2	2,9%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (29 объектов)	537 125,3	99,1	9,0%
Капитальный ремонт коррекционных школ (9 объектов)	226 792,4	99,7	10,0%
Капитальный ремонт детских садов (112 объектов)	2 147 313,2	90,9	12,0%
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах (115 организаций)	91,5	Общеобразовательные школы - ГК заключен. Коррекционные школы - сбор сметной документации.	
Капитальный ремонт ресурсных центров (15 объектов)	657 519,2	76,4	11,9%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	93,2	2,9
1	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	196 326,41	100	3,0
2	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 274,33	100	2,8
3	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 015,10	100	2,0
4	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	199 948,41	100	2,0
5	Казань, ул.Завойского	50	50	71 974,70	100	0,5
6	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	71 818,29	100	-
7	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	126 160,55	100	2,5
8	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	216 180,47	100	-
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	216 180,47	100	0,2
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	193 473,80	100	3,5
11	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	193 473,80	100	0,5
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	193 473,80	100	0,5
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	194 446,03	100	-
14	Арский, г.Арск	140	70	126 376,30	100	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	117 834,36	100	-
16	Актанышский, с.Поисево	120	20	96 150,96	100	10



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	93,2	2,9
17	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	199 596,65	100	5,0
18	Лаишевский, с.Усады	260	120	195 578,34	100	1,3
19	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	359 985,96	100	1,1
20	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	100	6,2
21	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	27,0	1,0
22	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	196 334,56	75,2	1,0
23	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	76,0	1,0
24	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	80,6	1,0
25	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	82,6	1,0
26	Елабужский, г.Елабуга	220	120	193 473,80	84,2	4,5
27	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	91,7	3,0
28	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	196 334,56	98,8	4,6
29	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	196 334,56	99,3	2,0
30	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	340 785,96	99,7	0,2



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа» Атнинский	40 041,9	91,0	11,1
2	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули» Алькеевский	44 476,5	99,0	14,0
3	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова»	67 087,1	99,0	4,0
4	МБОУ «Верхнекибьякозинская средняя общеобразовательная школа» Тюлячинский	20 769,6	99,0	15,0
Итого по РТ		537 125,3	99,1	9,0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	Атнинский	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа» Атнинский	91,0	ООО "Арская МСО"	Кровля 85%, окна 100%, входы 99%, вн.двери 100%, сан.узлы 100%, внутр.сети 100%, фасад 50%, отмостка 100%.	В связи с проведением ЕГЭ работы начали поздно. Работает 39 человека.
2	Лаишевский	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова»	99,0	ООО "СтройКонтактЭнергоПлюс"	Кровля 100%, окна 100%, входы 100%, вн.двери 100%, сан.узлы 100%, внутр.сети 100%, фасад 50%, отмостка 100%.	Работает 25 человек.
3	Алькеевский	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули»	99,0	ООО "Арстрой"	Кровля 100%, окна 100%, входы 100%, вн.двери 100%, сан.узлы 99%, вн.снти 90%, фасад 97%, отмостка 100%.	Работает 25 человек.
4	Тюлячинский	МБОУ «Верхнекибязинская средняя общеобразовательная школа»	99,0	ООО "Колос"	Кровля 100%, входы 100%, вн.двери 100%, сан.узлы 100%, внутр.сети 95%, фасад 100%, отмостка 100%.	Работает 32 человека.



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Лаишевский	20 763,4	98,0	16,0
2	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича» Мензелинский (интернат)	6 965,0	99,0	19,0
3	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича» Мензелинский (учебный корпус)	29 206,3	99,0	27,0
Итого по РТ		226 792,4	99,7	12,2



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	Лаишевский	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	98,0	ООО "СтройКонтактЭнергоПлюс"	Кровля 100%, окна 100%, входы 100%, вн.двери 100%, сан.узлы 100%, внутр.сети 100%, фасад 99%, отмостка 100%.	Работает 25 человек.
2	Мензелинский	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича (учебный корпус)	99,0	ООО "СК Гранит"	Окна 100%, входы 75%, вн.двери 95%, сан.узлы 70%, внутр.сети 75%, фасад 85%, отмостка 100%.	В связи с обрушением стены выполняли работы по восстановлению кладки и фундамента. Работает 28 человек.
3	Мензелинский	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича (интернат)	99,0	ООО "СК Гранит"	Входы 80%, вн.двери 80%, сан.узлы 82%, внутр.сети 80%, отмостка 100%.	Слабо организованы работы. Работает 7 человек.



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	112 объектов	2 130,16	57 объектов	90,9%	12,0%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,2	54,0	16,0
2	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,2	58,0	11,0
3	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,4	61,0	11,2
4	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,5	74,0	5,0
5	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,2	74,5	9,5
6	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,0	75,0	5,0
7	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,0	75,0	8,0
8	МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» г.Казань	49 303,0	76,0	16,0
Итого по РТ		2 130 158,4	90,0	11,17



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,9	77,0	22,0
10	МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» г.Казань	51 384,4	78,0	7,0
11	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,8	79,0	8,0
12	МБДОУ «Детский сад № 19» Нурлатский муниципальный район	8 655,5	80,0	15,0
13	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» Нижнекамский	44 827,8	82,0	15,0
14	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» Нижнекамский	49 943,7	83,0	11,0
15	МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Большое Афанасово Нижнекамский	23 837,2	83,0	10,0
16	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка» Елабужский	14 549,0	84,0	37,0
Итого по РТ		2 130 158,4	90,9	12,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» г.Казань	29 606,2	84,2	18,2
18	МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский муниципальный район	14 475,0	85,0	40,0
19	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка»	19 674,4	85,0	35,0
20	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Звездочка» Елабужский муниципальный район	21 958,7	86,0	34,0
21	МБДОУ «Кошарковский детский сад «Теремок» Пестречинский муниципальный район	15 945,3	87,0	9,0
22	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Нэни куллар» Альметьевский муниципальный район	9 983,4	88,0	20,0
23	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,7	88,0	4,0
24	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,5	90,0	18,0
Итого по РТ		2 130 158,4	90,9	12 0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида»	54,0	ООО "Ирбис-Инвест"	Кровля 0%, окна 95%, входы 70%, вн. двери 8%, сан. узлы 50%, внутр. сети 40%, наружные сети 0%, фасад 36%, отмостка 14%, благоустройство (асф.) 10%, ограждения, МАФы, теневые навесы 5%.	Слабо организованы работы. Работает 5 человек
2	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 298»	58,0	ООО "СФ Кровля"	Кровля 100%, окна 95%, входы 30%, внутренние двери 0%, сан. узлы 50%, внутренние сети 77%, наружные сети 100%, фасад 29%, отмостка 100%, благоустройство (асф.) 0%, ограждения 0%, МАФы 0%, теневые навесы 2%.	Слабая организация, поздно получены проекты. Работает 17 человек
3	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида»	61,0	ООО «СКД»	Кровля 90%, окна 90%, входы 0%, внутренние двери 0%, сан. узлы 50%, внутренние сети 75%, фасад 80%, отмостка 100%, ограждения 25%, МАФы теневые, навесы 40%.	Слабо организованы работы, поздно получены проекты. Работает 15 человек
4	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»	75,0	ООО "ЦентрСервис"	Кровля 75%, окна 100%, входы 0%, вн. двери 0%, сан. узлы 20%, внутр. сети 45%, наружные сети 100%, фасад 0%, отмостка 0%	Наружные сети д.б. вынесены Водоканалом. Слабая организация работ. Необходимо доп. фин. для завершения ориентировочно 21 млн.руб. Работает 37 человек



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
5	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида»	74,0	ООО "СКД"	Кровля 85%, окна 100%, входы 0%, внутренние двери 0%, сан. узлы 0%, внутренние сети 60%, наружные сети 0%, фасад 62%, отмостка 0%, МАФы 10%	Слабо организованы работы. Работает 5 человек
6	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида»	74,5	ООО "Радуга"	Кровля 97,5%, окна 95%, входы 90%, вн. двери 45%, сан. узлы 86%, внутр. сети 78%, фасад 75%	Приступили к работам в начале июня, слабая организация работ. Работает 63 человека
7	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида»	75,0	ООО "ЦентрСервис"	Кровля 100%, окна 100%, входы 55%, вн.сети 95%, нар.сети 96%	Слабо организованы работы. Необходимо доп.финансирование. Работает 24 человека
8	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида»	76,0	ООО "Нефтехимстрой"	Кровля 100%, окна 95%, входы 50%, вн.двери 0%, сан. узлы 20%, внутр. сети 55%, нар.сети 100%, фасад 75%, отмостка 20%, благоустройство 0%, ограждения 90%	Слабо организованы работы. По фасаду нет проекта. Работает 45 человек



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных школах и коррекционных школах	97 объектов	82,26	10 объектов	30,5%	18,7%
	17 объектов	9,26	сбор сметной документации		



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	45,0	9,0
2	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	60,0	5,0
3	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	65,0	12,0
Итого по РТ		611 458,5	76,4	11,9
4	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	80,0	18,0
5	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	53 757,1	90,0	30,0
6	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 477,5	91,0	14,0
7	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	9 950,0	92,0	12,0
8	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	4 975,0	95,0	9,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	611 458,5	76,4	11,9
9	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 712,4	95,0	7,0
10	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 357,5	97,0	12,0
11	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	71 818,6	98,5	2,5



Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок
(105 объектов)
на 100 объектах – работы завершены

Строительство блочно-модульных лыжных баз
(8 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

359 327,65

96,5

3,4%

61 450,9

99,1

8,1%



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	94,4	96,5	3,4
1	Мензелинский	1 из 3	33,3	17,6	2,4
2	Тукаевский	2 из 2	100	92,8	1,0
3	Зеленодольский	3 из 3	100	99,2	26,8
4	Сабинский	3 из 3	100	99,5	12,8
5	г.Казань	15 из 15	100	100	3,51
6	Лениногорский	3 из 3	100	100	11,8
7	Менделеевский	1 из 1	100	100	2,5
8	г.Наб. Челны	7 из 7	100	100	1,9
9	Агрызский	2 из 2	100	100	1,7
10	Азнакаевский	4 из 4	100	100	-
11	Аксубаевский	1 из 1	100	100	-
12	Актанышский	1 из 1	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	94,4	96,5	3,4
13	Алексеевский	1 из 1	100	100	-
14	Алькеевский	2 из 2	100	100	-
15	Альметьевский	3 из 3	100	100	-
16	Апастовский	1 из 1	100	100	-
17	Арский	1 из 1	100	100	-
18	Атнинский	1 из 1	100	100	-
19	Бавлинский	2 из 2	100	100	-
20	Балтасинский	2 из 2	100	100	-
21	Бугульминский	2 из 2	100	100	-
22	Буинский	3 из 3	100	100	-
23	Верхнеуслонский	1 из 1	100	100	-
24	Высокогорский	3 из 3	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	94,4	96,5	3,4
25	Дрожжановский	2 из 2	100	100	-
26	Елабужский	2 из 2	100	100	-
27	Заинский	2 из 2	100	100	-
28	К.Устьинский	1 из 1	100	100	-
29	Кайбицкий	1 из 1	100	100	-
30	Кукморский	2 из 2	100	100	-
31	Лайшевский	1 из 1	100	100	-
32	Мамадышский	1 из 1	100	100	-
33	Муслюмовский	2 из 2	100	100	-
34	Нижнекамский	4 из 4	100	100	-
35	Новошешминский	1 из 1	100	100	-
36	Нурлатский	2 из 2	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	94,4	96,5	3,4
37	Пестречинский	1 из 1	100	100	-
38	Р.Слободский	1 из 1	100	100	-
39	Сармановский	2 из 2	100	100	-
40	Спасский	1 из 1	100	100	-
41	Тетюшский	3 из 3	100	100	-
42	Тюлячинский	2 из 2	100	100	-
43	Черемшанский	1 из 1	100	100	-
44	Чистопольский	3 из 3	100	100	-
45	Ютазинский	3 из 3	100	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	61 450,9	99,1	8,1
1	Менделеевский, г.Менделеевск	7 681,36	97,4	4,4
2	Чистопольский, г.Чистополь	7 681,36	99	15,1
3	Муслюмовский, с.Муслюмово	7 681,36	99	6,9
4	Пестречинский, с.Пестрецы	7 681,36	100	10,2
5	Мамадышский, г.Мамадыш	7 681,36	100	10,0
6	Бавлинский, г.Бавлы	7 681,36	100	7,0
7	Высокогорский, с.Высокая гора	7 681,36	100	7,0
8	Зеленодольский, пгт.Васильево	7 681,36	100	-



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	Аукцион ориентировочно состоится в сентябре 2019г.	
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	50,5	5,4%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(26 объектов)</i>	92 137,0	95,6	5,1%
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	88,4	24,0%



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань	24 178,5	0,0	0,0
2	Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Лаишевский	117 008,0	15,0	3,0
4	Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» Чистопольский	3 980,0	34,0	0,0
3	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» Бугульминский	169 150,0	48,0	10,0
5	Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» Зеленодольский	40 795,0	50,0	7,0
Итого по РТ		694 442,3	50,5	5,4
6	МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский	141 106,9	60,0	10,5
7	Детский оздоровительный лагерь «Факел» Новошешминский	12 437,5	65,0	5,0
8	Оздоровительный лагерь «Заречье» г.Казань	52 735,0	72,0	1,0
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань	101 758,7	85,0	5,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 527,3	70,0	0,0
2	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 756,0	85,0	4,0
3	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 671,5	88,0	3,0
4	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	9 452,5	95,0	0,0
	Итого по РТ	92 137,0	95,6	5,1
5	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 786,0	97,0	2,0
6	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 298,0	99,0	19,0
7	Подростковый клуб «Алый парус», Набережные Челны	1 393,0	99,0	0,0
8	Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны	1 393,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт зданий молодежных центров

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МБУ «Молодежный центр «Хыял» Балтасинский	12 000,0	70,0	30,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	80,0	40,0
3	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	82,0	37,0
	Итого по РТ	106 200,0	88,4	24,0
4	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский	8 800,0	96,0	6,0



Здравоохранение

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство ФАПов (45 объектов)	135 775,9	77,1	17,7%
Строительство врачебных амбулаторий (9 объектов)	95 250,1	90,9	3,8%
Капитальный ремонт объектов здравоохранения (9 объектов)	70 924,2	78,4	7,1%



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Дрожжановский, Малоаксинский				
2	Заинский, Перцовский				
3	Менделеевский, Ново-Кокшанский				
4	Нурлатский, Аксумлинский				
5	Сармановский, Альметьевский				
6	Тетюшский, Бакрчинский				
7	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
8	Черемшанский, Туйметкинский				
9	Ютазинский, Подгорный				
10	Алексеевский, Левашевский				
11	Алексеевский, Бутлеровский				
12	Апастовский, Черемшанский				
13	Апастовский, Шемяковский				
14	Елабужский, Хлыстовский				
15	Лениногорский, Старо-Иштерякский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Мамадышский, Албайский				
17	Альметьевский, Новотроицкий				
18	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
19	Азнакаевский, Сарлинский				
20	Актанышский, Казкеевский				
21	Новошешминский, Екатерининский				
22	Пестречинский, Отар-Дубровский				
23	Нижнекамский, Благодатновский				
24	Аксубаевский, Старочувадамский				
25	Сабинский, Шикшинский				
26	Тюлячинский, Максабашский				
27	Чистопольский, Четыре-Дворский				
28	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				
29	Буинский, Тингашский				
30	Агрызский, Салакушкой				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Зеленодольский, Кульбашинский				
32	Мензелинский, Кадряковский				
33	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
34	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
35	Сармановский, Шарлиареминский				
36	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
37	Балтасинский, Сырьинский				
38	Кукморский, Сардекбашский				
39	Бугульминский, Ключевский				
40	Высокогорский, Березкинский				
41	Атнинский, Ключи-Сапский				
42	Арский, Средне-Пшалымский				
43	Бавлинский, Алексеевский				
44	Кайбицкий, Хозесановский				
45	Спасский, Вожинский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский				
2	Алькеевский				
3	Аксубаевский				
4	Альметьевский				
5	Камско-Устьинский				
6	Лаишевский				
7	Зеленодольский				
8	Менделеевский				
9	Пестречинский				

Капитальный ремонт
объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	78,4	7,1
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	44,0	7,0
2	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	80,0	5,0
3	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	87,0	7,0
4	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	87,0	15,0
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	92,0	16,0
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	100,0	-
7	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100,0	-
8	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100,0	-
9	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	100,0	-



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

79,6

6,4%

392 929,2

93,6

4,8%



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	79,6	6,4
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	34,6	7,1
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	43,5	7,7
3	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	44,8	2,2
4	Нурлатский район, с. Бурметьево	100	12 911,71	45,2	3,7
5	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	58,3	8,2
6	Агрызский район, с. Шаршада	200	14 872,90	73,3	7,5
7	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,3	73,8	13,5
8	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	76,5	9,5
9	Ютазинский район, с. Байряки-Тамак	50	7 453,3	78,5	6,8
10	Высокогорский район, с. Шигали	200	14 872,9	80,8	10,5
11	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	81,2	3,4



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	79,6	6,4
12	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	84,3	7,7
13	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,90	89,2	8,8
14	Аксубаевский район, п. Мюд	100	12 911,70	94,3	18,0
15	Апастовский район, с. Сатламышево	50	7 453,34	99,3	11,5
16	Высокогорский район, с. Улля	100	12 911,70	100	-
17	Бугульминский район, с. Новое Сумароково	100	12 911,70	100	5,3
18	Заинский район, с.Бура-Кирта	50	7 453,30	100	3,0
19	Буинский район, с. Чувашские Кищаки	100	12 911,70	100	-
20	Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево	50	7 453,34	100	-
21	Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское	200	14 872,90	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Бугульминский, СДК, п.Подгорный	11 276,8	37,0	0,0
2	Елабужский, СДК, с.Большие Армалы	8 109,0	65,0	10,0
3	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 386,8	74,0	6,0
4	Спасский, СДК, с.Три Озера	11 137,0	75,0	10,0
5	Высокогорский, СДК, с.Ямашурма	3 696,0	77,0	7,0
6	Кукморский, СДК, д.Асан-Елга	4 570,9	81,0	8,0
7	Кукморский, СДК, с.Туембаш	4 062,5	83,0	10,0
8	Чистопольский, СДК, с.Кубассы	17 998,2	90,0	21,0
9	Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово	18 560,4	90,0	8,0
10	Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово	8 889,1	93,0	8,0
Итого по РТ		400 929,2	93,6	4,8
11	Зеленодольский, СДК, с.Айша	16 533,7	95,0	15,0
12	Черемшанский, СДК, с.Лашманка	9 334,4	95,0	7,0
13	Тетюшский, Районный дом культуры, г. Тетюши	27 717,0	97,0	7,0
14	Сабинский, СДК, с.Юлбат	12 203,5	98,0	8,0
15	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курнали	10 967,7	98,0	2,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	400 929,2	93,6	4,8
16	Арский район, СДК, с. Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
17	Менделеевский район, СДК, с. Старое Гришкино	12 495,1	99,0	4,0
18	Бавлинский район, СДК, с. Потапо-Тумбарла	15 134,6	99,0	2,0



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	94,2	5,7%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	99,0	3,1%
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	13,1	1,2%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	93,4	6,8%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	82,8	9,2%



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	49 220,38	94,2	5,7
1	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	78,0	8,5
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	82,9	10,9
3	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	85,7	2,7
4	Бугульминский, Зеленогорщинское СП	4 474,58	91,2	23,7
5	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	99,3	9,8
6	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	99,7	3,7
7	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	99,7	3,5
8	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	100,0	-
9	Буинский, Нижнеларатбашское СП	4 474,58	100,0	-
10	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	100,0	-
11	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	100,0	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 791,0	91,0	5,0
2	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 001,4	92,0	22,0
3	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 069,5	92,0	12,0
4	Елабужский, с.Поспелово	1 542,8	95,0	15,0
5	Зеленодольский, с.Бишня	1 789,9	95,0	20,0
	Итого по РТ	48 503,6	99,0	3,1



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
2	Апастовский, с.Шонгуты				
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
4	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
5	Сабинский, с.Кренни				
6	Сабинский, д.Елышево				
7	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
8	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
9	Пестречинский, с.Тагашево				
10	Пестречинский, с.Богородское				
11	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
12	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
13	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
14	Камско-Устьинский, д.Челны				
15	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Нурлатский, д.Абляскино				
17	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
18	Атнинский, с.Кшклово				
19	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
20	Мензелинский, с.Деуково				
21	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
22	Нижнекамский, д.Байданкино				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	1 492,5	50,0	5,0
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,7	55,0	5,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	64,0	8,0
4	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	77,0	4,0
5	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	77,0	12,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,5	81,0	3,0
7	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе»	3 480,5	86,0	7,0
Итого по РТ		117 818,0	93,4	6,8



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	87,0	17,0
9	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	2 985,0	92,0	10,0
Итого по РТ		117 818,0	93,4	6,8
10	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском муниципальном районе»	1 990,0	94,0	7,0
11	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	95,0	5,0
12	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 149,0	95,0	4,0
13	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе»	2 487,5	95,0	6,0
14	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 985,0	98,0	32,0
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 487,5	98,0	3,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 818,0	93,4	6,8
16	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	21 890,0	98,0	11,0
17	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 492,5	99,0	2,0
18	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	2 985,0	99,0	2,0
19	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 492,5	99,0	0,0
20	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе»	5 472,5	99,0	7,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	926,4	17,0	17,0
2	г.Казань, ул.Баумана, д.38/17	8 819,0	45,0	23,0
Итого по РТ		49 186,3	82,8	9,2
5	п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а	7 074,1	84,0	7,0
3	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	85,0	12,0
4	пгт.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52	2 202,3	95,0	21,0
6	пгт.Алексеевское, ул.Казакова, д.9	5 040,1	100,0	5,0
7	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 090,7	100,0	0,0
8	г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.21	2 665,6	100,0	0,0
9	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	239,4	100,0	0,0
10	г.Чистополь, ул.Л.Толстого, д.157	788,3	100,0	0,0
11	с.Черемшан, ул.Советская, д.32	1 343,2	100,0	0,0
12	с.Базарные Матаки, ул.Базарная, д.1	9 396,8	100,0	0,0
13	г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.27 а	197,0	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
3	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	3 900	100	-
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	-
8	Арский, г.Арск	500	100	-
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
10	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	-
11	Буинский, г.Буинск	3 900	100	-
12	Заинский, г.Заинск	1 000	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	100	-
15	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-
22	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	99,4	1,2
1	Агрызский, г.Агрыз	2 300	95,0	11,0
2	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	-
3	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	100	-
4	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	100	-
5	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	-
6	г.Казань	2 000	100	-
7	Кукморский, г.Кукмор	3 000	100	-
8	Актанышский, с.Актаныш	1 800	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 500	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	-
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-



Готовность объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

7 813 объектов социально-культурной сферы в т.ч.:

- ❖ 1 911 объектов здравоохранения - 93%;**
- ❖ 2 893 объекта образования - 90%;**
- ❖ 1 976 объектов культуры - 92%;**
- ❖ 187 объектов спорта - 88%;**
- ❖ 159 объектов социальная защита и центры занятости населения - 93%.**





№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	90%	93%	92%	88%	93%
1	Мензелинский	74%	87%	84%	75%	0%
2	Бавлинский	92%	82%	97%	33%	33%
3	Муслюмовский	81%	86%	84%	100%	100%
4	Кукморский	92%	52%	62%	50%	100%
5	Лениногорский	97%	80%	98%	17%	75%
6	Нурлатский	69%	67%	85%	80%	100%
7	г. Наб.Челны	96%	94%	61%	65%	100%
8	Верхнеуслонский	17%	100%	100%	100%	100%
9	Атнинский	94%	96%	74%	100%	100%
10	Рыбно-Слободский	94%	95%	79%	50%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	90%	93%	92%	88%	93%
11	Аксубаевский	74%	78%	74%	100%	100%
12	Альметьевский	81%	100%	100%	100%	50%
13	Камско-Устьинский	93%	91%	56%	50%	100%
14	Тетюшский	96%	100%	79%	67%	100%
15	Черемшанский	89%	79%	88%	100%	100%
16	Чистопольский	72%	89%	100%	100%	100%
17	Бугульминский	100%	100%	93%	71%	100%
18	Сармановский	100%	100%	98%	75%	100%
19	Спасский	93%	95%	85%	100%	100%
20	Агрызский	81%	96%	100%	100%	100%
21	Новошешминский	94%	96%	89%	100%	100%
22	Азнакаевский	100%	96%	100%	92%	98%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	90%	93%	92%	88%	93%
23	Алькеевский	99%	100%	90%	100%	100%
24	Пестречинский	94%	100%	95%	100%	100%
25	Ютазинский	100%	90%	100%	100%	100%
26	Нижнекамский	98%	100%	95%	97%	100%
27	г. Казань	97%	95%	100%	100%	100%
28	Алексеевский	94%	100%	100%	100%	100%
29	Арский	96%	100%	100%	100%	100%
30	Лаишевский	100%	96%	100%	100%	100%
31	Елабужский	94%	100%	94%	100%	60%
32	Заинский	98%	100%	99%	100%	100%
33	Менделеевский	98%	100%	100%	100%	100%
34	Зеленодольский	99%	100%	100%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	90%	93%	92%	88%	93%
35	Мамадышский	100%	100%	100%	100%	100%
36	Тукаевский	100%	100%	100%	100%	100%
37	Кайбицкий	100%	100%	100%	100%	100%
38	Сабинский	100%	100%	100%	100%	100%
39	Тюлячинский	100%	100%	100%	100%	100%
40	Актанышский	100%	100%	100%	100%	100%
41	Апастовский	100%	100%	100%	100%	100%
42	Буинский	100%	100%	100%	100%	100%
43	Дрожжановский	100%	100%	100%	100%	100%
44	Высокогорский	100%	100%	100%	100%	100%
45	Балтасинский	100%	100%	100%	100%	100%



Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

1 946	котельных	93%
3 073,5 км	тепловых сетей	95%
2 321	водозаборное сооружение	97%
294	водопроводные насосные станции	95%
16 737,6 км	водопроводных сетей	93%
3 808,2 км	канализационных сетей	84%





**Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 29 августа 2019 года**

№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	г. Казань	5351	4789	89,5%	24	Буинский	86	86	100,0%
2	Елабужский	252	232	92,1%	25	Верхнеуслонский	24	24	100,0%
3	Чистопольский	239	221	92,5%	26	Камско-Устьинский	2	2	100,0%
4	Высокогорский	15	14	93,3%	27	Кукморский	12	12	100,0%
5	Бавлинский	126	118	93,7%	28	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
6	Зеленодольский	720	678	94,2%	29	Сабинский	4	4	100,0%
7	Лаишевский	19	18	94,7%	30	Сармановский	77	77	100,0%
8	Бугульминский	592	567	95,8%	31	Тетюшский	2	2	100,0%
9	Менделеевский	120	115	95,8%	32	Тукаевский	6	6	100,0%
10	Альметьевский	831	799	96,1%	33	Алькеевский	0	0	-
11	Нурлатский	215	207	96,3%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Пестречинский	27	26	96,3%	35	Аксубаевский	0	0	-
13	Нижнекамский	951	917	96,4%	36	Апастовский	0	0	-
14	г. Наб. Челны	1313	1272	96,9%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Спасский	43	42	97,7%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Азнакаевский	310	304	98,1%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Заинский	178	175	98,3%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Лениногорский	355	352	99,2%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Агрызский	88	88	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Актанышский	2	2	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Арский	1	1	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Атнинский	1	1	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Балтасинский	3	3	100,0%	ИТОГО по РТ		11971	11160	93,2%



Предъявление **паспортов готовности** за 2019/2020гг. по состоянию на 29 августа 2019 года

ТА1ССР

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Тетюшский	90	26	28,9%	24	Менделеевский	134	129	96,3%
2	Камско-Устьинский	86	46	53,5%	25	Тукаевский	258	249	96,5%
3	Новошешминский	43	33	76,7%	26	Арский	211	205	97,2%
4	Бавлинский	198	161	81,3%	27	Нурлатский	356	346	97,2%
5	Буинский	166	138	83,1%	28	Сабинский	107	104	97,2%
6	г. Казань	5736	4785	83,4%	29	Пестречинский	347	338	97,4%
7	Чистопольский	500	419	83,8%	30	Мензелинский	168	164	97,6%
8	Бугульминский	878	770	87,7%	31	Мамадышский	136	133	97,8%
9	Рыбно-Слободский	63	57	90,5%	32	Заинский	219	216	98,6%
10	г. Наб. Челны	1366	1248	91,4%	33	Аксубаевский	110	109	99,1%
11	Нижнекамский	987	906	91,8%	34	Лениногорский	510	506	99,2%
12	Спасский	75	69	92,0%	35	Агрызский	184	184	100,0%
13	Лаишевский	229	213	93,0%	36	Актанышский	77	77	100,0%
14	Высокогорский	288	268	93,1%	37	Алексеевский	109	109	100,0%
15	Черемшанский	30	28	93,3%	38	Алькеевский	15	15	100,0%
16	Сармановский	151	141	93,4%	39	Апастовский	37	37	100,0%
17	Елабужский	460	430	93,5%	40	Атнинский	5	5	100,0%
18	Зеленодольский	935	881	94,2%	41	Верхнеуслонский	89	89	100,0%
19	Альметьевский	1008	956	94,8%	42	Дрожжановский	19	19	100,0%
20	Азнакаевский	342	326	95,3%	43	Кайбицкий	3	3	100,0%
21	Балтасинский	44	42	95,5%	44	Муслюмовский	60	60	100,0%
22	Кукморский	132	126	95,5%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Тюлячинский	24	23	95,8%	ИТОГО по РТ		17175	15379	89,5%



**Прикрепление актов проверки дымоходов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 29 августа 2019 года**

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	Тетюшский	88	0	0,0%	24	Арский	210	208	99,0%
2	г. Казань	385	172	44,7%	25	Пестречинский	320	317	99,1%
3	Лаишевский	210	136	64,8%	26	Кукморский	120	119	99,2%
4	Камско-Устьинский	84	64	76,2%	27	Нурлатский	141	140	99,3%
5	Чистопольский	261	205	78,5%	28	Лениногорский	155	154	99,4%
6	Новошешминский	43	34	79,1%	29	Агрызский	96	96	100,0%
7	г. Наб. Челны	53	44	83,0%	30	Азнакаевский	32	32	100,0%
8	Сармановский	74	64	86,5%	31	Аксубаевский	110	110	100,0%
9	Рыбно-Слободский	57	51	89,5%	32	Актанышский	75	75	100,0%
10	Бугульминский	286	261	91,3%	33	Алексеевский	109	109	100,0%
11	Альметьевский	177	162	91,5%	34	Алькеевский	15	15	100,0%
12	Бавлинский	72	66	91,7%	35	Апастовский	37	37	100,0%
13	Спасский	32	30	93,8%	36	Атнинский	4	4	100,0%
14	Балтасинский	41	39	95,1%	37	Буинский	80	80	100,0%
15	Высокогорский	273	260	95,2%	38	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
16	Елабужский	208	199	95,7%	39	Дрожжановский	19	19	100,0%
17	Тюлячинский	24	23	95,8%	40	Кайбицкий	3	3	100,0%
18	Зеленодольский	215	209	97,2%	41	Менделеевский	14	14	100,0%
19	Заинский	41	40	97,6%	42	Муслюмовский	60	60	100,0%
20	Мензелинский	168	164	97,6%	43	Нижнекамский	36	36	100,0%
21	Мамадышский	136	133	97,8%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Тукаевский	252	248	98,4%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Сабинский	103	102	99,0%	ИТОГО по РТ		5204	4619	88,8%



**Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 29 августа 2019 года**

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	385	233	60,5%	24	Агрызский	96	96	100,0%
2	Чистопольский	261	203	77,8%	25	Азнакаевский	32	32	100,0%
3	Новошешминский	43	34	79,1%	26	Аксубаевский	110	110	100,0%
4	Сармановский	74	64	86,5%	27	Актанышский	75	75	100,0%
5	г. Наб. Челны	53	47	88,7%	28	Алексеевский	109	109	100,0%
6	Рыбно-Слободский	57	51	89,5%	29	Алькеевский	15	15	100,0%
7	Бугульминский	286	261	91,3%	30	Апастовский	37	37	100,0%
8	Бавлинский	72	66	91,7%	31	Атнинский	4	4	100,0%
9	Альметьевский	177	163	92,1%	32	Буинский	80	80	100,0%
10	Спасский	32	30	93,8%	33	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
11	Балтасинский	41	39	95,1%	34	Дрожжановский	19	19	100,0%
12	Тюлячинский	24	23	95,8%	35	Заинский	41	41	100,0%
13	Высокогорский	273	262	96,0%	36	Кайбицкий	3	3	100,0%
14	Елабужский	208	200	96,2%	37	Кукморский	120	120	100,0%
15	Лаишевский	210	202	96,2%	38	Менделеевский	14	14	100,0%
16	Камско-Устьинский	84	81	96,4%	39	Муслюмовский	60	60	100,0%
17	Зеленодольский	215	209	97,2%	40	Нижнекамский	36	36	100,0%
18	Мензелинский	168	164	97,6%	41	Нурлатский	141	141	100,0%
19	Мамадышский	136	133	97,8%	42	Сабинский	103	103	100,0%
20	Арский	210	208	99,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Пестречинский	320	317	99,1%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Лениногорский	155	154	99,4%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Тукаевский	252	251	99,6%	ИТОГО по РТ		5204	4863	93,4%



Подрядчик		ООО «УКС»	
Заказчик-застройщик		ГКУ Фонд газификации РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		122,73	
		12,41- ПИР	110,32 – СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019)	0,7	0,7	100
СМР			
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019)	15,3	15,3	100
СМР			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019)	84,3	84,3	77

На сегодняшний день выполнено:

Прокладка сетей газоснабжения – 100%, сетей водоснабжения – 100%, сетей канализации – 67%, сетей электроснабжения – 100%, автодороги - 57%

15.07.2019 заключен госконтракт на сумму 41,01 млн.руб

Работает: 25 чел.



Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		152,53	
		11,96- ПИР	140,57- СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019)	1,52	1,56	102,63
СМР	1,52	1,56	102,63
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019)	17,17	17,30	100,76
СМР	17,17	17,30	100,76
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019)	93,52	93,64	100,02

По 1 этапу: прокладка наружных сетей электроснабжения -100%, прокладка наружных сетей газоснабжения - 100%, прокладка сетей водопровода - 100%, бурение 2 скважин - 100%, автодороги (в щебне) - 100%, установка 2 резервуаров - 100%, отсыпка - 100%, установка КПП - 100%; установлены в полном объеме: 3 комплектные трансформаторные подстанции, 1 распределительный пункт, 1 пункт газорегуляторный блочный, 1 пункт газорегуляторный шкафной, 1 водопроводная насосная станция; ведется прокладка наружной сети связи - 60%, благоустройство - 70%.

По 2 этапу: прокладка сетей напорной канализации-35%, прокладка наружных сетей газоснабжения-15%



Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		142,02	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019)	2,13	2,16	101,41
СМР	2,13	2,16	101,41
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019)	10,93	11,01	100,73
СМР	10,93	11,01	100,73
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019)	55,18	55,43	100,45

На сегодняшний день: монтаж охранной будки-100%, монтаж ограждения-100%, устройство дорог (основание) - 55%, газопровод среднего давления -75%, газопровод выс. давления-90%, нар. электрооснабжение-55% (ведется поставка оборудования).

Работает 25 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик		ООО «Ак таш»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		324,31	
		15,67- ПИР	308,64 - СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019)	3,02	3,06	101,32
СМР	3,02	3,06	101,32
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019)	12,07	12,17	100,83
СМР	12,07	12,17	100,83
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019)	12,98	13,08	100,77

Автодорога-3%, прокладка сетей водопровода и канализации-32%, сети ливневой канализации-42%, благоустройство (ограждение по периметру) -14%.

Работает 31 чел.
