



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа




Культура

2 программы

Иные социальные программы 5 программ



Финансирование программы на 2019 год

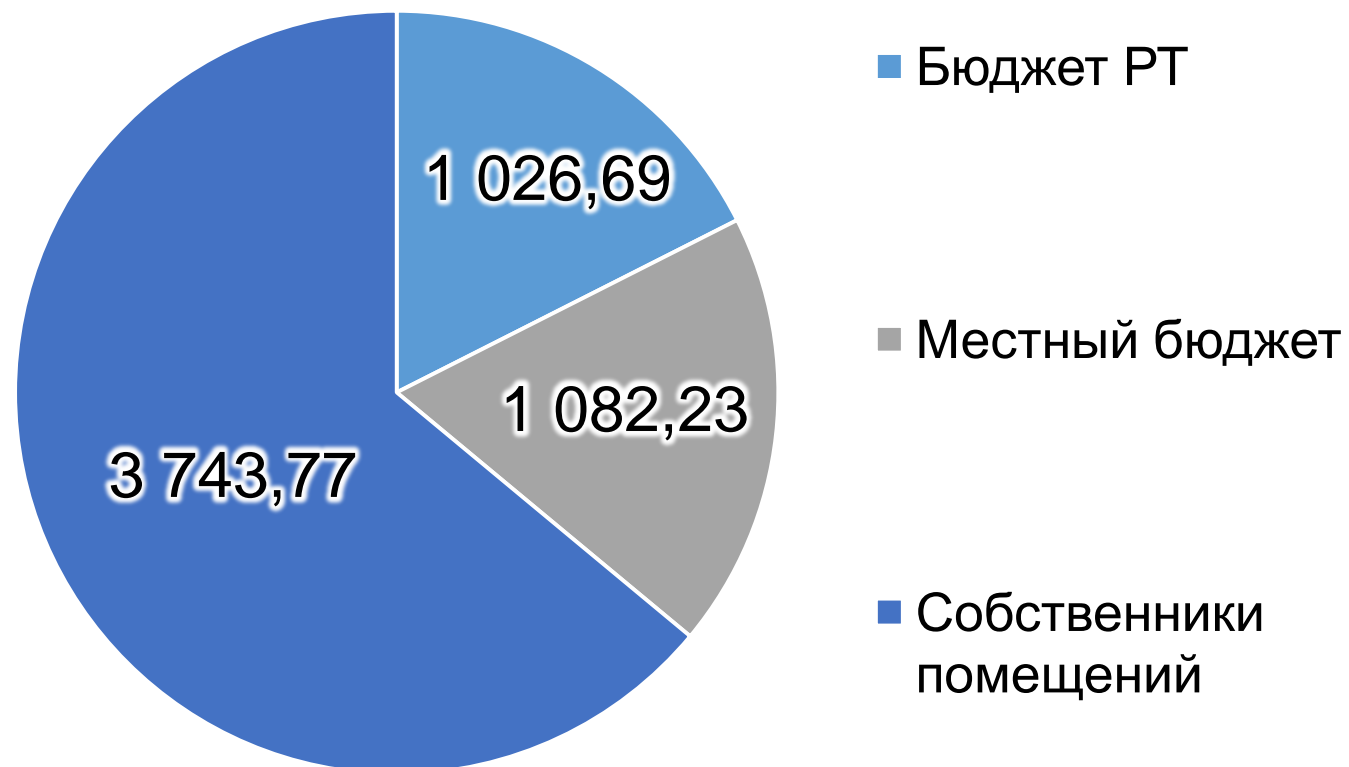

Всего: 942 МКД на 5 852,7 млн рублей



Не предоставлены технические задания и сметы
для проведения электронных аукционов, на 12.09.2019

	МО	К-во домов	Вид работ
1	г. Казань	2	ремонт подвала, замена лифта
		193	ПСД

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Алькеевский	1	1 830,56	1 721,29	94,03	0,00	0,00
2	Апастовский	5	3 741,41	3 560,40	95,16	0,00	0,00
3	Верхнеуслонский	2	5 814,53	5 558,11	95,59	7,45	0,00
4	Новошешминский	2	4 521,99	3 982,17	88,06	10,94	0,00
5	Высокогорский	19	39 540,04	36 880,78	93,27	3,60	1,98
6	Спасский	2	7 277,18	6 938,12	95,34	0,19	11,99
7	Арский	6	15 350,43	14 796,22	96,39	0,26	18,94
8	Черемшанский	1	2 342,54	2 252,45	96,15	0,00	26,86
9	Мамадышский	3	24 481,34	23 712,08	96,86	0,01	27,30
10	Балтасинский	2	4 221,64	4 065,75	96,31	0,00	32,72
11	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	1 135 131,87	91,90	3,20	38,79
12	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	6 049,39	95,04	0,00	43,78
13	Пестречинский	7	19 395,71	13 966,85	72,01	8,09	44,76
14	Зеленодольский	32	257 843,11	208 561,73	80,89	2,95	47,44
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	5 107 729,55	87,27	4,03	53,46

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
15	Менделеевский	17	67 672,29	59 619,96	88,10	11,73	48,58
16	г. Казань	243	1 914 468,61	1 490 562,18	77,86	5,17	49,66
17	Елабужский	21	160 323,73	149 571,67	93,29	8,70	52,96
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	5 107 729,55	87,27	4,03	53,46
18	Нурлатский	12	57 436,67	54 673,86	95,19	2,38	54,97
19	Сабинский	2	13 606,70	12 502,64	91,89	13,97	55,32
20	Нижнекамский	125	585 691,57	552 389,75	94,31	7,39	58,73
21	Альметьевский	63	438 169,83	419 408,39	95,72	0,31	61,81
22	Лаишевский	11	22 498,28	16 854,92	74,92	4,37	61,94
23	Бугульминский	47	206 892,12	178 967,58	86,50	4,27	62,29
24	Буинский	9	24 773,39	24 032,03	97,01	0,00	62,92
25	Агрызский	12	27 102,27	25 842,06	95,35	1,72	64,07
26	Ютазинский	13	19 565,18	18 565,00	94,89	0,00	69,29
27	Чистопольский	22	119 860,27	109 318,66	91,21	0,30	69,72
28	К.-Устьинский	5	7 838,76	5 956,98	75,99	0,00	70,28

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% приня- тых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
29	Мензелинский	4	19 222,51	18 064,91	93,98	1,16	73,66
30	Бавлинский	10	37 414,29	35 650,89	95,29	0,16	75,15
31	Тетюшский	4	11 125,10	10 732,55	96,47	5,41	79,48
32	Кукморский	6	16 971,13	16 021,23	94,40	1,56	81,12
33	Тюлячинский	1	198,88	180,79	90,90	0,00	82,84
34	Азнакаевский	29	89 343,08	83 211,79	93,14	0,21	83,47
35	Алексеевский	5	10 067,86	9 515,57	94,51	0,00	86,85
36	Сармановский	14	41 594,88	40 199,70	96,65	0,00	89,19
37	Заинский	15	75 556,39	75 556,39	100,00	0,60	95,46
38	Лениногорский	21	144 829,21	136 633,51	94,34	3,18	98,77
39	Тукаевский	9	27 177,63	25 963,62	95,53	0,54	99,61
40	Муслюмовский	3	8 306,71	7 910,30	95,23	0,00	100,00
41	Аксубаевский	5	6 865,61	6 409,86	93,36	0,00	100,00
42	Актанышский	2	9 344,56	7 019,57	75,12	0,00	100,00
Итого по РТ		942	5 852 702,98	5 107 729,55	87,27	4,03	53,46



	МО	К-во домов в программе	К-во домов с отставанием	Вид работ
1	г. Казань	243	9	ремонт фасада, крыши, теплоснабжения
2	Зеленодольский	32	7	ремонт фасада, крыши
3	Пестречинский	7	2	ремонт фасада, крыши
	Итого по РТ	942	18	



	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	291 672,31	200 000,0	68,57
2	Зеленодольский	48 927,00	34 356,20	70,22
3	Менделеевский	12 919,00	9 689,25	75,00
	Итого по РТ	1 082 235,99	972 055,17	89,82



№	МО
1	Альметьевский
2	Зеленодольский
3	г.Казань



№	МО
1	Набережные Челны
2	Тукаевский



Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство дошкольных образовательных организаций (30 объектов)	5 451 205,68	94,6	2,1%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (29 объектов)	537 125,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт коррекционных школ (9 объектов)	226 792,4	Работы завершены	
Капитальный ремонт детских садов (112 объектов)	2 147 313,2	94,5	3,6%
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах (115 организаций)	91,5	Общеобразовательные школы - ГК заключен. Коррекционные школы - сбор сметной документации.	
Капитальный ремонт ресурсных центров (15 объектов)	657 519,2	90,3	13,9%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	94,6	2,1
1	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	196 326,41	100	-
2	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 274,33	100	-
3	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 015,10	100	-
4	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	199 948,41	100	-
5	Казань, ул.Завойского	50	50	71 974,70	100	-
6	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	71 818,29	100	-
7	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	126 160,55	100	-
8	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	216 180,47	100	-
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	216 180,47	100	-
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	193 473,80	100	-
11	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	193 473,80	100	-
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	193 473,80	100	-
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	194 446,03	100	-
14	Арский, г.Арск	140	70	126 376,30	100	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	117 834,36	100	-
16	Актанышский, с.Поисево	120	20	96 150,96	100	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	94,6	2,1
17	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	199 596,65	100	-
18	Лаишевский, с.Усады	260	120	195 578,34	100	-
19	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	359 985,96	100	-
20	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	100	-
21	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	196 334,56	100	-
22	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	196 334,56	100	0,7
23	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	340 785,96	100	0,3
24	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	30,0	2,0
25	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигащ	220	120	196 334,56	77,7	0,6
26	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	81,0	3,0
27	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	84,0	2,0
28	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	85,0	2,0
29	Елабужский, г.Елабуга	220	120	193 473,80	97,0	6,5
30	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	99,6	0,5



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	112 объектов	2 130,16	85 объектов	94,5%	3,6%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,2	64,0	10,0
2	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,2	70,0	12,0
3	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,4	73,0	12,0
4	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,0	79,0	4,0
5	МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» г.Казань	49 303,0	80,0	4,0
6	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,5	80,0	6,0
7	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,0	81,0	6,0
8	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,2	83,0	8,5
Итого по РТ		2 130 158,4	94,5	3,6



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,8	85,0	6,0
10	МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» г.Казань	51 384,4	86,0	8,0
11	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,7	90,0	2,0
12	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка» Елабужский	14 549,0	90,0	6,0
13	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,9	90,0	13,0
14	МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» г.Казань	29 606,2	91,0	6,8
15	МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский	14 475,0	91,0	6,0
16	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка» Елабужский	19 674,4	92,0	7,0
Итого по РТ		2 130 158,4	94,5	3,6



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Звездочка» Елабужский	21 958,7	93,0	7,0
	Итого по РТ	2 130 158,4	94,5	3,6
18	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» Нижнекамский	44 827,8	95,0	13,0
19	МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Большое Афанасово Нижнекамский	23 837,2	95,0	12,0
20	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» Нижнекамский	49 943,7	95,0	12,0
21	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Дюймовочка» Зеленодольский	23 299,0	96,0	1,0
22	МБДОУ «Кошачковский детский сад «Теремок» Пестречинский	15 945,3	96,0	9,0
23	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,5	97,0	7,0
24	МАДОУ «Детский сад № 170 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	31 206,7	98,0	3,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	2 130 158,4	94,5	3,6
25	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» Зеленодольский	32 465,7	98,0	1,0
26	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Улыбка» Зеленодольский	28 004,2	98,0	0,0
27	МАДОУ «Детский сад №139 комбинированного вида» г.Казань	54 117,0	99,0	2,0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида»	64,0	ООО "Ирбис-Инвест"	Кровля 0%, окна 98%, входы 70%, вн. двери 8%, сан. узлы 50%, внутр. сети 50%, наружные сети 0%, фасад 90%, отмостка 20%, благоустройство (асф.) 10%, ограждения, МАФы, теневые навесы 5%.	Слабо организованы работы. Работает 5 человек
2	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 298»	70,0	ООО "СФ Кровля"	Кровля 100%, окна 100%, входы 60%, внутренние двери 40%, сан. узлы 70%, внутренние сети 100%, наружные сети 100%, фасад 40%, отмостка 100%, благоустройство (асф.) 0%, ограждения 0%, МАФы 0%, теневые навесы 10%.	Слабая организация, поздно получены проекты. Работает 23 человека
3	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида»	73,0	ООО «СКД»	Кровля 97%, окна 97%, входы 0%, внутренние двери 0%, сан. узлы 65%, внутренние сети 85%, фасад 75%, отмостка 100%, ограждения 90%, МАФы теневые, навесы 50%.	Слабо организованы работы, поздно получены проекты. Работает 15 человек
4	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»	79,0	ООО "ЦентрСервис"	Кровля 98%, окна 100%, входы 83%, вн. двери 8%, сан. узлы 81%, внутр. сети 82%, фасад 0%, отмостка 0%	Наружные сети д.б. вынесены Водоканалом. Слабая организация работ. Необходимо доп. фин. для завершения ориентировочно 21 млн.руб. Работает 15 человек



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
5	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида»	80,0	ООО "Нефтехимстрой"	Кровля 100%, окна 95%, входы 65%, вн.двери 0%, сан. узлы 65%, внутр. сети 60%, нар.сети 100%, фасад 82%, отмостка 20%, благоустройство 0%, ограждения 95%	Слабо организованы работы. По фасаду нет проекта. Работает 45 человек
6	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида»	80,0	ООО "СКД"	Кровля 100%, окна 100%, входы 80%, внутренние двери 0%, сан. узлы 0%, внутренние сети 99%, наружные сети 100%, фасад 65%, отмостка 0%, МАФы 10%	Слабо организованы работы. Работает 13 человек
7	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида»	81,0	ООО "ЦентрСервис"	Кровля 100%, окна 100%, входы 55%, вн.сети 95%, нар.сети 96%	Слабо организованы работы. Необходимо доп.финансирование. Работает 15 человек
8	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида»	83,0	ООО "Радуга"	Кровля 98%, окна 99%, входы 91%, вн. двери 55%, сан. узлы 90%, внутр. сети 81%, фасад 80%	Приступили к работам в начале июня, слабая организация работ. Работает 63 человека



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
9	г.Казань	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления»	85,0	ООО "СКД"	Кровля 99%, окна 10%, входы 0%, вн.двери 0%, сан. узлы 0%, внутр. сети 55%, нар.сети 0%, фасад 65%, отмостка 0%, благоустройство 0%, МАФы, ограждения 10%	Слабо организованы работы. Работает 22 человека
10	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида»	86,0	ООО "Авиатор+"	Кровля 98%, окна 99%, входы 69%, внутренние двери 71%, сан. узлы 93%, внутренние сети 95%, фасад 20%, отмостка 0%, МАФы 17%	Слабо организованы работы. Необходимо доп.финансирование 45 млн.руб.Работает 51 человек
11	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»	90,0	ООО "Стройпрогресс"	Кровля 98%, окна 100%, входы 0%, вн.двери 0%, сан.узлы 0%, вн.сети 75%, нар.сети 0%, фасад 85%, отмостка, благоустройство 0%, ограждения 99%, МАФы 36%	Слабо организованы работы. Работает 60 человек
12	Елабужский	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка»	90,0	ООО "Стройинвест"	Окна 100%, сан. узлы 100%, фасад 80%.	Слабая организация работ. Работает 12 человек



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
13	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида»	90,0	ООО "Портал"	Кровля 100%, окна 100%, входы 60%, вн.двери 40%, сан. узлы 80%, внутр. сети 98%, фасад 95%, отмостка 80%, благоустройство 70%, ограждения 100%, МАФы 35%	Слабо организованы работы. Работает 25 человек
14	г.Казань	МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида»	91,0	ООО "КульСтрой"	Кровля 100%, окна 100%, входы 95%, внутренние двери 70%, сан. узлы 100%, внутренние сети 98%, фасад 95%, отмостка 80%, благоустройство 70%, ограждения 100%, МАФы 35%	Не согласована кровля и пожарные лестницы. Слабо организованы работы. Работает 8 человек
15	Елабужский	МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик»	91,0	ООО "Стройинвест"	Кровля 100%, окна 100%, входы 10%, вн.двери 50%, сан.узлы 70%, вн.сети 87%, нар.сети 100%, фасад 0%, отмостка 50%	Слабо организованы работы. Работает 10 человек
16	Елабужский	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка»	92,0	ООО "Стройинвест"	Кровля 100%, окна 100%, входы 50%, вн.двери 15%, сан.узлы 85%, вн.сети 75%, фасад 10%, отмостка 10%	Слабо организованы работы. Работает 25 человек



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
17	Елабужский	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Звездочка»	93,0	ООО "Стройинвест"	Кровля 100%, окна 100%, входы 85%, вн.двери 100%, сан.узлы 85%, вн.сети 90%, фасад 100%, отмостка 100%	Слабо организованы работы. Работает 30 человек



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных школах и коррекционных школах	97 объектов	88,26	10 объектов	88,9%	27,4%
	17 объектов	9,26	сбор сметной документации		



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	74,0	29,0
2	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	80,0	20,0
Итого по РТ		611 458,5	90,3	13,9
3	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	93,0	13,0
4	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	97,0	32,0
5	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	9 950,0	97,0	7,0
6	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	53 757,1	99,0	9,0
7	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 712,4	99,0	4,0



Спорт

Строительство универсальных
спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

97,3

Динамика за
2 недели, %

0,7%

Строительство блочно-модульных
лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

99,7

0,6%



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,5	97,3	0,7
1	Мензелинский	1 из 3	75,0	32,7	15,1
2	Тукаевский	2 из 2	100	100	7,2
3	Зеленодольский	3 из 3	100	100	0,8
4	Сабинский	3 из 3	100	100	0,5
5	г.Казань	15 из 15	100	100	-
6	Лениногорский	3 из 3	100	100	-
7	Менделеевский	1 из 1	100	100	-
8	г.Наб. Челны	7 из 7	100	100	-
9	Агрызский	2 из 2	100	100	-
10	Азнакаевский	4 из 4	100	100	-
11	Аксубаевский	1 из 1	100	100	-
12	Актанышский	1 из 1	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,5	97,3	0,7
13	Алексеевский	1 из 1	100	100	-
14	Алькеевский	2 из 2	100	100	-
15	Альметьевский	3 из 3	100	100	-
16	Апастовский	1 из 1	100	100	-
17	Арский	1 из 1	100	100	-
18	Атнинский	1 из 1	100	100	-
19	Бавлинский	2 из 2	100	100	-
20	Балтасинский	2 из 2	100	100	-
21	Бугульминский	2 из 2	100	100	-
22	Буинский	3 из 3	100	100	-
23	Верхнеуслонский	1 из 1	100	100	-
24	Высокогорский	3 из 3	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,5	97,3	0,7
25	Дрожжановский	2 из 2	100	100	-
26	Елабужский	2 из 2	100	100	-
27	Заинский	2 из 2	100	100	-
28	К.Устьинский	1 из 1	100	100	-
29	Кайбицкий	1 из 1	100	100	-
30	Кукморский	2 из 2	100	100	-
31	Лайшевский	1 из 1	100	100	-
32	Мамадышский	1 из 1	100	100	-
33	Муслюмовский	2 из 2	100	100	-
34	Нижнекамский	4 из 4	100	100	-
35	Новошешминский	1 из 1	100	100	-
36	Нурлатский	2 из 2	100	100	-



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,5	97,3	0,7
37	Пестречинский	1 из 1	100	100	-
38	Р.Слободский	1 из 1	100	100	-
39	Сармановский	2 из 2	100	100	-
40	Спасский	1 из 1	100	100	-
41	Тетюшский	3 из 3	100	100	-
42	Тюлячинский	2 из 2	100	100	-
43	Черемшанский	1 из 1	100	100	-
44	Чистопольский	3 из 3	100	100	-
45	Ютазинский	3 из 3	100	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	61 450,9	99,7	0,6
1	Менделеевский, г.Менделеевск	7 681,36	98,9	1,5
2	Чистопольский, г.Чистополь	7 681,36	99,0	0,5
3	Муслюмовский, с.Муслюмово	7 681,36	100	1,0
4	Пестречинский, с.Пестрецы	7 681,36	100	-
5	Мамадышский, г.Мамадыш	7 681,36	100	-
6	Бавлинский, г.Бавлы	7 681,36	100	-
7	Высокогорский, с.Высокая гора	7 681,36	100	-
8	Зеленодольский, пгт.Васильево	7 681,36	100	-



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	Аукцион ориентировочно состоится в конце сентября 2019г.	
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	59,6	9,0%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(26 объектов)</i>	92 137,0	98,0	2,4%
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	91,5	3,2%

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань	24 178,5	15,0	15,0
2	Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Лаишевский	117 008,0	17,0	2,0
3	Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» Чистопольский	3 980,0	34,0	0,0
4	Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» Зеленодольский	40 795,0	54,0	4,0
5	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» Бугульминский	169 150,0	57,0	9,0
	Итого по РТ	694 442,3	59,6	9,0
6	Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский	141 106,9	68,0	8,0
7	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	52 735,0	75,0	3,0
8	Детский оздоровительный лагерь «Факел» Новошешминский	12 437,5	85,0	20,0
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань	101 758,7	92,0	7,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 527,3	77,0	7,0
2	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 756,0	91,0	6,0
	Итого по РТ	92 137,0	98,0	2,4
3	Подростковый клуб «Алый парус», Набережные Челны	1 393,0	99,0	0,0
4	Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны	1 393,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт зданий молодежных центров

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МБУ «Молодежный центр «Хыял» Балтасинский	12 000,0	77,0	7,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	85,0	5,0
3	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	87,0	5,0
	Итого по РТ	106 200,0	91,5	3,2
4	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский	8 800,0	99,0	3,0



Здравоохранение

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство ФАПов (45 объектов)	135 775,9	89,9	12,7%
Строительство врачебных амбулаторий (9 объектов)	95 250,1	94,8	3,9%
Капитальный ремонт объектов здравоохранения (9 объектов)	70 924,2	81,7	3,3%



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Азнакаевский, Сарлинский				
2	Актанышский, Казкеевский				
3	Алексеевский, Левашевский				
4	Альметьевский, Новотроицкий				
5	Дрожжановский, Малоаксинский				
6	Заинский, Перцовский				
7	Менделеевский, Ново-Кокшанский				
8	Новошешминский, Екатерининский				
9	Нурлатский, Аксумлинский				
10	Пестречинский, Отар-Дубровский				
11	Сармановский, Альметьевский				
12	Сармановский, Шарлиареминский				
13	Тетюшский, Бакрчинский				
14	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
15	Черемшанский, Туйметкинский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
16	Ютазинский, Подгорный				
17	Зеленодольский, Кульбашинский				
18	Аксубаевский, Старочувадамский				
19	Алексеевский, Бутлеровский				
20	Апастовский, Черемшанский				
21	Апастовский, Шемяковский				
22	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
23	Высокогорский, Березкинский				
24	Елабужский, Хлыстовский				
25	Лениногорский, Старо-Иштерякский				
26	Мамадышский, Албайский				
27	Мензелинский, Кадряковский				
28	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
29	Чистопольский, Четыре-Дворский				
30	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
31	Буинский, Тингашский				
32	Сабинский, Шикшинский				
33	Агрызский, Салакушкой				
34	Тюлячинский, Максабашский				
35	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
36	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
37	Балтасинский, Сырьинский				
38	Кукморский, Сардекбашский				
39	Бугульминский, Ключевский				
40	Нижнекамский, Благодатновский				
41	Атнинский, Ключи-Сапский				
42	Арский, Средне-Пшалымский				
43	Бавлинский, Алексеевский				
44	Кайбицкий, Хозесановский				
45	Спасский, Вожинский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский				
2	Алькеевский				
3	Аксубаевский				
4	Альметьевский				
5	Зеленодольский				
6	Менделеевский				
7	Камско-Устьинский				
8	Лаишевский				
9	Пестречинский				

Капитальный ремонт
объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	81,7	3,3
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	49,0	5,0
2	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	84,0	4,0
3	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	90,0	3,0
4	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	94,0	7,0
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	96,0	4,0
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	100	-
7	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100	-
8	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100	-
9	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	100	-



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

83,8

4,6%

392 929,2

95,8

2,2%



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	83,8	4,6
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	36,3	1,7
2	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	50,3	5,6
3	Нурлатский район, с. Бурметьево	100	12 911,71	51,0	5,8
4	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	54,3	10,8
5	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	60,8	2,5
6	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	79,0	2,5
7	Высокогорский район, с. Шигали	200	14 872,9	82,5	1,7
8	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,3	83,5	9,7
9	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	83,8	2,6
10	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,90	91,7	2,5
11	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	97,8	13,5



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	83,8	4,6
12	Апастовский район, с. Сатламышево	50	7 453,34	99,3	0,5
13	Агрызский район, с. Шаршада	200	14 872,90	100	26,7
14	Аксубаевский район, п. Мюд	100	12 911,70	100	5,7
15	Ютазинский район, с. Байряки-Тамак	50	7 453,3	100	21,5
16	Высокогорский район, с. Улля	100	12 911,70	100	-
17	Бугульминский район, с. Новое Сумароково	100	12 911,70	100	-
18	Заинский район, с.Бура-Кирта	50	7 453,30	100	-
19	Буинский район, с. Чувашские Кищаки	100	12 911,70	100	-
20	Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево	50	7 453,34	100	-
21	Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское	200	14 872,90	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Бугульминский, СДК п.Подгорный	11 276,8	42,0	5,0
2	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	67,0	2,0
3	Высокогорский, СДК с.Ямашурма	3 696,0	80,0	3,0
4	Кукморский, СДК д.Асан-Елга	4 570,9	84,0	3,0
5	Актанышский, СДК с.Чалманарат	12 386,8	85,0	11,0
6	Спасский, СДК с.Три Озера	11 137,0	88,0	13,0
7	Кукморский, СД, с.Туембаш	4 062,5	88,0	5,0
8	Чистопольский, СДК с.Кубассы	17 998,2	94,0	4,0
Итого по РТ		400 929,2	95,8	2,2
9	Муслюмовский, СДК д.Татарское Булярово	8 889,1	97,0	4,0
10	Нижнекамский, СДК с.Большое Афанасово	18 560,4	97,0	7,0
11	Арский, СДК с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
12	Черемшанский, СДК с.Лашманка	9 334,4	98,0	3,0
13	Зеленодольский, СДК с.Айша	16 533,7	99,0	4,0



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	99,2	4,9%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	99,7	0,7%
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	20,3	7,5%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	96,4	3,0%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	88,3	5,5%



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	49 220,38	99,2	4,9
1	Бугульминский, Зеленорощинское СП	4 474,58	93,1	1,9
2	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	98,2	20,2
3	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	99,8	0,1
4	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	100	0,2
5	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	100	-
6	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	100	17,1
7	Буинский, Нижнеларатбашское СП	4 474,58	100	-
8	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	100	-
9	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	100	0,7
10	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	100	14,3
11	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 791,0	95,0	4,0
2	Зеленодольский, с.Бишня	1 001,4	97,0	2,0
3	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 069,5	98,0	6,0
	Итого по РТ	48 503,6	99,7	0,7



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
2	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
4	Апастовский, с.Шонгуты				
5	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
6	Сабинский, д.Елышево				
7	Сабинский, с.Кренни				
8	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
9	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
10	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
11	Пестречинский, с.Тагашево				
12	Пестречинский, с.Богородское				
13	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
14	Камско-Устьинский, д.Челны				
15	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Нурлатский, д.Абляскино				
17	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
18	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
19	Мензелинский, с.Деуково				
20	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
21	Нижнекамский, д.Байданкино				
22	Атнинский, с.Кшклово				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,7	70,0	15,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	1 492,5	70,0	20,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	74,0	10,0
4	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	79,0	2,0
5	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	82,0	5,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,5	87,0	6,0
Итого по РТ		117 818,0	96,4	3,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	92,0	5,0
8	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	2 985,0	96,0	4,0
	Итого по РТ	117 818,0	96,4	3,0
9	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	98,0	3,0
10	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе»	2 487,5	99,0	4,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	926,4	35,0	18,0
2	г.Казань, ул.Баумана, д.38/17	8 819,0	62,0	17,0
3	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	88,0	3,0
	Итого по РТ	49 186,3	88,3	5,5
4	п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а	7 074,1	92,0	8,0
5	пгт.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52	2 202,3	96,0	1,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
3	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	3 900	100	-
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	-
8	Арский, г.Арск	500	100	-
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
10	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	-
11	Буинский, г.Буинск	3 900	100	-
12	Заинский, г.Заинск	1 000	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	100	-
15	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-
22	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	100	0,5
1	Агрызский, г.Агрыз	2 300	100	5,0
2	Актанышский, с.Актаныш	1 800	100	-
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	-
4	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	-
5	Буинский, г.Буинск	1 500	100	-
6	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	-
7	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-
8	Кукморский, г.Кукмор	3 000	100	-
9	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	100	-
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	100	-
11	г.Казань	2 000	100	-



Готовность объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

**7 667 объектов социально-культурной сферы – 98%,
в т.ч.:**

- 3 151 объект образования - 98%;**
- ❖ 2 055 объектов здравоохранения - 100%;**
- ❖ 2 083 объекта культуры - 97%;**
- ❖ 208 объектов спорта - 98%;**
- ❖ 170 объектов социальной защиты
и центров занятости населения - 99%.**





№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	98%	100%	97%	98%	99%
1	Кукморский	92%	100%	62%	100%	100%
2	Бавлинский	93%	100%	97%	67%	100%
3	г. Наб. Челны	99%	100%	72%	100%	100%
4	Аксубаевский	100%	100%	93%	75%	100%
5	Лениногорский	98%	100%	98%	100%	100%
6	Мензелинский	100%	100%	100%	75%	100%
7	Атнинский	100%	100%	77%	100%	100%
8	Муслюмовский	85%	100%	92%	100%	100%
9	Бугульминский	100%	100%	93%	86%	100%
10	Спасский	93%	100%	91%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	98%	100%	97%	98%	99%
11	Агрызский	90%	100%	100%	100%	100%
12	Черемшанский	100%	100%	88%	100%	100%
13	Тетюшский	100%	100%	100%	67%	100%
14	Альметьевский	90%	100%	100%	100%	100%
15	Пестречинский	94%	100%	100%	100%	100%
16	Елабужский	100%	100%	94%	100%	100%
17	г. Казань	97%	100%	100%	100%	91%
18	Менделеевский	98%	100%	100%	100%	100%
19	Сармановский	100%	100%	98%	100%	100%
20	Чистопольский	99%	100%	100%	100%	100%
21	Арский	99%	100%	100%	100%	100%
22	Азнакаевский	100%	100%	100%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	98%	100%	97%	98%	99%
23	Лаишевский	100%	100%	100%	100%	100%
24	Мамадышский	100%	100%	100%	100%	100%
25	Нижнекамский	100%	100%	100%	100%	100%
26	Нурлатский	100%	100%	100%	100%	100%
27	Рыбно-Слободский	100%	100%	100%	100%	100%
28	К.-Устьинский	100%	100%	100%	100%	100%
29	Новошешминский	100%	100%	100%	100%	100%
30	Зеленодольский	100%	100%	100%	100%	100%
31	Заинский	100%	100%	100%	100%	100%
32	Актанышский	100%	100%	100%	100%	100%
33	Алексеевский	100%	100%	100%	100%	100%
34	Алькеевский	100%	100%	100%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	98%	100%	97%	98%	99%
35	Апастовский	100%	100%	100%	100%	100%
36	Буинский	100%	100%	100%	100%	100%
37	Верхнеуслонский	100%	100%	100%	100%	100%
38	Дрожжановский	100%	100%	100%	100%	100%
39	Ютазинский	100%	100%	100%	100%	100%
40	Балтасинский	100%	100%	100%	100%	100%
41	Тукаевский	100%	100%	100%	100%	100%
42	Сабинский	100%	100%	100%	100%	100%
43	Тюлячинский	100%	100%	100%	100%	100%
44	Кайбицкий	100%	100%	100%	100%	100%
45	Высокогорский	100%	100%	100%	100%	100%



Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

- 2 051	котельная	98%
- 3 171 км	тепловых сетей	98%
- 2 373	водозаборных сооружения	99%
- 304	водопроводные насосные станции	98%
- 17 815 км	водопроводных сетей	99%
- 4 352 км	канализационных сетей	96%





**Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 13 сентября 2019 года**

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Менделеевский	120	115	95,8%	24	Камско-Устьинский	2	2	100,0%
2	Пестречинский	27	26	96,3%	25	Кукморский	12	12	100,0%
3	Зеленодольский	710	689	97,0%	26	Лаишевский	19	19	100,0%
4	Бугульминский	592	576	97,3%	27	Лениногорский	355	355	100,0%
5	Спасский	43	42	97,7%	28	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
6	г. Казань	5332	5258	98,6%	29	Сабинский	4	4	100,0%
7	Азнакаевский	310	307	99,0%	30	Сармановский	77	77	100,0%
8	г. Наб. Челны	1311	1301	99,2%	31	Тетюшский	2	2	100,0%
9	Нурлатский	215	214	99,5%	32	Тукаевский	6	6	100,0%
10	Елабужский	251	250	99,6%	33	Алькеевский	0	0	-
11	Нижнекамский	951	948	99,7%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Чистопольский	239	239	100,0%	35	Аксубаевский	0	0	-
13	Бавлинский	126	126	100,0%	36	Апастовский	0	0	-
14	Агрызский	88	88	100,0%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Актанышский	4	4	100,0%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Альметьевский	831	831	100,0%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Арский	1	1	100,0%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Атнинский	1	1	100,0%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Балтасинский	3	3	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Буинский	86	86	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Верхнеуслонский	24	24	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Высокогорский	14	14	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Заинский	178	178	100,0%	ИТОГО по РТ		11940	11804	98,9%



**Предъявление паспортов готовности
за 2019/2020гг. по состоянию на 13 сентября 2019 года**

ТАССР

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Буинский	166	138	83,1%	24	Агрызский	184	184	100,0%
2	Камско-Устьинский	86	79	91,9%	25	Актанышский	77	77	100,0%
3	Новошешминский	43	40	93,0%	26	Алексеевский	109	109	100,0%
4	Высокогорский	288	273	94,8%	27	Алькеевский	15	15	100,0%
5	Балтасинский	44	42	95,5%	28	Альметьевский	1008	1008	100,0%
6	Бугульминский	878	840	95,7%	29	Апастовский	37	37	100,0%
7	Зеленодольский	935	895	95,7%	30	Арский	211	211	100,0%
8	Менделеевский	134	129	96,3%	31	Атнинский	5	5	100,0%
9	Лаишевский	229	222	96,9%	32	Верхнеуслонский	89	89	100,0%
10	Сабинский	107	104	97,2%	33	Дрожжановский	19	19	100,0%
11	Спасский	75	73	97,3%	34	Заинский	219	219	100,0%
12	Азнакаевский	342	334	97,7%	35	Кайбицкий	3	3	100,0%
13	Пестречинский	348	340	97,7%	36	Кукморский	132	132	100,0%
14	г. Казань	5736	5608	97,8%	37	Лениногорский	510	510	100,0%
15	Бавлинский	198	194	98,0%	38	Мамадышский	136	136	100,0%
16	г. Наб. Челны	1367	1349	98,7%	39	Мензелинский	168	168	100,0%
17	Нижнекамский	987	984	99,7%	40	Муслюмовский	60	60	100,0%
18	Нурлатский	356	355	99,7%	41	Рыбно-Слободский	63	63	100,0%
19	Елабужский	459	458	99,8%	42	Сармановский	151	151	100,0%
20	Чистопольский	500	500	100,0%	43	Тетюшский	90	90	100,0%
21	Тюлячинский	24	24	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Аксубаевский	110	110	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Тукаевский	258	258	100,0%	ИТОГО по РТ		17176	16855	98,1%



**Прикрепление актов проверки дымоходов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 13 сентября 2019 года**

ТА1ССР

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	Камско-Устьинский	84	64	76,2%	24	Апастовский	37	37	100,0%
2	г. Казань	404	342	84,7%	25	Арский	210	210	100,0%
3	г. Наб. Челны	56	48	85,7%	26	Атнинский	4	4	100,0%
4	Балтасинский	41	39	95,1%	27	Буинский	80	80	100,0%
5	Бавлинский	72	69	95,8%	28	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
6	Лайшевский	210	203	96,7%	29	Дрожжановский	19	19	100,0%
7	Спасский	32	31	96,9%	30	Заинский	41	41	100,0%
8	Зеленодольский	225	219	97,3%	31	Кайбицкий	3	3	100,0%
9	Высокогорский	274	267	97,4%	32	Кукморский	120	120	100,0%
10	Новошешминский	43	42	97,7%	33	Лениногорский	155	155	100,0%
11	Бугульминский	286	283	99,0%	34	Мамадышский	136	136	100,0%
12	Пестречинский	321	319	99,4%	35	Менделеевский	14	14	100,0%
13	Чистопольский	261	260	99,6%	36	Мензелинский	168	168	100,0%
14	Тюлячинский	24	24	100,0%	37	Муслюмовский	60	60	100,0%
15	Елабужский	208	208	100,0%	38	Нижнекамский	36	36	100,0%
16	Тукаевский	252	252	100,0%	39	Нурлатский	141	141	100,0%
17	Агрызский	96	96	100,0%	40	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
18	Азнакаевский	32	32	100,0%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Аксубаевский	110	110	100,0%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Актанышский	73	73	100,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Алексеевский	109	109	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Алькеевский	15	15	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Альметьевский	177	177	100,0%	ИТОГО по РТ		5236	5113	97,7%



**Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 13 сентября 2019 года**

ТАССР

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	404	299	74,0%	24	Арский	210	210	100,0%
2	г. Наб. Челны	56	51	91,1%	25	Атнинский	4	4	100,0%
3	Балтасинский	41	39	95,1%	26	Буинский	80	80	100,0%
4	Бавлинский	72	69	95,8%	27	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
5	Камско-Устьинский	84	81	96,4%	28	Дрожжановский	19	19	100,0%
6	Лаишевский	210	203	96,7%	29	Елабужский	208	208	100,0%
7	Спасский	32	31	96,9%	30	Заинский	41	41	100,0%
8	Зеленодольский	225	219	97,3%	31	Кайбицкий	3	3	100,0%
9	Новошешминский	43	42	97,7%	32	Кукморский	120	120	100,0%
10	Высокогорский	274	269	98,2%	33	Лениногорский	155	155	100,0%
11	Бугульминский	286	283	99,0%	34	Мамадышский	136	136	100,0%
12	Чистопольский	261	259	99,2%	35	Менделеевский	14	14	100,0%
13	Пестречинский	321	319	99,4%	36	Мензелинский	168	168	100,0%
14	Тюлячинский	24	24	100,0%	37	Муслюмовский	60	60	100,0%
15	Тукаевский	252	252	100,0%	38	Нижнекамский	36	36	100,0%
16	Агрызский	96	96	100,0%	39	Нурлатский	141	141	100,0%
17	Азнакаевский	32	32	100,0%	40	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
18	Аксубаевский	110	110	100,0%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Актанышский	73	73	100,0%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Алексеевский	109	109	100,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Алькеевский	15	15	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Альметьевский	177	177	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Апастовский	37	37	100,0%	ИТОГО по РТ		5236	5091	97,2%



Подрядчик		ООО «УКС»	
Заказчик-застройщик		ГКУ Фонд газификации РТ	
Начало строительства		август 2018	
Завершение строительства		ноябрь 2019	
Лимит финансирования, млн.руб.		122,73	
		12,41- ПИР	110,32 – СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	2,2	2,2	100
СМР	2,2	2,2	100
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)	3,3	3,3	100
СМР	3,3	3,3	100
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)	87,6	78,6	79,37

Работает: 15 чел.



Строительство промышленного парка «Буинск»

Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	139,95	3,31	3,34	100,91	3,04	0,60	0,70
СМР		3,31	3,34	100,91	3,04	0,60	0,70
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		8,49	8,56	100,82	3,04	2,51	3,04
СМР		8,49	8,56	100,82	3,04	2,51	3,04
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		92,13	92,36	100,25	76,56	76,56	76,56
СМР		92,13	92,36	100,25	76,56	76,56	76,56

Работает 12 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	141,55	1,65	1,68	101,82	0,00	0,00	0,00
СМР		1,65	1,68	101,82	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		3,85	3,90	101,30	0,00	0,00	0,00
СМР		3,85	3,90	101,30	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		58,91	59,32	100,53	50,00	0,00	0,00
СМР		58,91	59,32	100,53	50,00	0,00	0,00

Работает 12 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	-	3,15	31,18	100,95	0,00	0,00	0,00
СМР		3,15	31,18	100,95	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		20,19	20,30	100,54	0,00	0,00	0,00
СМР		20,19	20,30	100,54	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		39,98	40,23	100,63	0,00	0,00	0,00
СМР		39,98	40,23	100,63	0,00	0,00	0,00

Работает 40 чел.
