



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа




Культура

2 программы

Иные социальные программы 5 программ



Финансирование программы на 2019 год

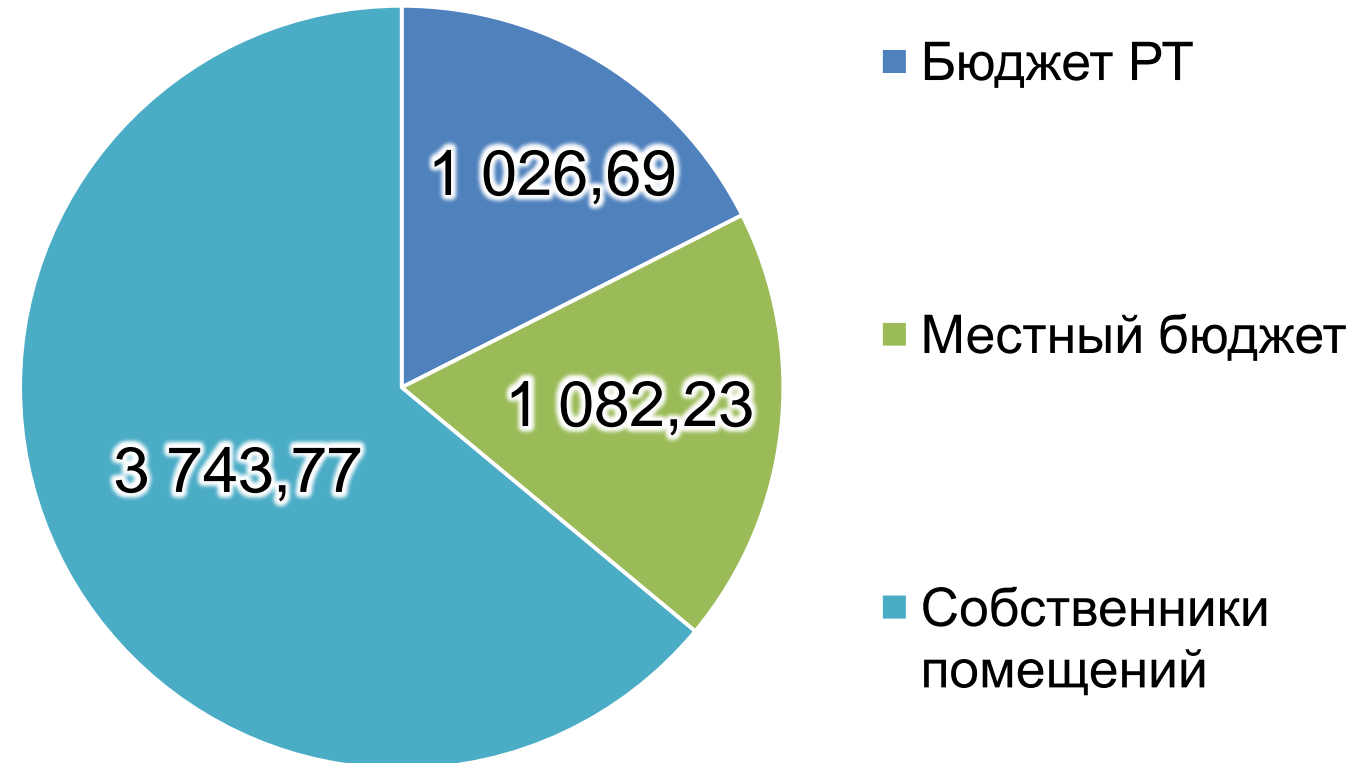

Всего: 942 МКД на 5 852,7 млн рублей

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Пестречинский	7	19 395,71	12 619,92	68,31	22,88	34,14
2	г. Казань	243	1 914 468,61	1 581 804,23	86,30	4,98	51,06
3	Лайшевский	11	22 498,28	19 277,48	89,94	11,3	65,08
4	Зеленодольский	32	257 843,11	229 899,40	93,48	8,68	50,54
5	Новошешминский	2	4 521,99	3 982,17	93,87	0	0,00
6	Бугульминский	47	206 892,12	185 293,54	94,62	3,23	71,24
7	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	1 172 810,21	95,02	3,06	41,76
8	Чистопольский	22	119 860,27	109 670,06	95,09	0,3	71,89
9	Менделеевский	17	67 672,29	62 187,31	96,35	3,98	46,58
10	Мензелинский	4	19 222,51	18 064,91	98,08	0	73,66
11	Азнакаевский	29	89 343,08	83 580,72	98,76	0,44	91,81
12	Высокогорский	19	39 540,04	37 307,21	98,84	1,13	1,96
13	Елабужский	21	160 323,73	154 020,70	98,85	2,85	61,15
14	Нижнекамский	125	585 691,57	554 056 572,32	99,08	0	61,93
15	Балтасинский	2	4 221,64	4 065 746,40	99,38	0	32,72
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	5 225 851,30	93,46	3,21	56,88



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
16	Кукморский	6	16 971,13	16 197 819,21	99,64	1,08	90,06
17	Актанышский	2	9 344,56	8 898,46	99,72	0	99,72
18	Агрызский	12	27 102,27	25 912 056,17	99,86	0,27	63,9
19	Арский	6	15 350,43	14 796 219,68	99,87	0	33,16
20	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	6 049 386,77	99,93	0	43,78
21	Нурлатский	12	57 436,67	54 903 978,37	99,94	0,42	59,2
22	Лениногорский	21	144 829,21	137 222 846,05	99,94	0,43	98,35
23	Альметьевский	63	438 169,83	419 777 990,00	99,95	0,09	70,36
24	Верхнеуслонский	2	5 814,53	5 558,11	100	0,00	0,00
25	Алькеевский	1	1 830,56	1 721,29	100	0,6	0,00
26	Спасский	2	7 277,18	6 938,12	100	1,56	17,76
27	Черемшанский	1	2 252,45	2 162,35	100	0	41,09
28	К.-Устьинский	5	7 838,76	7 447,19	100	20,01	56,21
29	Сабинский	2	13 606,70	13 121 596,50	100	4,72	62,34
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	5 591 360,39	93,46	3,21	56,88



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% приня- тых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
30	Мамадышский	3	24 481,34	23 712,08	100	0,16	63,02
31	Ютазинский	13	19 565,18	18 565,00	100	3,18	69,29
32	Буинский	9	24 773,39	24 032,03	100	0,54	77,36
33	Тюлячинский	1	198,88	180,79	100	0	82,84
34	Алексеевский	5	10 067,86	9 515,57	100	0	86,85
35	Сармановский	14	41 594,88	40 199 703,61	100	0	89,19
36	Апастовский	5	3 741,41	3 560,40	100	0	90,44
37	Бавлинский	10	37 414,29	35 669 327,40	100	0,05	96,63
38	Заинский	15	75 556,39	71 931 394,46	100	4,38	97,98
39	Тетюшский	4	11 125,10	10 732,55	100	5,41	98,36
40	Тукаевский	9	27 177,63	25 963,62	100	1,16	99,61
41	Муслюмовский	3	8 306,71	7 910,30	100	0,21	100
42	Аксубаевский	5	6 865,61	6 409,86	100	0	100
Итого по РТ		942	5 852 702,98	5 591 360,39	93,46	3,21	56,88



	МО	К-во домов в программе	К-во домов с отставанием	Вид работ
1	г. Казань	243	10	ремонт фасада, крыши, теплоснабжения
2	Пестречинский	7	2	ремонт фасада, крыши
	Итого по РТ	942	12	



	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	291 672,31	200 000,0	68,57
2	Зеленодольский	48 927,00	34 356,20	70,22
3	Менделеевский	12 919,00	9 689,25	75,00
	Итого по РТ	1 082 235,99	972 055,17	89,82



Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство дошкольных образовательных организаций (30 объектов)	5 451 205,68	96,0	1,4%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (29 объектов)	537 125,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт коррекционных школ (9 объектов)	226 792,4	Работы завершены	
Капитальный ремонт детских садов (112 объектов)	2 147 313,2	96,3	1,8%
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах (115 организаций)	91,5	Общеобразовательные школы - ГК заключен. Коррекционные школы - сбор сметной документации.	
Капитальный ремонт ресурсных центров (15 объектов)	657 519,2	93,4	3,1%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	96,0	1,4
1	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	100	0,4
2	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	95,0	11,0
3	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	95,0	10,0
4	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	88,0	7,0
5	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	196 334,56	81,2	3,5
6	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	39,0	9,0



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	112 объектов	2 130,16	91 объект	96,3%	1,8%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,2	74,0	10,0
2	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,4	78,0	5,0
3	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,2	78,0	8,0
4	МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» г.Казань	49 303,0	82,0	2,0
5	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,0	83,0	2,0
6	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,0	84,0	5,0
7	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,2	85,0	2,0
8	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,5	85,0	5,0
Итого по РТ		2 130 158,4	96,3	1,8



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,8	88,0	3,0
10	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,9	95,0	5,0
11	МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» г.Казань	51 384,4	95,0	9,0
12	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,7	95,0	5,0
13	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка» Елабужский	14 549,0	95,0	5,0
14	МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский	14 475,0	96,0	5,0
	Итого по РТ	2 130 158,4	96,3	1,8
15	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17 «Ромашка» Елабужский	19 674,4	97,0	5,0
16	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Звездочка» Елабужский	21 958,7	97,0	4,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,5	98,0	1,0
18	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Дюймовочка» Зеленодольский	23 299,0	98,0	2,0
19	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» Зеленодольский	32 465,7	98,5	0,5
20	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Улыбка» Зеленодольский	28 004,2	99,0	1,0
21	МАДОУ «Детский сад № 139 комбинированного вида» г.Казань	54 117,0	99,0	0,0
Итого по РТ		2 130 158,4	96,3	1,8



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных школах и коррекционных школах	97 объектов	88,26	87 объектов	94,3%	5,4%
	18 объектов	9,26	сбор сметной документации		



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	76,0	2,0
2	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	91,0	11,0
Итого по РТ		611 458,5	93,4	3,1
3	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	97,0	4,0
4	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	98,0	1,0



Спорт

Строительство универсальных
спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

98,1

Динамика за
2 недели, %

0,8%

Строительство блочно-модульных
лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

99,7

0,2%



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,5	98,1	0,8
1	Мензелинский	1 из 3	75,0	54,0	21,3

Строительство блочных модульных лыжных баз

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	61 450,9	99,7	0,5
1	Менделеевский, г.Менделеевск	7 681,36	98,9	1,0
2	Чистопольский, г.Чистополь	7 681,36	99,0	0,4



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	Аукцион ориентировочно состоится в конце ноября 2019г.	
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	63,0	3,5%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(26 объектов)</i>	92 137,0	98,5	0,5%
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	94,3	2,7%



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Звездный», Лаишевский	117 008,0	21,0	4,0
2	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», г.Казань	24 178,5	30,0	15,0
3	ДОЛ «Солнышко», Чистопольский	3 980,0	40,0	6,0
4	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина», Бугульминский	169 150,0	59,0	2,0
5	Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка», Зеленодольский	40 795,0	60,0	6,0
	Итого по РТ	694 442,3	63,0	3,5
6	МБУ «ДОЛ «Кама», Нижнекамский	141 106,9	73,0	5,0
7	Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань	52 735,0	76,0	1,0
8	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	101 758,7	93,0	1,0
9	Детский оздоровительный лагерь «Факел», Новошешминский	12 437,5	93,0	8,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 527,3	82,0	5,0
2	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 756,0	93,0	2,0
	Итого по РТ	92 137,0	98,5	0,5



Капитальный ремонт зданий молодежных центров

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	88,0	3,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	90,0	3,0
3	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	90,0	13,0
	Итого по РТ	106 200,0	94,3	2,7
4	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	8 800,0	99,0	0,0



Здравоохранение

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство ФАПов (45 объектов)	135 775,9	94,8	5%
Строительство врачебных амбулаторий (9 объектов)	95 250,1	95,8	1%
Капитальный ремонт объектов здравоохранения (9 объектов)	70 924,2	86,5	4,8%



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский, Бутлеровский				
2	Апастовский, Черемшанский				
3	Апастовский, Шемяковский				
4	Арский, Средне-Пшалымский				
5	Бугульминский, Ключевский				
6	Высокогорский, Березкинский				
7	Лениногорский, Старо-Иштерякский				
8	Мензелинский, Кадряковский				
9	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
10	Спасский, Вожинский				
11	Агрызский, Салакушский				
12	Аксубаевский, Старочувадамский				
13	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
14	Атнинский, Ключи-Сапский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
15	Бавлинский, Алексеевский				
16	Балтасинский, Сырьинский				
17	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
18	Кайбицкий, Хозесановский				
19	Кукморский, Сардекбашский				
20	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				
21	Нижнекамский, Благодатновский				
22	Сабинский, Шикшинский				
23	Тюлячинский, Максабашский				
24	Чистопольский, Четыре-Дворский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Камско-Устьинский				
2	Лаишевский				
3	Пестречинский				

Капитальный ремонт
объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	86,5	4,8
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	60,0	11,0
2	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	88,0	4,0
3	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	95,0	5,0
4	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	98,0	4,0
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	99,0	3,0



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

89,7

5,9%

392 929,2

97,1

1,3%



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	89,7	5,9
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	40,5	4,2
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	72,7	18,4
3	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	80,1	1,1
4	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	82,5	21,7
5	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	89,6	39,3
6	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	93,1	9,3
7	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,3	96,9	13,4
8	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,90	97,9	6,2
9	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	97,9	0,1



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Бугульминский, СДК п.Подгорный	11 276,8	44,0	2,0
2	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	70,0	3,0
3	Высокогорский, СДК с.Ямашурма	3 696,0	85,0	5,0
4	Спасский, СДК с.Три Озера	11 137,0	90,0	2,0
5	Кукморский, СДК д.Асан-Елга	4 570,9	90,0	6,0
6	Кукморский, СДК с.Туембаш	4 062,5	94,0	6,0
	Итого по РТ	400 929,2	97,1	1,3
7	Арский, СДК с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
8	Муслюмовский, СДК д.Татарское Булярово	8 889,1	99,0	2,0
9	Нижнекамский, СДК с.Большое Афанасово	18 560,4	99,0	2,0



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	99,3	0,1%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	99,9	0,3%
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	23,5	3,2%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	97,5	1,1%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	91,2	2,9%
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		49 220,38	99,3	0,1
1	Бугульминский, Зеленогорщинское СП	4 474,58	94,2	1,1
2	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	98,5	0,3



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский, с.Бишня	1 001,4	98,0	1,0
	Итого по РТ	48 503,6	99,9	0,3



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
2	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
3	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
4	Апастовский, с.Шонгуты				
5	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
6	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
7	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
8	Сабинский, д.Елышево				
9	Сабинский, с.Кренни				
10	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
11	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
12	Пестречинский, с.Тагашево				
13	Пестречинский, с.Богородское				
14	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
15	Камско-Устьинский, д.Челны				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Нурлатский, д.Абляскино				
17	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
18	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
19	Мензелинский, с.Деуково				
20	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
21	Нижнекамский, д.Байданкино				
22	Атнинский, с.Кшклово				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,7	75,0	5,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	1 492,5	75,0	5,0
3	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	81,0	2,0
4	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	84,0	10,0
5	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	91,0	9,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,5	92,0	5,0
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	93,0	1,0
Итого по РТ		117 818,0	97,5	1,1



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	926,4	50,0	15,0
2	г.Казань, ул.Баумана, д.38/17	8 819,0	72,0	10,0
3	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	89,0	1,0
	Итого по РТ	49 186,3	91,2	2,9
4	п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а	7 074,1	95,0	3,0



27.09.2019 17:00

	Объект	Произведен пуск	%
1	Котельные	2 977	99,9
2	Жилые дома	16 882	99,02
3	Школы	1 502	99,7
4	Детские сады	1 748	99,6
5	Здравоохранение	1 977	99,15
6	Культура	1 843	94,03
7	Спорт	284	98,61
8	Соцзащита	181	100,0



Информация по отсутствию тепла на объектах ЖКХ и социальной сферы в 13 МО

по состоянию на 27.09.2019 на 17-00

№	Наименование МО	Котель- ные	Жилые дома	Образо- вание	Здравоохра- нение	Культура	Спорт	Соцзащита, центр занятости
		%	%	%	%	%	%	%
	Итого	99,9	99,02	99,7	99,15	94,03	98,61	100,0
1	Азнакаевский	98,0	100,0	100,0	98,2	98,1	83,3	100,0
2	Актанышский	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Атнинский	100,0	100,0	100,0	100,0	85,2	100,0	100,0
4	Бугульминский	98,9	99,8	100,0	100,0	97,7	100,0	100,0
5	Буинский	100,0	100,0	100,0	79,5	23,0	100,0	100,0
6	Казань	100,0	98,19	99,6	99,2	96,6	97,6	100,0
7	Зеленодольский	100,0	99,0	100,0	100,0	98,3	100,0	100,0
8	Лениногорский	100,0	90,0	89,5	100,0	84,8	83,3	100,0
9	Менделеевский	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	100,0
10	Наб. Челны	100,0	100,0	100,0	100,0	94,4	94,1	100,0
11	Р.-Слободский	100,0	100,0	100,0	100,0	51,1	100,0	100,0
12	Тетюшский	100,0	100,0	100,0	100,0	69,2	100,0	100,0
13	Ютазинский	100,0	100,0	100,0	100,0	38,1	100,0	100,0



Дата	Дневная температура, °С	Ночная температура, °С	Среднесуточная температура за сутки, °С
Прогнозные данные (из электронных СМИ)			
27 сентября	7	4	5,5
28 сентября	8	1	4,5
29 сентября	9	5	7
30 сентября	9	6	7,5
1 октября	15	10	12,5
2 октября	14	10	12



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

ТА1ССР

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Азнакаевский	16	Тюлячинский	31	Кайбицкий
2	Аксубаевский	17	Ютазинский	32	Кукморский
3	Верхне-Услонский	18	Агрызский	33	Менделеевский
4	Камско-Устьинский	19	Актанышский	34	Муслюмовский
5	Лаишевский	20	Алькеевский	35	Нижнекамский
6	Мамадышский	21	Альметьевский	36	Новошешминский
7	Мензелинский	22	Апастовский	37	Рыбно-Слободский
8	Алексеевский	23	Бавлинский	38	Сабинский
9	Арский	24	Балтасинский	39	Тетюшский
10	Атнинский	25	Бугульминский	40	Тукаевский
11	Дрожжановский	26	Буинский	41	Черемшанский
12	Лениногорский	27	Высокорский	42	Чистопольский
13	Нурлатский	28	Елабужский	43	г. Наб.Челны
14	Пестречинский	29	Заинский	44	г.Казань
15	Сармановский	30	Зеленодольский	45	Спасский

Красный – низкая динамика предоставления документов;

Желтый – средняя динамика предоставления документов;

Зеленый – документы предоставлены.



Не представили информацию об актуализации лицевых счетов

№	МО	№	МО
1	г.Казань	6	Камско-Устьинский
2	Алькеевский	7	Кукморский
3	Атнинский	8	Лайшевский
4	Балтасинский	9	Пестречинский
5	Зеленодольский	10	Тетюшский



Не в полном объеме представили информацию об актуализации лицевых счетов

№	МО	№	МО
1	г. Набережные Челны	11	Заинский
2	Актанышский	12	Кайбицкий
3	Алексеевский	13	Лениногорский
4	Альметьевский	14	Менделеевский
5	Апастовский	15	Нижнекамский
6	Арский	16	Нурлатский
7	Верхнеуслонский	17	Тукаевский
8	Высокогорский	18	Тюлячинский
9	Елабужский	19	Чистопольский
10	Дрожжановский		

Строительство промышленного парка
«Урусу»

Подрядчик			ООО «УКС»				
Заказчик			ГКУ Фонд газификации РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			122,73				
			ПИР- 12,41			СМР-110,32	
Начало работ			Август 2018г.				
Завершение работ			Ноябрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 21.09.2019 по 27.09.2019)	110,32	3,34	3,34	100,00	4,1	4,1	4,1
СМР		3,34	3,34	100,00	4,1	4,1	4,1
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 27.09.2019)		11,9	11,9	100,00	4,1	4,1	4,1
СМР		11,9	11,9	100,00	4,1	4,1	4,1
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.09.2019)		95,7	95,7	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		95,7	95,7	100,00	73,41	73,41	73,41



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 21.09.2019 по 27.09.2019)	139,95	6,35	6,38	102,22	0,0	1,18	1,18
СМР		6,35	6,38	102,22	0,0	1,18	1,18
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 27.09.2019)		12,89	13,03	101,18	3,04	4,22	4,22
СМР		12,89	13,03	101,18	3,04	4,22	4,22
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.09.2019)		95,54	95,83	100,31	76,56	77,73	77,73
СМР		95,54	95,83	100,31	76,56	77,73	77,73

Работает 15 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 21.09.2019 по 27.09.2019)	141,55	8,80	8,91	100,85	0,00	0,00	0,00
СМР		8,80	8,91	100,85	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 27.09.2019)		18,30	18,51	100,94	0,00	0,00	0,00
СМР		18,30	18,51	100,94	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.09.2019)		73,06	73,93	101,13	50,00	0,00	0,00
СМР		73,06	73,93	101,13	50,00	0,00	0,00

Работает 20 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 21.09.2019 по 27.09.2019)	307,10	8,05	8,12	100,87	7,24	0,00	0,0
СМР		8,05	8,12	100,87	7,24	0,00	0,0
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 27.09.2019)		38,19	38,49	100,73	7,24	7,24	7,24
СМР		38,19	38,49	100,73	7,24	7,24	7,24
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.09.2019)		57,98	60,42	104,17	7,24	7,24	7,24
СМР		57,98	60,42	104,17	7,24	7,24	7,24

Работает 40 чел.
