




Программа ГЖФ РТ



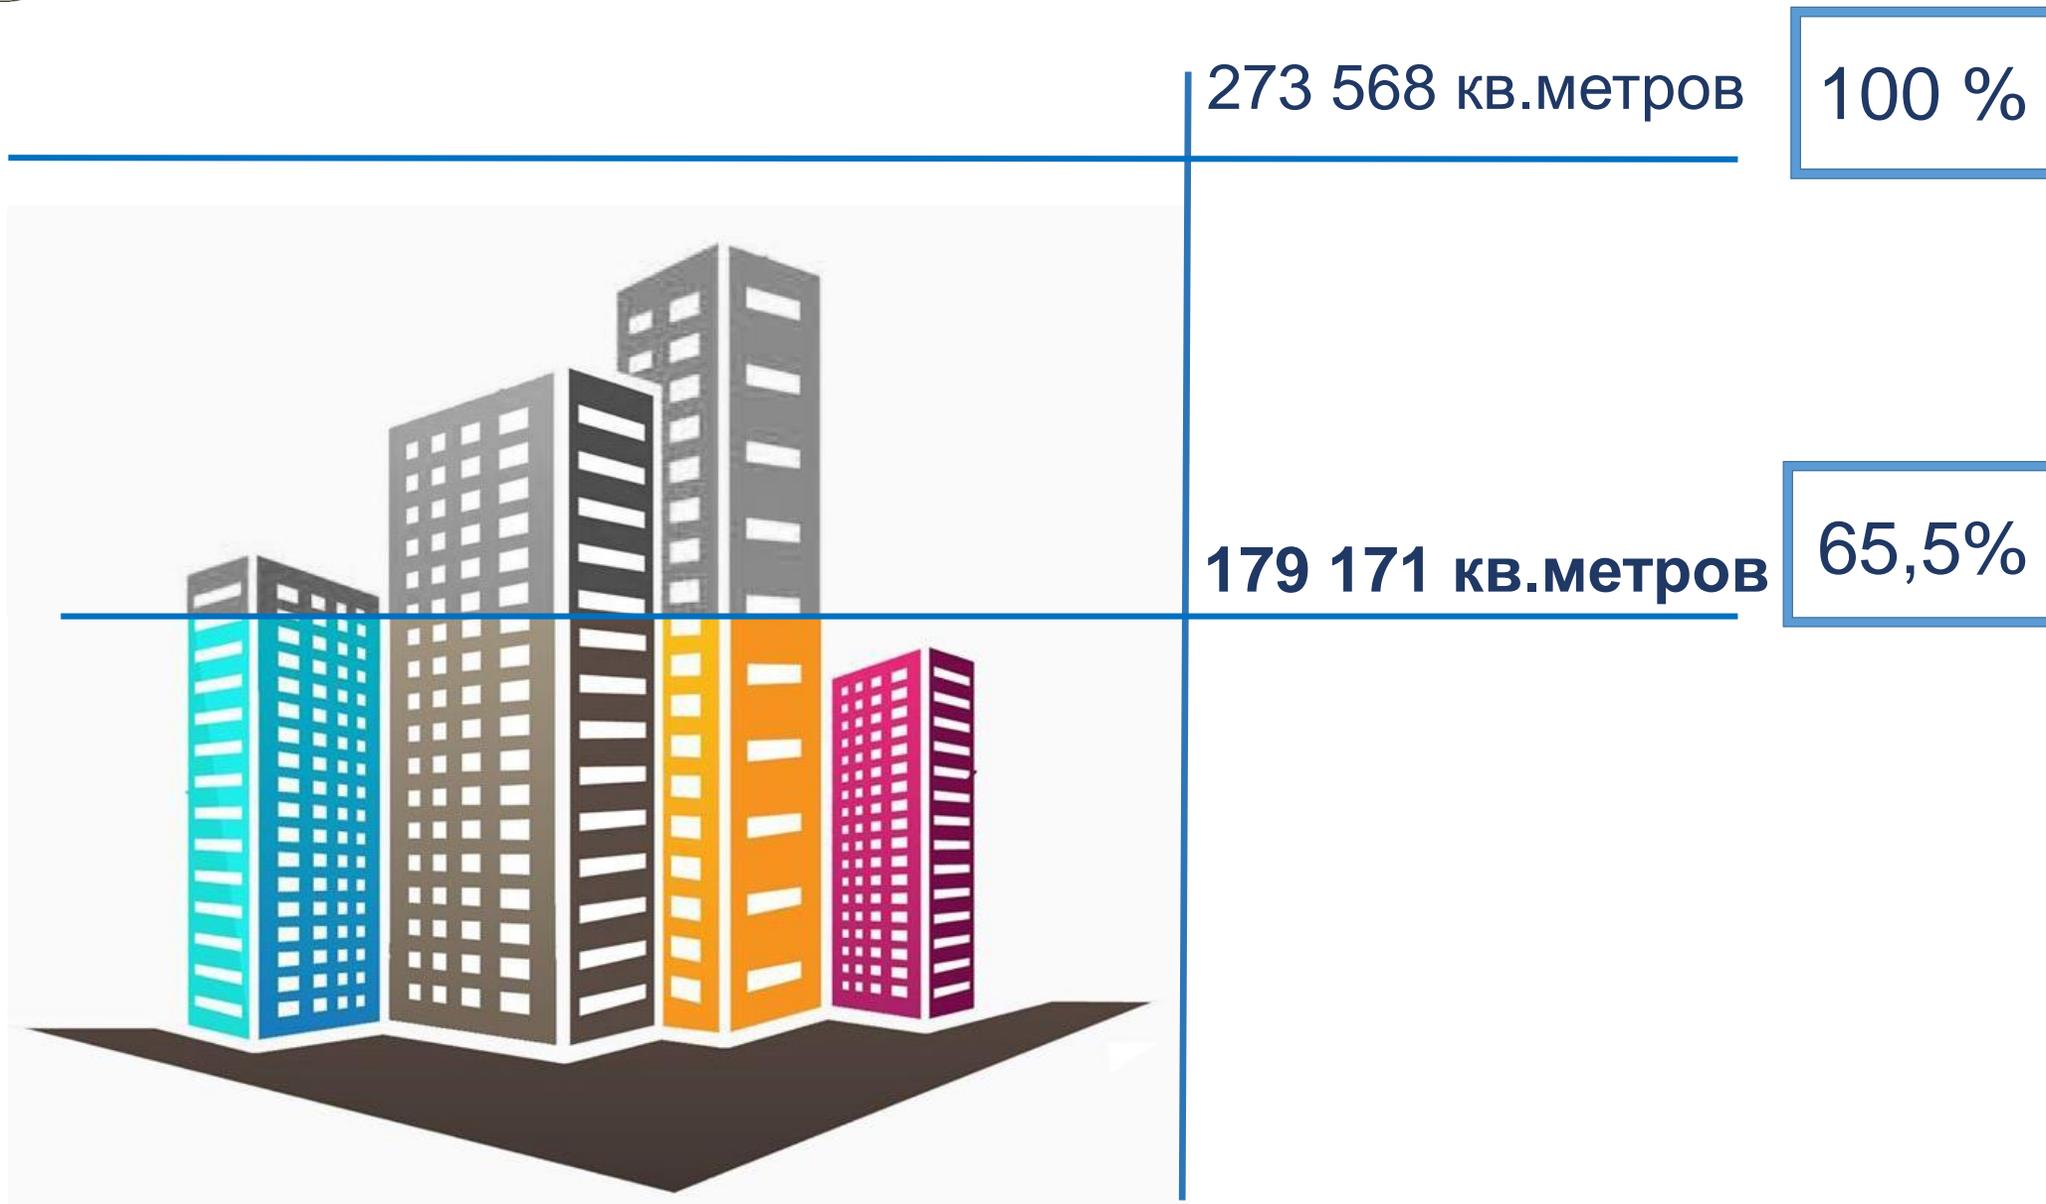

Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	План	Введено		Остаток	Степень готовности
		Всего	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)
Количество объектов	130	98	8	32	32
Количество квартир	4 970	3218	587	1 752	1 752
Общая площадь (тыс кв.метров)	273,6	179,2	28,2	94,4	94,4



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

№	МО РТ	Кол-во объектов	№	МО РТ	Кол-во объектов
1	Алексеевский	2	9	Заинский	1
2	Актанышский	4	10	Менделеевский	1
3	Арский	1	11	Нурлатский	5
4	Бавлинский	1	12	Новошешминский	4
5	Балтасинский	1	13	Тетюшский	1
6	Бугульминский	1	14	г. Нижнекамск	3
7	Верхнеуслонский	1	15	г. Наб. Челны	2
8	Высокогорский	1	16	г. Казань	3
				ВСЕГО	32




Ход исполнения программы ГЖФ РТ

тыс руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2 / КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
введены в эксплуатацию	5 694 218	5 694 218	19 053	5 266 497	126 526	5 314 826	16 393
высокая 70-100%	4 674 956	4 282 398	91 268	3 671 324	342 752	4 020 837	15 112
ИТОГО	10 369 174	9 976 616	110 321	8 937 821	469 278	9 335 663	31 505



Многоквартирное инвестиционное жилье

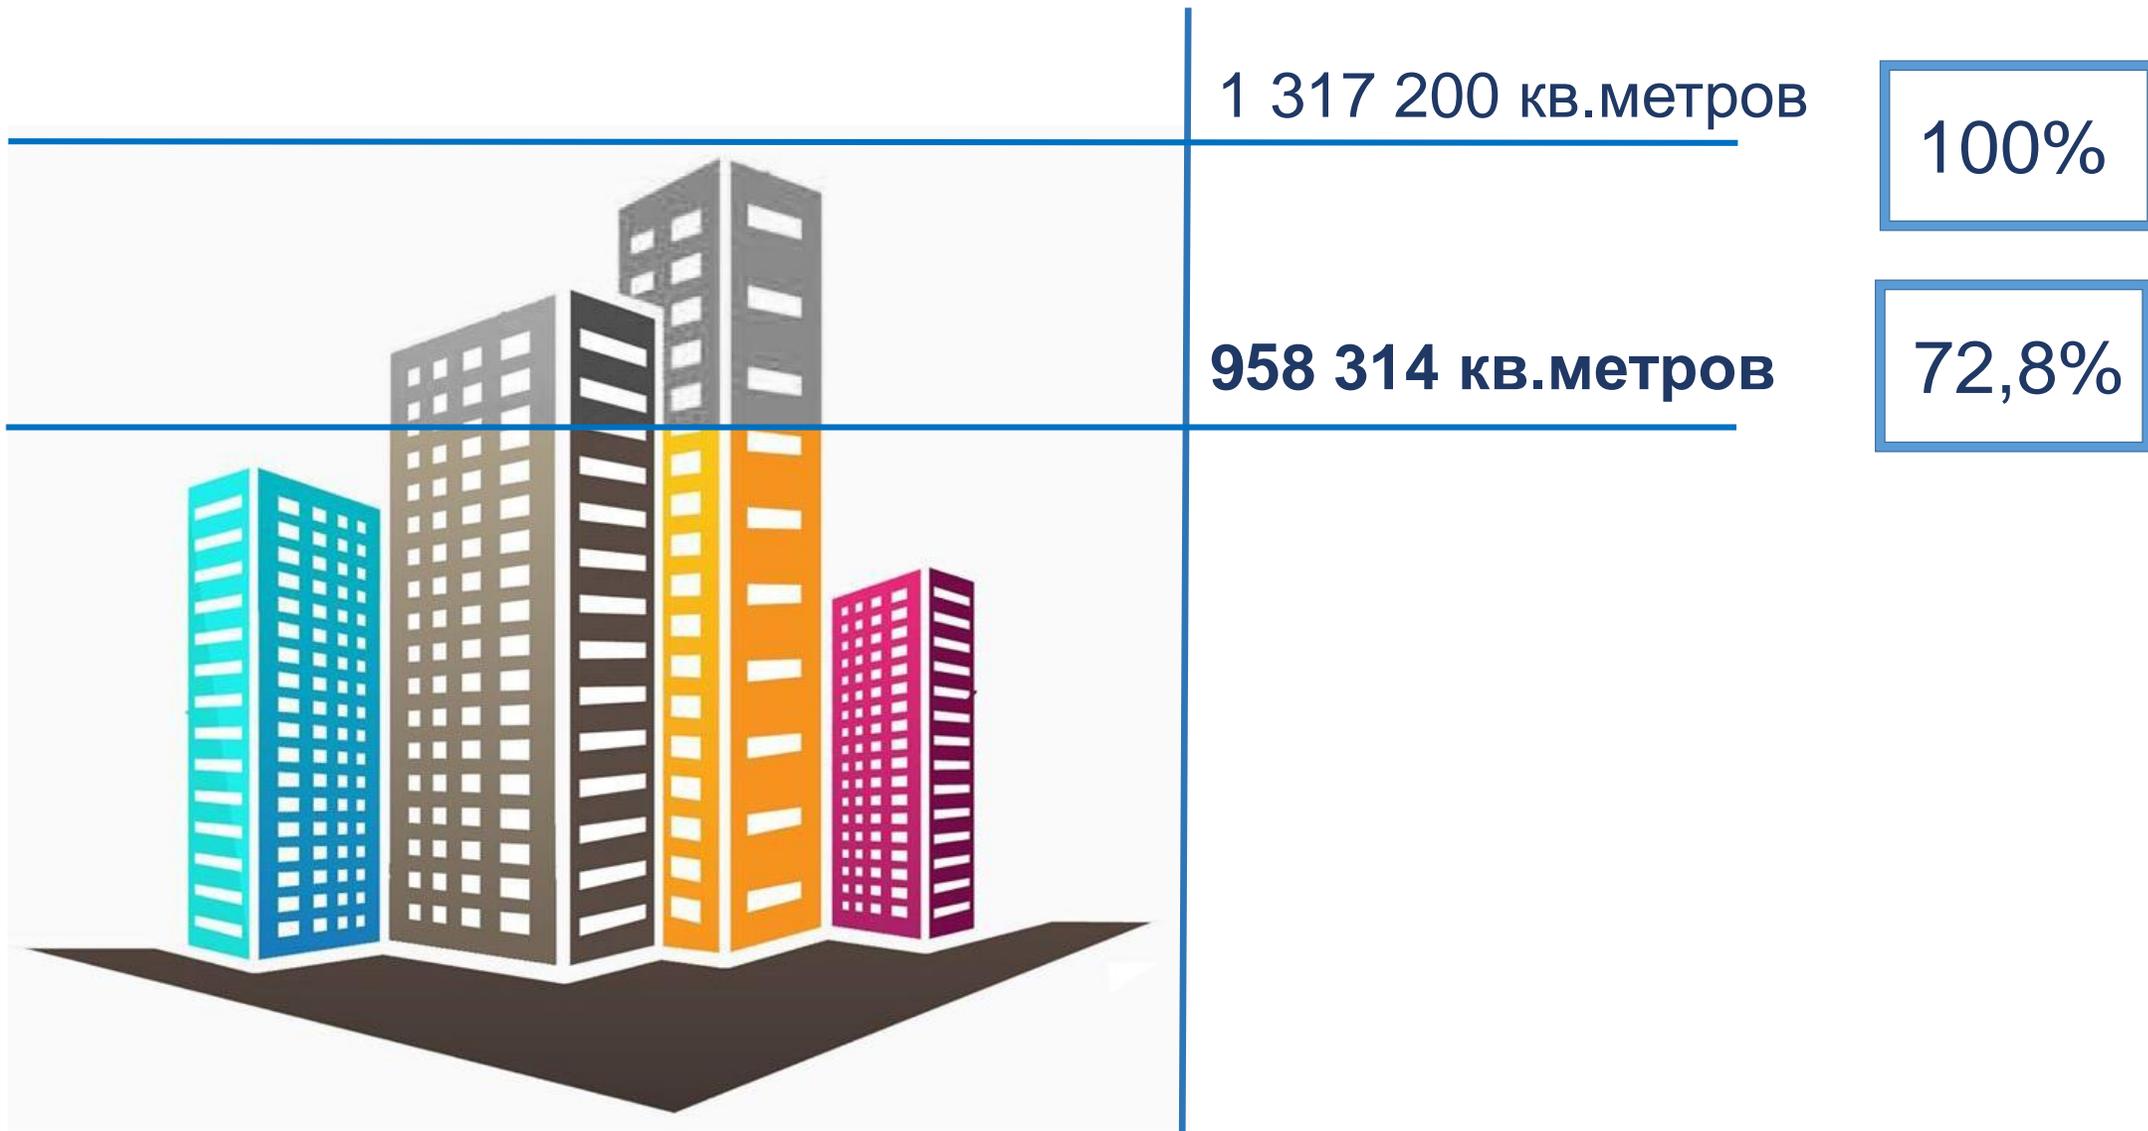




Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			высокая (70-100%)
1	Агрызский	1	1
2	Альметьевский	3	3
3	Елабужский	1	1
4	Зеленодольский	2	2
6	Пестречинский	4	4
7	г.Набережные Челны	9	9
9	г.Казань	18	18
ВСЕГО		38	38




Индивидуальное жилищное строительство

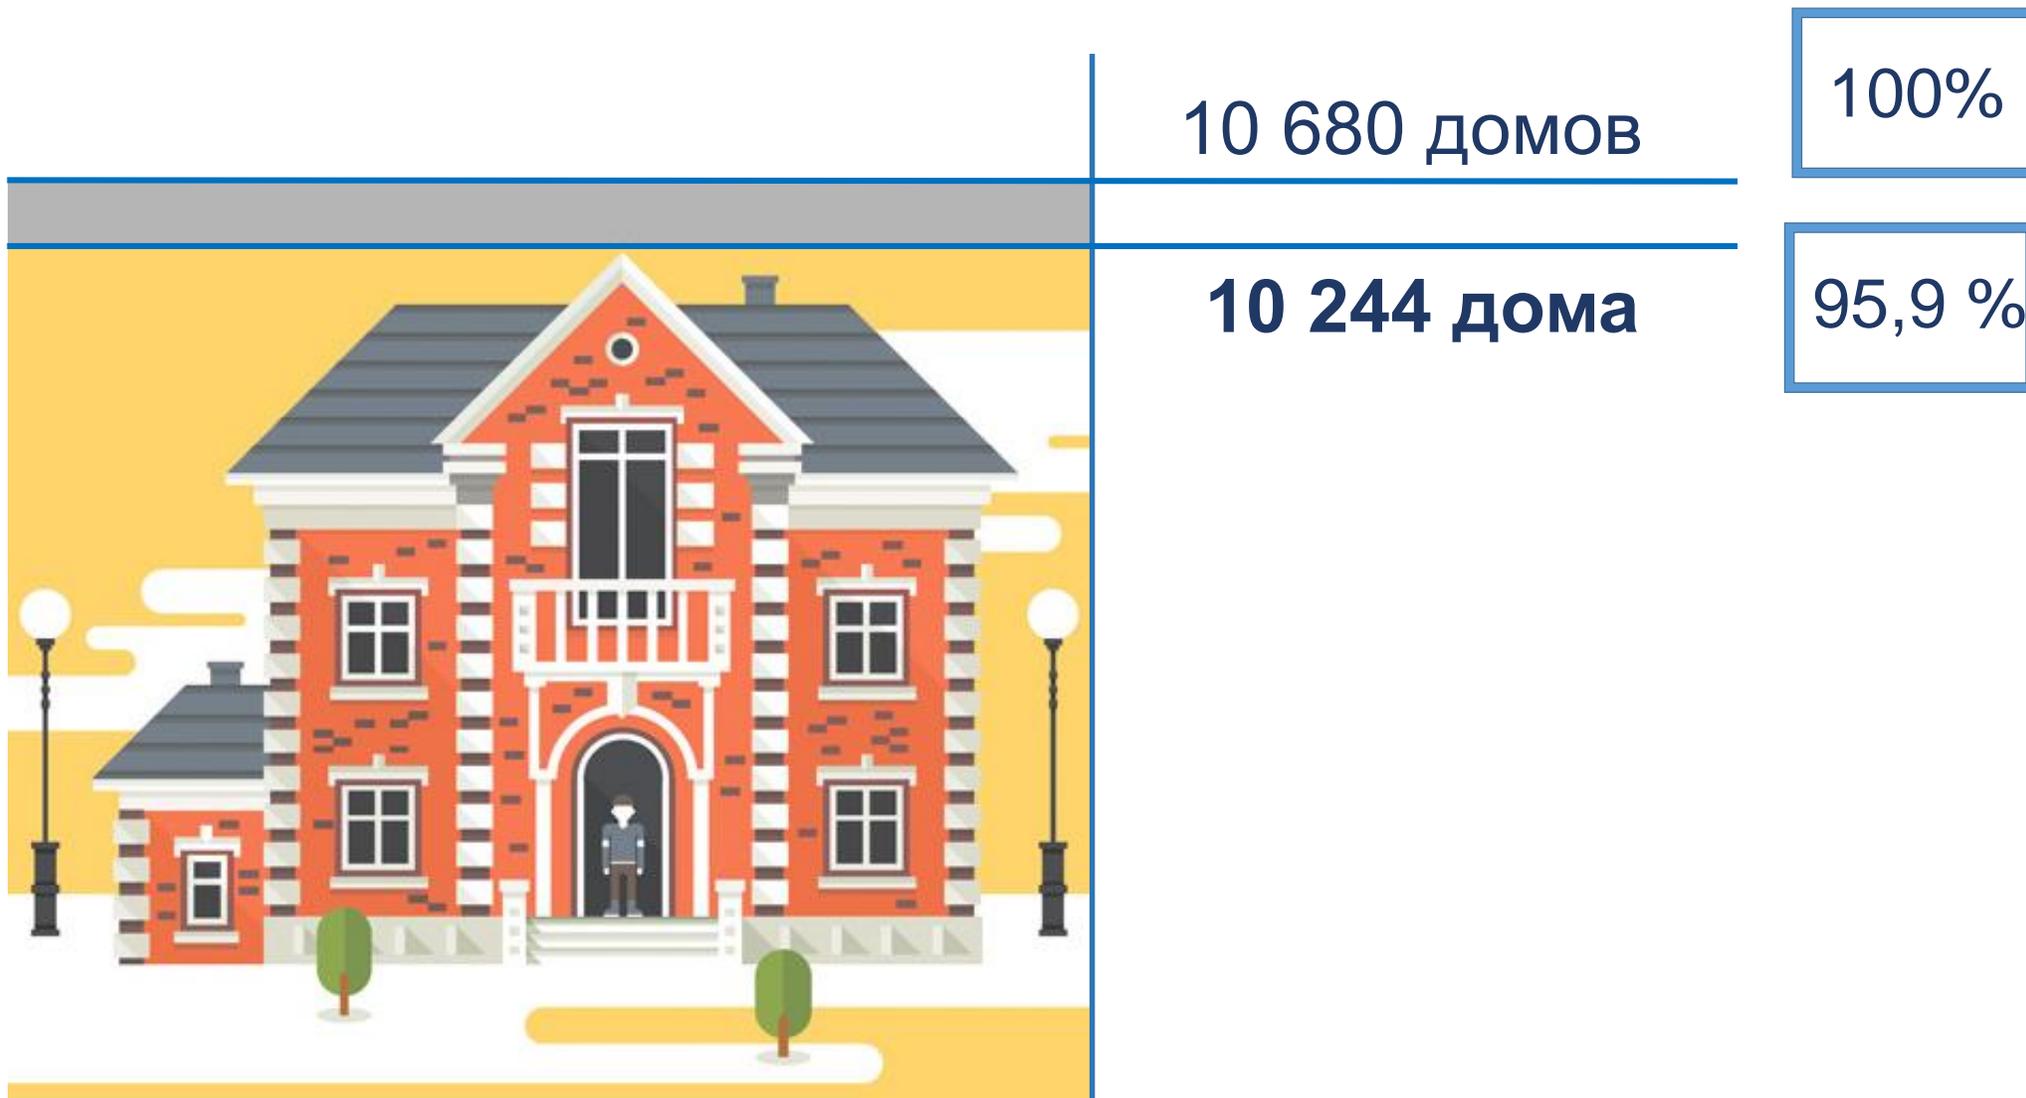



Ввод жилья в Республике Татарстан

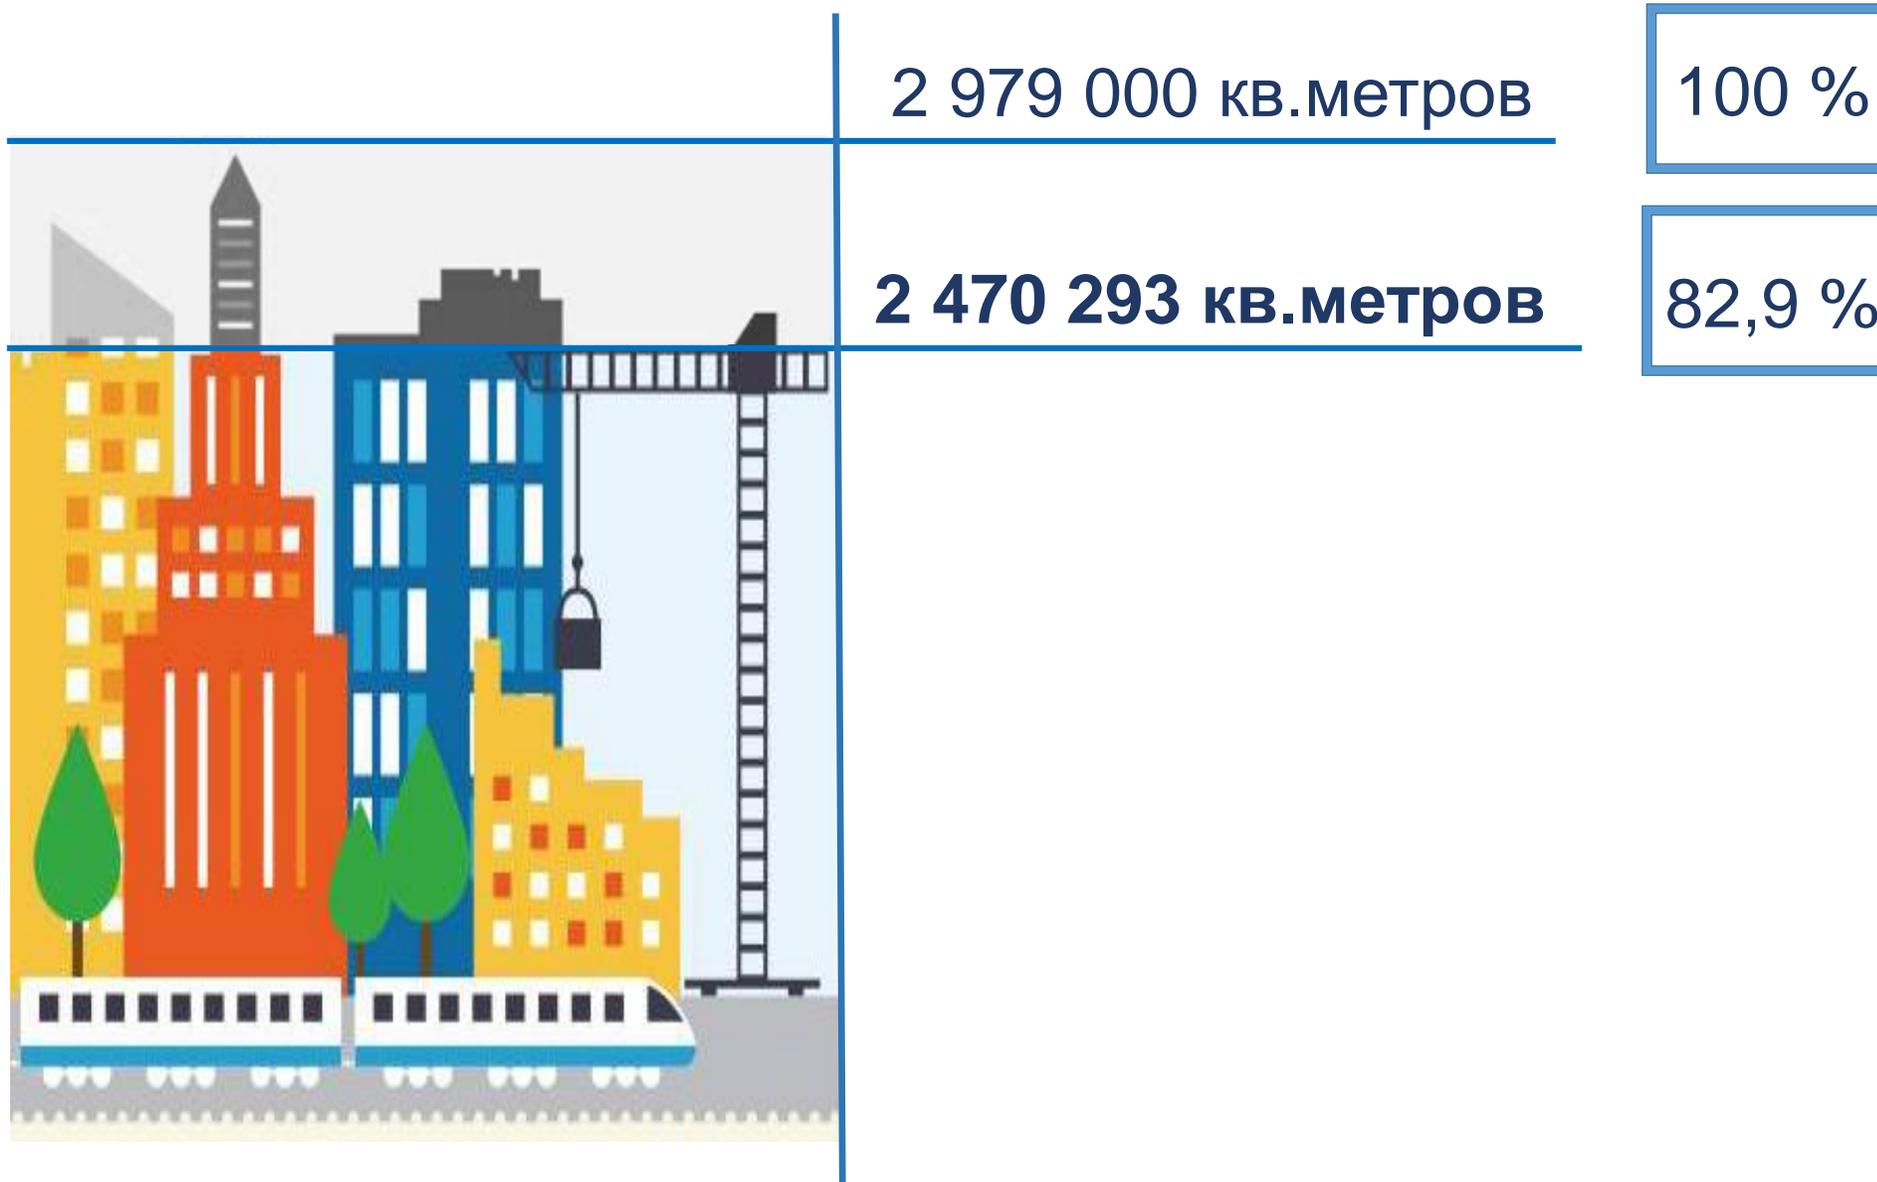



Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	50 536	45,9	59 464
2	Бугульминский	45 000	22 720	50,5	22 280
3	Лениногорский	32 000	16 898	52,8	15 102
4	Чистопольский	35 000	20 098	57,4	14 902
5	г.Наб.Челны	350 000	213 739	61,1	136 261
6	Новошешминский	6 000	3 718	62,0	2 282
7	Тетюшский	14 000	9 675	69,1	4 325
8	К-Устьинский	12 000	8 394	70,0	3 606
9	Атнинский	6 000	4 351	72,5	1 649
10	Менделеевский	15 000	10 988	73,3	4 012
11	г.Казань	960 000	738 673	76,9	221 327
12	Аксубаевский	10 000	7 901	79,0	2 099
13	Арский	30 000	23 759	79,2	6 241
14	Дрожжановский	9 000	7 244	80,5	1 756
15	Спасский	9 000	7 366	81,8	1 634
ВСЕГО		2 979 000	2 470 293	82,9	508 707



Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Зеленодольский	110 000	90 395	82,2	19 605
17	Бавлинский	18 000	15 226	84,6	2 774
18	Альметьевский	140 000	119 577	85,4	20 423
19	Азнакаевский	26 000	22 392	86,1	3 608
20	В-Услонский	50 000	44 043	88,1	5 957
21	Р-Слободский	18 000	16 366	90,9	1 634
22	Тюлячинский	12 000	11 020	91,8	980
23	Елабужский	65 000	59 838	92,1	5 162
24	Мензелинский	18 000	16 620	92,3	1 380
25	Ютазинский	15 000	13 882	92,5	1 118
26	Алексеевский	19 000	17 767	93,5	1 233
27	Сабинский	26 000	24 350	93,7	1 650
28	Алькеевский	10 000	9 480	94,8	520
29	Мамадышский	23 000	21 819	94,9	1 181
30	Агрызский	21 000	20 035	95,4	965
ВСЕГО		2 979 000	2 470 293	82,9	508 707



Ввод жилья по МО РТ

КВ.М.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Сармановский	12 000	11 449	95,4	551
32	Актанышский	18 000	17 355	96,4	645
33	Балтасинский	18 000	17 412	96,7	588
34	Кукморский	29 000	28 527	98,4	473
35	Заинский	21 000	20 673	98,4	327
36	Черемшанский	7 000	6 948	99,3	52
37	Муслюмовский	12 000	11 930	99,4	70
38	Нурлатский	20 000	20 060	100,3	-
39	Кайбицкий	7 000	7 031	100,4	-
40	Буинский	20 000	20 297	101,5	-
41	Пестречинский	200 000	203 568	101,8	-
42	Тукаевский	120 000	126 818	105,7	-
43	Апастовский	8 000	8 901	111,3	-
44	Высокогорский	110 000	127 567	116,0	-
45	Лаишевский	160 000	192 887	120,6	-
ВСЕГО		2 979 000	2 470 293	82,9	508 707



Улучшение жилищных условий граждан

■ Заселено, ед. ■ Остаток, ед.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

100%

План 46

обеспечено – 46

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

98%

2%

План 47

обеспечено – 46

ДЕТИ-СИРОТЫ

51%

49%

План 600

обеспечено – 304

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

96%

4%

План 24

обеспечено – 23

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Дети-сироты

№	МО РТ	Выставлено для выбора	В том числе по этапам оформления				№	МО РТ	Выставлено для выбора	В том числе по этапам оформления			
			Заселено	Право РТ	Право ГЖФ	Предпрод-подготовка				Заселено	Право РТ	Право ГЖФ	Предпрод-подготовка
1	Агрызский	4			4		12	Лаишевский	5	5			
2	Азнакаевский	3			3		13	Мензелинский	4	4			
3	Актанышский	1			1		14	Нижнекамский	132	90		14	28
4	Альметьевский	82	79		3		15	Сабинский	1			1	
5	Апастовский	1			1		16	Сармановский	4	4			
6	Бугульминский	9					17	Тукаевский	3			3	
7	Высокогорский	2	2				18	Тюлячинский	4				4
8	Елабужский	26				26	19	Черемшанский	2				2
9	Зеленодольский	2	2				20	Чистопольский	12			12	
10	Кайбицкий	1	1				21	г.Наб. Челны	13	13			
11	Кукморский	5	5					г.Казань	284	99		79	74
ИТОГО									600	304		121	134
41 жилое помещение в несданных МКД: Бугульминский – 9, г.Казань - 32.													



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено семей
1	Арский	1	1	7	Нижекамский	5	5
2	Альметьевский	1	1	8	Нурлатский	1	1
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Высокогорский	1	1	10	Ютазинский	1	1
5	Елабужский	1	1	11	г.Набережные Челны	10	10
6	Лаишевский	1	1	12	г.Казань	23	22
ИТОГО						47	46



Отдельные категории граждан

№	Категория граждан	Оформлено сертификатов		
		План	Выдано	Реализовано
1	Чернобыльцы	10	9	9
2	Вынужденные переселенцы	12	12	9
2.1	Альметьевский	1	1	0
2.2	Казань	2	2	0
3	Выехавшие из районов Крайнего Севера	2	2	1
3.1	Верхнеуслонский	1	1	0
	Итого	24	23	19




Образование

Строительство дошкольных образовательных организаций

Выполнение работ


Освоено Остаток

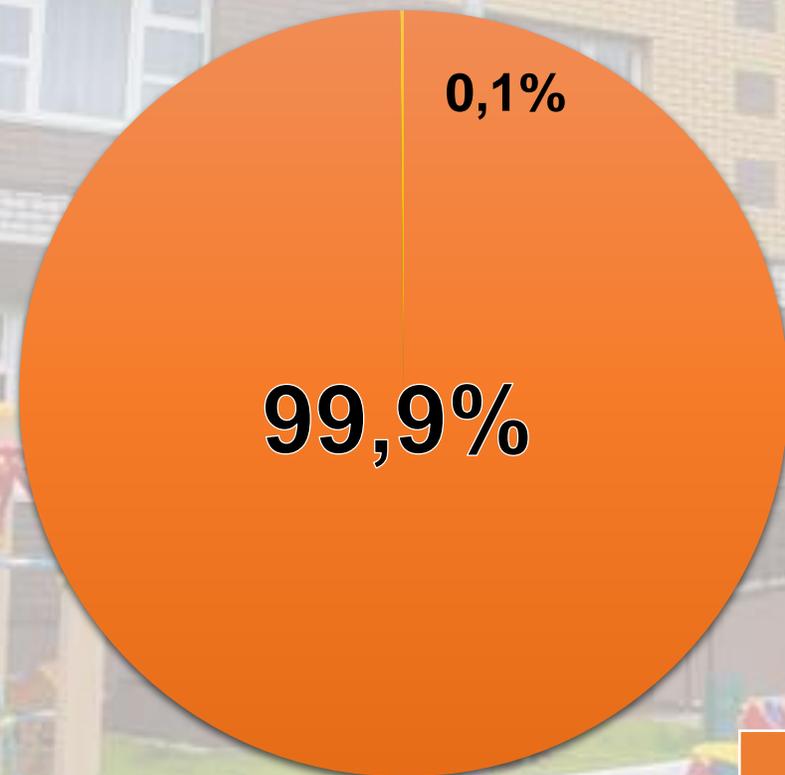

Динамика – 0,4%

Принято КС-2

Освоено Остаток

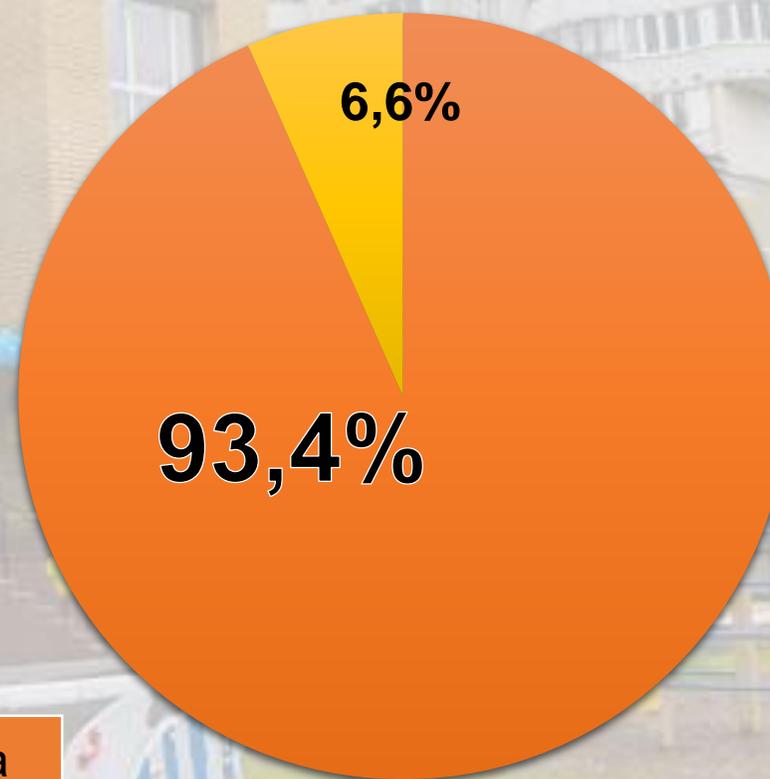

Всего 22 объекта

завершено – 21

Динамика – 5,6%



Строительство дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Детский сад на 340 мест в г.Казань, ЖР «Западное Заречье» (ул.Серова-Баруди)	355 521,73	97,0	2,0
ИТОГО по 22 объектам		5 282 814,68	99,85	0,4



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
1	Строительство ДОО на 340 мест, с.Высокая Гора	+	+	100	передан
2	Строительство ДОО на 340 мест, г.Казань, ЖК«Залесный Сити»	+	не требуются	100	передан
3	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, жилой район «Замелекесье», мкр.25	+	+	100	в стадии передачи
4	Строительство ДОО на 140 мест, Тукаевский МО, д.Азьмушкино	+	+	100	в стадии передачи
5	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, жилой район «Замелекесье», мкр.22	+	+	98,42	
6	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, п.ЗЯБ, мкр.19	+	+	100	



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %
7	Строительство ДОО на 120 мест, г.Казань, жилой комплекс «Весна 2»	+	не требуются	98,55
8	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.29	+	+	92,48
9	Строительство ДОО на 220 мест, г.Зеленодольск, жилой район «Красный металлист»	+	-	100
10	Строительство ДОО на 140 мест, г.Арск	+	+	100
11	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.35А	+	+	93,08
12	Строительство ДОО на 260 мест, г.Буинск	+	-	97,52
13	Строительство дошкольной образовательной организации на 50 мест в Сабинском районе, д.Илебер	-	-	91,65
14	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в Лаишевском районе, ЖК «Южный парк»	+	-	90,47



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %
15	Строительство ДОО на 260 мест 2 квартал жилого района "Салават купере"	+	не требуются	100
16	Строительство ДОО на 260 мест 3 квартал жилого района "Салават купере"	+	не требуются	100
17	Строительство ДОО на 220 мест жилой комплекс "Усадьба Царево"	+	+	100
18	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Казань, мкр. "Седьмое небо"	-	-	92,12



Здравоохранение

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

Динамика

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ

100,0%

89,3%

6,6%

Всего 43 объекта
завершено – 43

**СТРОИТЕЛЬСТВО
ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ**

99,7%

79,2%

3,9%

8,9%

Всего 7 объектов
завершено – 5

**СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ**

65,0%

41,5%

8%

0%

Всего 1 объект
завершено – 0

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%



Строительство модульно-врачебных амбулаторий

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский МР, с.Большое Шемякино	16 367,06	99,2	3,4
2	Кукморский МР, с.Ядыгерь	8 134,86	98,4	9,7
Итого по 7 объектам		77 358,6	99,7	3,9

Строительство офиса врача общей практики

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Офис врача общей практики ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, пос.Бирюлинского зверосовхоза	27 985,23	65,0	8,0




Сельское хозяйство

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

**СТРОИТЕЛЬСТВО
КОРОВНИКОВ
И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ**

**СТРОИТЕЛЬСТВО
СИЛОСНО-СЕНАЖНЫХ
ТРАНШЕЙ**

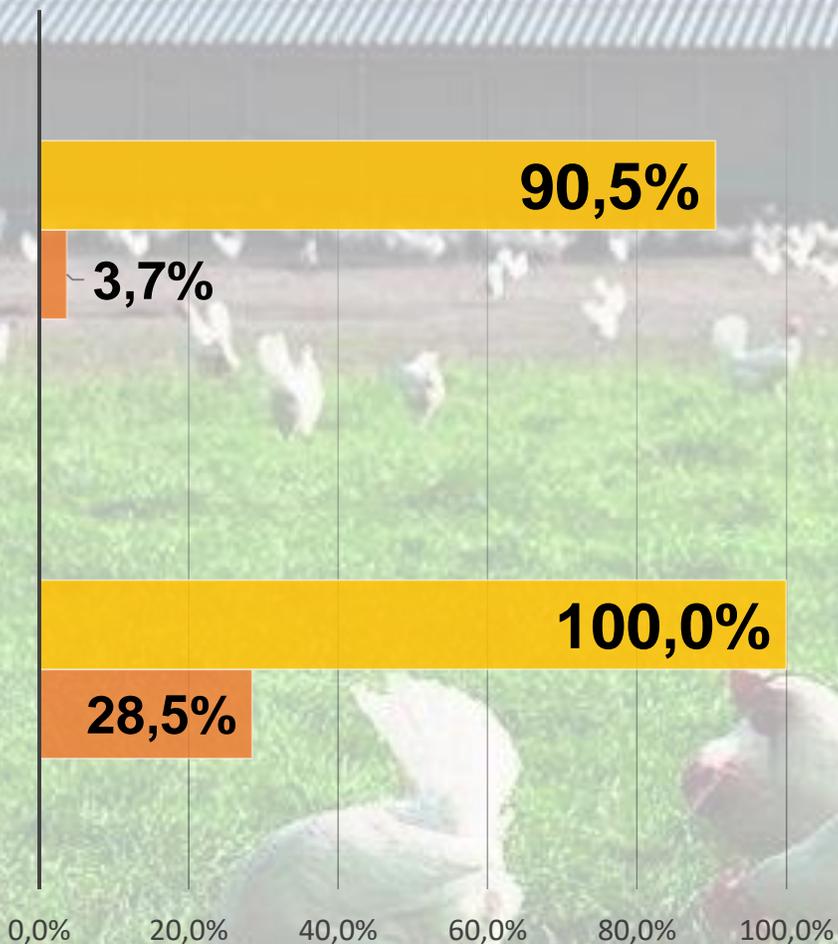

Динамика

9,5%

Всего 7 объектов

0%

завершено – 4

28,5%

Всего 77 объектов

завершено – 77



Сельское хозяйство

Строительство коровников и овцеводческих ферм

№	МО РТ	Сметная стоимость, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Балтасинский район, с.Княбаш	108 053,00	80,0	16,0
2	Сабинский район, с.Тюбяк	52 339,00	86,0	21,0
3	Ютазинский район. д.Яссы-Тугай	24 226,00	88,0	13,0
ИТОГО по 7 объектам		333 333,00	90,5	9,5



Формирование комфортной городской среды

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

Динамика

62 ПРОГРАММНЫХ ОБЪЕКТА

98,6%

2,3%

Всего 62 объекта

74,9%

25,6%

завершено – 49

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ

98,8%

2,3%

Всего 4 объекта

96,9%

17,6%

завершено – 2

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%



Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	г.Набережные Челны, Парк «Гренада», 2 очередь, пр.Московский	121 029,11	90	5
2	Сармановский, Центральный сквер по ул. Ленина, 2 очередь, пгт.Джалиль	16 984,76	90	28
3	Арский, Площадь Советская и ул.Большая, 3 очередь, г.Арск	40 433,455	92	23
4	Бугульминский, Активация городского центра, 2 очередь, г.Бугульма, ул.Владимира Ленина	81 453,534	93	3
5	Лениногорский, Сквер им.Ленина, г.Лениногорск	63 730,747	95	2
6	Буинский, Парк Сахарного завода, г.Буинск, ул.Строительная	33 029,652	96	21
7	Пестречинский, Парк отдыха, с.Шали, ул.КамАЗ	15 336,081	96	0
8	Казань, парк "Черное озеро", ул. Дзержинского	75 000,0	96	0
ИТОГО по 62 объектам		2 776 038,3	98,6	2,3



Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
9	Сабинский, Парк по ул.З.Юсупова, пгт.Богатые Сабы	24 214,671	97	1
10	Высокогорский, Сквер 100 лет ТАССР, с.Высокая гора ул.Центральная-Полковая,	39 414,663	97	4
11	Зеленодольский, Парк «Березовая роща», мкр.Мирный, г.Зеленодольск	129 245,55	98	3
12	Нижнекамский, Мемориальный комплекс, г.Нижнекамск	20 000,0	98	3
ИТОГО по 62 объектам		2 776 038,3	98,6	2,3



Формирование комфортной городской среды


Конкурс малых городов - 2020

№ п/п	Наименование объектов	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Лаишевский, «Экстрим-парк» г.Лаишево	45 000,00	98	3
2	Заинский, Центральная площадь у ДК «Энергетик»	70 000,00	98	4
ИТОГО по 4 объектам		187 293,60	98,8	2,3

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ СОВЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО- МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

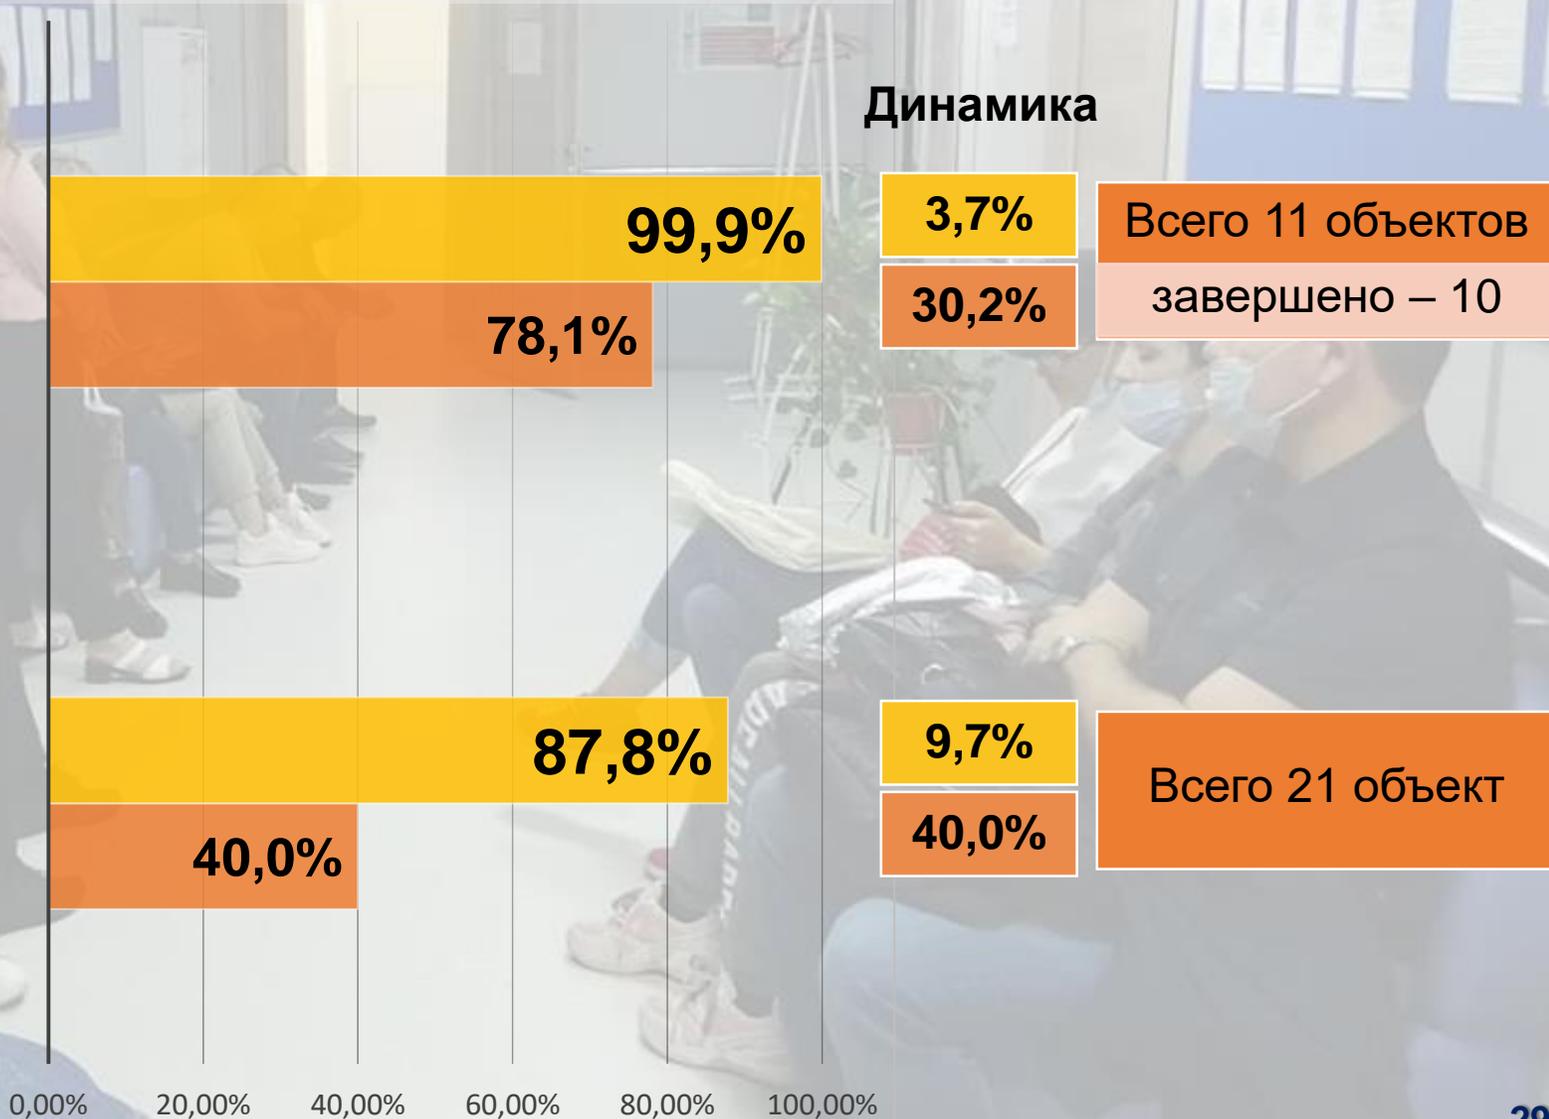



Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
2	Зеленодольский, с.Айша	5 758,5	99,2	1,0
ИТОГО по 11 объектам		63 343,5	99,9	3,7



Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Кудашево, ул.Тукая	2 673,96	77,0	21,0
2	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Дуслык	2 673,96	78,0	1,5
3	Сабинский, с.Старый Мичан, ул.Залесная	2 673,96	78,8	1,8
4	Елабужский, п.Малореченский, ул.Центральная	2 673,96	85,0	2,5
5	Камско-Устьинский, с. Балтачево, ул.Школьная	2 673,96	87,0	2,2
6	Кайбицкий, с.Ульянково, ул.Школьная	2 673,96	88,3	1,8
7	Новошешминский, с.Русская Чебоксарка, ул.Речная	2 673,96	88,5	22,1
8	Муслюмовский, с.Семяково, ул.Школьная	2 673,96	89,5	4,0
9	Кукморский, д.Старая Уча, ул.Первомайская	2 673,96	89,5	2,8
10	Актанышский, с.Чишма, ул.Центральная	2 673,96	90,0	1,2
11	Алексеевский, д.Березовая Грива, ул.Пушкина	2 673,96	90,0	1,2
ИТОГО по 21 объекту		56 153,16	87,8	9,7

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах**

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
12	Алькеевский, с.Верхнее Алькеево, ул.Мира	2 673,96	90,0	1,3
13	Буинский, д.Раково, ул.Центральная	2 673,96	90,0	1,5
14	Дрожжановский, с.Новые Чукалы, ул.Советская	2 673,96	90,0	1,4
15	Заинский, с.Сарапала, ул.Центральная	2 673,96	90,0	6,0
16	Сармановский, с.Сарманово, ул.В.Терешковой	2 673,96	90,0	1,0
17	Тукаевский, д.Кугашево, ул.Лесная	2 673,96	90,0	2,0
18	Черемшанский, д.Старое Серезкино, ул.Степная	2 673,96	90,0	1,5
19	Чистопольский, с.Четырчи, ул.Зеленая	2 673,96	90,0	5,6
20	Мамадышский, с.Дигитли, ул.Центральная	2 673,96	91,8	3,3
21	Мамадышский, с.Соколка, ул.Лесная	2 673,96	91,8	3,3
ИТОГО по 21 объекту		56 153,16	87,8	9,7



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
1	Чистопольский	475 435,54	254 070,80	53,44	221 364,74
2	Р.-Слободский	269 093,66	150 772,14	56,03	118 321,52
3	Аксубаевский	161 420,07	99 890,33	61,88	61 529,74
4	Нурлатский	214 499,67	151 254,30	70,51	63 245,37
5	Атнинский	84 255,23	63 184,88	74,99	21 070,35
6	Казань	12 161 642,75	9 208 039,11	75,71	2 953 603,64
7	Менделеевский	180 860,78	138 573,56	76,62	42 287,22
8	Алькеевский	195 465,56	152 673,95	78,11	42 791,61
9	Азнакаевский	213 148,19	167 682,59	78,67	45 465,60
10	Алексеевский	158 044,67	126 106,88	79,79	31 937,80
11	Высокогорский	759 295,67	620 310,82	81,70	138 984,85
12	Сабинский	356 226,54	295 707,19	83,01	60 519,35
13	Агрызский	181 065,74	150 988,76	83,39	30 076,98
14	Зеленодольский	1 143 299,09	954 880,25	83,52	188 418,84
15	Муслюмовский	152 133,29	132 980,84	87,41	19 152,45
Итого по РТ:		30 746 846,84	25 504 643,16	82,95	5 242 203,68



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
16	Наб.Челны	3 960 764,71	3 472 653,38	87,68	488 111,33
17	Мензелинский	119 210,88	104 536,41	87,69	14 674,47
18	Лаишевский	489 577,10	430 667,01	87,97	58 910,09
19	Арский	344 964,17	304 454,22	88,26	40 509,95
20	Черемшанский	158 558,77	141 300,31	89,12	17 258,46
21	Кукморский	362 683,65	324 415,20	89,45	38 268,45
22	Заинский	410 711,52	368 388,29	89,70	42 323,24
23	Нижнекамский	2 189 731,38	1 978 124,15	90,34	211 607,23
24	Мамадышский	208 744,54	189 360,38	90,71	19 384,16
25	Лениногорский	259 465,51	236 223,10	91,04	23 242,40
26	Альметьевский	639 353,83	585 707,66	91,61	53 646,17
27	Тукаевский	393 361,01	364 209,83	92,59	29 151,18
28	Актанышский	217 069,24	201 583,74	92,87	15 485,50
29	Новошешминский	95 429,46	88 771,23	93,02	6 658,23
30	Ютазинский	75 702,76	70 966,52	93,74	4 736,24
Итого по РТ:		30 746 846,84	25 504 643,16	82,95	5 242 203,68



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
31	Елабужский	516 127,29	483 904,53	93,76	32 222,77
32	Верхнеуслонский	131 377,17	125 712,69	95,69	5 664,48
33	Балтасинский	189 149,53	181 191,78	95,79	7 957,75
34	Бавлинский	253 158,46	242 864,21	95,93	10 294,24
35	Пестречинский	423 083,99	406 271,22	96,03	16 812,77
36	Кайбицкий	67 031,58	64 407,03	96,08	2 624,55
37	Бугульминский	588 028,40	567 778,41	96,56	20 249,99
38	Сармановский	156 365,88	151 162,64	96,67	5 203,25
39	Дрожжановский	160 551,52	155 596,19	96,91	4 955,33
40	Тетюшский	183 899,51	178 364,54	96,99	5 534,97
41	Камско-Устьинский	319 473,09	312 472,27	97,81	7 000,82
42	Буинский	606 116,79	593 212,16	97,87	12 904,63
43	Тюлячинский	80 346,71	78 843,65	98,13	1 503,06
44	Апастовский	299 180,71	294 709,06	98,51	4 471,65
45	Спасский	141 741,22	139 674,98	98,54	2 066,23
Итого по РТ:		30 746 846,84	25 504 643,16	82,95	5 242 203,68



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
1	Р.-Слободский	244 786,90	126 465,38	51,66	118 321,52
2	Чистопольский	460 848,05	239 483,31	51,97	221 364,74
3	Аксубаевский	147 925,33	86 395,59	58,40	61 529,74
4	Казань	5 295 312,59	3 513 130,00	66,34	1 782 182,59
5	Алькеевский	135 762,67	92 971,06	68,48	42 791,61
6	Нурлатский	144 917,56	101 004,69	69,70	43 912,87
7	Атнинский	70 728,33	49 670,48	70,23	21 057,85
8	Азнакаевский	190 790,89	145 325,29	76,17	45 465,60
9	Сабинский	218 609,41	170 886,14	78,17	47 723,26
10	Алексеевский	136 112,37	107 040,05	78,64	29 072,32
11	Агрызский	143 237,86	113 243,83	79,06	29 994,03
12	Высокогорский	586 481,09	475 593,94	81,09	110 887,16
13	Зеленодольский	1 096 345,28	910 252,20	83,03	186 093,08
14	Мензелинский	86 907,50	72 233,03	83,11	14 674,47
15	Наб.Челны	2 602 831,48	2 183 089,09	83,87	419 742,39
Итого по РТ:		19 268 461,80	15 505 529,32	80,47	3 762 932,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
16	Мамадышский	102 468,31	88 510,19	86,38	13 958,12
17	Нижнекамский	1 397 753,81	1 210 390,87	86,60	187 362,94
18	Лаишевский	475 187,69	416 277,61	87,60	58 910,09
19	Альметьевский	435 965,85	382 319,68	87,69	53 646,17
20	Арский	333 522,86	294 730,99	88,37	38 791,87
21	Елабужский	179 310,94	159 251,29	88,81	20 059,65
22	Кукморский	306 322,98	273 375,02	89,24	32 947,96
23	Черемшанский	99 080,98	88 523,86	89,34	10 557,12
24	Лениногорский	239 726,76	217 118,35	90,57	22 608,40
25	Актанышский	99 207,23	90 616,21	91,34	8 591,01
26	Ютазинский	62 149,13	57 412,88	92,38	4 736,24
27	Заинский	363 876,49	337 531,05	92,76	26 345,44
28	Муслюмовский	128 186,88	118 922,02	92,77	9 264,86
29	Тукаевский	348 807,68	327 443,01	93,87	21 364,67
30	Новошешминский	57 277,61	54 143,54	94,53	3 134,07
Итого по РТ:		19 268 461,80	15 505 529,32	80,47	3 762 932,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
31	Кайбицкий	55 101,98	52 512,99	95,30	2 588,99
32	Сармановский	111 060,90	105 855,07	95,31	5 205,83
33	Пестречинский	402 976,10	388 078,34	96,30	14 897,76
34	Бугульминский	529 833,08	511 389,87	96,52	18 443,21
35	Тетюшский	135 213,09	131 013,58	96,89	4 199,51
36	Балтасинский	139 324,72	135 471,56	97,23	3 853,16
37	Дрожжановский	96 336,41	93 747,67	97,31	2 588,74
38	Буинский	541 786,12	529 502,35	97,73	12 283,76
39	Тюлячинский	56 575,06	55 318,63	97,78	1 256,43
40	Менделеевский	67 819,26	66 545,72	98,12	1 273,54
41	Спасский	123 667,00	121 600,76	98,33	2 066,23
42	Апастовский	273 600,65	269 340,96	98,44	4 259,69
43	Камско-Устьинский	277 781,31	275 192,12	99,07	2 589,19
44	Верхнеуслонский	77 438,35	77 103,85	99,57	334,50
45	Бавлинский	189 505,31	189 505,20	100,00	0,00
Итого по РТ:		19 268 461,80	15 505 529,32	80,47	3 762 932,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
1	Муслюмовский	11 373,47	1 485,88	13,06	9 887,60
2	Тукаевский	12 507,30	4 720,79	37,74	7 786,51
3	Дрожжановский	4 169,10	1 802,50	43,23	2 366,60
4	Заинский	32 502,23	16 524,43	50,84	15 977,80
5	Нурлатский	43 451,36	24 419,17	56,20	19 032,19
6	Арский	4 169,10	2 451,02	58,79	1 718,08
7	Актанышский	4 860,70	2 891,30	59,48	1 969,40
8	Менделеевский	103 672,53	62 658,85	60,44	41 013,68
9	Высокогорский	8 032,80	5 330,39	66,36	2 702,41
10	Балтасинский	11 753,95	7 985,31	67,94	3 768,64
11	Тетюшский	4 169,10	2 917,13	69,97	1 251,97
12	Алексеевский	9 384,38	6 862,28	73,12	2 522,10
13	Бавлинский	46 915,16	36 621,03	78,06	10 294,13
14	Новошешминский	11 822,22	9 748,12	82,46	2 074,10
15	Казань	6 798 400,97	5 631 501,93	82,84	1 166 899,04
Итого по РТ:		10 162 429,07	8 739 170,22	85,99	1 423 258,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
16	Верхнеуслонский	32 375,01	27 236,52	84,13	5 138,48
17	Кукморский	23 465,44	19 844,41	84,57	3 621,03
18	Сабинский	120 378,11	107 943,94	89,67	12 434,17
19	Черемшанский	30 097,51	27 796,17	92,35	2 301,34
20	Мамадышский	69 221,91	65 302,87	94,34	3 919,04
21	Наб.Челны	1 340 302,77	1 271 933,83	94,90	68 368,94
22	Бугульминский	41 617,98	39 811,20	95,66	1 806,78
23	Елабужский	322 955,77	310 792,65	96,23	12 163,11
24	Нижнекамский	769 836,58	745 592,29	96,85	24 244,29
25	Тюлячинский	11 753,30	11 753,30	100	0,00
26	Агрызский	22 961,51	22 961,51	100	0,00
27	Алькеевский	42 413,80	42 413,80	100	0,00
28	Альметьевский	183 545,32	183 545,32	100	0,00
29	Мензелинский	18 727,28	18 727,28	100	0,00
30	Апастовский	3 495,49	3 495,49	100	0,00
31	Сармановский	22 096,93	22 099,51	100	0,00
Итого по РТ:		10 162 429,07	8 739 170,22	85,99	1 423 258,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
1	Высокогорский	164 781,78	139 386,49	84,59	25 395,29
2	Черемшанский	29 380,28	24 980,28	85,02	4 400,00
3	Камско-Устьинский	41 691,79	37 280,15	89,42	4 411,63
4	Пестречинский	20 107,90	18 192,89	90,48	1 915,01
5	Казань	67 929,19	63 407,17	93,34	4 522,02
6	Новошешминский	26 329,63	24 879,57	94,49	1 450,06
7	Кукморский	32 895,23	31 195,77	94,83	1 699,46
8	Зеленодольский	46 953,82	44 628,05	95,05	2 325,77
9	Актанышский	113 001,31	108 076,22	95,64	4 925,08
10	Мамадышский	37 054,32	35 547,32	95,93	1 507,00
11	Лениногорский	19 738,75	19 104,75	96,79	634,00
12	Алексеевский	12 547,93	12 204,55	97,26	343,38
13	Сабинский	17 239,03	16 877,11	97,90	361,92
14	Тюлячинский	12 018,35	11 771,72	97,95	246,63
15	Нурлатский	26 130,76	25 830,44	98,85	300,31
Итого по РТ:		1 315 955,98	1 259 943,62	95,74	56 012,35



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
16	Буинский	64 330,67	63 709,81	99,03	620,87
17	Апастовский	22 084,56	21 872,61	99,04	211,96
18	Верхнеуслонский	21 563,82	21 372,32	99,11	191,50
19	Балтасинский	38 070,87	37 734,92	99,12	335,95
20	Агрызский	14 866,37	14 783,42	99,44	82,96
21	Кайбицкий	11 929,60	11 894,04	99,70	35,57
22	Тетюшский	44 517,33	44 433,84	99,81	83,49
23	Атнинский	13 526,90	13 514,40	99,91	12,50
24	Бавлинский	16 737,99	16 737,98	100,00	0,00
25	Сармановский	23 208,05	23 208,05	100,00	0,00
26	Муслюмовский	12 572,94	12 572,94	100,00	0,00
27	Бугульминский	16 577,34	16 577,34	100,00	0,00
28	Тукаевский	32 046,02	32 046,02	100,00	0,00
29	Чистопольский	14 587,50	14 587,50	100,00	0,00
30	Азнакаевский	22 357,30	22 357,30	100,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 955,98	1 259 943,62	95,74	56 012,35



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
31	Менделеевский	9 368,99	9 368,99	100,00	0,00
32	Р.-Слободский	24 306,76	24 306,76	100,00	0,00
33	Аксубаевский	13 494,74	13 494,74	100,00	0,00
34	Спасский	18 074,22	18 074,22	100,00	0,00
35	Елабужский	13 860,59	13 860,59	100,00	0,00
36	Наб.Челны	17 630,46	17 630,46	100,00	0,00
37	Арский	7 272,21	7 272,21	100,00	0,00
38	Лаишевский	14 389,40	14 389,40	100,00	0,00
39	Ютазинский	13 553,64	13 553,64	100,00	0,00
40	Мензелинский	13 576,10	13 576,10	100,00	0,00
41	Заинский	14 332,80	14 332,80	100,00	0,00
42	Нижнекамский	22 140,99	22 140,99	100,00	0,00
43	Дрожжановский	60 046,02	60 046,02	100,00	0,00
44	Альметьевский	19 842,67	19 842,67	100,00	0,00
45	Алькеевский	17 289,09	17 289,09	100,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 955,98	1 259 943,62	95,74	56 012,35



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
1	Формирование комфортной городской среды	1 452 790,33	1 380 575,18	72 215,15	РКМ №1891-р от 29.09.2020
2	Реконструкция, строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах Республики Татарстан	162 200,00	150 846,00	11 354,00	РКМ №2481-р от 18.11.2020
3	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений Республики Татарстан	69 900,00	65 007,00	4 893,00	РКМ №2499-р от 20.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан	225 000,00	224 900,00	100,00	РКМ №2500-р от 20.11.2020
Министерство спорта РТ					
5	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок	300 000,00	292 289,10	7 710,90	РКМ №2445-р от 13.11.2020
6	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,00	484 175,08	15 824,92	РКМ №2494-р от 20.11.2020
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
7	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов)	60 000,00	60 000,00	0,00	РКМ №2449-р от 13.11.2020
8	Капитальный ремонт овощехранилищ	15 000,00	15 000,00	0,00	РКМ №2450-р от 13.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Вышедшие РКМ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии	30 000,00	30 000,00	0,00	РКМ №2513-р от 23.11.2020
10	Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений	20 000,00	20 000,00	0,00	
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ					
11	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания	100 000,00	100 000,00	0,00	РКМ №2566-р от 26.11.2020
Министерство лесного хозяйства РТ					
12	Капитальный ремонт подведомственных зданий	70 500,00	70 500,00	0,00	РКМ №2611-р от 28.11.2020
Государственный комитет РТ по архивному делу					
13	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	48 890,00	1 110,00	РКМ №2558-р от 25.11.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ, зашедшие в КМ РТ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Управление Росгвардии по РТ					
1	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии	111 403,45	111 403,45	0,00	вх. КМ РТ №65344 от 23.11.2020
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
2	Строительство силосно-сенажных траншей	54 600,00	54 600,00	0,00	вх. КМ РТ №66085 от 26.11.2020
3	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	50 000,00	2 920,56	вх. КМ РТ №67921 от 03.12.2020
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»					
4	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов	100 000,00	97 501,13	2 498,87	вх. КМ РТ №67745 от 03.12.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство по делам молодежи РТ					
1	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	согл-9993502-2 от 16.11.2020
2	Капитальный ремонт молодежных центров	95 000,00	91 390,00	3 610,00	согл-9889917-5 от 20.10.2020
3	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	96 200,00	3 800,00	согл-9907278-2 от 23.10.2020
Министерство здравоохранения РТ					
4	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения	330 000,00	318 119,88	11 880,12	согл-9847551-11 от 09.10.2020
5	Строительство и капитальный ремонт стационаров	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	согл-9849301-7 от 09.10.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство внутренних дел по РТ					
6	Строительство и капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	150 000,00	148 860,00	1 140,00	согл-9846875-3 от 09.10.2020
Министерство культуры РТ					
7	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	300 000,00	288 600,00	11 400,00	согл-9850189-5 от 09.10.2020
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	150 000,00	144 300,00	5 700,00	согл-9850286-6 от 09.10.2020
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ					
9	Обеспечение населения питьевой водой	650 000,00	589 250,00	60 750,00	согл-9742193-9 от 15.09.2020
10	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	167 100,00	167 100,00	0,00	согл-9849577-3 от 09.10.2020



Формирование государственных программ на 2021 год Проекты РКМ на межведомственном согласовании

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство образования и науки РТ					
11	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,8	179 654,72	10 395,08	согл-9971769-2 от 11.11.2020
12	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,0	481 000,00	19 000,00	согл-9971422-2 от 11.11.2020
13	Строительство дошкольных образовательных организаций	3 021 020,04	3 014 003,1	7 016,94	согл-10016146-1 от 20.11.2020
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ					
14	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах	150 000,00	150 000,00	0,00	Возвращен от КМ РТ на доработку. Ведется корректировка РКМ с учетом замечаний



Формирование государственных программ на 2021 год. Проводится работа по формированию программ

№	Наименование программы	Согласованные Президентом РТ лимиты финансирования тыс.рублей			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
Министерство образования и науки РТ					
1	Капремонт объектов образования	2 000 000,0	1 921 079,41	78 920,59	Перечень определен, необходимы документы по части объектов
2	Организация горячего питания в школах	1 000 000,00			Перечень определен, ожидается предоставление документации от районов, параллельно ведется работа по расчету стоимости объектов



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
Проведено проверок	2 346
Выявлено нарушений	602
Устранено нарушений	573
Процент устранения нарушений	95
Составлены предписания	289



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	Аксубаевский	26	1	0	0
2	Алексеевский	15	4	0	0
3	Кукморский	98	4	0	0
4	Лениногорский	29	4	0	0
5	Лаишевский	79	8	4	50
6	г. Казань	467	181	169	93
7	г. Наб.Челны	48	67	67	100
8	Агрызский	33	0	0	-
9	Азнакаевский	42	0	0	-
10	Актанышский	47	0	0	-
11	Алькеевский	12	2	2	100
12	Альметьевский	64	42	42	100
13	Апастовский	27	10	10	100
14	Арский	98	2	2	100
15	Атнинский	47	4	4	100
16	Бавлинский	26	0	0	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Балтасинский	52	3	3	100
18	Бугульминский	84	12	12	100
19	Буинский	34	23	23	100
20	Верхнеуслонский	16	10	10	100
21	Высокогорский	102	4	4	100
22	Дрожжановский	10	2	2	100
23	Елабужский	53	20	20	100
24	Заинский	29	17	17	100
25	Зеленодольский	104	32	32	100
26	Кайбицкий	22	16	16	100
27	Камско-Устьинский	28	20	20	100
28	Мамадышский	33	20	20	100
29	Менделеевский	13	7	7	100
30	Мензелинский	22	0	0	-
31	Муслюмовский	16	4	4	100



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	58	21	21	100
33	Новошешменский	26	0	0	-
34	Нурлатский	40	3	3	100
35	Пестречинский	87	0	0	-
36	Рыбно-Слободский	16	3	3	100
37	Сабинский	120	7	7	100
38	Сармановский	32	0	0	-
39	Спасский	10	1	1	100
40	Тетюшский	19	17	17	100
41	Тукаевский	49	5	5	100
42	Тюлячинский	43	2	2	100
43	Черемшанский	29	22	22	100
44	Чистопольский	19	2	2	100
45	Ютазинский	22	0	0	-
ИТОГО:		2 346	602	573	95



Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 278	-
Вынесено постановлений: - об административной ответственности, - в том числе предупреждений	131 49	5 598,0 -
Взыскано всего	46	3 104,5
Не истёк срок оплаты	33	2 282,5
Обжалуются в суде	3	211,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (саморегулируемые организации РТ)

с 01.01.2020

Наименование	Количество, ед.
Проведено проверок, в том числе:	1 612
- с выездом на объекты строительства	479
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 179
- выдано предписаний	394
- приостановлено право осуществлять строительство	266
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	65
- выдано предупреждений	454

Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Строительство ж/д, по ул. Ахметшина, г. Наб Челны



**Отсутствуют защитные
(страховочные) ограждения
на рабочих местах,
расположенных на высоте
более 1,3 м перепада высот**

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «Свой Дом». Подрядчик: ООО СМК «РОСТ»



Контроль за соблюдением норм охраны труда (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Строительство ж/д по ул. Дубравная, г. Казань



**Работники не обеспечены
защитными касками,
средствами индивидуальной
защиты органов дыхания и рук
(масками и рукавицами)**

Составлен протокол
об административном правонарушении
на физическое лицо

Застройщик: ООО «ИВА». Генподрядчик: ООО «СтандартСтройСервис»



Количество несчастных случаев

■ Со смертельным исходом ■ С тяжелым исходом

**ВСЕГО
по РТ**

янв-дек 2017



26

янв-дек 2018



22

янв -дек 2019



19

янв-дек 2020



18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26



Спасибо за внимание!
