



Программы капитального ремонта и модернизации инженерных систем

Многоквартирные дома	• 1 программа
Образование	• 4 программы
Спорт	• 1 программа
Молодежная политика	• 3 программы
Здравоохранение	• 2 программы
Культура	• 2 программы
Сельское хозяйство	• 7 программ
Иные социальные программы	• 6 программ
Инженерные системы	• 5 программ
31 программа	



Завершенные программы капитального ремонта социально культурных объектов

Объекты культурного назначения (37 объектов)

Образовательные учреждения отрасли культуры
(8 объектов)

Спортивные объекты
(21 объект)

Детские оздоровительные лагеря
(7 объектов)

Молодежные центры
(5 объектов)

Муниципальные архивы
(7 объектов)

Здания подведомственные Министерству
лесного хозяйства (14 объектов)

Ресурсные центры
(17 объектов)

Здания исполнительных комитетов поселений (21 объект)

Конфермы
(11 объектов)

Ветеринарные объединения и управления
сельского хозяйства (41 объект)

Объекты образования
(170 объектов)

Зернотоковые хозяйства
(127 объектов)

Машинно-тракторные парки
(65 объект)

Овощекртофелехранилища
(7 объектов)

Коровники
(154 объекта)

Итого 16 программ (543 объекта)



Завершенные программы модернизации инженерных сетей

**Переход на индивидуальные системы отопления,
установка БМК в городах и районах**

Восстановление уличного освещения в населенных пунктах


Замена котлов в котельных бюджетных учреждений

Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах

**Итого 4 программы
(728 объекта и 419,5 км инженерных сетей)**

Программа капитального ремонта МКД

Выполнение работ

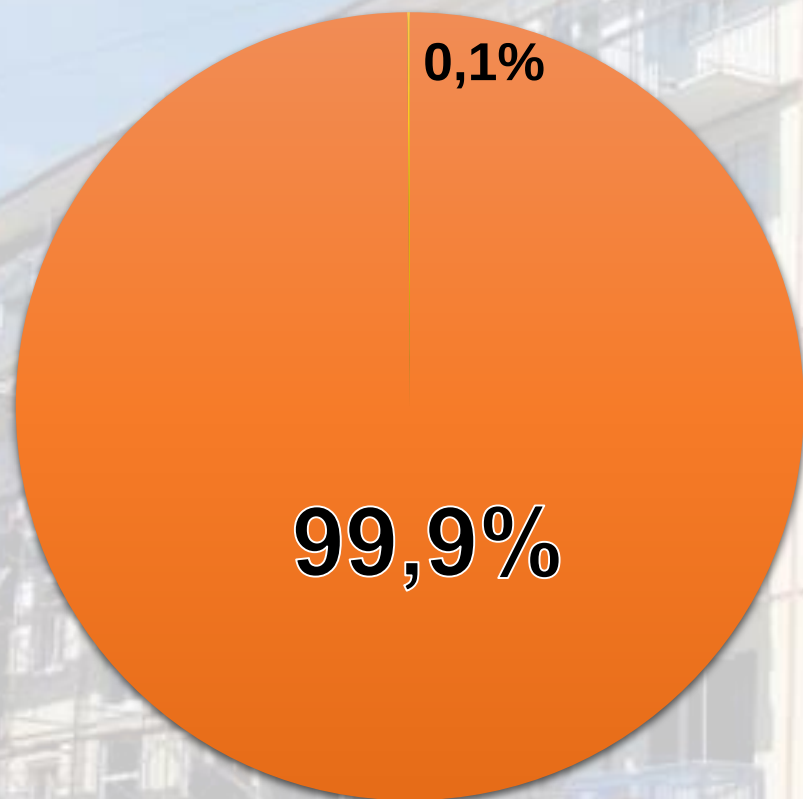


■ Освоено ■ Остаток

Освоено на 6,35 млрд рублей

Динамика за 2 недели – 0,1%

Работы приняты по КС-2

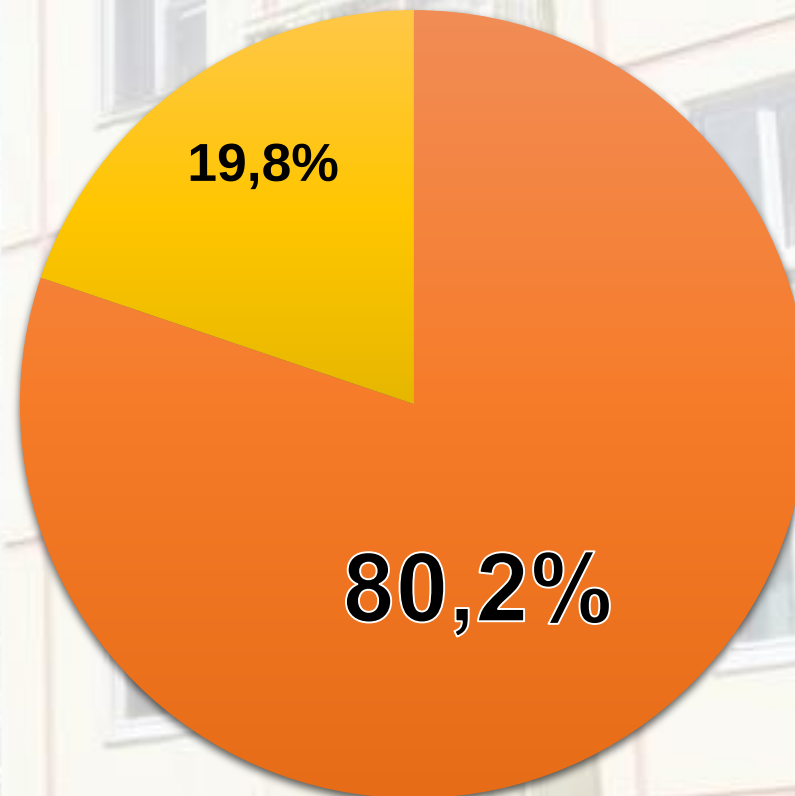

■ Принято КС-2 ■ Остаток

Принято на 5,1 млрд рублей

Динамика за 2 недели – 7,1%



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
1	Пестречинский	18,147	33,34	0,00	100,00	-
2	Высокогорский	45,347	52,07	1,65	100,00	-
3	г. Казань	2 229,228	60,68	5,48	99,24	1,76
4	Тукаевский	27,009	64,15	0,00	100,00	-
5	Зеленодольский	317,974	72,72	4,87	100,00	-
6	Арский	22,192	78,19	10,55	100,00	-
7	Менделеевский	55,476	79,99	1,38	100,00	-
ИТОГО по РТ		6 354,46	80,20	7,07	99,98	0,1
8	Елабужский	161,726	84,92	3,26	100,00	-
9	Рыбно-Слободский	6,098	85,46	0,00	100,00	-
10	Сармановский	41,792	87,57	0,00	100,00	-
11	г. Наб.Челны	1 330,869	87,80	15,71	100,00	-
12	Черемшанский	3,312	89,49	0,00	100,00	-



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
13	Альметьевский	353,197	92,26	2,10	100,00	-
14	Лаишевский	25,263	93,01	28,45	100,00	2,46
15	Нижнекамский	724,977	97,27	2,33	100,00	-
16	Нурлатский	59,813	97,94	0,00	100,00	-
17	Заинский	81,560	99,69	0,00	100,00	-
18	Апастовский	3,119	100,00	-	100,00	-
19	Спасский	7,775	100,00	-	100,00	-
20	Алексеевский	9,733	100,00	-	100,00	-
21	Кукморский	17,456	100,00	-	100,00	-
22	Агрызский	27,922	100,00	13,91	100,00	-
23	Азнакаевский	89,967	100,00	-	100,00	-
24	Аксубаевский	6,608	100,00	-	100,00	-
25	Актанышский	11,255	100,00	-	100,00	-
26	Бавлинский	36,765	100,00	-	100,00	-
	ИТОГО по РТ	6 354,46	80,20	7,07	99,98	0,1



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
27	Балтасинский	5,339	100,00	1,34	100,00	-
28	Бугульминский	222,523	100,00	-	100,00	-
29	Буинский	21,505	100,00	-	100,00	-
30	Верхнеуслонский	5,764	100,00	-	100,00	-
31	Кам-Устьинский	8,698	100,00	-	100,00	-
32	Лениногорский	139,090	100,00	-	100,00	-
33	Мамадышский	22,109	100,00	-	100,00	-
34	Мензелинский	21,954	100,00	-	100,00	-
35	Муслюмовский	6,926	100,00	-	100,00	-
36	Новошешминский	4,660	100,00	10,72	100,00	-
37	Сабинский	13,585	100,00	7,31	100,00	-
38	Тетюшский	10,513	100,00	-	100,00	-
39	Тюлячинский	2,107	100,00	11,63	100,00	-
40	Чистопольский	133,809	100,00	-	100,00	-
41	Ютазинский	21,292	100,00	-	100,00	-
ИТОГО по РТ		6 354,46	80,20	7,07	99,98	0,1



МО, по которым **не в полном объеме** **перечислены** средства Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Альметьевский	83 147,00	41 573,50	50,00
	Итого по РТ	1 075 994,77	1 034 421,26	96,14




Программа капитального ремонта МКД на 2021 год

Собственники помещений

Местный бюджет

Бюджет РТ

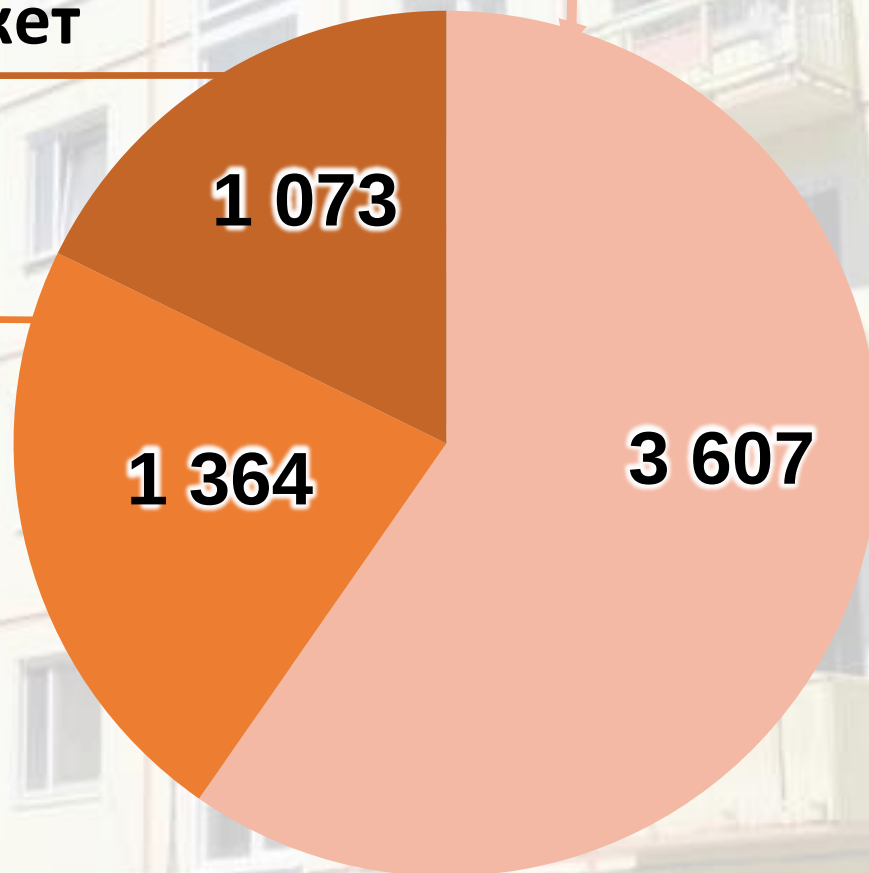

➤ **927 МКД**

➤ **41 МО**


Всего: 6 044 млн рублей

Программы модернизации инженерных систем

**Модернизация
систем
водоотведения**

■ Выполнение СМР

■ Принято КС-2

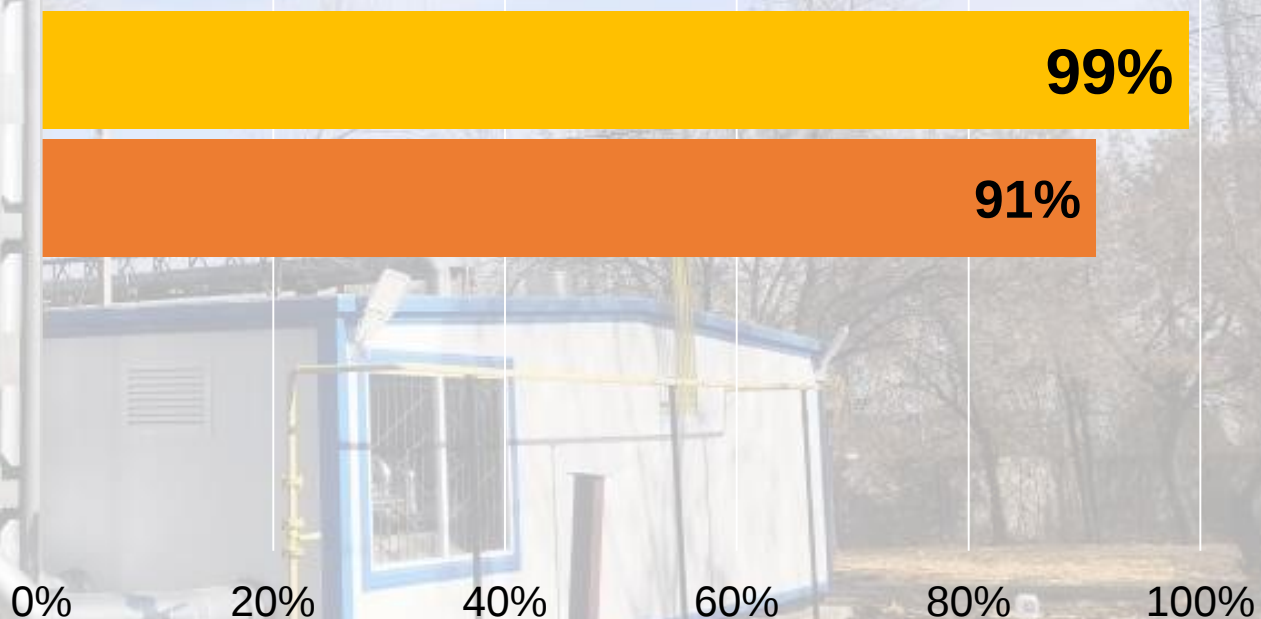



Модернизация систем водоотведения

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	Выполнение, %
Проектирование			
1	Проектирование по объекту: «Строительство очистных сооружений с сетями в с.Чепчуги», Высокогорский	4 651,00	92
2	Проектирование по объекту: «Строительство очистных сооружений с сетями в с.Куркачи», Высокогорский	3 967,00	92
3	Проектирование по объекту: «Строительство очистных сооружений в с.Шугурово», Лениногорский	2 100,00	95
4	Проектирование по объекту: «Строительство очистных сооружений с сетями в с.Шапши», Высокогорский	4 148,00	95
Капитальный ремонт			
5	Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в пгт.Куйбышевский Затон, Камско-Устьинский	23 500,00	92
Итого по 27 объектам		317 100,00	99



Образование

■ Выполнение СМР, %

■ Принято КС-2, %

Динамика

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И
ОБЩЕЖИТИЙ**

98,7%

56,1%

1,3%

Всего 3 объекта

4,3%

завершено – 2

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ТЕПЛЫХ ТУАЛЕТОВ**

97,9%

76,3%

2,7%

Всего 286 объектов

2,9%

завершено – 248

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%



Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум»	83 123,33	97,0	3,0
Итого по 3 объектам		190 049,8	98,7	1,3



Капитальный ремонт теплых туалетов

№	Типы организаций	Всего количество объектов/ завершено	Лимит, тыс рублей	Факт СМР, %	Динамика за 2 недели, %
1	Общеобразовательные организации	218/183	83 950,69	97,2	2,5
2	Дошкольные образовательные организации	57/54	21 275,01	100,0	9,5
3	Организации дополнительного образования	11/11	5 292,52	100,0	0,0
	ИТОГО	286/248	110 518,22	97,9	2,7

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

Динамика

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТАЦИОНАРОВ**

95,2%

66,1%

1,7%

Всего 15 объектов

4,3%

завершено – 11

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

96,7%

86,7%

8,8%

Всего 8 объектов

7,1%

завершено – 7

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%



Капитальный ремонт стационаров

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
				Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани	здание лечебного корпуса № 2, г.Казань, ул.Исаева, д.5	90 000,00	60,00	15,0
2	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»	лечебный корпус №3, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.14	81 088,11	75,00	5,00
3	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница»	лечебный корпус, г.Азнакаево, ул. Хасаншиной, д.21	73 348,25	77,00	7,00
4	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»	стационар, г.Чистополь, ул.Вишневого, д.1	137 563,82	98,00	2,00
Итого по 15 объектам			1 588 903,09	95,22	1,72



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	Наименование учреждения	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18», г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д.10	11 532,50	80,00	53,0
Итого по 8 объектам		69 169,55	96,7	8,8




Сельское хозяйство

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

Динамика

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПТИЦЕФЕРМ

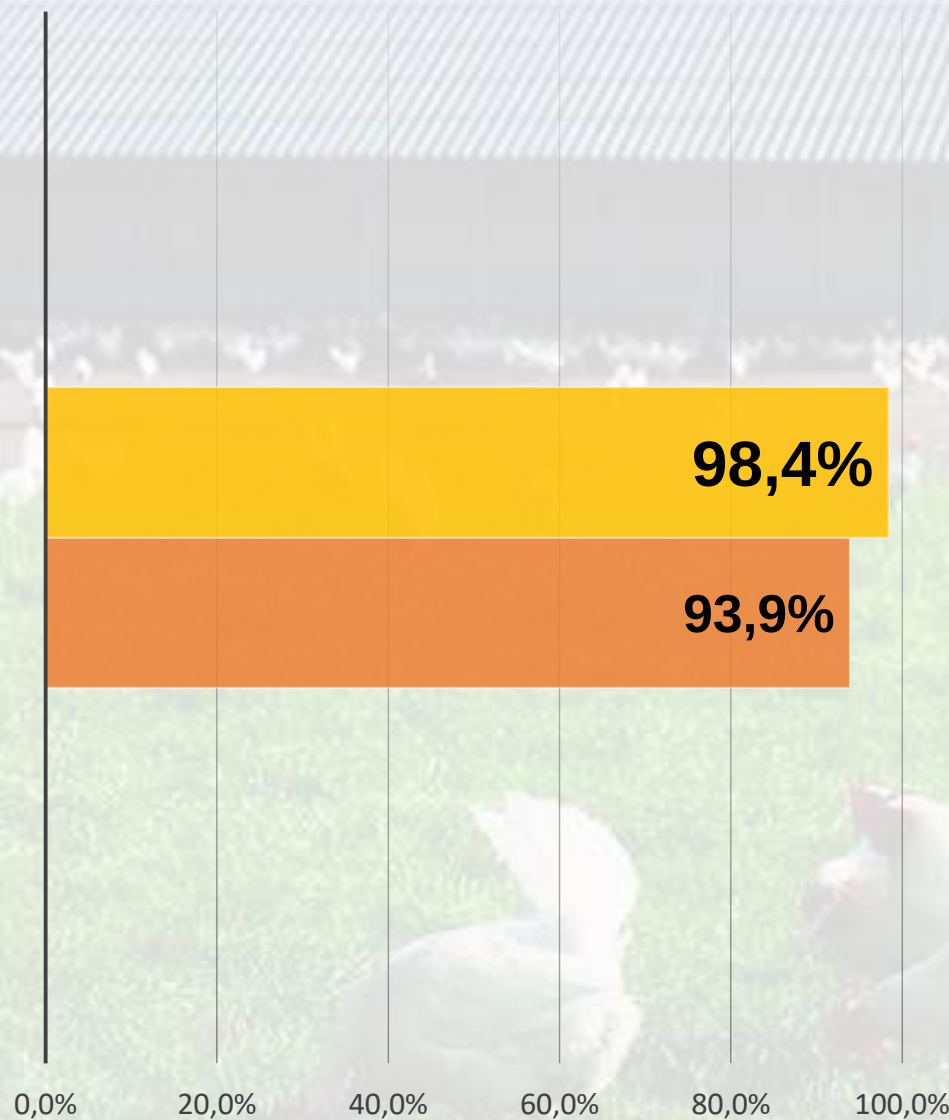

0,2%

Всего 12 объектов

4,5%

завершено – 11




Капитальный ремонт птицеферм

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	птицеферма в с.Байлянгар (1-й этап), Кукморский	4 000,00	74,00	3,00
Итого по 12 объектам		66 307,0	98,4	0,18



Молодежная политика

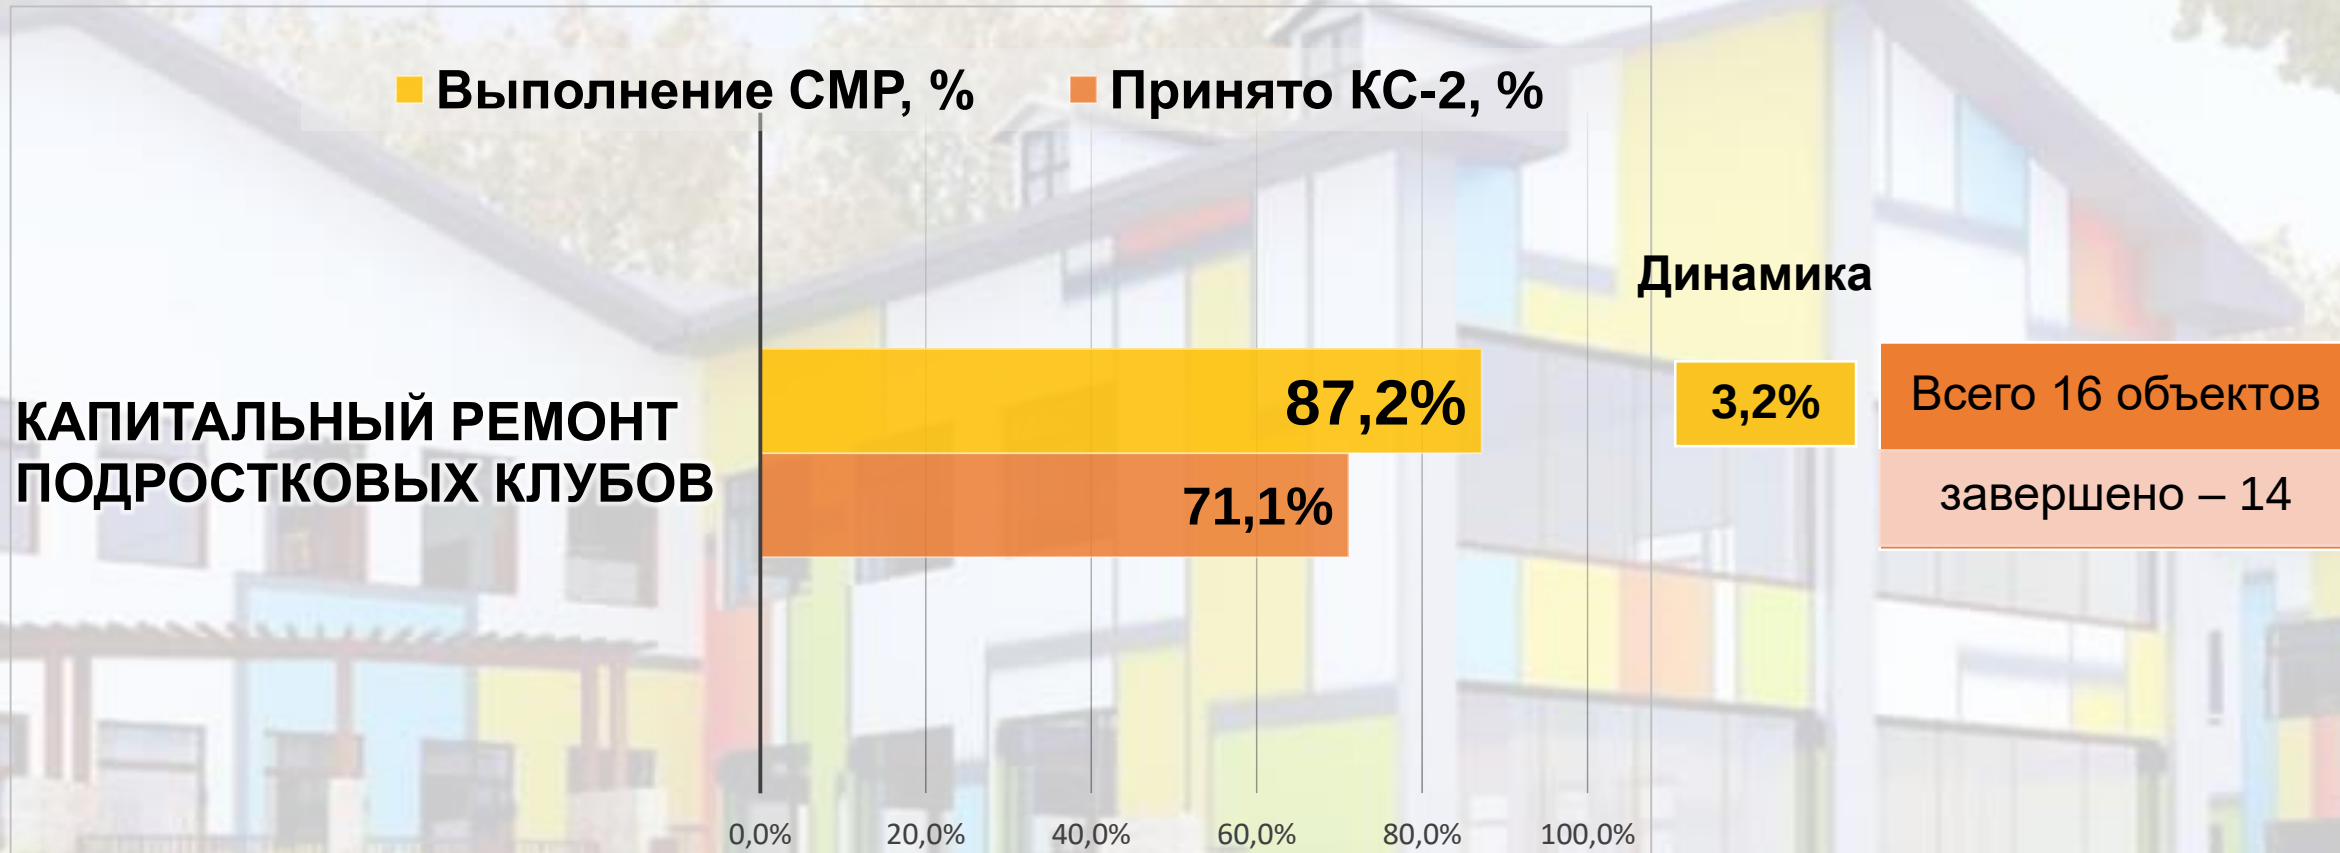



Капитальный ремонт подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Юниор», г.Казань	24 231,22	55,00	10,00
2	Подростковый клуб «Свои», г.Казань	7 678,66	97,00	8,00
Итого по 16 объектам		93 190,58	87,6	3,18



Иные социальные программы

■ Выполнение СМР, %

■ Принято КС-2, %

Динамика

**КАПРЕМОНТ ЗДАНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МВД
ПО РТ**

99,6%

61,6%

0,2%

Всего 3 объекта

завершено – 2

**КАПРЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ВОЙСК НАЦ. ГВАРДИИ РФ
ПО РТ**

99,3%

48,4%

0,2%

Всего 14 объекта

завершено – 12

**КАПРЕМОНТ ЗДАНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

99,9%

91,5%

0,7%

Всего 37 объектов

завершено – 36

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%



Капитальный ремонт зданий подведомственных МВД по РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	62 543,89	99,00	2,00
Итого по 3 объектам		150 000,00	99,58	0,83



Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ОВО по Алексеевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Алексеевский	830,71	78,00	13,00
2	ОВО по Мензелинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», Мензелинский	5 238,66	90,00	5,00
Итого по 14 объектам		111 403,45	99,34	0,87



Капитальный ремонт зданий социального обслуживания

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	3 500,00	96,0	0,00
Итого по 37 объектам		119 750,0	99,9	0,7



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
1	Чистопольский	475 435,54	270 007,06	56,79	3,35	205 428,48
2	Р.-Слободский	269 093,66	159 036,26	59,10	3,07	110 057,40
3	Аксубаевский	161 420,07	100 306,91	62,14	0,26	61 113,16
4	Нурлатский	214 258,59	155 176,44	72,42	1,91	59 082,16
5	Менделеевский	180 860,78	139 627,29	77,20	0,58	41 233,48
6	Сабинский	390 185,79	303 843,06	77,87	0,00	86 342,73
7	Казань	12 161 642,75	9 472 064,75	77,88	2,17	2 689 578,00
8	Алькеевский	195 465,56	152 888,85	78,22	0,11	42 576,71
9	Азнакаевский	213 148,19	171 837,59	80,62	1,95	41 310,60
10	Алексеевский	158 044,68	128 170,12	81,10	1,31	29 874,56
11	Высокогорский	759 356,89	627 732,47	82,67	0,97	131 624,42
12	Атнинский	83 975,04	69 832,42	83,16	8,17	14 142,61
13	Зеленодольский	1 142 056,00	963 231,13	84,34	0,82	178 824,87
14	Агрызский	180 813,28	154 690,79	85,55	2,16	26 122,50
15	Наб.Челны	3 960 764,71	3 483 859,59	87,96	0,28	476 905,12
Итого по РТ:		30 792 928,22	25 975 438,30	84,36	1,40	4 817 489,92



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
16	Лаишевский	489 701,17	439 807,88	89,81	1,84	49 893,29
17	Нижнекамский	2 189 731,38	1 978 275,31	90,34	0,01	211 456,07
18	Черемшанский	158 618,89	143 589,68	90,52	1,41	15 029,21
19	Муслюмовский	152 133,29	137 720,33	90,53	3,12	14 412,96
20	Арский	344 636,50	312 498,98	90,67	2,42	32 137,52
21	Мамадышский	208 744,54	189 360,38	90,71	0,00	19 384,16
22	Лениногорский	260 107,48	236 865,04	91,06	0,02	23 242,44
23	Заинский	410 502,89	374 713,49	91,28	1,59	35 789,41
24	Тукаевский	396 508,55	367 461,37	92,67	0,09	29 047,18
25	Кукморский	363 273,59	337 622,09	92,94	3,49	25 651,49
26	Мензелинский	118 904,23	110 529,76	92,96	5,27	8 374,47
27	Новошешминский	95 429,46	88 771,23	93,02	0,00	6 658,23
28	Альметьевский	639 353,83	597 849,86	93,51	1,90	41 503,97
29	Актанышский	211 928,68	202 201,82	95,41	2,54	9 726,86
30	Верхнеуслонский	131 685,67	125 986,29	95,67	0,00	5 699,38
Итого по РТ:		30 792 928,22	25 975 438,30	84,36	1,40	4 817 489,92



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
31	Бавлинский	253 158,46	242 864,31	95,93	0,00	10 294,14
32	Кайбицкий	67 436,08	64 795,48	96,08	0,00	2 640,60
33	Бугульминский	588 172,46	567 965,65	96,56	0,01	20 206,81
34	Балтасинский	188 948,14	182 520,74	96,60	0,81	6 427,40
35	Дрожжановский	160 407,46	155 452,13	96,91	0,00	4 955,33
36	Елабужский	515 832,13	501 042,41	97,13	3,38	14 789,71
37	Сармановский	156 395,88	152 565,69	97,55	0,88	3 830,19
38	Пестречинский	423 175,07	412 855,13	97,56	1,54	10 319,93
39	Камско-Устьинский	320 218,33	313 217,51	97,81	0,01	7 000,82
40	Тюлячинский	81 250,71	79 747,65	98,15	0,02	1 503,06
41	Тетюшский	183 899,51	180 753,24	98,29	1,30	3 146,27
42	Буинский	605 340,08	596 911,06	98,61	0,74	8 429,02
43	Спасский	141 334,07	140 130,75	99,15	0,61	1 203,33
44	Ютазинский	75 763,98	75 467,15	99,61	5,86	296,83
45	Апастовский	313 814,19	313 591,16	99,93	1,42	223,03
Итого по РТ:		30 792 928,22	25 975 438,30	84,36	1,40	4 817 489,92



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Рыбно-Слободский	244 786,90	134 729,50	55,04	3,38	110 057,40
2	Чистопольский	460 848,05	255 419,57	55,42	3,46	205 428,48
3	Аксубаевский	147 925,33	86 812,17	58,69	0,28	61 113,16
4	Алькеевский	135 762,67	93 185,96	68,64	0,16	42 576,71
5	Казань	5 295 312,59	3 731 726,53	70,47	4,13	1 563 586,06
6	Сабинский	251 742,88	178 186,24	70,78	0,00	73 556,64
7	Нурлатский	144 917,56	104 867,59	72,36	2,67	40 049,97
8	Азнакаевский	190 790,89	149 480,29	78,35	2,18	41 310,60
9	Алексеевский	136 112,37	108 759,91	79,90	1,26	27 352,46
10	Атнинский	70 789,54	56 646,93	80,02	9,79	14 142,61
11	Высокогорский	586 542,31	477 321,95	81,38	0,29	109 220,36
12	Агрызский	143 068,35	116 945,86	81,74	2,68	26 122,50
13	Зеленодольский	1 096 406,49	918 085,36	83,74	0,71	178 321,14
14	Наб.Челны	2 602 831,48	2 194 295,30	84,30	0,43	408 536,18
15	Мамадышский	102 468,31	88 510,19	86,38	0,00	13 958,12
Итого по РТ:		19 314 855,80	15 903 842,34	82,34	1,87	3 411 013,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Нижнекамский	1 397 753,81	1 210 542,03	86,61	0,01	187 211,78
17	Лаишевский	475 248,90	425 418,47	89,51	1,91	49 830,42
18	Мензелинский	86 600,84	78 226,38	90,33	7,21	8 374,47
19	Альметьевский	435 965,85	394 461,88	90,48	2,79	41 503,97
20	Лениногорский	239 726,76	217 118,31	90,57	0,00	22 608,44
21	Арский	333 195,19	302 398,80	90,76	2,39	30 796,38
22	Черемшанский	99 142,18	90 814,31	91,60	2,26	8 327,88
23	Актанышский	98 962,05	91 233,53	92,19	0,85	7 728,52
24	Елабужский	179 015,78	165 554,33	92,48	3,67	13 461,45
25	Кукморский	306 384,19	286 053,19	93,36	4,12	20 331,00
26	Тукаевский	348 868,90	327 608,22	93,91	0,03	21 260,67
27	Заинский	363 876,49	341 823,92	93,94	1,18	22 052,57
28	Новошешминский	57 277,61	54 143,54	94,53	0,00	3 134,07
29	Кайбицкий	55 101,98	52 512,99	95,30	0,00	2 588,99
30	Муслюмовский	128 186,88	123 661,51	96,47	3,70	4 525,37
Итого по РТ:		19 314 855,80	15 903 842,34	82,34	1,87	3 411 013,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Бугульминский	529 833,08	511 433,06	96,53	0,01	18 400,03
32	Сармановский	111 060,90	107 228,13	96,55	1,24	3 832,77
33	Дрожжановский	96 336,41	93 747,67	97,31	0,00	2 588,74
34	Тюлячинский	56 575,06	55 318,63	97,78	0,00	1 256,43
35	Пестречинский	402 976,10	394 662,25	97,94	1,63	8 313,85
36	Балтасинский	139 324,72	136 665,96	98,09	0,86	2 658,76
37	Буинский	541 786,12	533 357,10	98,44	0,71	8 429,02
38	Тетюшский	135 213,09	133 402,28	98,66	1,77	1 810,80
39	Спасский	123 148,52	121 945,20	99,02	0,69	1 203,33
40	Камско-Устьинский	277 781,31	275 192,12	99,07	0,00	2 589,19
41	Ютазинский	62 210,34	61 913,51	99,52	7,14	296,83
42	Верхнеуслонский	77 438,35	77 103,85	99,57	0,00	334,50
43	Менделеевский	67 819,26	67 599,45	99,68	1,55	219,80
44	Апастовский	288 234,13	288 223,06	100,00	1,55	11,07
45	Бавлинский	189 505,31	189 505,30	100,00	0,00	0,01
Итого по РТ:		19 314 855,80	15 903 842,34	82,34	1,87	3 411 013,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Муслюмовский	11 373,47	1 485,88	13,06	0,00	9 887,60
2	Тукаевский	12 507,30	4 720,79	37,74	0,00	7 786,51
3	Дрожжановский	4 169,10	1 802,50	43,23	0,00	2 366,60
4	Нурлатский	43 451,36	24 419,17	56,20	0,00	19 032,19
5	Заинский	32 502,23	18 765,39	57,74	6,89	13 736,84
6	Актанышский	4 860,70	2 891,30	59,48	0,00	1 969,40
7	Менделеевский	103 672,53	62 658,85	60,44	0,00	41 013,68
8	Высокогорский	8 032,80	5 330,39	66,36	0,00	2 702,41
9	Арский	4 169,10	2 827,97	67,83	9,04	1 341,13
10	Балтасинский	11 753,95	7 985,31	67,94	0,00	3 768,64
11	Тетюшский	4 169,10	2 917,13	69,97	0,00	1 251,97
12	Алексеевский	9 384,38	6 862,28	73,12	0,00	2 522,10
13	Бавлинский	46 915,16	36 621,03	78,06	0,00	10 294,13
14	Новошешминский	11 822,22	9 748,12	82,46	0,00	2 074,10
15	Казань	6 798 400,97	5 675 400,99	83,48	0,65	1 122 999,98
Итого по РТ:		10 162 429,07	8 796 522,03	86,56	0,56	1 365 907,04



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
16	Верхнеуслонский	32 375,01	27 236,52	84,13	0,00	5 138,48
17	Кукморский	23 465,44	19 844,41	84,57	0,00	3 621,03
18	Сабинский	120 378,11	107 943,94	89,67	0,00	12 434,17
19	Черемшанский	30 097,51	27 796,17	92,35	0,00	2 301,34
20	Мамадышский	69 221,91	65 302,87	94,34	0,00	3 919,04
21	Наб.Челны	1 340 302,77	1 271 933,83	94,90	0,00	68 368,94
22	Бугульминский	41 617,98	39 811,20	95,66	0,00	1 806,78
23	Нижнекамский	769 836,58	745 592,29	96,85	0,00	24 244,29
24	Елабужский	322 955,77	321 627,50	99,59	3,35	1 328,27
25	Тюлячинский	11 753,30	11 753,30	100,00	0,00	0,00
26	Агрызский	22 961,51	22 961,51	100,00	0,00	0,00
27	Алькеевский	42 413,80	42 413,80	100,00	0,00	0,00
28	Альметьевский	183 545,32	183 545,32	100,00	0,00	0,00
29	Мензелинский	18 727,28	18 727,28	100,00	0,00	0,00
30	Апастовский	3 495,49	3 495,49	100,00	0,00	0,00
31	Сармановский	22 096,93	22 099,51	100,01	0,00	0,00
Итого по РТ:		10 162 429,07	8 796 522,03	86,56	0,56	1 365 907,04



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Черемшанский	29 379,20	24 979,20	85,02	0,00	4 400,00
2	Высокогорский	164 781,78	145 080,12	88,04	3,46	19 701,66
3	Камско-Устьинский	42 437,02	38 025,39	89,60	0,19	4 411,63
4	Пестречинский	20 198,97	18 192,89	90,07	0,00	2 006,08
5	Новошешминский	26 329,63	24 879,57	94,49	0,00	1 450,06
6	Кукморский	33 423,95	31 724,49	94,92	0,08	1 699,46
7	Казань	67 929,19	64 937,22	95,60	2,25	2 991,97
8	Мамадышский	37 054,32	35 547,32	95,93	0,00	1 507,00
9	Лениногорский	20 380,73	19 746,73	96,89	0,10	634,00
10	Сабинский	18 064,80	17 712,88	98,05	0,15	351,92
11	Тюлячинский	12 922,35	12 675,72	98,09	0,14	246,63
12	Зеленодольский	45 649,50	45 145,77	98,90	3,85	503,74
13	Верхнеуслонский	21 872,32	21 645,92	98,96	0,00	226,40
14	Апастовский	22 084,56	21 872,61	99,04	0,00	211,96
15	Лаишевский	14 452,28	14 389,40	99,56	0,00	62,87
Итого по РТ:		1 315 643,35	1 275 073,93	96,92	1,17	40 569,42



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Кайбицкий	12 334,10	12 282,49	99,58	0,00	51,61
17	Тетюшский	44 517,33	44 433,84	99,81	0,00	83,49
18	Актанышский	108 105,93	108 076,99	99,97	4,33	28,94
19	Арский	7 272,21	7 272,21	100,00	0,00	0,00
20	Агрызский	14 783,42	14 783,42	100,00	0,56	0,00
21	Елабужский	13 860,59	13 860,59	100,00	0,00	0,00
22	Сармановский	23 238,05	23 238,05	100,00	0,00	0,00
23	Бавлинский	16 737,98	16 737,98	100,00	0,00	0,00
24	Муслюмовский	12 572,94	12 572,94	100,00	0,00	0,00
25	Чистопольский	14 587,50	14 587,50	100,00	0,00	0,00
26	Балтасинский	37 869,47	37 869,47	100,00	0,88	0,00
27	Алексеевский	12 547,93	12 547,93	100,00	2,74	0,00
28	Атнинский	13 185,49	13 185,49	100,00	0,09	0,00
29	Бугульминский	16 721,40	16 721,40	100,00	0,00	0,00
30	Менделеевский	9 368,99	9 368,99	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 643,35	1 275 073,93	96,92	1,17	40 569,42



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Р.-Слободский	24 306,76	24 306,76	100,00	0,00	0,00
32	Спасский	18 185,55	18 185,55	100,00	0,00	0,00
33	Наб.Челны	17 630,46	17 630,46	100,00	0,00	0,00
34	Заинский	14 124,18	14 124,18	100,00	0,00	0,00
35	Дрожжановский	59 901,96	59 901,96	100,00	0,00	0,00
36	Нурлатский	25 889,68	25 889,68	100,00	1,15	0,00
37	Аксубаевский	13 494,74	13 494,74	100,00	0,00	0,00
38	Буинский	63 553,96	63 553,96	100,00	0,97	0,00
39	Ютазинский	13 553,64	13 553,64	100,00	0,00	0,00
40	Азнакаевский	22 357,30	22 357,30	100,00	0,00	0,00
41	Мензелинский	13 576,10	13 576,10	100,00	0,00	0,00
42	Нижнекамский	22 140,99	22 140,99	100,00	0,00	0,00
43	Альметьевский	19 842,66	19 842,67	100,00	0,00	0,00
44	Тукаевский	35 132,35	35 132,35	100,00	0,00	0,00
45	Алькеевский	17 289,09	17 289,09	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 315 643,35	1 275 073,93	96,92	1,17	40 569,42



Спасибо за внимание!
