



Итоги ввода жилья в Республике Татарстан в 2020 году

КВ.М.

Введено в эксплуатацию	в том числе		
	МКД инвестиционное	Социальная ипотека	ИЖС
2 680 087	1 010 928	216 474	1 452 685



Количество несчастных случаев





Улучшение жилищных условий граждан

Жилье для детей-сирот

План 600

обеспечено – 489

Обеспечение жильем категорий граждан

Обеспечено:

9 чернобыльцов

12 вынужденных переселенцев

2 выехавших из крайнего севера

Обеспечение жильем многодетных семей

обеспечено – 46 семей

Обеспечение жильем молодых семей

обеспечено – 47 семей

Итого – 716 семей

Общий объем финансирования - 1,168 млрд. рублей



Дети-сироты

№	МО РТ	Выставлено для выбора	Передано по актам приема- передачи	Заселено	№	МО РТ	Выставлено для выбора	Передано по актам приема- передачи	Заселено
1	Агрызский	4	4	4	12	Лайшевский	5	5	5
2	Азнакаевский	3	3	3	13	Мензелинский	4	4	4
3	Актанышский	1	1	1	14	Нижнекамский	132	132	109
4	Альметьевский	82	82	82	15	Сабинский	1	1	
5	Апастовский	1	1	1	16	Сармановский	4	4	4
6	Бугульминский	9	9		17	Тукаевский	3	3	3
7	Высокогорский	2	2	2	18	Тюлячинский	4	4	
8	Елабужский	26	26		19	Черемшанский	2	2	2
9	Зеленодольский	2	2	2	20	Чистопольский	12	12	2
10	Кайбицкий	1	1	1	21	г.Наб. Челны	13	13	13
11	Кукморский	5	5	5	22	г.Казань	284	284	246
ИТОГО							600	600	489



Образование

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Строительство дошкольных образовательных организаций	22 - завершено	96,7
Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	3 - завершено	87,3
Капитальный ремонт теплых туалетов	271 - завершен	90,1
Капитальный ремонт объектов образования	172 - завершено	93,1
Капитальный ремонт ресурсных центров	17 - завершено	89,4
ИТОГО	485 - завершено	



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
1	Строительство ДОО на 340 мест, с.Высокая Гора	+	+	100	передан
2	Строительство ДОО на 340 мест, г.Казань, ЖК «Залесный Сити»	+	не требуется	100	передан
3	Строительство ДОО на 140 мест, Тукаевский МО, д.Азьмушкино	+	+	100	передан
4	Строительство ДОО на 220 мест жилой комплекс «Усадьба Царево»	+	+	100	передан
5	Строительство ДОО на 140 мест, г.Арск	+	+	100	передан
6	Строительство ДОО на 220 мест, г.Зеленодольск, ЖР «Красный металлист»	+	+	100	передан



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
7	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, ЖР «Замелекесье», мкр.25	+	+	100	передан
8	Строительство дошкольной образовательной организации на 50 мест в Сабинском районе, д.Илебер	+	-	100	передан
9	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, ЖР «Замелекесье», мкр.22	+	+	100	акт в МЗИО РТ
10	Строительство ДОО на 220 мест, г.Наб.Челны, п.ЗЯБ, мкр.19	+	+	100	акт в МЗИО РТ
11	Строительство ДОО на 260 мест 2 квартал жилого района «Салават купере»	+	не требуется	100	акт в МЗИО РТ
12	Строительство ДОО на 260 мест 3 квартал жилого района «Салават купере»	+	не требуется	100	акт в МЗИО РТ
13	Строительство ДОО на 260 мест, г.Нижнекамск, мкр.35А	+	+	100	акт в МЗИО РТ
14	Строительство ДОО на 260 мест, г.Буинск	+	+	100	акт в МЗИО РТ



Информация по передаче на баланс, введенных в эксплуатацию детских садов

№	Наименование объекта	Выписка ЕГРН на здание	Выписки ЕГРН на сети	Принято КС-2, %	Примечание
15	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Казань, мкр. «Седьмое небо»	+	не требуется	100	акт в МЗИО РТ
16	Строительство ДОО на 260 мест, г. Нижнекамск, мкр. 29	+	+	100	акт в МЗИО РТ
17	Строительство ДОО на 120 мест, г. Казань, жилой комплекс «Весна 2»	+	не требуется	100	акт в МЗИО РТ
18	Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в Лаишевском районе, ЖК «Южный парк»	+	не требуется	100	
19	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Казань, ППТ «Волжские просторы»	-	-	82,25	



Здравоохранение

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Капитальный ремонт стационаров	26 объектов, в т.ч.: 11 - только ПИР, 15 - СМР: 14 завершено 1 в работе	87,02
Строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, офиса врача общей практики и капитальный ремонт объектов здравоохранения	Завершено: - 43 ФАП - 7 амбулаторий - ремонт 8 поликлиник Ведется строительство 1 офиса врача.	92,93
ИТОГО	72 - завершено 2 - в работе	



Строительство офиса врача общей практики

№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Офис врача общей практики ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, пос.Бирюлинского зверосовхоза	27 985,23	92,0	18,0



Капитальный ремонт стационаров

№	Наименование учреждения	Наименование объекта	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
				Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани	здание лечебного корпуса № 2, г.Казань, ул.Исаева, д.5	90 000,00	75,00	15,0
Итого по 15 объектам			1 588 903,09	98,58	3,36



Молодёжная политика

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Капитальный ремонт сети подростковых клубов	15 - завершено 1 переходящий	73,2
Капитальный ремонт молодежных центров	5 - завершено	69,9
Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	13 - завершено 1 переходящий	61,0
ИТОГО	33 - завершено 2 переходящих	



Капитальный ремонт подростковых клубов

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Юниор», г.Казань	24 231,22	68,00	23,00
Итого по 16 объектам		93 190,58	91,8	7,8

Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию», г.Казань	234 682,08	91,00	9,00
Итого по 14 объектам		1 160 000,00	98,15	2,0



Спорт

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Строительство универсальных спортивных площадок, модульных лыжных баз и футбольного манежа	завершено: - 86 спортплощадок - 6 лыжных баз - 1 футбольный манеж	98,85
Капитальный ремонт спортивных объектов	23 - завершено	91,18
ИТОГО	116 - завершено	



Сельское хозяйство

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Строительство коровников и овцеводческих ферм	7 - завершено	24,5
Строительство силосно-сенажных траншей	77 - завершено	100,0
Капитальный ремонт птицеферм	12 - завершено	100,0
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства	41 - завершено	97,8
Капитальный ремонт зернотоков	127 - завершено	99,9
Капитальный ремонт конеферм	11 - завершено	100,0
Капитальный ремонт коровников на 100 и 200 голов	154 - завершено	99,2
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	65 - завершено	99,8
Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	8 - завершено	12,4
ИТОГО	502 - завершено	



Культура

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	12 - завершено	91,05
Капитальный ремонт образовательных учреждений культуры	8 - завершено	97,96
Капитальный ремонт объектов культурного назначения	37 - завершено	92,97
ИТОГО	57 - завершено	



Иные социальные программы

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	21 - завершен	52,9
Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений	завершено: - 11 строительство - 21 капремонт	99,4
Капитальный ремонт стационарных организаций соц.обслуживания	37 - завершено	95,3
Капремонт подведомственных зданий Минлесхоза	14 - завершено	93,0
Капремонт помещений муниципальных архивов	7 - завершено	86,9
Доступная среда	12 - завершено	100,0
Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии	14 - завершено	88,8
Капремонт зданий, подведомственных МВД	2 - завершено 1 в работе	61,6
ИТОГО	139 - завершено 1 - в работе	




Капитальный ремонт зданий подведомственных МВД по РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Административное здание отдела МВД России по Зеленодольскому району	62 543,89	99,00	0,00
Итого по 3 объектам		150 000,00	99,58	0,00

Программа капитального ремонта МКД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

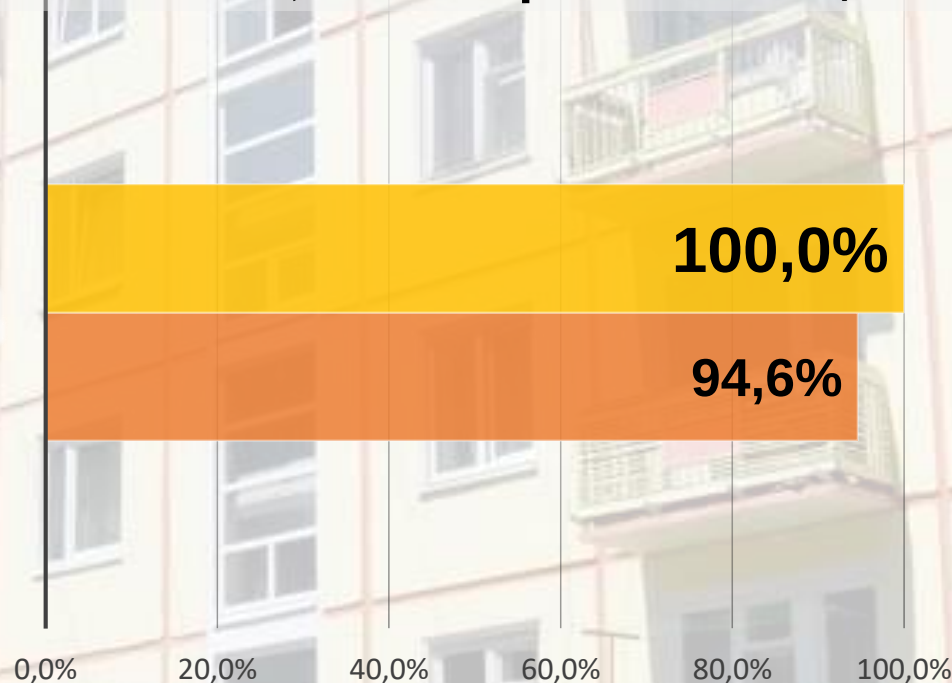

Лимит СМР - 6,2 млрд руб.

Принято КС-2 - 5,8 млрд руб.

Динамика за 2 недели – 14,37%



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
1	Высокогорский	42,680	80,03	27,96	100,00	-
2	Пестречинский	18,115	86,31	52,97	100,00	-
3	г. Казань	2 188,056	87,20	26,52	100,00	0,76
4	Зеленодольский	300,659	91,67	18,95	100,00	-
5	Елабужский	161,351	91,81	6,89	100,00	-
6	Р.-Слободский	6,212	92,39	6,93	100,00	-
7	Лаишевский	25,263	93,02	0,00	100,00	-
ИТОГО по РТ		6 221,972	94,57	14,37	100,00	0,02
8	Менделеевский	55,476	95,44	15,45	100,00	-
9	Заинский	81,888	98,92	0,00	100,00	-
10	Альметьевский	353,184	99,61	7,35	100,00	-
11	Черемшанский	2,634	100,00	10,51	100,00	-
12	Нижнекамский	692,157	100,00	2,73	100,00	-



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
13	Агрызский	27,738	100,00	-	100,00	-
14	Азнакаевский	89,855	100,00	-	100,00	-
15	Аксубаевский	6,506	100,00	-	100,00	-
16	Актанышский	10,596	100,00	-	100,00	-
17	Алексеевский	9,733	100,00	-	100,00	-
18	Апастовский	2,782	100,00	-	100,00	-
19	Арский	21,212	100,00	21,81	100,00	-
20	Бавлинский	36,755	100,00	-	100,00	-
21	Балтасинский	4,970	100,00	-	100,00	-
22	Бугульминский	217,196	100,00	-	100,00	-
23	Буинский	21,029	100,00	-	100,00	-
24	Верхнеуслонский	5,764	100,00	-	100,00	-
25	г. Набережные Челны	1 311,789	100,00	12,20	100,00	-
26	Кам-Устьинский	8,503	100,00	-	100,00	-
	ИТОГО по РТ	6 221,972	94,57	14,37	100,00	0,02



Информация о сдаче КС-2 и выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

№	МО	Лимит СМР, млн. руб	Выполнение по актам КС-2, %		% физического выполнения	
			Принято Фонд ЖКХ	Динамика за 2 недели	По данным стройконтроля	Динамика за 2 недели
27	Кукморский	16,903	100,00	-	100,00	-
28	Лениногорский	139,090	100,00	-	100,00	-
29	Мамадышский	22,108	100,00	-	100,00	-
30	Мензелинский	21,954	100,00	-	100,00	-
31	Муслюмовский	6,926	100,00	-	100,00	-
32	Новошешминский	4,660	100,00	-	100,00	-
33	Нурлатский	59,505	100,00	2,06	100,00	-
34	Сабинский	13,585	100,00	-	100,00	-
35	Сармановский	41,201	100,00	12,43	100,00	-
36	Спасский	7,749	100,00	-	100,00	-
37	Тетюшский	10,087	100,00	-	100,00	-
38	Тукаевский	24,472	100,00	35,85	100,00	-
39	Тюлячинский	2,105	100,00	-	100,00	-
40	Чистопольский	128,571	100,00	-	100,00	-
41	Ютазинский	20,956	100,00	-	100,00	-
	ИТОГО по РТ	6 221,972	94,57	14,37	100,00	0,02



Программы модернизации инженерных систем

Программы	Количество объектов	Принято КС-2 %
Модернизация систем водоотведения	26 - завершено 1 в работе	96,9
Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах	- переведено на индивидуальное отопление 1 353 квартиры - установлено 29 котлов - построено 14 км газопровода	99,1
Восстановление уличного освещения в населенных пунктах	- смонтировано 252 км. СИП - установлено 12 715 светильников	100,0
Замена котлов в котельных бюджетных учреждений	установлено 109 котлов на 63 объектах	98,8
Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах	- проведено 153,5 км сетей, - установлено 28 водонапорных башен - установлено 21 артезианская скважина	98,9



Модернизация систем водоотведения

Не завершённые объекты на 23.12.2020

№	МО РТ	Лимит, тыс рублей	Выполнение, %
<i>Капитальный ремонт</i>			
1	Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в пгт.Куйбышевский Затон, Камско-Устьинский	23 500,00	99,90



Формирование комфортной городской среды

■ Выполнение СМР, % ■ Принято КС-2, %

61 ПРОГРАММНЫЙ ОБЪЕКТ

100,0%

завершено – 61

87,7%

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ

100,0%

завершено – 4

100,0%

80,0%

100,0%



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
1	Казань	11 355 395,08	9 750 458,38	85,87	3,60	1 604 936,70
2	Чистопольский	475 267,24	421 359,50	88,66	2,26	53 907,74
3	Наб.Челны	3 989 679,07	3 557 097,65	89,16	0,64	432 581,41
4	Р.-Слободский	269 876,89	240 761,20	89,21	17,53	29 115,69
5	Зеленодольский	1 142 449,16	1 028 847,57	90,06	2,92	113 601,59
6	Алексеевский	150 176,93	139 002,61	92,56	0,90	11 174,32
7	Аксубаевский	163 308,24	151 629,55	92,85	21,32	11 678,68
8	Азнакаевский	213 117,67	201 039,53	94,33	10,70	12 078,14
9	Мензелинский	118 840,30	112 236,74	94,44	0,05	6 603,56
10	Мамадышский	211 730,66	200 465,54	94,68	2,39	11 265,12
11	Нурлатский	246 222,58	235 185,93	95,52	4,61	11 036,65
12	Нижнекамский	2 833 087,78	2 711 858,10	95,72	1,05	121 229,68
13	Высокогорский	751 324,09	727 031,24	96,77	2,66	24 292,85
14	Арский	378 611,01	367 086,11	96,96	1,34	11 524,90
15	Бугульминский	588 172,46	572 009,92	97,25	0,69	16 162,54
Итого по РТ:		30 794 791,74	28 279 024,33	91,83	2,51	2 515 767,41



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
16	Тукаевский	383 862,05	375 254,83	97,76	0,74	8 607,21
17	Кукморский	363 718,22	356 979,23	98,15	2,48	6 738,99
18	Новошешминский	90 474,13	88 855,05	98,21	0,12	1 619,08
19	Агрызский	180 726,64	177 791,89	98,38	10,66	2 934,75
20	Сабинский	390 320,57	385 821,30	98,85	11,67	4 499,27
21	Актанышский	206 909,48	205 229,21	99,19	0,17	1 680,27
22	Альметьевский	1 000 899,78	992 869,82	99,20	0,25	8 029,96
23	Елабужский	518 602,76	514 724,21	99,25	0,83	3 878,55
24	Пестречинский	423 123,40	420 526,04	99,39	0,55	2 597,36
25	Камско-Устьинский	320 078,44	318 332,63	99,45	0,85	1 745,80
26	Кайбицкий	67 548,61	67 206,94	99,49	0,00	341,66
27	Черемшанский	156 928,78	156 179,86	99,52	1,46	748,92
28	Алькеевский	194 969,50	194 575,58	99,80	0,90	393,92
29	Муслюмовский	140 658,75	140 405,52	99,82	2,08	253,23
30	Заинский	377 786,27	377 312,10	99,87	3,67	474,18
Итого по РТ:		30 794 791,74	28 279 024,33	91,83	2,51	2 515 767,41



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ, ГУИС, ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
31	Бавлинский	207 657,89	207 638,75	99,99	0,68	19,14
32	Сармановский	155 738,00	155 723,65	99,99	0,66	14,35
33	Тетюшский	179 691,26	179 690,28	100,00	0,81	0,00
34	Балтасинский	177 189,52	177 189,37	100,00	0,04	0,00
35	Спасский	141 334,07	141 334,02	100,00	0,09	0,00
36	Ютазинский	75 945,43	75 945,40	100,00	0,73	0,00
37	Атнинский	83 975,04	83 975,02	100,00	2,24	0,00
38	Буинский	605 152,72	605 152,71	100,00	0,02	0,00
39	Дрожжановский	156 128,89	156 128,89	100,00	0,06	0,00
40	Апастовский	313 514,99	313 514,99	100,00	0,07	0,00
41	Лаишевский	489 673,85	489 673,84	100,00	0,87	0,00
42	Лениногорский	259 846,18	259 846,19	100,00	0,14	0,00
43	Верхнеуслонский	86 724,03	86 724,03	100,00	0,23	0,00
44	Тюлячинский	81 165,08	81 165,08	100,00	0,18	0,00
45	Менделеевский	77 188,25	77 188,27	100,00	0,75	0,00
Итого по РТ:		30 794 791,74	28 279 024,33	91,83	2,51	2 515 767,41



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Казань	5 295 312,59	4 217 297,34	79,64	5,85	1 078 015,25
2	Наб.Челны	2 602 831,48	2 223 282,17	85,42	0,99	379 549,31
3	Р.-Слободский	245 586,48	216 470,79	88,14	19,26	29 115,69
4	Чистопольский	460 727,39	406 819,65	88,30	2,33	53 907,74
5	Зеленодольский	1 096 352,87	983 701,80	89,72	3,08	112 651,07
6	Алексеевский	136 044,32	124 870,00	91,79	1,00	11 174,32
7	Аксубаевский	149 860,07	138 181,38	92,21	23,27	11 678,68
8	Мензелинский	86 536,92	79 933,36	92,37	0,07	6 603,56
9	Мамадышский	105 454,43	98 715,35	93,61	4,79	6 739,08
10	Нижнекамский	1 400 771,28	1 311 823,71	93,65	1,31	88 947,57
11	Азнакаевский	190 807,89	178 729,76	93,67	11,96	12 078,13
12	Нурлатский	142 776,41	133 802,37	93,71	7,89	8 974,04
13	Арский	333 195,19	321 670,29	96,54	1,12	11 524,90
14	Высокогорский	586 542,31	568 851,78	96,98	1,17	17 690,53
15	Бугульминский	529 833,08	515 477,33	97,29	0,76	14 355,76
Итого по РТ:		19 312 736,97	17 433 949,84	90,27	3,29	1 878 787,13



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Тукаевский	348 800,85	340 193,64	97,53	0,82	8 607,21
17	Агрызский	143 000,31	140 065,56	97,95	13,47	2 934,75
18	Альметьевский	435 965,85	427 935,89	98,16	0,57	8 029,96
19	Кукморский	307 010,84	301 549,41	98,22	2,94	5 461,43
20	Сабинский	252 342,40	247 894,79	98,24	13,61	4 447,61
21	Актанышский	98 894,00	97 213,73	98,30	0,32	1 680,27
22	Елабужский	181 786,41	179 236,13	98,60	2,38	2 550,28
23	Алькеевский	135 295,24	134 901,32	99,71	1,30	393,92
24	Черемшанский	99 226,54	98 994,94	99,77	2,32	231,60
25	Муслюмовский	128 118,83	127 865,61	99,80	2,29	253,23
26	Пестречинский	402 976,10	402 293,74	99,83	0,56	682,35
27	Заинский	363 744,52	363 270,34	99,87	3,81	474,18
28	Сармановский	110 992,85	110 978,50	99,99	0,93	14,35
29	Бавлинский	190 943,82	190 924,67	99,99	0,74	19,14
30	Тетюшский	135 213,09	135 212,11	100,00	1,02	0,00
Итого по РТ:		19 312 736,97	17 433 949,84	90,27	3,29	1 878 787,13



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГИСУ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Балтасинский	139 324,72	139 324,57	100,00	0,05	0,00
32	Спасский	123 148,52	123 148,47	100,00	0,10	0,00
33	Ютазинский	62 488,42	62 488,39	100,00	0,89	0,00
34	Атнинский	70 789,54	70 789,53	100,00	2,66	0,00
35	Новошешминский	57 209,56	57 209,56	100,00	0,19	0,00
36	Буинский	541 718,07	541 718,05	100,00	0,02	0,00
37	Камско-Устьинский	277 713,26	277 713,26	100,00	0,04	0,00
38	Дрожжановский	96 268,36	96 268,36	100,00	0,10	0,00
39	Апастовский	288 037,64	288 037,63	100,00	0,00	0,00
40	Лаишевский	475 248,90	475 248,89	100,00	0,89	0,00
41	Кайбицкий	54 872,84	54 872,84	100,00	0,15	0,00
42	Лениногорский	239 726,76	239 726,76	100,00	0,00	0,00
43	Верхнеуслонский	64 851,71	64 851,72	100,00	0,00	0,00
44	Тюлячинский	56 575,06	56 575,07	100,00	0,26	0,00
45	Менделеевский	67 819,26	67 819,27	100,00	0,86	0,00
Итого по РТ:		19 312 736,97	17 433 949,84	90,27	3,29	1 878 787,13



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Казань	5 992 153,30	5 468 223,82	91,26	1,65	523 929,48
2	Мамадышский	69 221,91	65 302,87	94,34	0,00	3 919,04
3	Кукморский	23 465,44	22 187,88	94,56	0,00	1 277,56
4	Бугульминский	41 617,98	39 811,20	95,66	0,00	1 806,78
5	Наб.Челны	1 369 217,13	1 316 185,03	96,13	0,00	53 032,10
6	Нурлатский	77 796,67	75 734,06	97,35	0,00	2 062,61
7	Новошешминский	6 961,52	6 792,50	97,57	0,00	169,02
8	Нижнекамский	1 410 245,87	1 377 963,76	97,71	0,81	32 282,11
9	Черемшанский	28 364,50	27 847,17	98,18	0,18	517,32
10	Елабужский	322 955,77	321 627,50	99,59	0,00	1 328,27
11	Сабинский	120 378,11	120 326,45	99,96	9,33	51,66
12	Арский	38 381,85	38 381,85	100,00	3,49	0,00
13	Алексеевский	1 687,58	1 687,58	100,00	0,00	0,00
14	Тюлячинский	11 753,30	11 753,30	100,00	0,00	0,00
15	Агрызский	22 961,51	22 961,51	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		10 169 232,54	9 548 856,59	93,90	1,21	620 375,94



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГЖФ)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Алькеевский	42 413,80	42 413,80	100,00	0,00	0,00
17	Альметьевский	545 336,59	545 336,59	100,00	0,00	0,00
18	Мензелинский	18 727,28	18 727,28	100,00	0,00	0,00
19	Апастовский	3 495,49	3 495,49	100,00	0,00	0,00
20	Сармановский	22 096,93	22 096,93	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		10 169 232,54	9 548 856,59	93,90	1,21	620 375,94



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
1	Пестречинский	20 147,31	18 232,30	90,49	0,43	1 915,01
2	Новошешминский	26 303,05	24 852,99	94,49	0,00	1 450,06
3	Казань	67 929,19	64 937,22	95,60	0,00	2 991,97
4	Камско-Устьинский	42 365,18	40 619,38	95,88	6,14	1 745,80
5	Высокогорский	164 781,78	158 179,46	95,99	7,95	6 602,32
6	Кайбицкий	12 675,76	12 334,10	97,30	0,00	341,66
7	Зеленодольский	46 096,29	45 145,77	97,94	0,00	950,52
8	Мамадышский	37 054,32	36 447,32	98,36	2,43	607,00
9	Азнакаевский	22 309,78	22 309,77	100,00	0,00	0,00
10	Агрызский	14 764,82	14 764,82	100,00	0,00	0,00
11	Бавлинский	16 714,07	16 714,07	100,00	0,00	0,00
12	Сабинский	17 600,05	17 600,05	100,00	0,00	0,00
13	Елабужский	13 860,59	13 860,59	100,00	0,00	0,00
14	Муслюмовский	12 539,91	12 539,91	100,00	0,00	0,00
15	Лениногорский	20 119,43	20 119,43	100,00	1,85	0,00
Итого по РТ:		1 312 822,24	1 296 217,90	98,74	1,29	16 604,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
16	Верхнеуслонский	21 872,32	21 872,32	100,00	1,04	0,00
17	Апастовский	21 981,86	21 981,86	100,00	0,96	0,00
18	Лаишевский	14 424,95	14 424,95	100,00	0,44	0,00
19	Тетюшский	44 478,18	44 478,18	100,00	0,19	0,00
20	Актанышский	108 015,48	108 015,48	100,00	0,03	0,00
21	Арский	7 033,97	7 033,97	100,00	0,00	0,00
22	Чистопольский	14 539,85	14 539,85	100,00	0,00	0,00
23	Балтасинский	37 864,80	37 864,80	100,00	0,00	0,00
24	Черемшанский	29 337,74	29 337,74	100,00	0,00	0,00
25	Кукморский	33 241,95	33 241,95	100,00	0,00	0,00
26	Тюлячинский	12 836,72	12 836,72	100,00	0,00	0,00
27	Алексеевский	12 445,03	12 445,03	100,00	0,00	0,00
28	Атнинский	13 185,49	13 185,49	100,00	0,00	0,00
29	Бугульминский	16 721,40	16 721,40	100,00	0,00	0,00
30	Менделеевский	9 368,99	9 368,99	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 312 822,24	1 296 217,90	98,74	1,29	16 604,34



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам (ГУИС)

№	МО	Лимит по гос. Контракту, тыс.руб.	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика,%	Остаток, тыс.рублей
31	Р.-Слободский	24 290,42	24 290,42	100,00	0,00	0,00
32	Спасский	18 185,55	18 185,55	100,00	0,00	0,00
33	Наб.Челны	17 630,46	17 630,46	100,00	0,00	0,00
34	Заинский	14 041,75	14 041,75	100,00	0,00	0,00
35	Дрожжановский	59 860,53	59 860,53	100,00	0,00	0,00
36	Аксубаевский	13 448,17	13 448,17	100,00	0,00	0,00
37	Буинский	63 434,65	63 434,65	100,00	0,00	0,00
38	Ютазинский	13 457,01	13 457,01	100,00	0,00	0,00
39	Нижнекамский	22 070,63	22 070,63	100,00	0,00	0,00
40	Альметьевский	19 597,34	19 597,34	100,00	0,00	0,00
41	Тукаевский	35 061,19	35 061,19	100,00	0,00	0,00
42	Алькеевский	17 260,46	17 260,46	100,00	0,00	0,00
43	Сармановский	22 648,22	22 648,22	100,00	0,00	0,00
44	Нурлатский	25 649,50	25 649,50	100,00	0,00	0,00
45	Мензелинский	13 576,10	13 576,10	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ:		1 312 822,24	1 296 217,90	98,74	1,29	16 604,34



Диспетчерская Министерства



телефон
8(843)2-311-410

круглосуточно



С наступающим новым годом!

2021

100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН





Спасибо за внимание!
