



# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН




**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

*27 февраля 2021 г.*

# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Торги проведены



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок (15 объектов)	300 000,00	292 289,10	7 710,90	УСП, лыжные базы – ГК № 144-20/СМР от 29.12.2020, Манежи - ГК № 1-21/смр от 15.02.2021
2	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (16 объектов)	50 000,00	47 507,37	2 492,63	ГК № 5-21/СМР от 15.02.2021
3	Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза РТ (28 объектов)	70 500,00	70 500,00	-	ГК № 1-КР/21 от 12.02.2021
4	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии (12 объектов)	30 000,00	30 000,00	-	
5	Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений (13 объектов)	20 000,00	20 000,00	-	
6	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания (29 объектов)	100 000,00	100 000,00	-	ГК № 2-КР/21 от 15.02.2021
7	Формирование комфортной городской среды (49 объектов)*	1 535 704,57	1 460 262,10	75 442,47	ГК № 125-20/СМР, № 126-20/СМР от 23.10.2020 (46 объектов)

\* В т.ч. 3 объекта, проект РКМ РТ о внесении изменений внесен в КМ РТ (№ 6262 от 08.02.2021)



# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Торги проведены частично




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Капитальный ремонт спортивных объектов (20 объектов)	500 000,00	484 175,08	15 824,92	ГК № 3-КР/21 от 15.02.2021 (8 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (10 объектов)
2	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений МО (28 объектов)	100 000,00	97 292,89	2 707,11	ГК № 5-21/смр от 15.02.2021 (13 объектов) ГК ориент. 15.03.2021 (15 объектов)
3	Строительство и капитальный ремонт стационаров (25 объектов)	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	ГК № 4-21/смр от 15.02.2021 (1 объект) ГК № 7-КР/21 от 15.02.2021 (9 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (11 объектов)
4	Строительство дошкольных образовательных организаций (13 объектов)	3 021 020,04	3 014 003,10	7 016,94*	ГК № 3-21/смр от 15.02.2021 (2 объекта) ГК № 6-21/смр от 19.02.2021 (1 объект) ГК № 8-21/смр от 19.02.2021 (2 объекта) ГК № 11-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 12-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 13-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 14-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК ориент. 09.03.2021 (2 объекта) ГК ориент. 31.03.2021 (2 объекта)

\* Сумма выделена на 2 объекта по которым ранее не разработана ПСД

# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Торги проведены частично




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
5	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения (50 объектов)	330 000,00	318 119,88	11 880,12	ГК № 4-21/смр от 15.02.2021 (47 объектов); ГК ориент. 30.04.2021 (3 объекта)
6	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей (12 объектов)	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	ГК № 9-КР/21 от 20.02.2021 (3 объекта) ГК ориент. 30.04.2021 (9 объектов)
7	Капитальный ремонт объектов образования (213 объектов)	2 000 000,00	1 921 079,41	78 920,59	ГК № 16-21/смр от 24.02.2021 (рекон. - 1 объект); ГК ориент. 12.03.2021 (к/р – 120 объектов); ГК ориент. 31.05.2021 (к/р - 92 объектов)
8	Капитальный ремонт молодежных центров (4 объекта)	95 000,00	91 390,00	3 610,00	ГК № 6/21-ПР от 26.02.2021 (проектные работы 1 объект); ГК ориент. 31.03.2021 (1 объект); ГК ориент. 30.04.2021 (2 объекта)



# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД


## Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
9	Обеспечение населения питьевой водой (126 объектов СМР, 56 ПИР)	650 000,00	589 250,00	60 750,00	<p>Заключение Г/К 01.03.2021 – 203,4 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 09.03.2021 – 33,8 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 22.03.2021 – 114,8 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 23.03.2021 – 9,5 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 05.04.2021 – 150,0 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 12.04.2021 – 60,75 млн. руб.;</p> <p>Заключение Г/К 31.05.2021 – 77,75 млн. руб.</p>
10	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета (11 852 светильника, 203 км СИП, 34 ВЩУ)	225 000,00	224 900,00	100,00	Заключение Г/К 12.03.2021

# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Проведение торгов




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации (13 объектов)	167 100,00	167 100,00	-	01.03.2021 – 94,0 млн. руб. 15.04.2021 – 67,6 млн. руб.
2	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений (44 объекта)	69 900,00	65 007,00	4 893,00	01.03.2021 – 40,45 млн. руб. 15.04.2021 – 24,5 млн. руб.
3	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах (58 ВНБ, 45 скважин, 21 км водопровода, 61 площадка ТБО)	150 000,00	150 000,00	-	ГК ориент. 03.03.2021
4	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (39 объектов)	162 200,00	150 846,00	11 354,00	04.03.2021 – 142,46 млн. руб. 15.04.2021 – 8,84 млн. руб.
5	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии (11 объектов)	111 403,45	111 403,45	-	ГК ориент. 03.03.2021



# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Проведение торгов




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
6	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов (9 объектов)	50 000,00	48 890,00	1 110,00	ГК ориент. 12.03.2021
7	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий (6 объектов)	190 049,80*	181 199,96	8 849,84	
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (6 объектов)	150 000,00	145 264,42	4 735,58	
9	Капитальный ремонт сети подростковых клубов (11 объектов)	100 000,00	92 469,00	7 531,00	ГК ориент. 30.04.2021
10	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ (10 объектов)	150 000,00	139 520,00	9 340,00	
11	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей (9 объектов)	500 000,00**	481 000,00	19 000,00	

\* с учетом нераспределенного лимита - 130 451,88 тыс.рублей

\*\* с учетом нераспределенного лимита – 213 712,25 тыс.рублей

# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

## Субсидия



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов) (7 объектов)	60 000,00	60 000,00	-	Субсидия Торги не требуются
2	Капитальный ремонт овощехранилищ (5 объектов)	15 000,00	15 000,00	-	
3	Строительство силосно-сенажных траншей (67 объектов)	54 600,00	54 600,00	-	



# ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД




## Проекты РКМ, зашедшие в КМ РТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Организация горячего питания в школах (201 объект)	1 000 000,00	984 083,64	15 916,36	Вх. КМ РТ № 6121 от 05.02.2021
2	Капитальный ремонт объектов культурного назначения (22 объекта)	300 000,00*	291 987,95	8 012,05	Исх. № 01-08-2606 от 26.02.2021

\* С учетом нераспределенного лимита – 207 533,02 тыс.рублей

# Строительство дошкольных образовательных организаций



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	180 177,80	2,00	2,00
2	Строительство ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК Лето	270 618,34	3,00	2,00
3	Строительство ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	270 085,01	6,00	2,00
4	Строительство ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	184 748,60	7,80	7,10
5	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	269 841,33	16,00	5,60
<b>ИТОГО по 9 объектам</b>		<b>2 178 848,44</b>	<b>20,1</b>	<b>4,47</b>
6	Строительство ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	188 561,48	21,00	0,50
7	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	286 693,16	34,00	2,50
8	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	258 702,33	41,00	6,00
9	Строительство ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	269 420,39	50,80	4,68




# ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

НА 2021 ГОД

**41** МО

**948** ДОМОВ,  
В Т.Ч.


дополнительно  
5 домов в г.Казани  
24 в г.Наб.Челны



БЮДЖЕТ РТ



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ




СОБСТВЕННИКИ  
ПОМЕЩЕНИЙ



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД В РАЗРЕЗЕ МО




№ п/п	МО РТ	Кол. дом.	Лимит, млн.руб.
1	Агрызский	14	29,41
2	Азнакаевский	31	91,61
3	Аксубаевский	9	7,24
4	Актанышский	2	9,02
5	Алексеевский	5	9,62
6	Альметьевский	36	324,82
7	Апастовский	3	3,77
8	Арский	5	15,97
9	Бавлинский	10	40,47
10	Балтасинский	3	5,12
11	Бугульминский	33	219,31
12	Буинский	6	21,45
13	Верхнеуслонский	2	4,99
14	Высокогорский	10	36,80
15	г. Казань	243	2 254,61
16	г. Набережные Челны	150	1 469,57
17	Елабужский	16	133,66
18	Заинский	68	74,59
19	Зеленодольский	33	281,08
20	Камско-Устьинский	3	7,81
21	Кукморский	7	23,86

№ п/п	МО РТ	Кол. дом.	Лимит, млн.руб.
22	Лаишевский	8	24,87
23	Лениногорский	23	139,81
24	Мамадышский	3	24,03
25	Менделеевский	10	54,16
26	Мензелинский	5	22,19
27	Муслюмовский	3	6,50
28	Нижнекамский	98	611,41
29	Новошешминский	2	4,77
30	Нурлатский	9	54,65
31	Пестречинский	17	38,93
32	Рыбно-Слободский	3	6,50
33	Сабинский	14	13,63
34	Сармановский	17	40,74
35	Спасский	4	7,49
36	Тетюшский	7	10,70
37	Тукаевский	9	27,86
38	Тюлячинский	1	0,48
39	Черемшанский	4	2,40
40	Чистопольский	12	113,97
41	Ютазинский	10	24,36
<b>ИТОГО:</b>		<b>948</b>	<b>6 294,267</b>



# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД


## Информация о размещении извещений на торги (1, 2)



№ п/п	Предмет закупки	Кол-во домов всего	В том числе			
			размещено на эл.площадке	Лот на формировании	Торги состоялись	Не представлены документы в Фонд
	<b>Итого</b>	<b>843</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>632</b>	<b>181</b>
<b>1</b>	<b>ПСД и СМР</b>	<b>663</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>632</b>	<b>17</b> (необходима корректировка ПКМ) Верхнеуслонский - 2 (из 2 МКД) Пестречинский – 15 (из 17 МКД)
<b>2</b>	<b>СМР</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>16</b> (12 МКД Казань, 1 МКД Пестречинский, 1 МКД Лаишевский, 1 МКД Высокогорский, 1 МКД Чистопольский)	<b>-</b>	<b>164</b> (необходимо заключение о ПДОСС) Казань – 163 (из 175 МКД) Пестречинский – 1 (из 17 МКД)

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД


## Информация о размещении извещений на торги (3, 4)



№ п/п	Предмет закупки	Кол-во домов всего	В том числе			
			заключен договор	размещено на эл.площадке	Торги состоялись	Сбор документов для представления в Фонд
	<b>Итого</b>	<b>117</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>29</b>
<b>3</b>	<b>ПСД на лифты и замена лифтов</b>	<b>115</b> (321 лифтов)	<b>51</b> (146 лифтов)	-	<b>35</b> (85 лифтов)	<b>29 МКД (90 лифтов, включены в программу дополнительно)</b>  Казань – 5 МКД (17 лифта) Наб.Челны – 24 МКД (73 лифта)
<b>4</b>	<b>Замена лифтов</b>	<b>2</b> (4 лифта)	-	<b>2</b> (4 лифта)	-	-




# Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов (Программа 2013-2017 годов)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ не переданы	ЗУ переданы	Динамика передачи за неделю
1	Зеленодольский	190	181*	9	0
2	Чистопольский	183	168	15	0
3	Казань	89	83	6	0
4	Высокогорский	76	25	51	0
5	Кукморский	53	19*	34	0
6	Агрызский	21	8	13	0
7	Лениногорский	16	8	8	0
8	Спасский	29	5	24	0
9	Арский	54	3	51	9
10	Бугульминский	12	3	9	0
11	Лаишевский	20	3	17	0
ВСЕГО по РТ		1102	512	590	9

\* два аварийных дома в Зеленодольском и Кукморском районах не снесены


# Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов (Программа 2013-2017 годов)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ не переданы	ЗУ переданы	Динамика передачи за неделю
12	Альметьевский	14	2	12	0
13	Ютазинский	19	2	17	0
14	Буинский	19	1	18	0
15	Тетюшский	8	1	7	0
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>1 102</b>	<b>512</b>	<b>590</b>	<b>9</b>




# НАЛИЧИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД) ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	НАЛИЧИЕ ПСД
НП «ЖИЛЬЕ»	ФП «ЖИЛЬЕ»	7 (3-детских сада, 1-школа, 1-очистн. сооруж., 2-наруж.сети водоснабж.)	+ (7)
	ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы), 8 (конкурс малых городов 2021 г.)	+ (46), - (3) + (8)
	ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	1 (строительство станц. водопод.)	+ (1)
НП «ЭКОЛОГИЯ»	ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	2 (реконструкция БОСК г.Казань, строительство БОС в с.Кощаково)	+ (2)
	ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки)	+ (2)
	ФП «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»	3 (расчистка рек и пруда)	+ (3)
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВ-Я, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	+ (1)
НП «КУЛЬТУРА»	ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	7 (2-стр.центра культ.развития, 3-стр.дома культуры, 2-рек.детс.муз.школы)	+ (2), - (5)
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	+ (11), - (2)
	ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал)	+ (1)
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	- (1)
	ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	не требуется
ИТОГО:		97	+ (84), - (11)

# ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОПРОКАТА

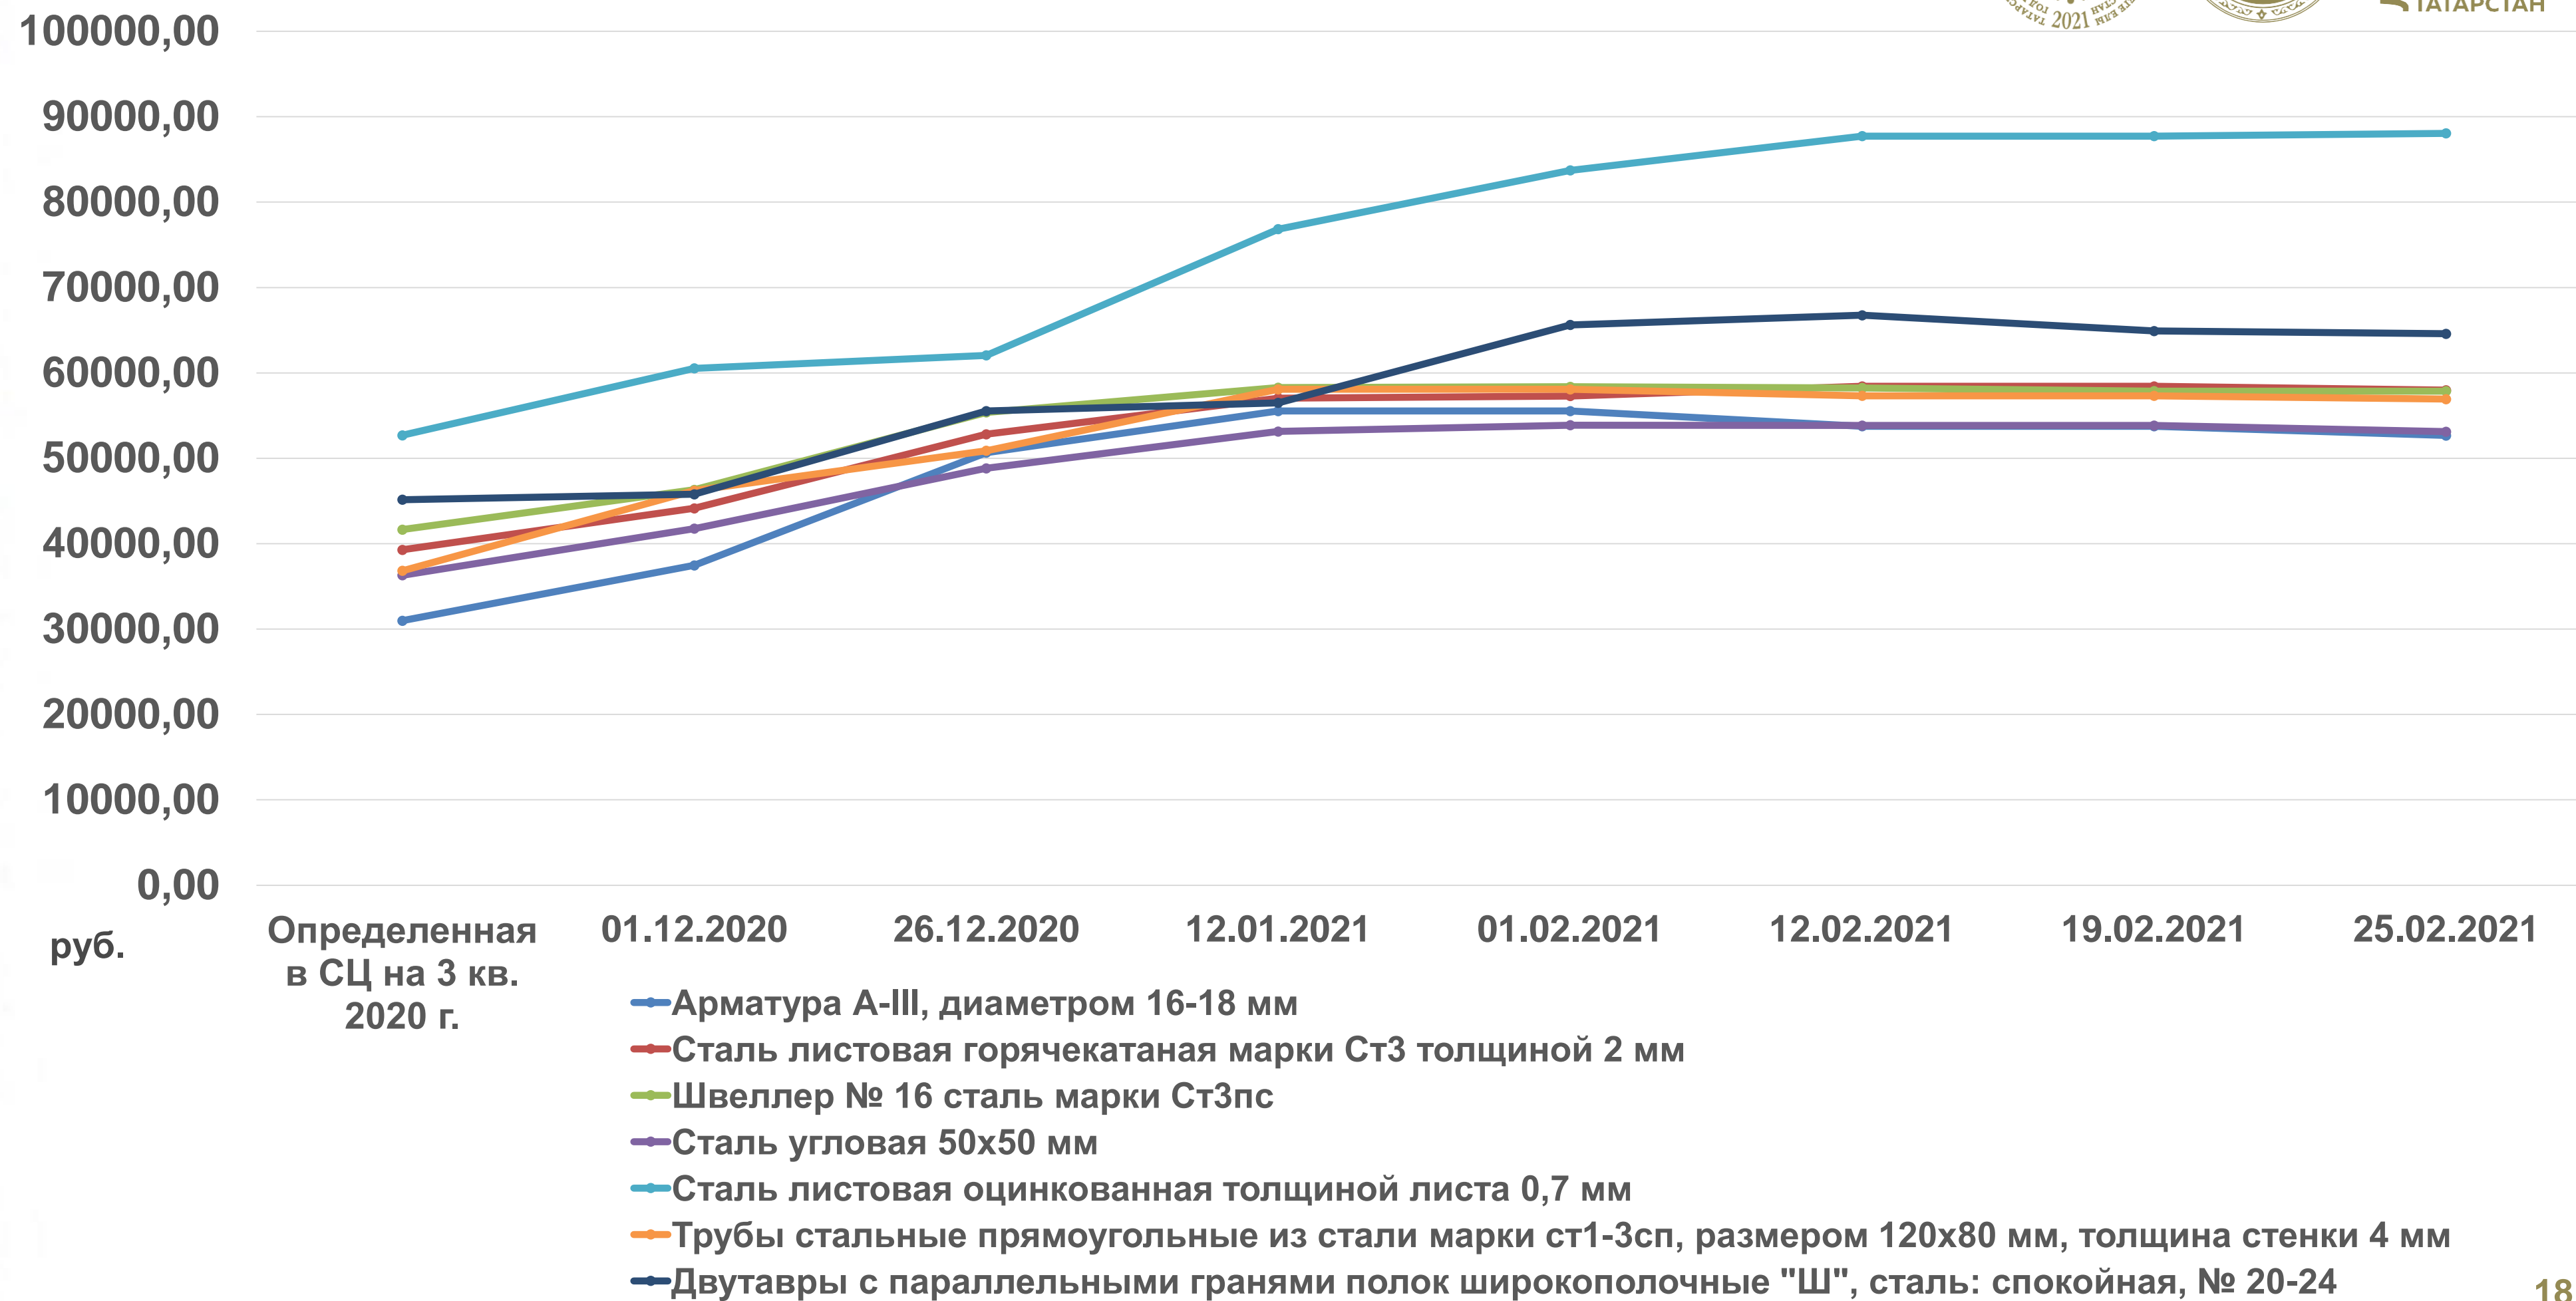



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**
