Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2020 году

Формирование программ

50 программ

утверждаются Распоряжением Кабинета Министров РТ

38 программ

утверждаются иными соглашениями

12 программ

утверждены распоряжениями Кабинета Министров РТ

31 программа

внесены в Кабинет Министров РТ

проекты 3 программ

находятся на межведомственном согласовании

проекты 4 программ

Готовность технических условий для строительства социально-культурных объектов

Проектная документация

№	Программа / Объекты	%	МО РТ представили частично	Динамика по МО, %
1	Здания исполнительных комитетов (Советов) поселений *всего 11 объектов*	96	Атнинский (50%)	0
2	Детские сады *всего 22 объекта*	99	Пестречинский (86%)	0
Итого по РТ		**99**	**Динамика по РТ**	**2**

Готовность сметной документации по программам капитального ремонта социально-культурных объектов

Проектная документация

№	Программа / Объекты	%	Динамика по программе,%	МО РТ не представили / представили частично
1	Молодежные центры *всего 2 объекта*	50	0	Балтасинский
2	Ресурсные центры *всего 17 объектов*	50	43	г.Казань
3	Спортивные объекты *всего 10 объектов*	56	0	Новошешминский, Сабинский, Сармановский, г.Казань
4	Образовательные учреждения культуры *всего 8 объектов*	75	25	Альметьевский, Пестречинский
5	Объекты культурного назначения (СДК) *всего 37 объектов*	82	0	Арский
6	Подростковые клубы *всего 17 объектов*	83	16	г.Казань (75%)
Итого по сметной документации		**98**	**11**	

План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

ЖКХ

№	Наименование программы	План	Подготовительные работы
1	**Обеспечение** населения **питьевой водой** в населенных пунктах РТ	- 220 км сетей водопровода - 30 скважин - 35 водонапорных башен	Подготовлено **88%** ПСД
2	Восстановление **уличного освещения** в населенных пунктах РТ	- 12 100 светильников - 335 км СИП	Оформлены дефектные ведомости по **всем** объектам
3	**Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 113 котлов на 65 объектах в 43 МО	Подготовлено **25%** ПСД
4	Переход на **индивидуальные системы отопления**, установка БМК	- Перевод на инд. системы отопления 1 547 квартир - Установка 21 котла на объектах СКБ - Строительство 15 км газопроводов	Подготовлено **29%** проектов по переводу квартир на инд. системы отопления
5	Модернизация систем **водоотведения**	Распоряжение Кабинета Министров РТ не утверждено	Ведется работа по обследованию объектов

Финансирование программы капитального ремонта МКД

Капитальный ремонт МКД

Финансирование программы на 2020 год (без г.Казани)

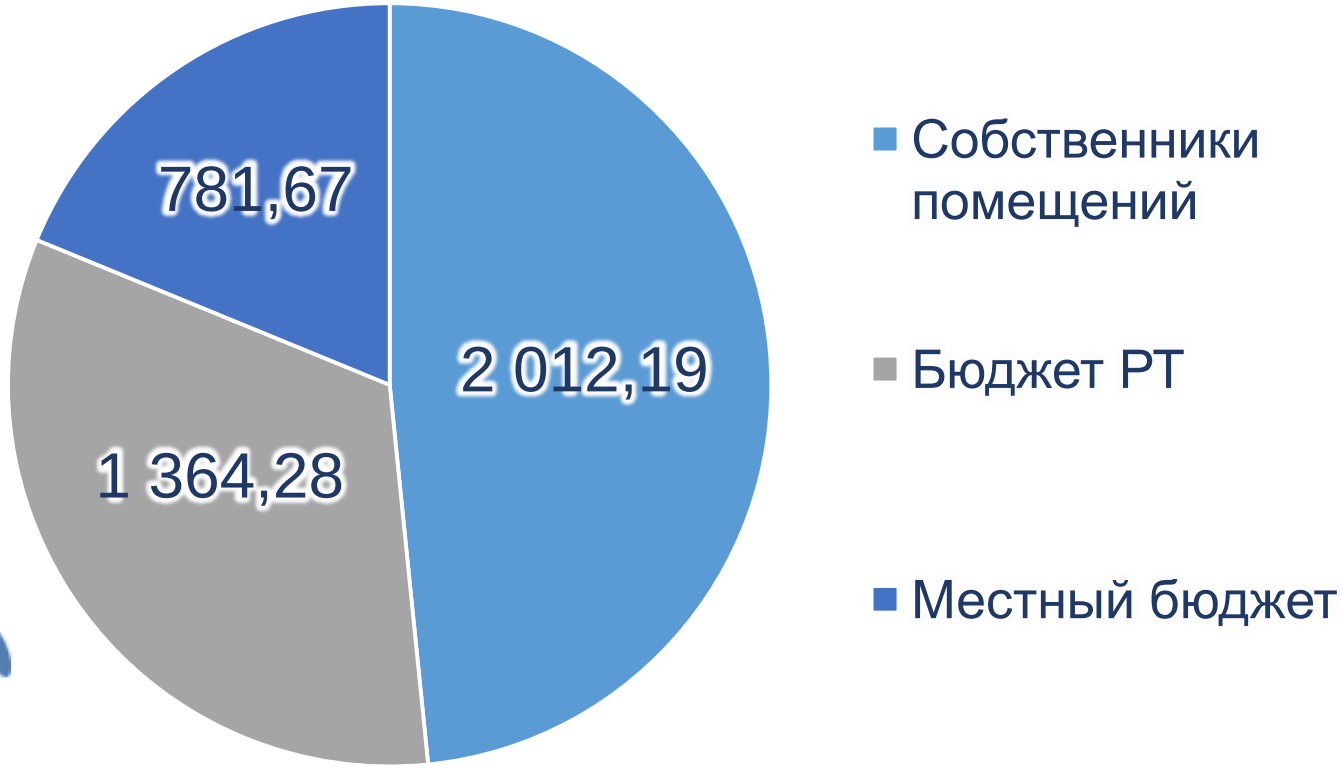

Всего: 4 158,44 млн рублей

Информация о размещенных электронных аукционах

Капитальный ремонт МКД

№	Предмет аукциона	кол-во МО, участвующих в программе	кол-во МКД		Примечание
			всего	торги состоялись	
1	Выполнение работ по разработке ПСД	40	731	731	
2	Выполнение работ по разработке ПСД и замене лифтов	7	83	0	дата проведения торгов 02.03.2020г.

Ввод жилья в Республике Татарстан по состоянию на 21.02.2020г.

Ввод жилья

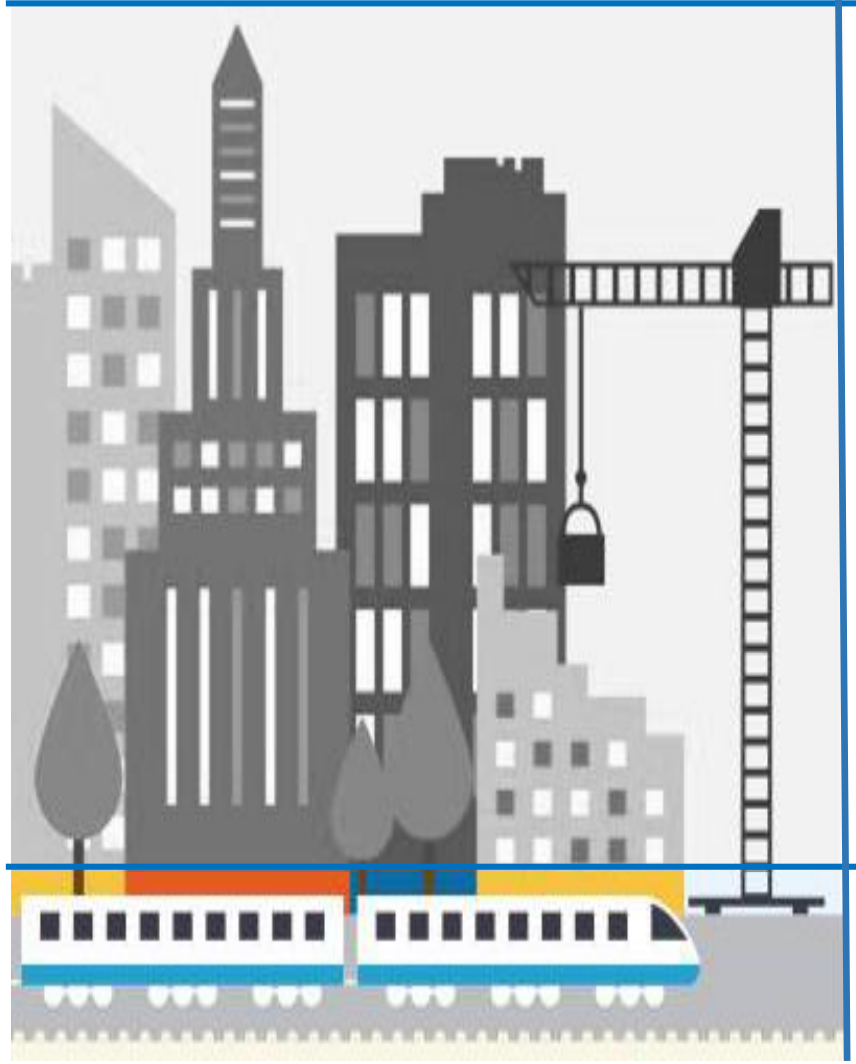

2 979 000 кв.м.

100 %

401 960 кв.м.

13,5 %

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 21.02.2020г.

Ввод жилья

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Нижнекамский	110 000	0	0,0	110 000
2	Бавлинский	18 000	160	0,9	17 840
3	Лениногорский	32 000	389	1,2	31 611
4	Муслюмовский	12 000	304	2,5	11 696
5	Альметьевский	140 000	3 807	2,7	136 193
6	Сабинский	26 000	813	3,1	25 187
7	Дрожжановский	9 000	392	4,4	8 608
8	Новошешминский	6 000	271	4,5	5 729
9	г.Наб.Челны	350 000	17 091	4,9	332 909
10	Менделеевский	15 000	742	4,9	14 258
11	Елабужский	65 000	3 338	5,1	61 662
12	Азнакаевский	26 000	1 345	5,2	24 655
13	Атнинский	6 000	317	5,3	5 683
14	Тукаевский	120 000	7 449	6,2	112 551
15	Актанышский	18 000	1 255	7,0	16 745
Всего по РТ		**2 979 000**	**401 960**	**13,5**	**2 577 040**

Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 21.02.2020г.

Ввод жилья

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Кайбицкий	7 000	500	7,1	6 500
17	Чистопольский	35 000	2 545	7,3	32 455
18	Арский	30 000	2 222	7,4	27 778
19	Апастовский	12 000	1 075	9,0	10 925
20	Сармановский	12 000	1 075	9,0	10 925
21	Черемшанский	7 000	639	9,1	6 361
22	Буинский	20 000	1 894	9,5	18 106
23	Агрызский	21 000	2 005	9,5	18 995
24	Бугульминский	45 000	4 339	9,6	40 661
25	Тетюшский	14 000	1 372	9,8	12 628
26	Р-Слободский	18 000	1 790	9,9	16 210
27	Зеленодольский	110 000	11 780	10,7	98 220
28	В-Услонский	50 000	5 517	11,0	44 483
29	Мензелинский	18 000	2 293	12,7	15 707
30	Мамадышский	23 000	3 004	13,1	19 996
Всего по РТ		**2 979 000**	**401 960**	**13,5**	**2 577 040**

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 21.02.2020г.

Ввод жилья

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Спасский	9 000	1 256	14,0	7 744
32	Алексеевский	19 000	2 661	14,0	16 339
33	Алькеевский	10 000	1 457	14,6	8 543
34	Ютазинский	15 000	2 224	14,8	12 776
35	Аксубаевский	10 000	1 532	15,3	8 468
36	Заинский	21 000	3 226	15,4	17 774
37	К-Устьинский	12 000	1 898	15,8	10 102
38	г.Казань	960 000	153 274	16,0	806 726
39	Высокогорский	110 000	18 959	17,2	91 041
40	Нурлатский	20 000	3 492	17,5	16 508
41	Кукморский	29 000	5 828	20,1	23 172
42	Балтасинский	18 000	3 712	20,6	14 288
43	Лаишевский	160 000	37 445	23,4	122 555
44	Тюлячинский	12 000	3 613	30,1	8 387
45	Пестречинский	200 000	81 660	40,8	118 340
Всего по РТ		**2 979 000**	**401 960**	**13,5**	**2 577 040**

Программа ГЖФ РТ

Ввод жилья

273 568 кв.м.

100%

5 194 кв.м.

1,9%

Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

Ввод жилья

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за неделю		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	**130**	10	0	120	26	54	40
Количество квартир	**4 970**	108	0	4 862	1 756	1 257	1 849
Общая площадь (тыс.кв.м.)	**273,6**	5,2	0	268,3	101,2	68,8	98,3

Ход исполнения программы ГЖФ РТ

Ввод жилья

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
введены в эксплуатацию	153 845	153 845	0	136 895	44	135 651	0
высокая 70-100%	3 838 503	3 487 785	29 205	2 977 551	107 734	3 507 540	17 791
средняя 30-70%	2 659 189	1 405 752	70 175	811 097	133 780	1 327 628	14 842
низкая 0-30%	3 610 767	680 256	50 151	345 425	735	1 301 973	6 624
ИТОГО	**10 262 304**	**5 727 638**	**149 531**	**4 270 968**	**242 294**	**6 272 792**	**39 257**

Многоквартирное инвестиционное жилье

Ввод жилья

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	3	1	2	-
3	Арский	2	-	-	2
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	3	1	-	2
6	Верхнеуслонский	2	1	1	-
7	Высокогорский	6	1	5	-
8	Елабужский	3	2	1	-
9	Зеленодольский	6	4	2	-
10	Лаишевский	5	-	5	-
11	Пестречинский	30	6	17	7
12	г.Набережные Челны	31	10	20	1
13	г.Казань	49	41	8	-
Всего по РТ		**142**	**69**	**61**	**12**

Индивидуальное жилищное строительство по состоянию на 21.02.2020г.

Ввод жилья

10 680 домов

100%

1 322 дома

12,4%

Переходящие объекты по программам 2019 года

ЖКХ / Молодежная политика

№	Наименование программы	Лимит, млн. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за неделю, %
Модернизация систем водоотведения				
1	Строительство БОС с.Крым-сарай, Бавлинский район	21,4	90	0
2	Капремонт сетей водоотведения в г.Буинске	9,4	75	5
3	Капитальный ремонт БОС пгт.Рыбная Слобода	47	100	-
4	Капитальный ремонт БОС г.Болгар	43	90	0
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей				
5	ДОЛ «Звездный» ГБУ Молодежный центр «Сэлэт», Лаишевский район	117,01	58	3
	Итого	**237,81**	**83**	2

МСАЖКХ РТ

75 ПОБЕДА! 1945–2020

1945 2020

ТАССР
Празднование 100-летия Татарской АССР
Татарстан АССР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү
1920-2020
