МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

06 февраля 2021 г.

ПРОГРАММА ГЖФ РТ

280 496 кв.м — **100 %**

72 635 кв.м — **25,9 %**

МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ

	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	161	12	4	149	71	41	37
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	5 159	1 313	4	3 846	991	1 868	987
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	280,5	72,6	0,15	208	53,5	102,2	52,3

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ

1 265 304 кв.м — **100 %**

85 280 кв.м — **6,7 %**

МНОГОКВАРТИРНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-	-
2	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	3	2	1	-
3	АРСКИЙ	2	1	1	-
4	БУИНСКИЙ	2	1	1	-
5	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	10	4	2	4
6	ВЫСОКОГОРСКИЙ	4	-	3	1
7	ЕЛАБУЖСКИЙ	3	1	-	2
8	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	1	-	3
9	ЛАИШЕВСКИЙ	2	1	-	1
10	НИЖНЕКАМСКИЙ	1	-	1	-
11	НУРЛАТСКИЙ	1	-	1	-
12	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	33	5	8	20
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	27	11	16	-
14	Г.КАЗАНЬ	52	15	19	18
	ВСЕГО по РТ	145	43	53	49

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

8 330 домов — **100 %**

913 домов — **10,9 %**

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

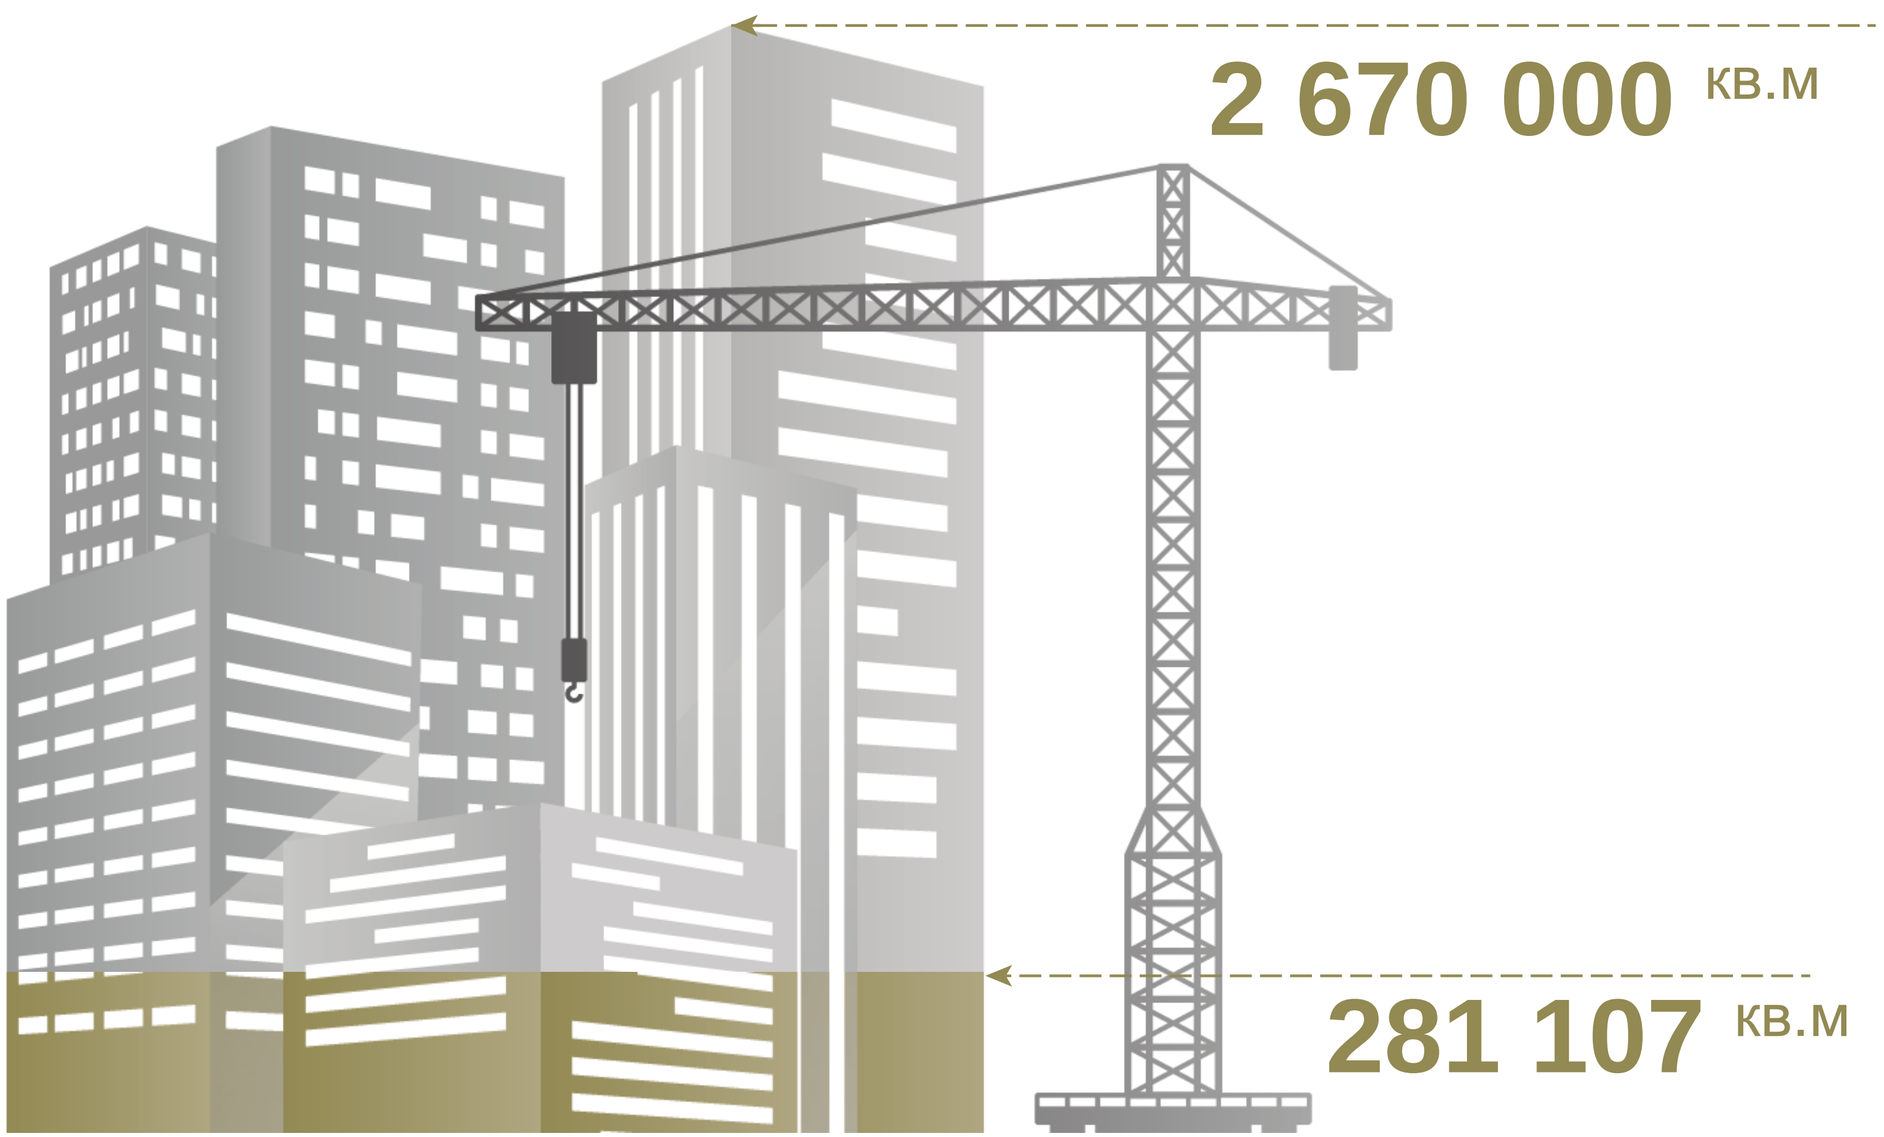

2 670 000 кв.м — **100 %**

281 107 кв.м — **10,5 %**

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	ВЕРХНЕ-УСЛОНСКИЙ	35 000	0	0,0	35 000
2	НОВОШЕШМИНСКИЙ	5 000	0	0,0	5 000
3	ТУКАЕВСКИЙ	110 000	0	0,0	110 000
4	ЕЛАБУЖСКИЙ	60 000	1 407	2,3	58 593
5	СПАССКИЙ	5 000	154	3,1	4 846
6	Г.КАЗАНЬ	960 000	30 289	3,2	929 711
7	САРМАНОВСКИЙ	10 000	324	3,2	9 676
8	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	13 000	437	3,4	12 563
9	МУСЛЮМОВСКИЙ	10 000	348	3,5	9 652
10	БУИНСКИЙ	16 000	579	3,6	15 421
11	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	22 000	873	4,0	21 127
12	АЗНАКАЕВСКИЙ	22 000	1 032	4,7	20 968
13	ЛЕНИНОГОРСКИЙ	25 000	1 429	5,7	23 571
14	МАМАДЫШСКИЙ	20 000	1 233	6,2	18 767
15	РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ	15 000	937	6,2	14 063
	ВСЕГО по РТ	2 670 000	281 107	10,5	2 388 893

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	АКСУБАЕВСКИЙ	8 000	501	6,3	7 499
17	ТЕТЮШСКИЙ	10 000	632	6,3	9 368
18	БАВЛИНСКИЙ	15 000	1 016	6,8	13 984
19	ЛАИШЕВСКИЙ	160 000	10 972	6,9	149 028
20	САБИНСКИЙ	22 000	1 681	7,6	20 319
21	ЮТАЗИНСКИЙ	13 000	1 003	7,7	11 997
22	НУРЛАТСКИЙ	17 000	1 391	8,2	15 609
23	АРСКИЙ	25 000	2 073	8,3	22 927
24	К-УСТЬИНСКИЙ	7 000	581	8,3	6 419
25	БУГУЛЬМИНСКИЙ	35 000	3 167	9,0	31 833
26	АПАСТОВСКИЙ	8 000	724	9,1	7 276
27	БАЛТАСИНСКИЙ	15 000	1 394	9,3	13 606
28	АТНИНСКИЙ	4 000	376	9,4	3 624
29	КАЙБИЦКИЙ	5 000	474	9,5	4 526
30	МЕНЗЕЛИНСКИЙ	14 000	1 479	10,6	12 521
	ВСЕГО по РТ	2 670 000	281 107	10,5	2 388 893

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

кв.м.

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	АГРЫЗСКИЙ	18 000	2 059	11,4	15 941
32	ЗАИНСКИЙ	20 000	2 593	13,0	17 407
33	ДРОЖЖАНОВСКИЙ	7 000	935	13,4	6 065
34	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	16 000	2 141	13,4	13 859
35	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	120 000	16 094	13,4	103 906
36	ТЮЛЯЧИНСКИЙ	7 000	952	13,6	6 048
37	АЛЬКЕЕВСКИЙ	8 000	1 119	14,0	6 881
38	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	90 000	12 779	14,2	77 221
39	КУКМОРСКИЙ	27 000	4 244	15,7	22 756
40	АКТАНЫШСКИЙ	15 000	2 525	16,8	12 475
41	ЧЕРЕМШАНСКИЙ	6 000	1 215	20,3	4 785
42	НИЖНЕКАМСКИЙ	70 000	14 765	21,1	55 235
43	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	320 000	77 007	24,1	242 993
44	ВЫСОКОГОРСКИЙ	110 000	27 917	25,4	82 083
45	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	190 000	48 256	25,4	141 744
	ВСЕГО по РТ	2 670 000	281 107	10,5	2 388 893

Доработка генеральных планов
В РАЗРЕЗЕ МО

№ п/п	МО РТ	Выполнение, %
1	Кайбицкий	0
2	Агрызский	7
3	Новошешминский	7
4	Тюлячинский	8
5	Тетюшский	10
6	Черемшанский	14
7	Рыбно-Слободский	15
8	Дрожжановский	16
9	Муслюмовский	16
10	Альметьевский	24
11	Спасский	24
12	Алексеевский	25
13	Бугульминский	26
14	Алькеевский	27
15	Бавлинский	29
16	Чистопольский	33
17	Зеленодольский	37
18	Камско-Устьинский	38
19	Сармановский	39
20	Заинский	43
21	Елабужский	44
22	Мамадышский	48
23	Мензелинский	50
24	Аксубаевский	52

№ п/п	МО РТ	Выполнение, %
25	Ютазинский	55
26	Балтасинский	56
27	Атнинский	58
28	Лаишевский	58
29	Буинский	65
30	Высокогорский	68
31	Тукаевский	70
32	Азнакаевский	71
33	Лениногорский	72
34	Менделеевский	73
35	Нурлатский	79
36	Актанышский	81
37	Пестречинский	85
38	Апастовский	91
39	Нижнекамский	94
40	Кукморский	97
31	Арский	100
42	Верхнеуслонский	100
43	Сабинский	100
44	Казань	100
45	Набережные Челны	100
Всего по РТ:		**51**

Доработка правил землепользования и застройки поселений В РАЗРЕЗЕ МО

№ п/п	МО РТ	Выполнение, %
1	Агрызский	0
2	Азнакаевский	0
3	Аксубаевский	0
4	Алексеевский	0
5	Атнинский	0
6	Бавлинский	0
7	Балтасинский	0
8	Буинский	0
9	Кайбицкий	0
10	Камско-Устьинский	0
11	Кукморский	0
12	Лениногорский	0
13	Мамадышский	0
14	Новошешминский	0
15	Нурлатский	0
16	Рыбно-Слободский	0
17	Сармановский	0
18	Тетюшский	0
19	Тукаевский	0
20	Тюлячинский	0
21	Набережные Челны	0
22	Заинский	4
23	Чистопольский	4
24	Алькеевский	5

№ п/п	МО РТ	Выполнение, %
25	Муслюмовский	5
26	Елабужский	6
27	Черемшанский	6
28	Менделеевский	7
29	Альметьевский	8
30	Ютазинский	9
31	Бугульминский	16
32	Дрожжановский	16
33	Пестречинский	19
34	Мензелинский	20
35	Зеленодольский	21
36	Спасский	24
37	Верхнеуслонский	25
38	Нижнекамский	29
39	Лаишевский	54
40	Актанышский	96
41	Апастовский	100
42	Арский	100
43	Высокогорский	100
44	Сабинский	100
45	Казань	100
Всего по РТ:		**18**

Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов

(Программа 2013-2017 годов)

№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ не переданы	ЗУ переданы	Динамика передачи за неделю
1	Зеленодольский	190	181*	9	0
2	Чистопольский	183	179	4	0
3	Казань	89	83	6	0
4	Высокогорский	76	25	51	0
5	Кукморский	53	19*	34	0
6	Арский	54	12	42	0
7	Бугульминский	12	11	1	0
8	Лениногорский	16	8	8	4
9	Агрызский	21	8	13	3
10	Спасский	29	8	21	8
11	Алексеевский	13	3	10	0
	ВСЕГО по РТ	1 102	551	551	21

* два аварийных дома в Зеленодольском и Кукморском районах не снесены

Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов

(Программа 2013-2017 годов)

№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ не переданы	ЗУ переданы	Динамика передачи за неделю
12	Лаишевский	20	3	17	0
13	Тетюшский	8	2	6	0
14	Альметьевский	14	2	12	0
15	Балтасинский	18	2	16	3
16	Ютазинский	19	2	17	1
17	Сабинский	4	1	3	0
18	Буинский	19	1	18	0
19	Нурлатский	23	1	22	0
	ВСЕГО по РТ	1 102	551	551	21

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД
НА 2021 ГОД

41 МО

927 ДОМОВ

БЮДЖЕТ РТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
В РАЗРЕЗЕ МО

№ п/п	МО РТ	Кол-во домов	Лимит, млн.руб.
1	Агрызский	14	29,41
2	Азнакаевский	31	91,61
3	Аксубаевский	9	7,24
4	Актанышский	2	9,02
5	Алексеевский	5	9,62
6	Альметьевский	36	324,82
7	Апастовский	3	3,77
8	Арский	5	15,97
9	Бавлинский	10	40,47
10	Балтасинский	3	5,12
11	Бугульминский	33	219,31
12	Буинский	6	21,45
13	Верхнеуслонский	2	4,99
14	Высокогорский	10	36,80
15	г. Казань	238	2 209,45
16	г. Набережные Челны	134	1 264,61
17	Елабужский	16	133,66
18	Заинский	68	74,59
19	Зеленодольский	33	281,08
20	Камско-Устьинский	3	7,81
21	Кукморский	7	23,86

№ п/п	МО РТ	Кол-во домов	Лимит, млн.руб.
22	Лаишевский	8	24,87
23	Лениногорский	23	139,81
24	Мамадышский	3	24,03
25	Менделеевский	10	54,16
26	Мензелинский	5	22,19
27	Муслюмовский	3	6,50
28	Нижнекамский	98	611,41
29	Новошешминский	2	4,77
30	Нурлатский	9	54,65
31	Пестречинский	17	38,93
32	Рыбно-Слободский	3	6,50
33	Сабинский	14	13,63
34	Сармановский	17	40,74
35	Спасский	4	7,49
36	Тетюшский	7	10,70
37	Тукаевский	9	27,86
38	Тюлячинский	1	0,48
39	Черемшанский	4	2,40
40	Чистопольский	12	113,97
41	Ютазинский	10	24,36
ИТОГО:		927	6 044,144

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

Информация о размещении извещений на торги (1,2)

№ п/п	Предмет закупки	Кол-во домов всего	Примечание	
1	ПСД и СМР	664	632	размещены извещения
			32	не представлены документы: Верхнеуслонский - 2 (из 2 МКД) – необходима корректировка ПКМ Елабужский - 12 (из 16 МКД) – необходима корректировка ПКМ Пестречинский– 15 (из 17 МКД) – необходима корректировка ПКМ Балтасинский – 3 (из 3 МКД) – необходима корректировка ПКМ
2	СМР	180	5	формирование лота: Казань – 3 (из 175 МКД) Высокогорский – 1 (из 10 МКД) Пестречинский – 1 (из 17 МКД)
			175	не представлены документы: Казань – 172 (из 175 МКД) – необходимо заключение о ПДОСС Лаишевский – 1 (из 8 МКД) – необходимо заключение о ПДОСС Пестречинский –1 (из 17 МКД)–необходимо заключение о ПДОСС Чистопольский –1 (из 12 МКД)–необходимо заключение о ПДОСС

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

Информация о размещении извещений на торги (3,4)

№ п/п	Предмет закупки	Кол-во домов всего	Примечание	
3	ПСД на лифты и замена лифтов	90 (247 лифтов)	51 (146 лифтов)	заключены договоры
			35 (91 лифт)	размещены извещения
			4 (10 лифтов)	не представлены документы: Елабужский – 4
4	Замена лифтов	2 (3 лифта)	2 (3 лифта)	не представлены документы: Казань – 2

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

	План, квартир	Финанси-рование, млн.руб.	Бюджет РФ, млн.руб.	Бюджет РТ, млн.руб.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	45	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	9	22,42	22,42	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,50	11,50	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,34	3,34	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КР.СЕВЕРА	3	7,57	7,57	-
ИТОГО:	**739**	**1 197,68**	**101,31**	**1 096,37**

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
1	АЗНАКАЕВСКИЙ	1
2	АРСКИЙ	1
3	БАВЛИНСКИЙ	1
4	БУГУЛЬМИНСКИЙ	1
5	БУИНСКИЙ	1
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	1
8	НУРЛАТСКИЙ	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
9	САБИНСКИЙ	1
10	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1
11	ЮТАЗИНСКИЙ	1
12	АПАСТОВСКИЙ	2
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	8
14	НИЖНЕКАМСКИЙ	11
15	Г.КАЗАНЬ	17
	ИТОГО:	49

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1
4	АРСКИЙ	2
5	БАЛТАСИНСКИЙ	6
6	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2
7	БУИНСКИЙ	1
8	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5
9	ЕЛАБУЖСКИЙ	1
10	ЗАИНСКИЙ	1
11	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4
12	КУКМОРСКИЙ	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей
13	ЛАИШЕВСКИЙ	1
14	МАМАДЫШСКИЙ	1
15	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1
15	МУСЛЮМОВСКИЙ	1
17	НИЖНЕКАМСКИЙ	3
18	НУРЛАТСКИЙ	3
19	САБИНСКИЙ	1
20	САРМАНОВСКИЙ	1
21	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1
22	Г.КАЗАНЬ	1
23	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	5
	ИТОГО:	45

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2021 ГОДУ

ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ

33 ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНЫ РКМ РТ ПО

32

ПРОГРАММЕ

ПО

1

ПРОГРАММЕ ПРОЕКТ РКМ РТ ВНЕСЕН В КМ РТ

ПО

1

ПРОГРАММЕ ПРОЕКТ РКМ РТ НАХОДИТСЯ НА СОГЛАСОВАНИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Проект РКМ, зашедшие в КМ РТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ					
1	Организация горячего питания в школах	1 000 000,00	984 083,64	15 916,36	Вх. КМ РТ от 05.02.2021

Проект РКМ на межведомственном согласовании

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РТ					
1	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	300 000,00	291 413,74	8 586,26	Согл-9850189-13 от 09.10.2020

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД ВЫШЕДШИЕ РКМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Формирование комфортной городской среды (49 объектов)*	1 535 704,57	1 460 262,10	75 442,47	ГК № 125-20/СМР, № 126-20/СМР от 23.10.2020 (46 объектов)
2	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок (15 объектов)	300 000,00	292 289,10	7 710,90	УСП, лыжные базы – ГК № 144-20/СМР от 29.12.2020, Манежи - ГК ориент. 15.02.2021
3	Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза РТ (28 объектов)	70 500,00	70 500,00	-	ГК ориент. 12.02.2021
4	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии (12 объектов)	30 000,00	30 000,00	-	
5	Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений (13 объектов)	20 000,00	20 000,00	-	
6	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (16 объектов)	50 000,00	47 507,37	2 492,63	ГК ориент. 15.02.2021
7	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания (29 объектов)	100 000,00	100 000,00	-	
8	Капитальный ремонт спортивных объектов (20 объектов)	500 000,00	484 175,08	15 824,92	ГК ориент. 15.02.2021 (8 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (10 объектов)

* В т.ч. 3 объекта, проект РКМ РТ о внесении изменений на межведомственном согласовании (согл-10249273-2 от 18.01.2021)

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД ВЫШЕДШИЕ РКМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
9	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений МО (28 объектов)	100 000,00	97 292,89	2 707,11	ГК ориент. 15.02.2021 (13 объектов) ГК ориент. 31.03.2021 (15 объектов)
10	Строительство и капитальный ремонт стационаров (25 объектов)	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	ГК ориент. 15.02.2021 (10 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (11 объектов)
11	Обеспечение населения питьевой водой (126 объектов СМР, 56 ПИР)	650 000,00	589 250,00	60 750,00	18.02.2021 – 403,13 млн. руб. 01.03.2021 – 212,0 млн. руб.
12	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета (11 852 светильника, 203 км СИП, 34 ВЩУ)	225 000,00	224 900,00	100,00	ГК ориент. 18.02.2021
13	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей (12 объектов)	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	ГК ориент. 20.02.2021 (3 объекта) ГК ориент. 31.03.2021 (9 объектов)
14	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения (50 объектов)	330 000,00	318 119,88	11 880,12	ГК ориент. 26.02.2021 (47 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (3 объекта)

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД ВЫШЕДШИЕ РКМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
15	Строительство дошкольных образовательных организаций (13 объектов)	3 021 020,04	3 014 003,10	7 016,94*	ГК ориент. 26.02.2021 (9 объектов) ГК ориент. 31.03.2021 (4 объекта)
16	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации (13 объектов)	167 100,00	167 100,00	-	01.03.2021 – 94,0 млн. руб. 15.04.2021 – 67,6 млн. руб.
17	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений (44 объекта)	69 900,00	65 007,00	4 893,00	01.03.2021 – 40,45 млн. руб. 15.04.2021 – 24,5 млн. руб.
18	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (39 объектов)	162 200,00	150 846,00	11 354,00	01.03.2021 – 142,46 млн. руб. 15.04.2021 – 8,84 млн. руб.
19	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах (50 ВНБ, 33 скважины, 11 км водопровода, 52 площадки ТБО)	150 000,00	150 000,00	-	ГК ориент. 01.03.2021

* Сумма выделена на 2 объекта по которым ранее не разработана ПСД

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД ВЫШЕДШИЕ РКМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
20	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии (11 объектов)	111 403,45	111 403,45	-	ГК ориент. 31.03.2021
21	Капитальный ремонт молодежных центров (4 объекта)	95 000,00	91 390,00	3 610,00	
22	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов (9 объектов)	50 000,00	48 890,00	1 110,00	
23	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий (6 объектов)	190 049,80*	181 199,96	8 849,84	
24	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (6 объектов)	150 000,00	145 264,42	4 735,58	
25	Капитальный ремонт сети подростковых клубов (11 объектов)	100 000,00	92 469,00	7 531,00	ГК ориент. 30.04.2021
26	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ (12 объектов)	150 000,00	139 520,00	9 340,00	
27	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей (9 объектов)	500 000,00**	481 000,00	19 000,00	

* С учетом нераспределенного лимита - 130 451,88 тыс.рублей

** с учетом нераспределенного лимита – 213 712,25 тыс.рублей

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД ВЫШЕДШИЕ РКМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
28	Капитальный ремонт объектов образования (213 объектов)	2 000 000,00	1 921 079,41	78 920,59	ГК ориент. 31.05.2021
29	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов) (7 объектов)	60 000,00	60 000,00	-	Субсидия Торги не требуются
30	Капитальный ремонт овощехранилищ (5 объектов)	15 000,00	15 000,00	-	
31	Строительство силосно-сенажных траншей (67 объектов)	54 600,00	54 600,00	-	

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СУЧАЕВ

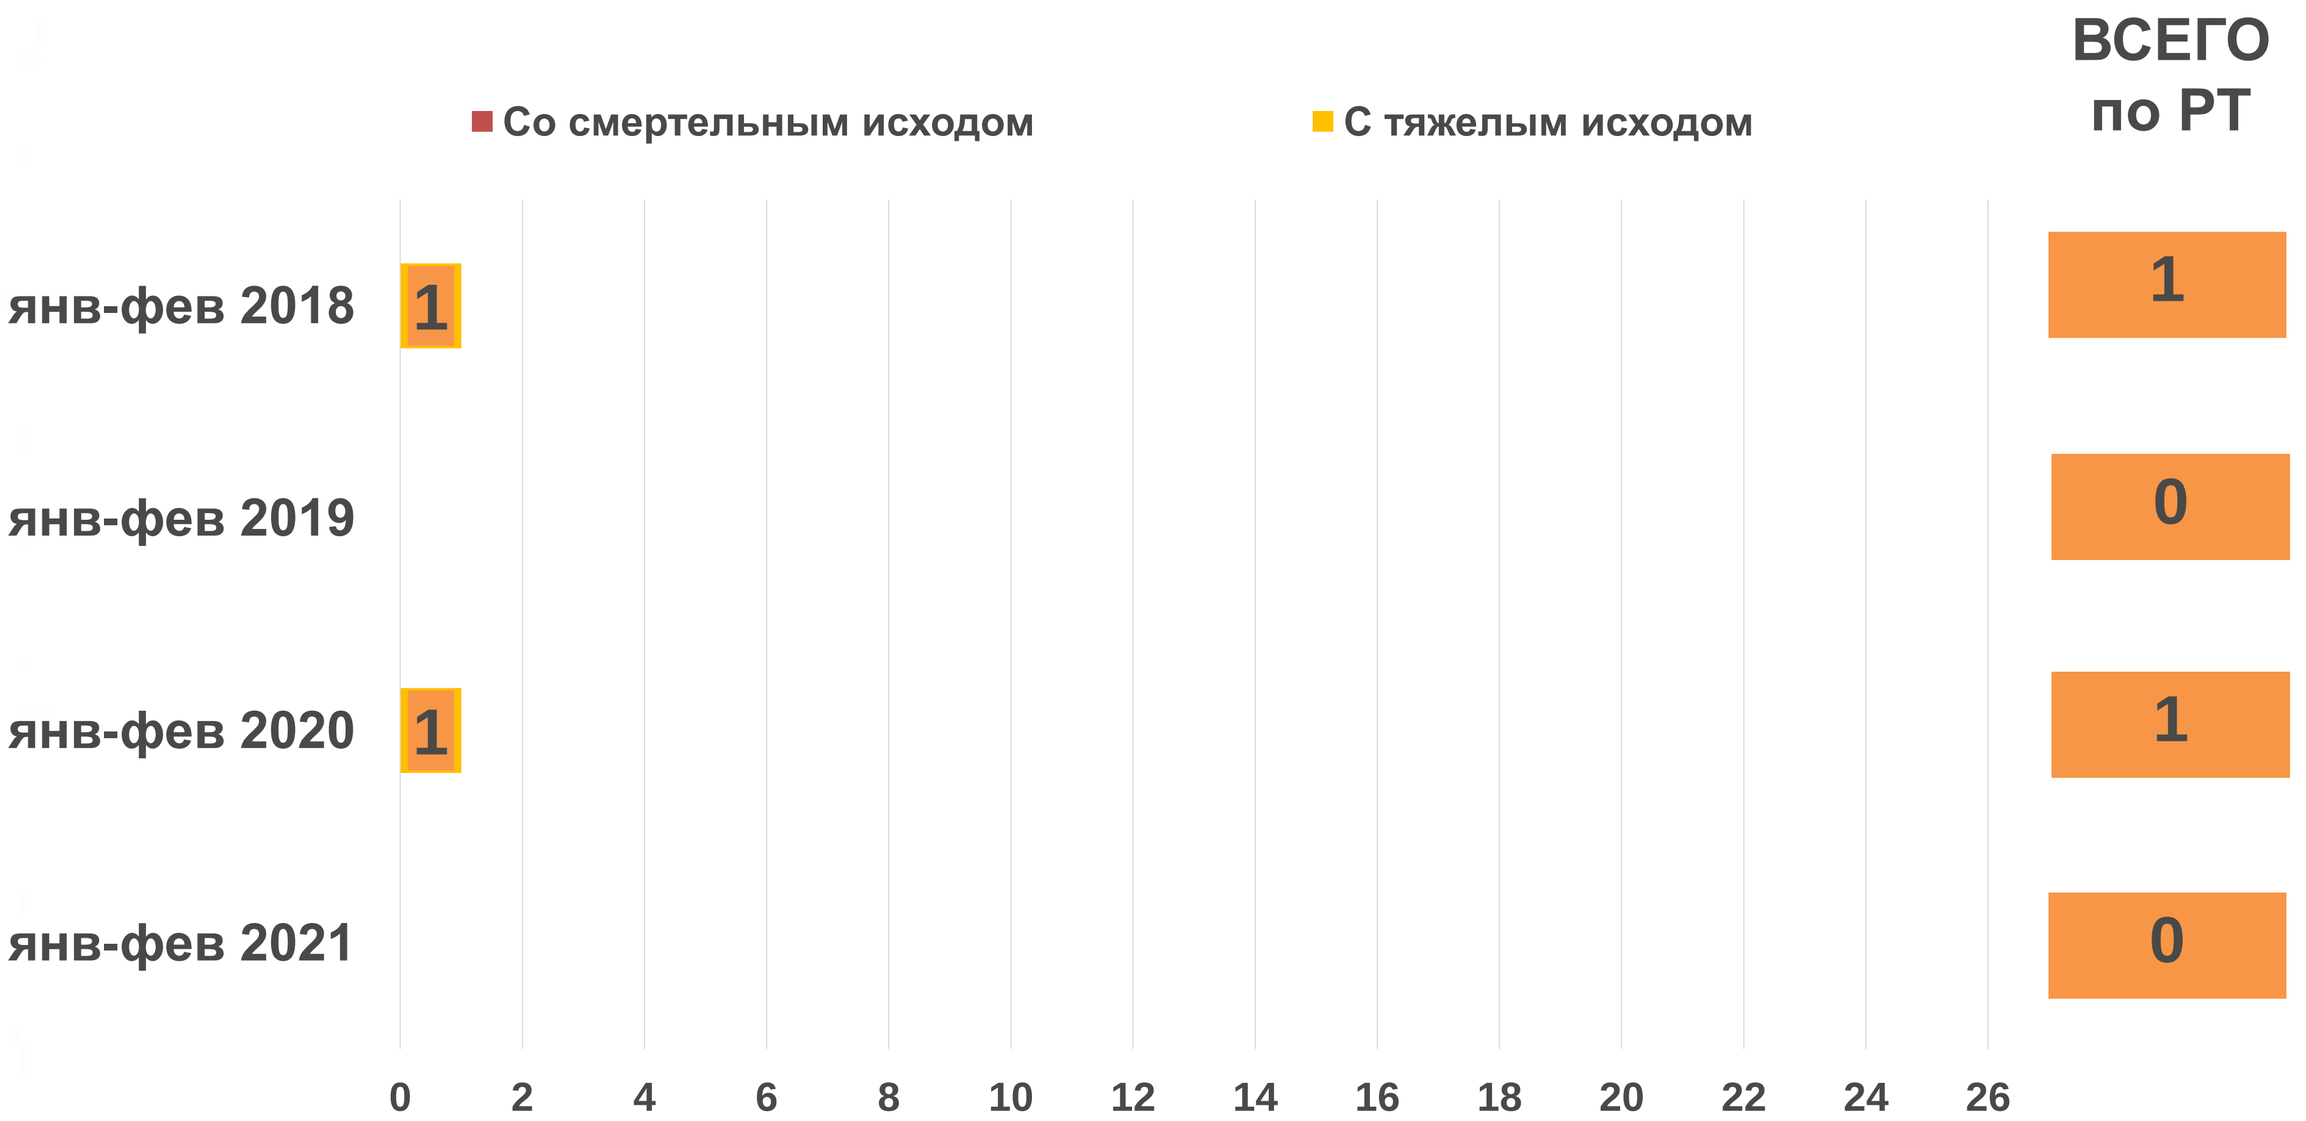

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ

Строительство кафе-бильярдной по ул.Гаврилова, г.Казань

Баллон с газом эксплуатируется с разбитым манометром

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «ЖИЛСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ООО «Строитель»

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	83	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ:		
- ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,	1	30,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	-	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	-	-
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	-	-
ОБЖАЛУЮТСЯ В СУДЕ	-	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	**95**
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	56
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	**26**
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	26
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	-
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	-
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	194
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	48
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	48
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	13

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г. Казань	25	19	19	100
2	г. Набережные Челны	11	1	1	100
3	Агрызский	5	0	0	-
4	Азнакаевский	4	0	0	-
5	Аксубаевский	2	0	0	-
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	2	4	4	100
8	Алькеевский	2	0	0	-
9	Альметьевский	4	6	6	100
10	Апастовский	8	3	3	100
11	Арский	1	0	0	-
12	Атнинский	0	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	1	0	0	-
16	Буинский	9	2	2	100
	ВСЕГО по РТ	194	48	48	100

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	2	0	0	100
18	Высокогорский	1	0	0	-
19	Дрожжановский	4	0	0	-
20	Елабужский	8	0	0	-
21	Заинский	3	0	0	-
22	Зеленодольский	2	0	0	-
23	Кайбицкий	2	0	0	-
24	Камско-Устьинский	3	4	4	100
25	Кукморский	7	0	0	-
26	Лаишевский	2	1	1	100
27	Лениногорский	14	4	4	100
28	Мамадышский	10	0	0	-
29	Менделеевский	5	0	0	-
30	Мензелинский	1	0	0	-
31	Муслюмовский	2	0	0	-
	ВСЕГО по РТ	**194**	**48**	**48**	**100**

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»

№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	9	0	0	-
33	Новошешменский	2	0	0	-
34	Нурлатский	3	2	2	100
35	Пестречинский	1	0	0	-
36	Рыбно-Слободский	1	0	0	-
37	Сабинский	2	0	0	-
38	Сармановский	1	0	0	-
39	Спасский	2	0	0	-
40	Тетюшский	7	0	0	-
41	Тукаевский	9	0	0	-
42	Тюлячинский	1	0	0	-
43	Черемшанский	2	0	0	-
44	Чистопольский	6	0	0	-
45	Ютазинский	4	0	0	-
	ВСЕГО по РТ	194	48	48	100

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
