




Травматизм в строительной отрасли

(по данным Государственной инспекции труда в РТ)

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
2013 год	75	33	42
2014 год	57	19	38
2015 год	44	17	27
2016 год	31	11	20



Травматизм в строительной отрасли (в разрезе МО)

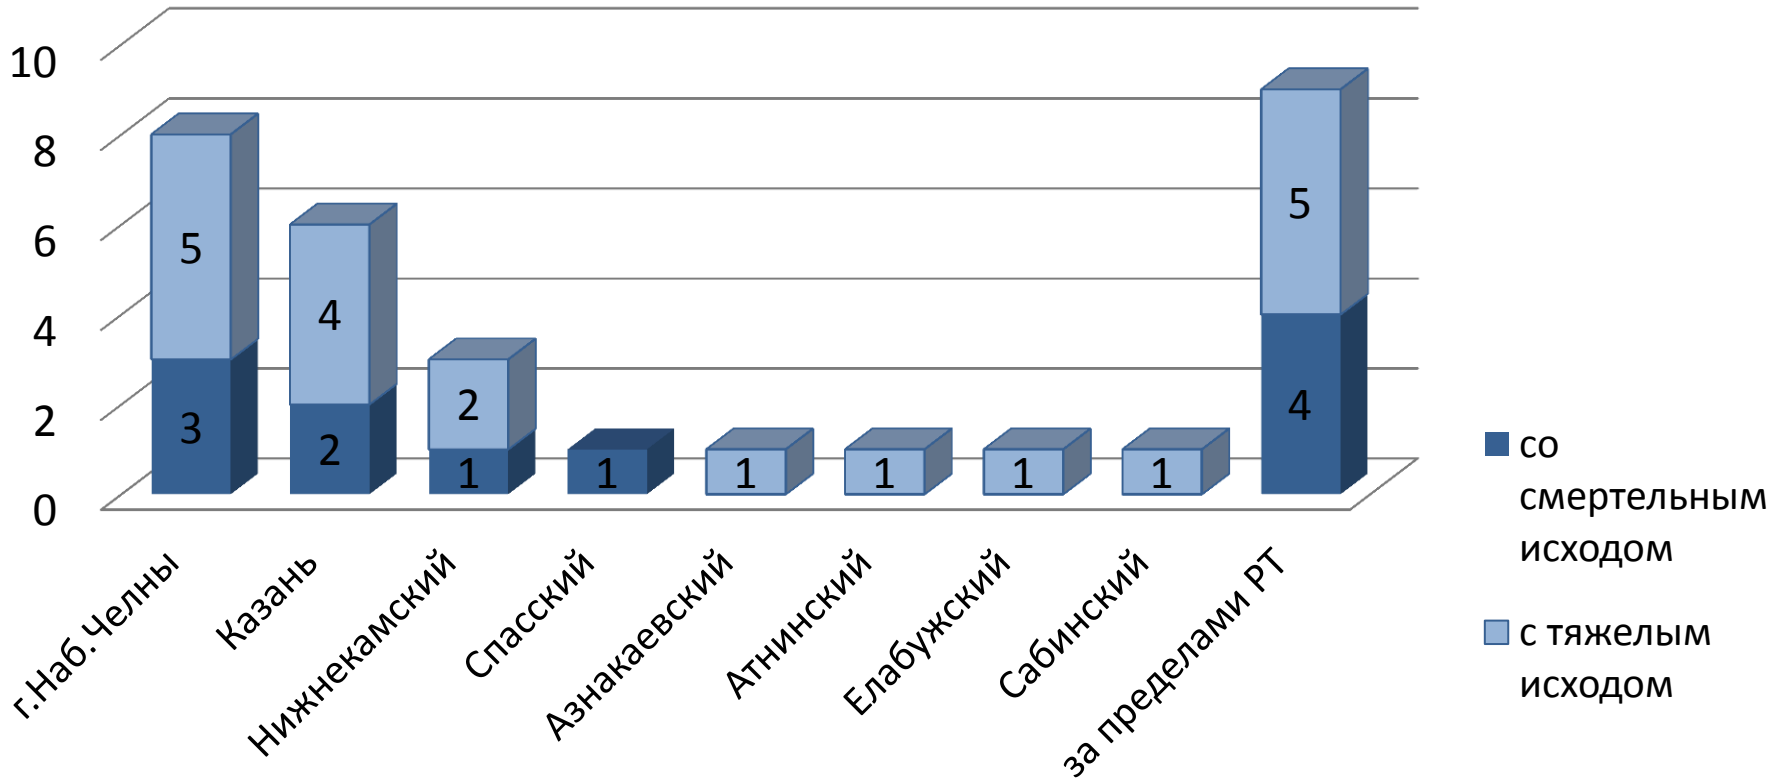



Травматизм в строительной отрасли

(смертельные случаи в разрезе МО)

№	МО	Количество несчастных случаев	
		2015г.	2016г.
1	г. Казань	9	2
2	г.Наб.Челны	-	3
3	Верхнеуслонский	2	-
4	Нижекамский	3	1
5	Спасский	-	1
	за пределами РТ	3	4
	ИТОГО:	17	11




Травматизм в строительной отрасли

(тяжелые случаи в разрезе МО)

№	МО	Количество за год	
		2015г.	2016г.
1	г. Казань	5	4
2	г.Наб.Челны	2	5
3	Азнакаевский	-	1
4	Арский	1	-
5	Атнинский	-	1
6	Бугульминский	1	-
7	Елабужский	1	1
8	Нижнекамский	8	2
9	Пестречинский	1	-
10	Сабинский	-	1
	за пределами РТ	8	5
	ИТОГО:	27	20


Виды несчастных случаев

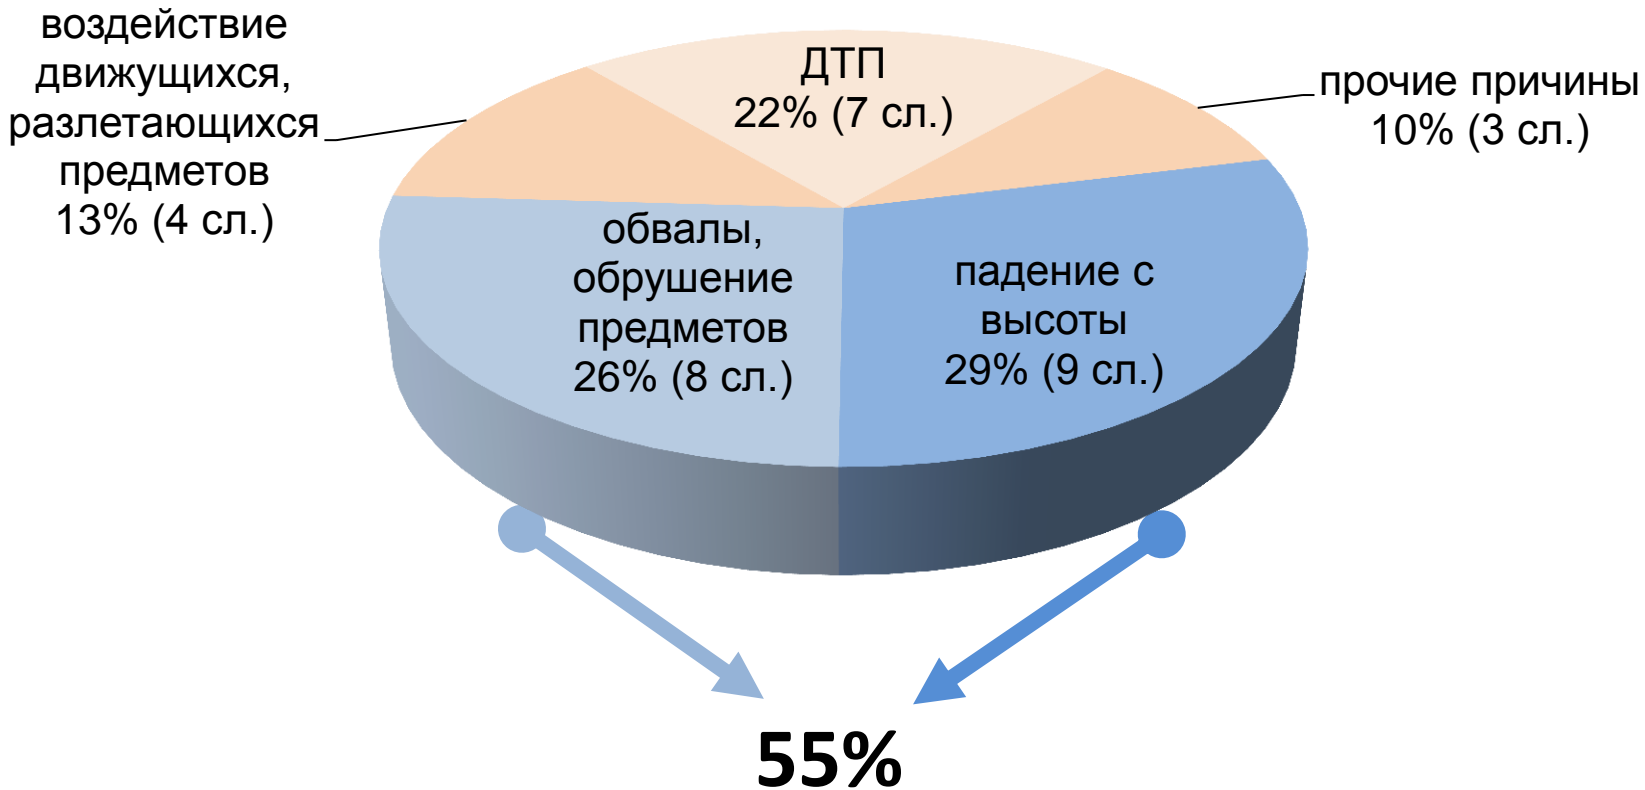

55%
падение с высоты и обвалы, обрушение предметов



Виды объектов, на которых произошли несчастные случаи

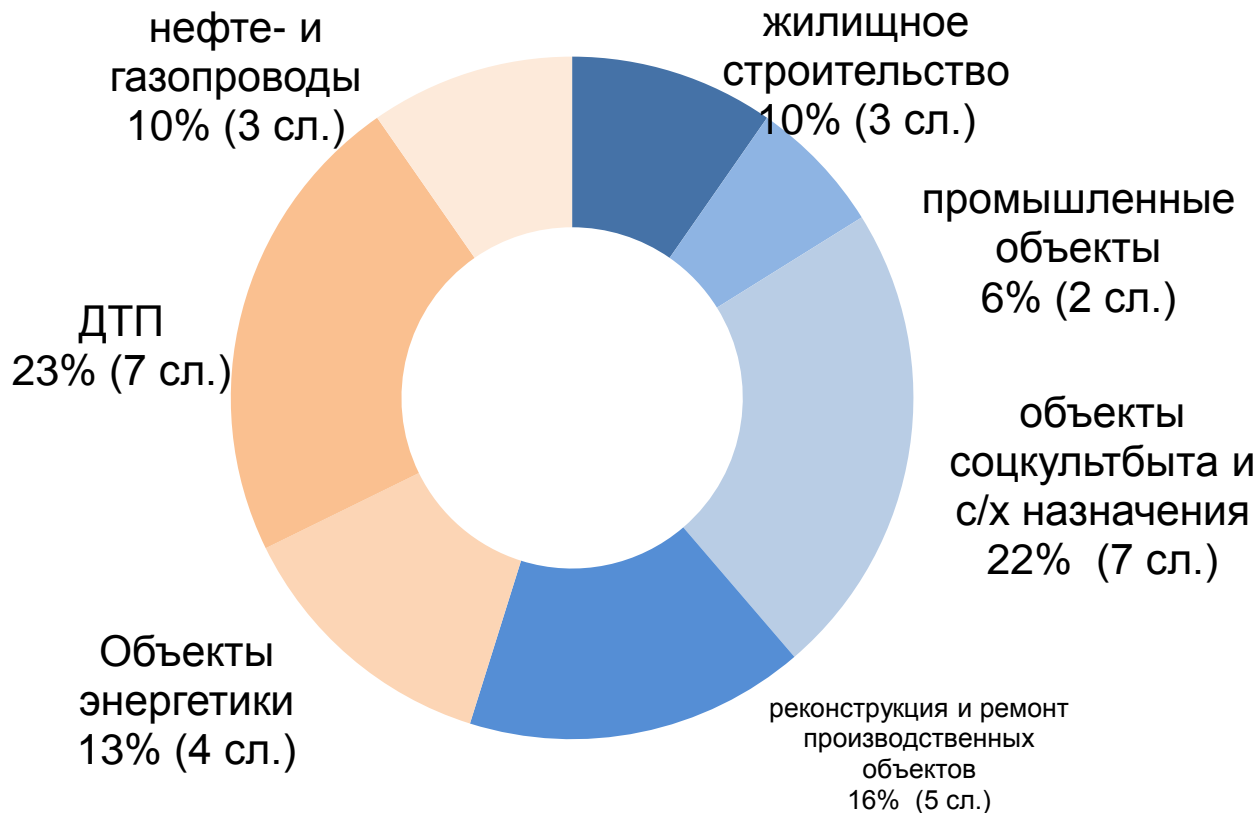



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(по данным Государственной инспекции труда в РТ и
Инспекции государственного строительного надзора РТ)

Проведено

1 685 проверок

Вынесено **523** постановления

об административной ответственности на сумму

19 439,0 тыс.руб.

Взыскано по **311** постановлениям

13 412,0 тыс.руб.

Не истек срок оплаты по **95** постановлениям на сумму

3 987,0 тыс.руб.

Направлено

в службу судебных приставов **18** постановлений на сумму

1 570,0 тыс.руб.

Обжалуются в суде **6** постановлений на сумму

440,0 тыс.руб.



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(по данным АСРО «Содружество строителей РТ»)

Всего проведено

842 проверки,

в том числе с выездом
на объекты строительства -

202 проверки


Приняты меры дисциплинарного воздействия по **372** проверкам, в том числе:

- выдано **93** предписания;
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев по **224** проверкам;
- прекращено действие **45** Свидетельств



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Главное инвестиционно-строительное управление РТ)

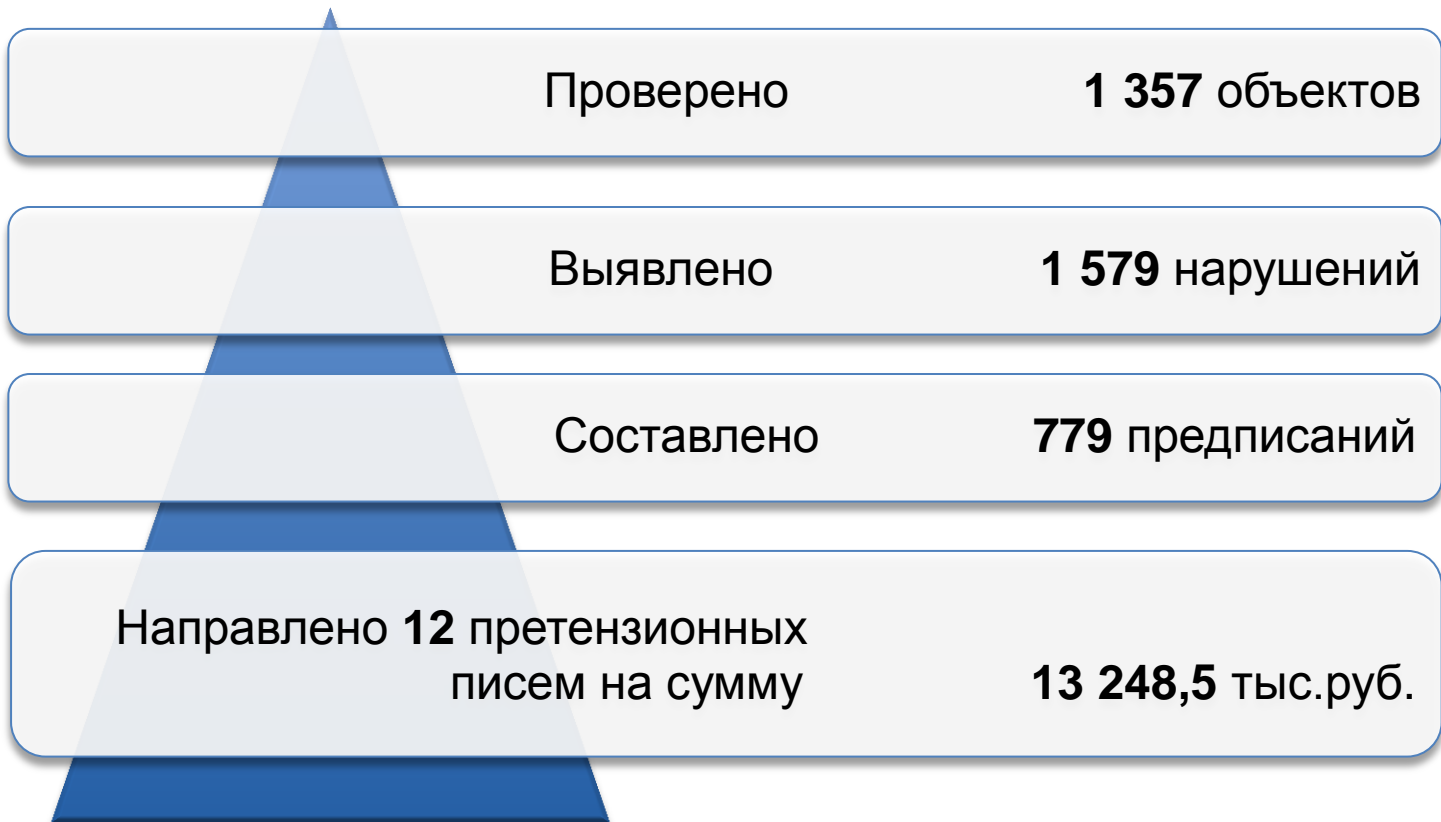



Профилактическая работа по охране труда в РТ в 2016 году

10

- | | |
|--|---|
| • Заседания рабочей группы по охране труда | 18 заседаний |
| • Обезды строящихся объектов
(МО, контрольно-надзорные органы, СРО, Минстрой РТ) | 3 050 обездов |
| • Смотры-конкурсы по охране труда
(республиканские и в МО) | 103 смотра-конкурса |
| • Заседания Координационных советов
в МО по строительной отрасли | 202 заседания |
| • Мероприятия к Всемирному дню охраны труда,
в том числе республиканские | 95 мероприятий
3 мероприятия |
| • Обучение руководителей и специалистов строительных
организаций по охране труда за счет бюджета РТ | 242 человек |
| • Республиканские мероприятия по ОТ
(круглые столы, семинары, выставки) | 12 мероприятий |
| • Мероприятия по ОТ в МО
(круглые столы, семинары, выставки) | 213 мероприятий |



Готовность документации для строительства объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено документов по зем.участкам в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка ПИР
1	Строительство объектов культурного назначения	86	Типовой проект, необходима привязка
2	Строительство зданий советов поселений	48	Типовые проекты
3	Строительство врачебных амбулаторий	25	Сооружение модульного типа
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	10	
	Строительство патологоанатомических отделений	30	
4	Строительство спортивных площадок	55	Типовые проекты
5	Устройство лыжных баз	3	Типовые проекты



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
6	Капремонт объектов образования	100	100
7	Капремонт ресурсных центров	100	100
8	Капремонт детских оздоровительных лагерей	90	90
9	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100	100
10	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	100	100
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	100	100
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	100/10	100/10
13	Капремонт объектов здравоохранения	42	42



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка сметной документации, в %
14	Капитальный ремонт коровников	76	76
15	Капитальный ремонт муниципальных архивов	100	100
16	Капитальный ремонт зданий советов поселений	100	100

**Готовность документации по программам 2017 года реализуемых через
ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития
инженерных сетей Республики Татарстан»**



№	Наименование программы	Разработка проектно- сметной документации
1	Обеспечение населения водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан	Ведется разработка проектно-сметной документации с последующим прохождением Госэкспертизы
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан	Перечень сформирован и направлен на согласование в ОАО «Сетевая компания» для рассмотрения, после согласования которого начнется комиссионное обследование объектов
3	Проведение работ по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетных учреждений Республики Татарстан	Согласно графика проведено комиссионное обследование объектов в 12 муниципальных образованиях с представителями РОСТЕХНАДЗОР и ООО «Газпром Трансгаз Казань». По остальным районам обследование продолжается согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах Республики Татарстан	Ведутся подготовительные работы по переводу пгт.Уруссу на индивидуальную систему отопления



Программа жилищного строительства 2017 года

15

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	В том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малоэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 402 000	534 083	896 944	970 973
1	Агрызский	20 000	0	4 240	15 760
2	Азнакаевский	25 000	2 895	0	22 105
3	Аксубаевский	6 000	1 097	0	4 903
4	Актанышский	12 000	77	0	11 923
5	Алексеевский	14 000	1 521	0	12 479
6	Алькеевский	6 500	60	0	6 440
7	Альметьевский	155 000	28 139	19 181	107 680
8	Апастовский	15 000	1 097	0	13 903
9	Арский	27 000	1 728	5 884	19 388
10	Атнинский	4 000	1 610	0	2 390
11	Бавлинский	17 000	4 641	0	12 359
12	Балтасинский	14 000	0	0	14 000
13	Бугульминский	40 000	5 564	1 000	33 436
14	Буинский	15 000	916	0	14 084
15	Верхне-Услонский	30 000	0	0	30 000



Программа жилищного строительства 2017 года

16

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	в том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малоэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 402 000	534 083	896 944	970 973
16	Высокогорский	70 000	11 003	5 234	53 763
17	Дрожжановский	5 000	0	0	5 000
18	Елабужский	50 000	7 883	32 228	9 889
19	Заинский	17 000	0	0	17 000
20	Зеленодольский	140 000	59 379	26 416	54 205
21	Кайбицкий	4 800	0	0	4 800
22	Камско-Устьинский	10 000	2 331	0	7 669
23	Кукморский	25 000	1 550	1 334	22 116
24	Лаишевский	80 000	0	8 989	71 011
25	Лениногорский	30 000	0	5 641	24 359
26	Мамадышский	15 000	1 796	0	13 204
27	Менделеевский	10 000	0	0	10 000
28	Мензелинский	16 000	0	0	16 000
29	Муслюмовский	8 000	0	0	8 000
30	Нижнекамский	130 000	57 474	27 198	45 328



Программа жилищного строительства 2017 года

17

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	В том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малозэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 402 000	534 083	896 944	970 973
31	Новошешминский	5 000	63	0	4 937
32	Нурлатский	24 000	0	0	24 000
33	Пестречинский	85 000	1 528	45 598	37 874
34	Рыбно-Слободский	13 000	0	0	13 000
35	Сабинский	18 000	780	0	17 220
36	Сармановский	10 000	0	0	10 000
37	Спасский	8 000	2 326	0	5 674
38	Тетюшский	10 000	0	0	10 000
39	Тукаевский	85 000	0	0	85 000
40	Тюлячинский	7 500	0	1 000	6 500
41	Черемшанский	6 000	90	0	5 910
42	Чистопольский	50 000	15 760	0	34 240
43	Ютазинский	10 000	2 475	0	7 525
44	г.Казань	800 000	301 479	485 656	12 865
45	г.Набережные Челны	300 000	18 821	227 345	53 834



Программа ГЖФ 2017 года

Кол-во домов, план	Оформлены земельные участки	Наличие ПСД	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на стр-во
			Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ	
140	140	133	137	137	135	139	132	140



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2017 году.

21

Наименование	План	Финансирование, млн.рублей
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	305	346,7246
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	49	143,7845
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	50	50,0
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Всего по ПВГО ФЦП «Жилище»	49	90,2755
Чернобыльцы	20	33,5924
Вынужденные переселенцы	26	53,5076
Переселенцы с Крайнего Севера	2	2,009
Уволенные военные	1	1,1662

Инвестиционное жилье 2017 года (по данным МО РТ)



Кол-во МКД, план	Оформлены земельные участки	Наличие ПСД	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на стр-во
			Вода	Канализация	Электро-снабжение	Тепло	Газ	
111	107	106	97	101	97	97	97	105



Программы 2017 года (объекты социально-культурного назначения)

Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов	
		План	Начаты работы на 06.01.17
Сельские клубы			
Строительство многофункциональных центров	274,97	31	2
Модернизация первичной медико-санитарной помощи в РТ			
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	121,00	42	0
Строительство патологоанатомических отделений	37,28	5	0
Строительство врачебных амбулаторий	54,69	6	0
Кап. ремонт станций медпомощи и больниц	41,99	6	1
Кап. ремонт амбул.-поликлинических учреждений	62,30	8	0
Кап. ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства			
Кап. ремонт зданий учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	30,00	26	1
Кап. ремонт зданий Минсельхоза РТ	20,00	15	0
Универсальные спортивные площадки			
Строительство УСП	355,89	120	0
Строительство блочных модульных лыжных баз	66,00	11	0



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

25

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 355,13

1 073,05

2 628,7

5 056,88



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

28

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

29

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

30

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить - 6 газораспределительных шкафов Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	Строительство и реконструкция 12-ти биологических очистных сооружений канализаций в 12 МО.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	1 052	30,6%	6,8%
МКД	3 191	802	25,1%	0,2%
Частный сектор	250	250, в т.ч.: 43 – по программе ФГ 207 – за счет собственных средств	100%	0%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за январь	План на 2017 г.		
	январь ПЛАН	январь ФАКТ		февраль	март	апрель
3 441	1 951	1 052	53,9%	650	550	290



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	331	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



**Программа развития общественных пространств в
муниципальных образованиях на 2017 год
(проект РКМ РТ, согл-5211331-1 от 5.01.2017)**

Запланировано 57 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ - 1 900,0 млн.руб. (СМР)

Средства бюджета РТ - 100,0 млн.руб. (ПИР)



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
120 870,0	10	96	106



Модернизация инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

№	МО РТ	Капремонт площадок ТБО, тыс.рублей	Капремонт системы водоснабжения тех. водой, тыс.рублей	Модернизация объектов электросетевого хозяйства, тыс.рублей
1	Альметьевский	50 000,0	100 000,0	100 000,0
2	Высокогорский			
3	Верхнеуслонский			
4	Зеленодольский			
5	Лаишевский			
6	Нижнекамский			
7	Тукаевский			
8	г. Казань			



Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик	ООО «Грань»	
		Технический заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
		Стоимость объекта, млн. руб.	Не определена	
		Начало строительства	Апрель 2015 г.	
		Срок завершения строительства	Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 30.12.16 по 06.01.17		Остаток
1 434,84	725,90	0,00		681,29
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (30.12.2016г. – 06.01.2017г.)		9,72	10,02	103,08
СМР		9,72	10,02	103,08
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 06.01.2017г.)		4,86	5,01	103,08
СМР		4,86	5,01	103,08
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.01.2017г.)		1 458,35	1 470,84	100,85
СМР		1 458,35	1 470,84	100,85
Оборудование		0,00	0,00	0,00



Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (30.12.2016г. – 06.01.2017г.)	9,87	10,13	102,56
СМР	9,87	10,13	102,56
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 06.01.2017г.)	4,90	5,03	102,65
СМР	4,90	5,03	102,65
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.01.2017г.)	653,79	665,92	101,85
СМР	653,79	665,92	101,85
Оборудование	0,00	0,00	0,00



Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

42

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (30.12.2016г. – 06.01.2017г.)	1,02	0,98	96,08
СМР	1,02	0,98	96,08
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 06.01.2017г.)	0,52	0,49	94,23
СМР	0,52	0,49	94,23
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.01.2017г.)	33,68	33,58	99,70

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Агрызский район					
1	г.Агрыз, ул.Гоголя	+			
2	г.Агрыз, юго-восточная часть	+			
Аксубаевский район					
3	пгт. Аксубаево, ул.Саморенкина, Гусева, Хамадиева	+			
4	п. Сосновка	+			
5	пгт. Аксубаево, ул.Х.Туфана	+			
6	п. Аксубаевского лесозавода	+			
Алексеевский район					
7	н.п. Ивановский, ул.Центральная	+			
Алькеевский район					
8	н.п. Каргополь				

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Альметьевский район					
9	г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул.Бахорина	+			
10	г. Альметьевск, ул.Кислородная, Карьерная, Промышленная	+			
11	г. Альметьевск, ул.Радио, Спартак	+			
Арский район					
12	д. Ташкич, ул. Х. Такташ, ул. Г. Тукая				
13	с. Ташкичу, ул.Нариманова, ул.Ленина				
14	с. Большие Вережи, ул.Татарстан				
15	с. Старый Айван, ул.М.Айвань				
16	с. Купербаш, ул.Школьная, ул.Татарстан				
17	д. Васильева Бужа, ул.Магистральная, ул.Полевая, ул.Центральная				
18	с. Новое Чурилино, ул.Сергина, ул.Школьная				

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Атнинский район					
19	н.п.Большая Атня, ул. Б. Зиганшина, Октябрьская	+			
Бавлинский район					
20	н.п. Старые Чути, ул.Речная	+		+	
21	г. Бавлы, ул.Юбилейная, Западная	+		+	
22	г. Бавлы, ул.Радужная, Горная	+		+	
Балтасинский район					
23	с. Старый Салаусь, ул.Мира, Минуллина	+			
24	с. Ципья, ул.Чайникова	+			
25	пгт. ,Балтаси, мкр. Южный, ул.Халяльная, Воинов-Интернационалистов, Б.Ахмадуллиной	+			
26	н.п.Верхний Субаш, ул.Школьная	+			
27	н.п. Сала-Кушкет, ул.Комсомольская	+			
28	с. Арбор, ул.Молодежная, Татарстан	+			
29	н.п.Верхний Шубан, ул.Центральная	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Буинский район					
30	с.Черки-Гришино	+			
31	д. Мещеряково	+			
32	г.Буинск ул.Комарова	+			
33	г.Буинск ул.Железнодорожная	+			
34	г.Буинск ул.Кольцевая	+			
Верхнеуслонский район					
35	д. Елизаветено Верхнеуслонский р-н РТ				
36	д. Рудник Верхнеуслонский р-н РТ				
37	с. Набережные Моркваши				
Высокогорский район					
38	с.Дубьязы, ул.Авдеева	+			
39	п. Бирюлинский зверосовхоз, ул.Садовая, Светлая, Залесная	+			
40	с. Высокая Гора, ул.Озерная	+			
41	н.п. Ильино				
42	д. Мазяр	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Дрожжановский район					
43	С. Шланга	+			
Елабужский район					
44	г. Елабуга, ул.Московская, Городищенская	+			
45	г. Елабуга, ул.Пристанская, Прикамская	+			
46	г. Елабуга, ул.Окружное шоссе (кольцо), микрорайон Лесная Поляна	+			
47	г. Елабуга, ул.Отрадная, микрорайон Лесная Поляна	+			
48	г. Елабуга, ул.Северная	+			
49	г. Елабуга, микрорайон Елабужский	+			
50	г. Елабуга, микрорайон 4-10	+			
51	д. Большая Тарловка	+			
52	д. Колосовка	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Зеленодольский район					
53	д.Воронино, ул.Садовая, Поперечная, Центральная	+			
54	г.Зеленодольск, ул.Октябрьская, Островского	+			
55	п.Новочувашское	+			
56	пгт.Нижние Вязовые, ул.Мира	+			
57	д. Бритвино	+			
58	с.Айша, ул.Новая ул.Школьная	+			
Кукморский район					
59	с. Новый Сардек, ул.Центральная				
60	д. Красный Цветок				
61	пгт. Кукмор, ул.Почтовая				
62	н.п.Копки				
Лаишевский район					
63	н.п. Тарлаши	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Менделеевский район					
64	г. Менделеевск, ГРП-5 ул.Пушкина, ГРП-6 ул.Бурмистрова				
65	г. Менделеевск, 112 земельных участков, ул.Пастернака, Георгиевского, Полевая				
66	г.Менделеевск,4,84-х квартирный жилой дом				
Мензелинский район					
67	н.п. Подгорый Байлар, ул.Мирная, Школьная, Центральная				
68	г. Мензелинск, ул.К.Либкнехта				
Муслюмовский район					
69	с. Муслюмово, мкр. «Янарыш», ул. Ф. Садриева, Б.Валиева, Тынычлык, Тургай, Шатлык, Таулы, Дуслык	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Нижнекамский район					
70	г. Нижнекамск, п.Красный Ключ, ул.Ключевая, 5, ул.Центральная, 1				
71	н.п. Н.Афанасово, ул.Центральная				
72	п. Красный Ключ, ул.Ключевая				
Нурлатский район					
73	п. Старый Аул				
Пестречинский район					
74	п. Первое Мая, ул.Первомайская				
75	н.п.Куюки				
Рыбно-Слободский район					
76	н.п. Новый Арыш	+			
Сабинский район					
77	с. Б. Сабы, ул.Пионерская	+			
78	с. Шемордан, ул.Семейная, Солнечная, Дальняя, Родниковая, Радужная	+			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Сармановский район					
79	с. Сарманово, ул.Мира, Новая, Болгар, Айтуган, Победы, Сююмбике, С. Рафикова, Р. Камалетдинова	+			
80	с. Муртыш-Тамак, ул.Молодежная	+			
Спасский район					
81	п. Коминтерн				
82	г. Болгар, ул.Вахитова, ж.д. №66	+			
83	п.Приволжский, ул.Заповедная, Ленинградская, Приволжская, Луговая, Щорса, Лермонтова, Витебская, Владимирская, Декабристов, Спасская, Тенишевская, Орловская				
Тукаевский район					
84	н.п. Старые Ерыклы, ул.Восточная, Народная				
85	н.п .Биклянь, ул.Магариф				
86	н.п. Новотроицкий, ул.Челнинская, Ленина				

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление об утверждении ППТ, размещение в сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Тюлячинский район					
87	с. Тюлячи, ул.Спортивная	+			
88	с. Тюлячи, ул.Ш.Усманова	+			
89	д. Большие Меретяки, д. Удельные Меретяки	+			
90	с. Максабаш, ул.Нагорная	+			
Чистопольский район					
91	с. Бурнашева	+			
92	г. Чистополь, мкр. Подсобного хозяйства кондитерской фабрики	+			
93	г. Чистополь, ул.Левитана, Репина	+			
94	г. Чистополь	+			
95	н.п. Бахта	+			
96	н.п. Ст. Иванаево	+			
Ютазинский район					
97	н.п. Дым-Тамак, ул.Матросова, Ленина	+			
Казань					
98	п. Петровский				
99	П. Алтан, ул.Заветная				
